ATTI PARLAMENTARI

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **CXLVII**
n. **2**

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE RECANTE INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA

(Aggiornata al 31 dicembre 2006)

(Articolo 4, ultimo comma, della legge 29 novembre 1984, n. 798)

Predisposta dal Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo, istituito ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge 29 novembre 1984, n. 798

Presentata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali

(CHITI)

Trasmessa alla Presidenza il 18 settembre 2007

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

PAGINA BIANCA

INDICE

1. Quadro riepilogativo dei finanziamenti e dello stato di attuazione degli interventi finanziati della legislazione speciale per Venezia ..... *Pag.* 5

1.1. Premessa ..... » 5

1.2. Lo stato di attuazione ..... » 6

1.3. Il ruolo dell'Ufficio di Piano ..... » 13

1.4. L'attività del Comitato ex articolo 4 legge n. 798 del 1984 nel corso del 2006 ..... » 14

1.5. Conclusioni ..... » 18

2. Stato di attuazione dei finanziamenti da parte dei diversi soggetti attuatori ..... » 21

2.1. Interventi di competenza dello Stato (in amministrazione diretta e in concessione al Consorzio Venezia Nuova) ..... » 21

2.2. Stato di attuazione degli interventi di competenza della Regione del Veneto ..... » 23

2.3. Stato di attuazione degli interventi di competenza del Comune di Venezia, del Comune di Chioggia e del Comune di Cavallino – Treporti ..... » 24

2.4. Stato di attuazione degli interventi di competenza di altre amministrazioni ..... » 26

PAGINA BIANCA

1 QUADRO RIEPILOGATIVO DEI FINANZIAMENTI E DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA LEGISLAZIONE SPECIALE PER VENEZIA

1.1 Premessa

La presente relazione costituisce l'aggiornamento sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna che, in base all'art. 4 della Legge n. 798/84, il Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo è tenuto a trasmettere annualmente al Parlamento, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali.

Il Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo ex art. 4 legge n. 798/84, infatti, in conformità ai disposti della legislazione speciale per Venezia, ha esercitato ed esercita le proprie funzioni seguendo e promuovendo le attività dei vari soggetti attivi nell'attuazione della Legge Speciale, costituendo il punto di riferimento e di coordinamento tra i vari Organismi che operano per la salvaguardia e che rappresentano realtà ed esigenze fortemente diversificate, nonostante perseguano l'unico obiettivo della salvaguardia di Venezia.

I lavori del Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo ex art. 4 legge n. 798/84 consentono di sviluppare e di porre in essere alcune fondamentali tematiche riguardanti la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, permettendo l'assunzione di decisioni di carattere generale e di scelte operative specifiche, in forma di stretto coordinamento e di cooperazione tra i diversi Organismi attivi sul territorio lagunare.

La Relazione che annualmente il Comitato ex art. 4 legge n. 798/84 fornisce al Parlamento è, pertanto, una informativa importante sull'azione svolta dal Comitato stesso e sui risultati che si possono raggiungere quando più Enti agiscono in modo sinergico e coordinato per il raggiungimento di uno stesso obiettivo.

I dati economico - finanziari riportati nella presente Relazione tengono conto degli aggiornamenti trasmessi dai diversi Enti a seguito di specifica richiesta da parte del Segretario del Comitato ex art. 4 legge n. 798/84 (v. nota allegata prot. n. 262/GAB del 04 aprile 2007) e riproducono la **situazione al 31 dicembre 2006**.

1.2 Lo stato di attuazione

Dal quadro riepilogativo dei finanziamenti finora assegnati (*Allegato n. 1*), risulta che **lo Stato italiano, dal 1984, ha finanziato per Venezia 9.003 milioni di euro**.

Il finanziamento indicato comprende anche i volumi di investimento assegnati dal CIPE al "Sistema MOSE" con deliberazione n. 109 del 29.11.2002 e successive modificazioni e integrazioni, n. 40 del 29.09.2004 e successive modificazioni e n. 74 del 29.03.2006, quale opera inserita nel programma delle "infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale" finanziate nell'ambito della "Legge Obiettivo" n. 443/01, a conferma della volontà dello Stato italiano di procedere nella realizzazione degli interventi di salvaguardia di Venezia e della sua laguna, anche ricorrendo a strumenti di finanziamento diversi dalla legislazione speciale per Venezia.

A questo riguardo giova ricordare che il decreto di attuazione della "Legge Obiettivo" (Decreto Legislativo n. 190 del 20 agosto 2002), prendendo atto del carattere sistemico dell'opera, all'art. 16, comma 4, prevede specificamente che «*le norme del [...] decreto non derogano le previsioni delle leggi [...] relative alle procedure speciali per la salvaguardia di Venezia*».

La procedura codificata dalla legislazione speciale rimane, quindi, vigente e il Comitato ex art. 4 Legge n. 798/84 continua ad essere l'organo di riferimento istituzionale per la programmazione e il controllo degli interventi per la salvaguardia di Venezia e della laguna.

L'importo indicato **non comprende** il volume di investimento assegnato dal CIPE al "Sistema MOSE" **(243 milioni di euro)**, con deliberazione del 03.08.2007, in

quanto tale finanziamento, a valere sulla Legge n. 296/2006 – Finanziaria per il 2007, è relativo ad un contributo pluriennale con decorrenza dal 2007 e sarà effettivamente disponibile solo dall'esercizio finanziario 2008 e quindi non rientra nella situazione al 31.12.2006.

Non si tiene conto, inoltre, delle somme autorizzate dalla Legge n. 296/2006 (Finanziaria per il 2007) per il rifinanziamento degli interventi di salvaguardia di Venezia e delle sua laguna, **115 milioni di euro** suddivisi in 85 milioni di euro per il 2007 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, in quanto oggetto di ripartizione tra i diversi Soggetti nel corso del 2007 (seduta del 3 maggio 2007 del Comitato ex art. 4 legge 798/1984). Tali fondi saranno, pertanto, assegnati ai Soggetti attuatori nel corso del 2007.

Tenendo conto anche di tali fondi recati dalla Legge 296/2006, le somme complessivamente assegnate dallo Stato ammontano a 9.361 milioni di euro circa.

Nell'*Allegato n. 2* è riportato, sinteticamente, lo *stato di attuazione dei finanziamenti* per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, con l'indicazione per ciascun Ente degli *importi assegnati* e degli *importi spesi* relativamente agli interventi di propria competenza.

Viene riportato nelle tabelle successive il *quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti* con l'indicazione delle somme assegnate, impegnate e spese per ciascuna Legge:

- *Allegato n. 3 – Legge n. 798/84 e successivi rifinanziamenti;*
- *Allegato n. 4 – Legge n. 139/92;*
- *Allegato n. 5 – Legge n. 539/95;*
- *Allegato n. 6 – Legge n. 515/96;*
- *Allegato n. 7 – Legge n. 345/97;*
- *Allegato n. 8 – Legge n. 295/98;*
- *Allegato n. 9 – Legge n. 448/98;*
- *Allegato n. 10 – Legge n. 488/99;*
- *Allegato n. 11 – Legge n. 388/00;*

- *Allegato n. 12 – Legge n. 448/01;*
- *Allegato n. 13 – Legge n. 166/02;*
- *Allegato n. 14 – Legge n. 350/03 per il rifinanz. fondo opere strategiche;*
- *Allegato n. 15 – Legge n. 350/03*
- *Allegato n. 16 – Legge n. 266/05 per il rifinanz. fondo opere strategiche.*

L'*Allegato n. 17* riepiloga sinteticamente, per gli Enti principali, gli importi assegnati e disponibili nel 2006 impegnati e spesi.
Al 31 dicembre 2006 risultano complessivamente impegnati 7.973 milioni di euro, pari all'89% degli importi assegnati, e spesi 6.543 milioni di euro, pari al 73% degli importi assegnati.

L'*Allegato n. 18* riporta il *confronto dello stato di attuazione delle somme spese* tra la situazione al 31.12.2005 della precedente "Relazione al Parlamento", datata settembre 2006, e la situazione aggiornata al 31.12.2006 presentata in questo documento. Risulta che, nel corso del 2006, vi è stato un incremento di circa il 13% delle somme complessivamente spese, in massima parte generato dalle opere in corso di realizzazione alle bocche di porto per la regolazione dei flussi di marea.
La situazione suesposta è stata sinteticamente illustrata dal Segretario del Comitato ex art. 4 legge n. 798/1984 nel corso della seduta del 3 maggio 2007, seppure ancora in fase di aggiornamento a quella data.

Con riferimento ai singoli Allegati, relativamente agli importi finanziati, impegnati e spesi per singole Leggi si ha:

- la **Legge n. 798/1984** e le successive Leggi di rifinanziamento (Leggi n. 910/86, n. 67/88, n. 360/91, n. 415/92 e n. 724/94) hanno reso disponibili **1.134 milioni di euro in conto capitale, già tutti sostanzialmente impegnati e spesi**;

- a partire dalla **Legge n. 139/1992 e per tutte le Leggi di seguito indicate,** per proseguire l'opera di salvaguardia **sono stati autorizzati "limiti di impegno" quindicennali** e indicati i soggetti autorizzati a contrarre mutui a valere su tali "limiti di impegno". **La Legge n. 139/92 ha reso così disponibili 1.360 milioni di euro**, di cui risultano **impegnati** 1.293 milioni (**95%**) e **spesi** 1.205 milioni (**89%**);

- la **Legge n. 539/1995** ha reso disponibili **324 milioni di euro**, di cui risultano **impegnati** 315 milioni (**97%**) e **spesi** 295 milioni (**91%**);

- la **Legge n. 515/1996** ha reso disponibili **1.153 milioni di euro**, di cui risultano **impegnati** 1.107 milioni (**96%**) e **spesi** 975 milioni (**85%**);

- la **Legge n. 345/1997** ha reso disponibili **674 milioni di euro,** di cui risultano **impegnati** 623 milioni (**92%**) e **spesi** 490 milioni (**73%**);

- la **Legge n. 295/1998** ha reso disponibili **135 milioni di euro**, di cui risultano **impegnati** 119 milioni (**88%**) e **spesi** 90 milioni (**67%**).
  Si fa notare che, data l'entità, molto contenuta, dei fondi resi disponibili dalla Legge in oggetto per le annualità 1999 e 2000, il Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo, nel proporre l'attribuzione di tali finanziamenti ai diversi Enti, ha ritenuto opportuno favorire, in particolare, lo sviluppo di interventi da parte di Enti normalmente non destinatari di fondi – o di fondi di entità significativa – provenienti dalla Legge Speciale;

- la **Legge n. 448/1998** ha reso disponibili **791 milioni di euro**, di cui risultano **impegnati** 714 milioni (**90%**) e **spesi** 536 milioni (**68%**);

- la **Legge n. 488/1999** ha reso disponibili **658 milioni di euro**, di cui risultano **impegnati** 559 milioni di euro (**85%**) e **spesi** 373 milioni di euro (**57%**);

- la **Legge n. 388/2000** ha reso disponibili **491 milioni di euro**, di cui risultano **impegnati** 417 milioni di euro (**85%**) e **spesi** 277 milioni di euro (**56%**);

  la **Legge n. 448/2001** ha reso disponibili **681 milioni di euro** di cui risultano **impegnati** 534 milioni di euro (**78%**) e **spesi** 253 milioni di euro (**37%**). In tali importi sono compresi anche 28 milioni di euro assegnati al Magistrato alle Acque in conto capitale.

- la **Legge n. 166 del 1° agosto 2002, Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti,** in attuazione di quanto disposto dalla Legge n. 443/01 (c.d. "legge obiettivo"), all'art. 13 istituisce un apposito "fondo" e autorizza "limiti di impegno" quindicennali al fine di consentire il finanziamento della progettazione e della realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale individuate nel programma di cui alla deliberazione del CIPE del 21 dicembre 2001, che comprende anche il *"progetto per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna: Sistema MOSE"*.
  In base a tale Legge, il CIPE, con deliberazione n. 109 del 29.11.2002, successivamente rimodulata con deliberazione n. 63 del 25.07.2003, ha assegnato al "Sistema MOSE" un volume di investimento attivabile a valere su "limiti di impegno" con decorrenza dal 2003, quale prima "tranche" di finanziamento del fabbisogno complessivo del "Sistema MOSE".
  Successivamente, il CIPE ha recepito, nella deliberazione n. 72 del 29.09.03, le indicazioni del Comitato ex art. 4 Legge 798/84 del 4.02.2003 – espresse sulla base delle disposizioni di cui all'art. 16 comma 4 del Decreto Legislativo n. 190/2002 di attuazione della "Legge Obiettivo" e di cui all'art. 80, comma 28, della Legge n. 289/2002 – assegnando il "limite di impegno" di 41 milioni di euro circa, con decorrenza dal 2003, ripartito tra il Concessionario Consorzio Venezia Nuova e le Amministrazioni Comunali di Venezia, di Chioggia e di Cavallino – Treporti, consentendo così l'attivazione di un volume di investimento complessivo pari a **500 milioni di euro circa**.
  Al 31.12.2006, relativamente a tale Legge, risultano **impegnati** 490 milioni di euro (**98%**) e spesi 399 milioni di euro (**80%**);

- la **Legge n. 289/2002 (Legge Finanziaria per il 2003)** non destina nuovi "limiti di impegno" per la prosecuzione delle attività di salvaguardia di Venezia e della sua laguna, ma all'art. 80 comma 28 espressamente dispone che *"una quota degli importi autorizzati ai sensi dell'art. 13 della L. 1.8.2002 n. 166 può essere destinata al finanziamento degli interventi previsti dall'art. 6 della L. 29.11.1984 n. 798 con le modalità ivi previste, nonché di quelli previsti dalle relative Ordinanze di Protezione Civile"*.
  Come indicato al punto precedente, il Comitato ex art. 4 legge n. 798/84, nella seduta del 4 febbraio 2003, sulla base di quanto disposto all'art. 16 comma 4 dal Decreto Legislativo 20 agosto 2002 n. 190 recante la *"Attuazione della L. 21.11.2001 n. 443"*, ha quindi deliberato in merito alla ripartizione dei suddetti "limiti di impegno", destinandone una quota-parte ai Comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino - Treporti, e una quota-parte agli interventi di regolazione delle maree alle bocche di porto affidati al concessionario Consorzio Venezia Nuova;

- la **Legge n. 350 del 24 dicembre 2003 (Legge Finanziaria per il 2004)** non destina nuovi "limiti di impegno" di rifinanziamento della Legge Speciale per la prosecuzione delle attività di salvaguardia da parte dei diversi Enti, mentre **reca, in Tabella D, in conto capitale, 13 milioni di euro nel 2004, 3 milioni di euro nel 2005 e 3 milioni di euro nel 2006 per gli interventi di competenza dello Stato in amministrazione diretta** di cui all'art. 3, primo comma, lettera a) della Legge 798/84. Il finanziamento si è reso effettivamente disponibile solo alla fine del 2004; al 31.12.2006 risultano **impegnati** 13 milioni di euro.
  La Legge, inoltre, assicura il rifinanziamento dell'art. 13 della Legge n. 166/2002, destinando alle opere strategiche, tra le quali è compreso il "Sistema MOSE", nuovi "limiti di impegno" con decorrenza dal 2005 e dal 2006.
  In base a tale Legge, il CIPE, con deliberazione n. 40 del 29.09.2004, ha assegnato al "Sistema MOSE" un "contributo" pluriennale con decorrenza dal 2005, quale seconda "tranche" di finanziamento del fabbisogno complessivo del "Sistema MOSE". Successivamente, il CIPE ha recepito, nella

deliberazione n. 75 del 20.12.04, le indicazioni del Comitato ex art. 4 Legge 798/84 del 4.11.2004 - espresse sulla base delle disposizioni di cui all'art. 80, comma 28, della Legge n. 289/2002 prorogato dall'art. 23-quater del Decreto legge n. 355/2003, convertito con la Legge n. 47/2004 – e ha assegnato il "contributo" di 64,888 milioni di euro circa, con decorrenza dal 2005, ripartito tra il Concessionario Consorzio Venezia Nuova e le Amministrazioni Comunali di Venezia, di Chioggia e di Cavallino – Treporti, consentendo così l'attivazione, nel corso del 2005, da parte dei Soggetti indicati, di un importo complessivo di **703 milioni di euro circa**. Di questi, al 31.12.2006, risultano **impegnati** 692 milioni di euro (**98%**) e **spesi** 541 milioni di euro (**77%**).

- la **Legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (Legge Finanziaria per il 2005)** non destina nuovi limiti di impegno per la prosecuzione delle attività di salvaguardia da parte dei diversi Enti, ne' assicura il rifinanziamento dell'art. 13 della Legge n. 166/2002 per le opere strategiche.

- la **Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (Legge Finanziaria per il 2006)** non destina nuovi limiti di impegno per la prosecuzione delle attività di salvaguardia da parte dei diversi soggetti; assicura, invece, il rifinanziamento dell'art. 13 della Legge n. 166/2002 per le opere strategiche.

  In base a tale legge, il CIPE, con deliberazione n. 74 del 29.03.2006, ha assegnato al "Sistema MOSE" un contributo pluriennale di 33,972 milioni di euro che consente l'attivazione di un volume di investimento di almeno **380 milioni di euro.**

  Alla data attuale, il volume di investimento è in fase di attivazione, tenuto conto che le disposizioni recate dall'art. 1, commi 511 e 512, della legge 296/2006, hanno richiesto, nel corso del 2007, l'emissione di uno specifico Decreto interministeriale circa l'operazione finanziaria da condurre da parte del concessionario Consorzio Venezia Nuova. Nelle more della disponibilità del finanziamento, sono stati comunque spesi 108 milioni di euro da parte del concessionario, per garantire continuità ai lavori in corso alle bocche di porto lagunari, per la realizzazione del "Sistema MOSE".

1.3 Il ruolo dell'Ufficio di Piano

L'**Ufficio di Piano**, costituito con D.P.C.M. del 13 febbraio 2004, quale organo tecnico collegiale di supporto al Comitato ex art. 4 Legge 798/84, coordinato dal Presidente del Magistrato alle Acque, ha svolto in questi anni un importante ruolo di concertazione tra i vari Soggetti competenti in materia di salvaguardia. L'Ufficio di Piano ha iniziato la propria attività nel mese di aprile del 2004 e fino a luglio 2007 si è riunito 42 volte; si è dotato di proprie Linee Guida e di un Programma di Attività e, a fini istruttori, ha formato una propria Segreteria avente il compito di predisporre indagini conoscitive, effettuare analisi ed elaborazioni dei dati, integrare e sintetizzare la documentazione ed eseguire approfondimenti tematici, sui quali ha espresso propri specifici pareri.

In particolare, l'Ufficio di Piano si è posto il compito di formulare un quadro organico e aggiornato sullo **stato di avanzamento delle attività da parte dei soggetti che operano nell'ambito della legislazione speciale per Venezia**, al fine di pervenire a futuri indirizzi sull'impiego ottimale delle risorse finanziarie afferenti alla legislazione speciale e alla massima integrazione degli interventi di salvaguardia programmati dalle singole Amministrazioni competenti.
L'Ufficio ha inteso, quindi, procedere innanzitutto con l'audizione dei principali soggetti beneficiari dei finanziamenti assegnati dalla Legislazione Speciale per Venezia, ritenendo, invece, sufficiente, per i restanti soggetti non chiamati in audizione, il semplice esame della documentazione da essi fornita sullo stato di avanzamento tecnico e finanziario degli interventi di loro competenza.
Il Magistrato alle Acque, per gli interventi in amministrazione diretta e per quelli in concessione, la Regione del Veneto, i Comuni di Venezia, di Chioggia e di Cavallino-Treporti sono stati invitati a rispondere "de visu" sullo stato di avanzamento degli interventi e sullo stato della spesa e del fabbisogno ulteriore da finanziare per il prosieguo delle opere di rispettiva competenza. Alle audizioni hanno fatto seguito la richiesta di approfondimenti di carattere tecnico, ove ritenuti necessari.

La documentazione nel complesso fornita ha consentito all'Ufficio di Piano di concludere la propria disamina, nel mese di maggio 2005, con la redazione di quadri di sintesi e di dettaglio finanziario sugli interventi di salvaguardia, che risultano in corso di aggiornamento alla data attuale, con riferimento alla situazione al 31.12.2006.

E' prevista, quindi, l'emissione di un parere da parte dell'Ufficio di Piano sull'impiego ottimale delle risorse finanziarie afferenti la Legislazione Speciale.

1.4 L'attività del Comitato ex art. 4 legge 798/1984 nel corso del 2006

Si ritiene importante riepilogare il ruolo svolto e le decisioni assunte nel corso del 2006 da parte del Comitato ex art. 4 legge 798/1984, relativamente ad un argomento di primaria importanza quale la valutazione di alcune soluzioni alternative al "Sistema MOSE" proposte dall'Amministrazione comunale di Venezia.

Si ricorda che, sulla base del progetto definitivo del novembre 2002, il Comitato ex art. 4 legge 798/84 ha deliberato, nella seduta del 3 aprile 2003, di completare la progettazione esecutiva e di avviare la realizzazione delle opere di regolazione delle maree alle bocche di porto lagunari, sviluppando, in parallelo, alcuni approfondimenti richiesti dalle Amministrazioni Comunali di Venezia e di Chioggia.

Nel corso della **seduta del 20 luglio 2006, il Comitato di Indirizzo Coordinamento e Controllo ha accolto la richiesta del Sindaco del Comune di Venezia di prendere in esame delle proposte alternative al "Sistema MOSE"** presentate dal Comune di Venezia stesso. Il Comitato ha anche definito la procedura e il programma per realizzare tale esame, affidando al Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo (DICA) della Presidenza del Consiglio dei Ministri lo svolgimento dell'istruttoria e il recepimento dei pareri, con l'obiettivo di poter convocare una nuova seduta del Comitato a fine settembre per recepire le risultanze dell'esame effettuato.

In data 1° agosto 2006, il citato Dipartimento ha richiesto al Comune di Venezia l'invio della documentazione, che avrebbe trasmesso, non appena pervenuta, ai Soggetti istituzionali interessati, al fine di avviare al più presto l'istruttoria in oggetto.

In data 5 agosto 2006, il Dipartimento ha trasmesso ai Soggetti istituzionali la documentazione dell'Amministrazione Comunale nel frattempo pervenuta (composta da documenti relativi a: proposte d'interventi alle bocche di porto; proposte di attività sperimentali; studi sugli impatti generati alle bocche di porto dalle attività in corso), invitando i rispettivi Organi tecnici a esprimere il loro contributo.

Sulla documentazione trasmessa hanno espresso il loro parere i seguenti Enti coinvolti dalla Presidenza del Consiglio:

- **Gruppo di lavoro nominato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici**, con parere trasmesso dal Ministro delle Infrastrutture al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 ottobre 2006, prot. n. 0015092;

- **Gruppo di lavoro incaricato dal Presidente del Magistrato alle Acque**, con conclusioni condivise dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque nell'adunanza del 29 settembre 2006, con voto n. 128; parere e voto trasmessi al DICA in data 29 settembre 2006, prot. n. 707/GAB;

- **Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale per i Beni Architettonici e paesaggistici**, mediante note di valutazione da parte delle Soprintendenze territorialmente competenti; parere del 18 ottobre 2006, trasmesso con prot. n. DG.BAP.S02/19065;

- **Ministero dell'Università e della Ricerca – CORILA,** con parere in data 30 settembre 2006;

- **Regione del Veneto,** con parere trasmesso al DICA in data 4 ottobre 2006, prot. n. 3490/C.P./52.00;

- **Autorità portuale di Venezia,** con parere trasmesso dal Magistrato alle Acque al DICA in data 29 settembre 2006, prot. n. 707/GAB;

- **Ministero dei Trasporti – Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo,** con parere del 27 ottobre 2006, trasmesso con prot. 12606, e con nota della Direzione Marittima di Venezia dell'11 settembre 2006;

- **Ufficio di Piano** ex D.P.C.M. 13 febbraio 2004, con parere trasmesso al DICA dal coordinatore dell'Ufficio, Presidente del Magistrato alle Acque, in data 13 ottobre 2006, prot. n. 735/GAB.

I pareri ricevuti sono stati trasmessi dal DICA a tutti i Soggetti che erano stati interessati. A seguito dell'esame dei pareri fino a quel momento ricevuti, il Dipartimento ha convocato, in data **2 novembre 2006,** un **incontro tecnico** coordinato dal Segretario Generale della Presidenza del Consiglio. Alla riunione ha partecipato anche il Sindaco di Venezia.

Successivamente, in data 6 novembre 2006, è pervenuto al DICA, con prot. n. 02501/S.P., il parere del **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,** illustrato durante la riunione del 2 novembre.

In data **8 novembre 2006**, su richiesta del Sindaco di Venezia, si è svolto un **ulteriore incontro tecnico.**

In data **10 novembre 2006, il Ministro delle Infrastrutture ha presentato al Consiglio dei Ministri una relazione sul "Sistema MOSE"**, che ripercorre l'iter

del progetto e riferisce sulle risultanze dell'esame e degli approfondimenti effettuati da tutti gli Enti interpellati dalla Presidenza del Consiglio riguardo alle proposte alternative presentate dal Comune di Venezia, nonché sugli esiti degli incontri tecnici tenutisi presso la Presidenza del Consiglio.

La relazione rileva che, dall'esame dei parere pervenuti, "non sono emersi elementi nuovi tali da richiedere la modifica delle opere del "Sistema MOSE", né, d'altra parte, è accettabile un'interruzione anche se breve delle attività in corso per eventuali ulteriori approfondimenti."

La relazione segnala, infine, l'importanza di poter disporre di adeguati finanziamenti per la Legislazione Speciale per Venezia per la prosecuzione dei piani di intervento di competenza dei vari Soggetti coinvolti nella salvaguardia di Venezia e della sua laguna e nello sviluppo socio economico dell'area.

In vista della seduta del Comitato ex art. 4 legge 798/1984, la relazione è stata posta ai voti ed **è stata fatta propria dal Governo a maggioranza,** con il voto favorevole di 20 Ministri.

Considerata, pertanto, a seguito degli approfondimenti effettuati nonché della citata relazione del Ministro delle Infrastrutture:

- l'insussistenza di elementi giuridico-ammministrativi impeditivi dell'ulteriore avanzamento dei lavori,
- l'inadeguatezza delle soluzioni proposte dal Comune di Venezia a rappresentare idonee alternative al "Sistema MOSE",

il **Comitato ex art. 4 legge 798/1984, nella riunione del 22.11.2006, ha deliberato**, con un proprio Ordine del Giorno, ***"di procedere al completamento della costruzione delle opere del "Sistema MOSE" e delle opere morfologiche connesse, assicurando la disponibilità dei finanziamenti,*** *nel rispetto degli impegni e del cronoprogramma stabiliti nell'Atto Aggiuntivo rep. n. 8067/2005 alla Convenzione Generale rep. n. 7191/1991 tra Magistrato alle Acque di Venezia e il Concessionario, che ha introdotto il criterio "a prezzo chiuso" per l'esecuzione dei lavori stessi".*

1.4 Conclusioni

Anche se dalla situazione riportata nella presente Relazione al Parlamento risulta che, progressivamente, lo Stato italiano ha destinato delle somme molto significative alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, confermando, nel corso degli anni, l'impegno finanziario e la volontà politica di sostenere gli interventi fisici, ambientali, socio - economici e artistici avviati dalle Amministrazioni e dagli Enti e Istituzioni a ciò preposti, **è comunque necessario che Governo e Parlamento assicurino continuità alle attività di salvaguardia intraprese**.

Da una parte, tenuto conto anche dell'avanzamento dell'opera (31% al 30.06.2007), diviene **necessario che venga assicurata continuità ai finanziamenti per il "Sistema MOSE", come ribadito dal Comitato ex art. 4 legge 798/1984 nella seduta del 22.11.2006,** per consentire il suo sviluppo secondo il *"Cronoprogramma"* di realizzazione, allegato all'atto contrattuale rep. n. 8067, sottoscritto in data 11.05.2005 dall'Amministrazione Concedente con il Concessionario, che ha introdotto il "prezzo chiuso" per il completamento delle opere alle bocche di porto e che prevede l'ultimazione dei lavori entro il 2012.
A valere sulle prime due "tranches" di fondi assegnati dal CIPE, resisi effettivamente spendibili, rispettivamente, dai primi mesi del 2004 e dai primi mesi del 2006, sono stati avviati i cantieri alle bocche di porto lagunari per la realizzazione del "Sistema MOSE", una volta acquisite le necessarie approvazioni sugli stralci di progetto esecutivo, cantieri che ora stanno lavorando a pieno ritmo; i suddetti fondi si esauriranno, sostanzialmente, nel corso del 2007.
La Legge Finanziaria per il 2005 non ha recato il rifinanziamento del fondo per le opere strategiche, mentre, a valere sul rifinanziamento di tale fondo destinato dalla Legge n. 266/2005 (Finanziaria per il 2006), in data 29.03.2006 il CIPE ha assegnato (deliberazione n. 74) una terza "tranche" di finanziamento al "Sistema MOSE", con decorrenza dal 2007, di 380 milioni di euro. Tale importo, inferiore rispetto al fabbisogno indicato dal *Piano dei Finanziamenti* allegato al citato contratto rep. n. 8067/2005, si renderà disponibile solo dai primi mesi del 2008,

significativamente in ritardo rispetto alle previsioni del *Piano* stesso, in quanto la procedura di attivazione dei fondi, che tiene conto di quanto stabilito dall'art. 1 commi 511 e 512 della Legge n. 296/06 per l'utilizzo dei contributi pluriennali, si sta dimostrando particolarmente articolata e sta richiedendo molti mesi per il suo perfezionamento.

La quarta "tranche" di finanziamento, deliberata dal CIPE in data 3.08.2007, di importo pari a 243 milioni di euro, è di molto inferiore al fabbisogno, non solo rispetto al *Piano dei finanziamenti* originario, ma anche rispetto ai più recenti aggiornamenti che, tenuto conto delle assegnazioni di fondi effettivamente intervenute, ridefinivano i fabbisogni a medio termine per garantire almeno la continuità operativa dei cantieri alle bocche di porto lagunari nel biennio 2007 – 2009.

Si ritiene, pertanto, doveroso esprimere preoccupazione circa l'assegnazione del finanziamento residuo necessario per il completamento del "Sistema MOSE", dato che le ultime "tranches" assegnate si discostano in modo significativo dal fabbisogno operativo, sia come entità degli importi assegnati che come tempistiche di effettiva disponibilità dei fondi, pregiudicando lo sviluppo e la conclusione dell'opera nei tempi contrattualmente previsti.

Al riguardo è importante segnalare che il Consiglio dell'*Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture*, nell'adunanza del 7 marzo 2006, in esito alla visita effettuata ai lavori di salvaguardia in corso di realizzazione da parte del Magistrato alle Acque tramite il proprio Concessionario, ha comunicato al Magistrato alle Acque (nota del 5.04.2006) che avrebbe predisposto una segnalazione al Governo per *"rimarcare la necessità di assicurare gli ulteriori finanziamenti del Piano Generale degli Interventi in tempi certi a fronte dei segnalati rischi di degrado che le opere corrono se non utilizzate nella loro completezza"*.

Dall'altra parte, in una visione sistemica e globale dell'opera di salvaguardia, ribadita dal Comitato ex art. 4 Legge 798/84 nel corso delle sedute del 20 luglio 2006, del 22 novembre 2006 e del 3 maggio 2007, per citare solo le più recenti, è necessario che **vengano garantite, comunque e indipendentemente dal**

"Sistema MOSE", anche le risorse per la prosecuzione delle altre attività di salvaguardia fisica, ambientale e socio-economica già intraprese dai diversi Soggetti, secondo le varie competenze, a valere sulla Legislazione Speciale per Venezia; ciò mediante l'assegnazione, anno dopo anno, di "limiti di impegno" – ovvero di contributi pluriennali sulla base della vigente normativa - di entità adeguata che, secondo le procedure previste per gli interventi ricompresi nella legislazione speciale per Venezia, una volta ripartiti tra i vari soggetti dal Comitato ex art. 4 Legge 798/84, consentano l'attivazione delle risorse finanziarie richieste.

E' importante ricordare che la Legge n. 296/2006 – Finanziaria per il 2007 ha autorizzato, con somme in conto capitale, il rifinanziamento della legislazione speciale per Venezia, ripristinando quel flusso di finanziamenti che si era interrotto dal 2002.

La possibilità di accedere a una quota parte delle risorse assegnate dal CIPE, per il "Sistema MOSE" a valere sui limiti di impegno destinati alle opere strategiche, infatti, è stata riservata, in questi ultimi anni, solo ad alcuni Soggetti (Amministrazioni Comunali di Venezia, Chioggia e Cavallino - Treporti), con un "iter" particolarmente complesso per l'ottenimento effettivo dei fondi. Tale "iter" non è più comunque percorribile essendo decaduta la normativa al riguardo (art. 80, comma 28, della Legge n. 289/2002 prorogato dall'art. 23-quater della Legge 47/2004).

E', tuttavia, necessario segnalare, come ribadito dai principali Soggetti attuatori degli interventi (Magistrato alle Acque di Venezia, Regione del Veneto, Amministrazioni Comunali di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti), nel corso della seduta del 3 maggio 2007, che le somme recate dalla Legge n. 296/2006 sono di molto inferiori ai fabbisogni esposti dai vari Enti nei propri piani generali di intervento per il triennio 2007- 2009.

Dalla semplice disamina dei dati riportati nelle tabelle e nei documenti allegati, risulta evidente, infatti, come i finanziamenti della legge speciale assegnati ai vari Soggetti risultino ormai già del tutto impegnati e per lo più anche spesi.

Si ritiene, pertanto, doveroso segnalare la **necessità che nella Legge Finanziaria per il 2008 siano previste adeguate assegnazioni per gli interventi di**

salvaguardia di Venezia, sia mediante il rifinanziamento della legislazione speciale per Venezia con fondi di entità adeguata rispetto ai fabbisogni, sia mediante il rifinanziamento delle opere strategiche di preminente interesse nazionale, tra le quali è ricompreso il "Sistema MOSE", la cui realizzazione, ormai in fase avanzata, non può essere inficiata da interruzioni nel flusso dei finanziamenti.

2 STATO DI ATTUAZIONE DEI FINANZIAMENTI DA PARTE DEI DIVERSI SOGGETTI ATTUATORI

2.1 INTERVENTI DI COMPETENZA DELLO STATO

2.1.1 Interventi dello Stato in amministrazione diretta (v. Documento A)

Gli interventi dello Stato da eseguire in amministrazione diretta – Magistrato alle Acque di Venezia, previsti dall'art. 3 (lettere a), b), c), e), f), g), h), i), m)) della Legge n. 798/84, riguardano: riequilibrio idrogeologico della laguna; servizio vigilanza ed antinquinamento; marginamenti lagunari; restauro di edifici demaniali e di quelli di carattere storico-artistico destinati all'uso pubblico; recupero del complesso edilizio dell'Arsenale; consolidamento di ponti, canali e fondamenta; sistemazione dei corsi d'acqua naturali e artificiali; restauro e conservazione del patrimonio artistico mobiliare pubblico; interventi di edilizia universitaria.

Per lo Stato in Amministrazione diretta – **Magistrato alle Acque di Venezia**, le somme complessivamente assegnate sono pari a 217 milioni di euro, relativamente alla Legge n. 798/84 e alle recenti Leggi n. 448/01, che ha assegnato dei fondi al Magistrato alle Acque per il servizio di polizia lagunare e per la manutenzione straordinaria dei beni demaniali in fregio alla laguna, e n.

350/03 che ha assegnato dei fondi per il riequilibrio idrogeologico. Al 31 dicembre 2006, il Magistrato alle Acque ha impegnato 200 milioni di euro e speso 179 milioni di euro relativamente alle somme effettivamente disponibili.

2.1.2 Interventi dello Stato in concessione al Consorzio Venezia Nuova (v. Documento B)

Gli interventi dello Stato in concessione al Consorzio Venezia Nuova riguardano i seguenti obiettivi, richiamati anche dall'art. 3 lettere a), c), d), e l) della Legge n. 798/84, dall'art. 3 della Legge n. 139/92 nonché dalla Legge 443/2001 (c.d. Legge Obiettivo): riequilibrio idrogeologico della laguna e arresto ed inversione del processo di degrado del bacino lagunare; opere di regolazione delle maree alle bocche di porto lagunari; difesa dalle acque alte degli abitati insulari; rinforzo dei moli foranei alle tre bocche di porto; marginamenti lagunari; opere portuali marittime a difesa dei litorali; studi per la sostituzione del traffico petrolifero in laguna e per l'apertura delle valli da pesca all'espansione delle maree.

Per il concessionario dello Stato **Consorzio Venezia Nuova**, le somme complessivamente assegnate e disponibili sono pari a 4.155 milioni di euro, che tengono conto dei fondi assegnati con la Legislazione Speciale per Venezia e da parte del CIPE nell'ambito della c.d. Legge obiettivo. Al 31 dicembre 2006, il Consorzio Venezia Nuova ha impegnato 3.775 milioni di euro e speso 3.382 milioni di euro.

2.2 STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI COMPETENZA DELLA REGIONE DEL VENETO (v. Documento C)

Gli interventi della Regione del Veneto di cui alla Legge n. 798/84, Legge n. 360/91 e n. 139/92 riguardano in particolare gli interventi in materia di disinquinamento, risanamento, tutela ambientale e prevenzione dall'inquinamento del territorio dei comuni della gronda lagunare e del bacino scolante nella laguna di Venezia, anche mediante la realizzazione di opere di approvvigionamento idrico, igienico-sanitario nonché d'impianti di depurazione; opere di ristrutturazione dell'ospedale SS. Giovanni e Paolo; realizzazione di opere igienico-sanitarie nel centro storico di Venezia secondo un progetto integrato, in accordo con il Comune di Venezia, finalizzato alla manutenzione dei rii cittadini.

Per la **Regione del Veneto**, le somme complessivamente assegnate sono pari a 1.762 milioni di euro compresi i fondi relativi alle Leggi n. 388/00 e n. 448/01, di recente attivazione da parte della Regione. Al 31 dicembre 2006, la Regione del Veneto ha impegnato 1.263 milioni di euro e speso 865 milioni di euro relativamente alle somme assegnate.

Si ricorda che le somme indicate comprendono la quota pari al 10% delle disponibilità derivanti dai "limiti di impegno" destinati alla Regione Veneto, quota che viene assegnata al Comune di Venezia per la realizzazione del progetto integrato rii in base all'art. 3 della Legge n. 139/92.

2.3 STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI VENEZIA, DEL COMUNE DI CHIOGGIA E DEL COMUNE DI CAVALLINO - TREPORTI

Gli interventi del Comune di Venezia e del Comune di Chioggia di cui all'art. 6 della Legge n. 798/84 riguardano: acquisizione, restauro e risanamento conservativo di immobili da destinare alla residenza e ad attività sociali, culturali, produttive, artigianali e commerciali; opere di urbanizzazione primaria; sistemazione di ponti, canali e fondamenta di competenza comunale; contributi ai privati per l'esecuzione di opere di restauro e risanamento conservativo del patrimonio immobiliare; acquisizione di aree da destinare ad insediamenti produttivi; per il Comune di Venezia: interventi volti alla manutenzione dei rii cittadini e degli edifici su di essi prospicienti secondo un progetto integrato, in accordo con la Regione Veneto.

2.3.1 Stato di attuazione degli interventi di competenza del Comune di Venezia (v. Documento D)

Per il **Comune di Venezia**, le somme complessivamente assegnate e disponibili sono pari a 1.927 milioni di euro. Al 31 dicembre 2006, il Comune di Venezia ha impegnato 1.867 milioni di euro e speso 1.465 milioni di euro relativamente alle somme disponibili che tengono conto anche delle recenti Leggi n. 388/00, n. 488/01 e della prima e seconda assegnazione di fondi al Comune di Venezia dal CIPE, come quota-parte delle somme assegnate al "Sistema MOSE" .

Come già indicato nel paragrafo relativo alla Regione del Veneto, l'art. 3 della Legge n. 139/92 prevede che una quota pari al 10% delle disponibilità derivanti dai limiti di impegno autorizzati per la Regione del Veneto venga destinata al Comune di Venezia per la **realizzazione del progetto integrato di manutenzione dei rii** e degli edifici su di essi prospicienti.

Pertanto, agli importi totali assegnati al Comune di Venezia dalle diverse Leggi speciali vanno sommati tali importi.

Il documento del Comune di Venezia (Documento D) non tiene conto degli importi assegnati e spesi relativamente alla Legge n. 798/1984.
Con gli importi assegnati al Comune di Venezia con la legge 448/98 e con la prima assegnazione CIPE, come quota-parte dei fondi per il "Sistema MOSE", il Comune di Venezia ha finanziato l'Aeroporto Marco Polo (SAVE) e il Commissario Delegato al traffico acqueo.

2.3.2 Stato di attuazione degli interventi di competenza del Comune di Chioggia (v. Documento E)

Per il **Comune di Chioggia**, le somme complessivamente assegnate e disponibili sono pari a 286 milioni di euro. Al 31 dicembre 2006, il Comune di Chioggia ha impegnato 266 milioni di euro e speso 187 milioni di euro relativamente alle somme disponibili che tengono conto anche delle recenti Leggi n. 388/00, n. 488/01 e delle assegnazioni di fondi al Comune di Chioggia da parte del CIPE come quota-parte delle somme assegnate al "Sistema MOSE".

2.3.3 Stato di attuazione degli interventi di competenza del Comune di Cavallino - Treporti

Per il **Comune di Cavallino – Treporti**, Amministrazione Comunale di recente istituzione di cui il Comitato ex art. 4 Legge n. 798/84 ha preso atto nel corso della seduta del 6 dicembre 2001, le somme complessivamente assegnate e disponibili sono pari a 20 milioni di euro. Al 31 dicembre 2004, il Comune di Cavallino-Treporti ha impegnato 17 milioni di euro e speso 285.000 euro relativamente alle somme disponibili provenienti dalle recenti Leggi n. 388/00, n. 488/01 e dalle assegnazioni di fondi al Comune di Cavallino-Treporti da parte del CIPE come quota-parte delle somme assegnate al "Sistema MOSE" .

I dati si riferiscono al 31.12.2004 in quanto non sono stati forniti, da parte del Comune di Cavallino-Treporti, dati aggiornati al 31.12.2006.

2.4 STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI COMPETENZA DI ALTRE AMMINISTRAZIONI

Per gli interventi di competenza di **altri Enti** [1], le somme complessivamente assegnate sono pari a 636 milioni di euro. Al 31 dicembre 2006, tali Enti hanno complessivamente impegnato 584 milioni di euro e hanno speso 464 milioni di euro delle somme disponibili.
Di seguito si evidenziano i finanziamenti e gli importi spesi di competenza di ogni singola Amministrazione:

2.4.1 Provincia di Venezia

Gli interventi della Provincia di Venezia riguardano il restauro e il risanamento conservativo del patrimonio di competenza della Provincia nei centri storici di Venezia e Chioggia.

Il totale dei finanziamenti assegnati alla Provincia di Venezia, è pari a 103 milioni di euro (Leggi n. 798/84, n. 139/92, n. 539/95, n. 515/96, n. 345/97, n. 295/98, n. 388/00 e n. 448/01); gli importi spesi ammontano a 47 milioni di euro.

---

[1] Provincia di Venezia; Università degli Studi Ca' Foscari; Istituto Universitario Architettura Venezia; Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca Scientifica; Procuratoria di S. Marco; Autorità Portuale di Venezia già Provveditorato al Porto; Fondazione Querini Stampalia; SAVE Aeroporto Marco Polo; CO.RI.LA.; Diocesi Patriarcato di Venezia; Diocesi di Chioggia; Fondazione Giorgio Cini; Biennale di Venezia; Azienda Speciale Porto Chioggia; Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica; Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Commissario Delegato al traffico acqueo.

2.4.2 Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca Scientifica (già Ministero Università Ricerca Scientifica e Tecnologica)

Gli interventi di competenza del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca Scientifica riguardano lo svolgimento del programma di ricerca e di studio sul "Sistema lagunare veneziano" che coinvolge CNR, Università di Padova, Università di Venezia, Istituto di architettura di Venezia, UNESCO.
Il totale dei finanziamenti assegnati al Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca Scientifica è di 10 milioni di euro (Legge n. 798/84); gli importi spesi sono pari a 9 milioni di euro.

2.4.3 Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Gli interventi di competenza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali riguardano il restauro di edifici demaniali e di quelli di carattere storico-artistico destinati all'uso pubblico.

Il totale dei finanziamenti assegnati al Ministero per i Beni e le Attività Culturali è di 9 milioni di euro (Legge n. 798/84); gli importi spesi sono pari a 8 milioni di euro.

2.4.4 Ministero del Tesoro

Il totale dei finanziamenti assegnati al Ministero del Tesoro è di 1 milione di euro (Legge n. 798/84), già speso prima del 1998.

2.4.5 Università degli Studi Ca' Foscari (v. Documento F)

Gli interventi di competenza dell'Università degli Studi Ca' Foscari riguardano l'acquisizione e il restauro di sedi universitarie, l'informatizzazione dell'Ateneo e la creazione di biblioteche informatiche.

Il totale dei finanziamenti assegnati all'Università degli Studi Ca' Foscari al 31.12.2006 è di 121 milioni di euro (Leggi n. 798/84, n. 139/92, n. 539/95, n. 515/96, n. 345/97, n. 295/98, n. 388/00 e n. 488/01); gli importi spesi ammontano a 87 milioni di euro.

2.4.6 Istituto Universitario Architettura Venezia (I.U.A.V.)

Gli interventi di competenza dell'Istituto Universitario di Architettura riguardano l'acquisizione e il restauro di sedi per lo svolgimento delle attività dell'Istituto.
Il totale dei finanziamenti assegnati all'Istituto Universitario Architettura Venezia al 31.12.2005 è di 54 milioni di euro (Leggi n. 139/92, n. 539/95, n. 515/96, n. 345/97, n. 295/98 e 448/01); gli importi spesi ammontano a 51 milioni di euro.

I dati si riferiscono al 31.12.2005 in quanto non sono stati forniti, dell'Istituto Universitario Architettura Venezia, dati aggiornati al 31.12.2006.

2.4.7 Consorzio per la gestione del Centro di Coordinamento delle attività di ricerca inerenti la salvaguardia della laguna veneziana – CO.RI.LA. (Consorzio tra Università di Venezia Ca' Foscari, IUAV, Università di Padova e CNR) (v. Documento G)

Gli interventi di competenza del CO.RI.LA. riguardano il coordinamento delle ricerche e degli studi scientifici inerenti la laguna di Venezia e la sua salvaguardia.

Il totale dei finanziamenti assegnati al CO.RI.LA. al 31.12.2006 è pari a 12 milioni di euro (Leggi n. 295/98, n. 388/00 e n. 448/01). Gli importi spesi sono pari a 10 milioni di euro.

2.4.8 Aeroporto Marco Polo (SAVE) (v. Documento H)

Gli interventi di competenza dell'Aeroporto Marco Polo riguardano l'ampliamento dell'aerostazione, la sistemazione della viabilità, la realizzazione di piste e impianti per voli notturni, di nuovi piazzali per aeromobili e di garage multipiano.

Il totale dei finanziamenti assegnati all'Aeroporto Marco Polo al 31.12.2006 è di 91 milioni di euro (Leggi n. 798/84, n. 139/92, n. 539/95, n. 515/96, n. 345/97, n. 295/98, n. 388/00 e n. 448/01), Gli importi spesi sono pari a 84 milioni di euro.

Relativamente alla Legge n. 448/98, i limiti di impegno e, quindi, i finanziamenti per la SAVE sono stati concessi attraverso il Comune di Venezia e quindi inseriti nei conteggi del Comune di Venezia.

2.4.9 Autorità Portuale di Venezia già Provveditorato al Porto

Gli interventi di competenza dell'Autorità Portuale di Venezia (già Provveditorato al Porto) riguardano il dragaggio di accosti e di canali portuali, consolidamento di banchine, sistemazione di aree portuali, realizzazione di piazzali e banchine.
Il totale dei finanziamenti assegnati all'Autorità Portuale al 31.12.2004 è di 68 milioni di euro (Leggi n. 798/84, n. 515/96 n. 295/98, n. 388/00 e n. 448/01); gli importi spesi sono pari a 54 milioni di euro.

I dati si riferiscono al 31.12.2004 in quanto non sono stati forniti, da parte dell'Autorità Portuale di Venezia, dati aggiornati al 31.12.2006.

2.4.10 Azienda Speciale per il Porto Chioggia

Gli interventi di competenza Azienda Speciale per il Porto Chioggia riguardano il dragaggio di accosti e di canali portuali, consolidamento di banchine, sistemazione di aree portuali, realizzazione di piazzali e banchine.

Il totale dei finanziamenti assegnati all'Azienda Speciale per il Porto Chioggia (A.S.P.O) al 31.12.2005 è pari a 11 milioni di euro (Legge n. 448/98 concessi attraverso il Comune di Chioggia, Leggi n. 388/00 e n. 448/01). Gli importi spesi sono pari a 1,72 milioni di euro.
I dati si riferiscono al 31.12.2005 in quanto non sono stati forniti, Azienda Speciale per il Porto di Chioggia, dati aggiornati al 31.12.2006.

2.4.11 La Biennale di Venezia (v. Documento I)

Gli interventi di competenza della Biennale di Venezia riguardano l'allestimento e la gestione di attività culturali di livello internazionale.

Il totale dei finanziamenti assegnati alla Biennale di Venezia al 31.12.2006 è pari a 26 milioni di euro (Legge n. 295/98 e n. 488/99). Gli importi spesi sono pari a 23 milioni di euro.
Con le Leggi n. 388/00 e n. 448/01 sono stati concessi dei "limiti di impegno" e, quindi, dei finanziamenti attraverso il Comune di Venezia.

2.4.12 Fondazione Scientifica Querini Stampalia (v. Documento L)

Gli interventi di competenza della Fondazione Querini Stampalia riguardano attività per l'ampliamento e la funzionalità della sede destinata a biblioteca e a galleria.

Il totale dei finanziamenti assegnati alla Fondazione Querini Stampalia al 31.12.2006 è di 8 milioni di euro (Leggi n. 798/84 e n. 295/98); gli importi spesi sono pari a 7 milioni di euro.

Con la Legge n. 448/01 sono stati concessi dei "limiti di impegno" e, quindi, dei finanziamenti attraverso il Comune di Venezia.

2.4.13 Fondazione Giorgio Cini (v. Documento M)

Gli interventi di competenza della Fondazione Giorgio Cini riguardano il restauro del compendio immobiliare ubicato nell'isola di San Giorgio Maggiore, sede della Fondazione stessa.

Il totale dei finanziamenti assegnati alla Fondazione Giorgio Cini al 31.12.2006 è di 32 milioni di euro (fondi concessi attraverso il Consorzio Venezia Nuova per la Legge n. 488/99; fondi assegnati direttamente per le Leggi n. 388/00 e n. 448/01); gli importi spesi ammontano a 9 milioni di euro.

2.4.14 Procuratoria di S. Marco

Gli interventi di competenza della Procuratoria di S. Marco riguardano interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione della Basilica di San Marco.

Il totale dei finanziamenti assegnati alla Procuratoria di S. Marco al 31.12.2005 è di 17 milioni di euro (Leggi n. 798/84, n. 488/99 e n. 388/00); gli importi spesi sono pari a 17 milioni di euro.

2.4.15 Curia Patriarcale di Venezia (v. Documento N)

Gli interventi di competenza della Diocesi riguardano la manutenzione ordinaria e straordinaria delle chiese e delle sedi patriarcali nel centro storico veneziano.

Il totale dei finanziamenti assegnati alla Diocesi al 31.12.2006 è pari a 52 milioni di euro (Legge n. 295/98, n. 488/99 e n. 388/00). Gli importi spesi sono pari a 35 milioni di euro.

2.4.16 Diocesi di Chioggia (v. Documento O)

Gli interventi di competenza della Diocesi riguardano la manutenzione ordinaria e straordinaria delle chiese del centro storico di Chioggia.

Il totale dei finanziamenti assegnati alla Diocesi al 31.12.2006 è pari a 10 milioni di euro (Leggi n. 448/98, n. 488/99, n. 388/00 e n. 448/01). Gli importi spesi sono pari a 8 milioni di euro.
Relativamente alla Legge n. 448/98 i finanziamenti sono stati concessi attraverso il Comune di Chioggia.

Ministero delle Infrastrutture

MAGISTRATO ALLE ACQUE

COMITATO DI INDIRIZZO COORDINAMENTO E CONTROLLO
(ART. 4 - LEGGE 29.11.1984, N. 798)

IL SEGRETARIO
(T. +39041794341 / 351 Fax +39041794384
Mail: presidenza@magisacque.it)

Prot. n. 262 / GAB

Venezia, 4 Aprile 2007-

Al Ministero Università e Ricerca
Gabinetto On.le Ministro
Piazzale Kennedy, 20
00100 ROMA

Al Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Gabinetto On.le Ministro
Via del Collegio Romano, 27
00186 ROMA

Alla Giunta Regionale del Veneto
Segreteria del Sig. Presidente
Cà Balbi - Dorsoduro, 3901
30123 VENEZIA

Al Sig. Presidente Provincia di Venezia
S. Marco - Palazzo Corner, 2662
30124 VENEZIA

Al Sig. Sindaco del Comune di Venezia
S. Marco, 4136 - Cà Farsetti
30124 VENEZIA

Al Sig. Sindaco del Comune di Chioggia
Corso del Popolo, 1193
30015 CHIOGGIA

Al Sig. Sindaco del Comune di Cavallino Treporti
Via Concordia, 38/d
30010 CA' SAVIO (VE)

Al Sig. Rettore Università degli Studi di Venezia
Dorsoduro-Ca' Foscari, 3246
30125 VENEZIA

Al Sig. Rettore I.U.A.V.
Tolentini - S. Croce, 191
30123 VENEZIA

Al Sig. Presidente CO.RI.LA
S. Marco, 2847 - Palazzo Franchetti
30124 VENEZIA

Al Sig. Presidente S.A.V.E.
Aeroporto Marco Polo
30030 TESSERA-VENEZIA

Al Sig. Presidente Autorità Portuale
Dorsoduro, Zattere, 1401
30100 VENEZIA

Al Sig. Presidente Azienda Speciale
Porto di Chioggia
Via Maestri del Lavoro, 50
30015 CHIOGGIA

Al Sig. Presidente Società di Cultura
La Biennale di Venezia
S. Marco, Cà Giustinian, 1364/a
30124 VENEZIA

Al Sig. Presidente Fondazione Giorgio Cini
Isola di S. Giorgio Maggiore
30100 VENEZIA

Al Sig. Presidente Fondazione Querini Stampalia
Castello, 4778
30100 VENEZIA

Al Responsabile Amministrativo della
Procuratoria di S. Marco di Venezia
S. Marco, 328
30124 VENEZIA

Al Responsabile Amministrativo della
Diocesi Patriarcato di Venezia
S. Marco, 320/a
30124 VENEZIA

Al Responsabile Amministrativo della
Diocesi di Chioggia
via del Vescovado
30015 CHIOGGIA

Al Consorzio Venezia Nuova
S. Marco, 2803
30124 VENEZIA

OGGETTO: *Richiesta dati.*

In esecuzione al disposto del quarto comma dell'art. 4 della legge 798/84 è necessario predisporre l'annuale "Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia".

Ai fini della redazione di tale elaborato si chiede di voler trasmettere, entro il ***30 Aprile 2007****, un dettagliato quadro, con somme espresse in Euro ed aggiornato al* ***31 dicembre 2006****, sullo stato di attuazione delle attività svolte a fronte dei finanziamenti ottenuti con la legislazione speciale.*

Al fine di rendere omogenee tali informazioni e per facilitare l'aggiornamento dei dati al 31 dicembre 2006, Vi anticipiamo, in allegato, i precedenti "Quadri analitici dello stato di attuazione dei finanziamenti", già inseriti nella Relazione sopraccitata aggiornata al 31 dicembre 2005.

Distinti saluti

Presidente del Magistrato alle Acque
Segretario del Comitato
f.to dott. ing. Maria Giovanna Piva

PAGINA BIANCA

ALLEGATI

INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA

QUADRO RIEPILOGATIVO DEI FINANZIAMENTI ASSEGNATI

CON LE LEGGI 798/84 E SUCCESSIVI RIFINANZIAMENTI, 139/92, 539/95, 515/96, 345/97, 295/98, 448/98, 488/99, 388/00, 448/01, 166/02, 3[illegible]03 E 266/05

SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2006

IMPORTI LORDI IN MIGLIAIA DI EURO

	LEGGE SPECIALE PER VENEZIA											LEGGE OBIETTIVO (443/01)		
	LEGGE N. 798/84 E RIFINANZ.	LEGGE N. 139/92	LEGGE N. 539/95	LEGGE N. 515/96	LEGGE N. 345/97	LEGGE N. 295/98	LEGGE N. 448/98	LEGGE N. 488/99	LEGGE N. 388/00	LEGGE N. 448/01	LEGGE N. 350/03	LEGGE N. 166/02 E RIFINANZ. FONDO OPERE STRATEGICHE	TOTALE PER ENTE E TOTALE GENERALE	LEGGE N 296/06
	IMPORTI ASSEGNATI IN CONTO CAPITALE	IMPORTI FINANZIATI A VALERE SUI LIMITI DI IMPEGNO CON DECORRENZA DAL 1993 E DAL 1994	IMPORTI FINANZIATI A VALERE SUI LIMITI DI IMPEGNO CON DECORRENZA DAL 1994 E DAL 1997	IMPORTI FINANZIATI A VALERE SUI LIMITI DI IMPEGNO CON DECORRENZA DAL 1997 E DAL 1998	IMPORTI FINANZIATI A VALERE SUI LIMITI DI IMPEGNO CON DECORRENZA DAL 1998 E DAL 1999	IMPORTI FINANZIATI A VALERE SUI LIMITI DI IMPEGNO CON DECORRENZA DAL 1999 E DAL 2000	IMPORTI FINANZIATI A VALERE SUI LIMITI DI IMPEGNO CON DECORRENZA DAL 1999, DAL 2000 E DAL 2001	IMPORTI FINANZIATI A VALERE SUI LIMITI DI IMPEGNO CON DECORRENZA DAL 2001 E DAL 2003	IMPORTI FINANZIATI A VALERE SUI LIMITI DI IMPEGNO CON DECORRENZA DAL 2002 E DAL 2003	IMPORTI FINANZIATI A VALERE SUI LIMITI DI IMPEGNO CON DECORRENZA DAL 2003 DAL 2003 E DAL 2004	IMPORTI ASSEGNATI IN CONTO CAPITALE	IMPORTI ATTIVABILI A VALERE SUI LIMITI DI IMPEGNO/CONTRIBUTI DELIBERATI DAL CIPE	(D)= A+B+C+D+F+G+H+I+L+M+N	IMPORTI ASSEGNATI IN CONTO CAPITALE
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(L)	(M)	(N)		(P)
STATO:														
STATO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	170.408									27.505	19.000		216.913	
Restauro archeologico	362										19.000		19.362	
Adeguamento	7.775												7.775	
Mantenimento ordinario	1.984									27.505			29.489	
Edifici demaniali	77.975												77.975	
Arsenale	12.352												12.352	
Restauro conservativo fondamenta	49.643												49.643	
Canali d'acqua	9.413												9.413	
Patrimonio immobiliare pubblico	4.882												4.662	
Università Architettura	6.242												6.242	
STATO IN CONCESSIONE (CONSORZIO VENEZIA NUOVA)	401.404	560.260	125.500	478.000	246.000		263.784	215.000	162.60	236.500		1.488.100	4.154.548	
Opere alle bocche di porto	85.648	25.332	9.418	2.750	9.973		19.630	50.812	90.420	14.465		1.468.100	1.776.588	
Rialzo rive	15.705	85.061	0	6.964	0		0	75	0	0			107.805	
Difesa abitati insulari e risanamenti	112.221	169.048	21.501	209.781	102.427		115.242	58.344	2.55[illegible]	119.708			910.843	
Morfologia e ambiente degrado	119.838	136.739	43.504	155.691	102.114		96.086	94.094	55.13[illegible]	69.327			882.330	
Servizio informatico	12.893	14.148	3.447	15.715	3.099		12.826	10.679	9.127	9.451			91.385	
Aiuti alla navigazione	7.414	7.746	0	0	0		303	0	0	0			15.463	
Difesa fiorai	43.846	119.181	47.630	76.310	26.337		17.156	997	4.72[illegible]	21.549			357.730	
Petroli e vasi da pesca	4.040	3.005	0	770	2.050		2.541	0	0	0			12.406	
REGIONE VENETO (1) (3)	274.393	386.376	50.435	181.902	142.026		235.605	205.033	97.702	189.123			1.762.495	
Disinquinamento	239.791	386.376	47.076	181.902	119.351		201.935	194.704	89.867	173.958			1.634.962	
Acquedotto	20.858				22.675		33.570	10.329	6.813	13.187			107.232	
Ospedale SS. Giovanni e Paolo	13.944		3.357						1.022	1.978			20.301	
COMUNE DI VENEZIA (2) (4)	203.941	308.005	97.371	315.618	195.994	13.698	244.351	162.640	133.920	187.645		81.678	1.926.861	
Risanamento immobili		167.016	70.886	199.188	91.622	13.698	93.187	64.262	71.838	45.879				
Urbanizzazione primaria		23.803	12.501	44.282	24.397		49.234	30.473	19.283	44.183				
Contributi a privati		30.790	9.296	41.781	35.895		25.070	28.569	4.669	27.297				
Insediamenti produttivi		31.961	3.739	12.575	18.308		29.419	11.756	12.522	4.252				
Progetto integrato rii		54.435	949	17.792	27.772		49.441	27.580	25.608	46.034				
COMUNE DI CHIOGGIA (3) (5)	32.060	35.687	14.761	46.706	24.830	2.506	40.904	23.396	16.831	29.940		18.859	286.481	
Risanamento immobili														
Urbanizzazione primaria														
Contributi ai privati									13.219	28.140				
Infrastrutture														
Contributi acquisto 1° casa														
Ers van Fraccia attraverso il Comune di Chioggia									3.612	1.800				

Allegato n. 1

COMUNE DI CAVALLINO - TREPORTI																			
ALTRI ENTI	51.619	68.825	35.982	130.556	84.714	13.428	118.304	4.857			51.688		74.201	6.838	23.872		10.164	4.665	19.937
FONDAZIONE DI VENEZIA	1.756	14.826	8.263	42.866	13.428	15.494							4.648		1.336				102.739
UNIVERSITA' DEGLI STUDI CA' FOSCARI	12.911	17.091	9.237	22.134	29.545	24.177							3.918		3.602				120.517
ISTITUTO VENETO DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI																			
MUSEO STORICO INTERNAZIONALE UNIVERSITARIO DELLA RESISTENZA E DEPORTAZIONE	10.329	10.490	6.246	9.878	12.039	12.562									3.024				54.249
PARROCCHIA DI SAN MARCO	4.870										11.524		1.239						10.329
AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA	10.846			36.736		13.665							4.300		3.040				17.434
ORGANIZZAZIONE DELLA PASTORALE (4)	516					7.230													68.607
ARCIDIOCESI VENEZIA (4)	1.033	26.512	12.216	18.944	12.701	12.739	0				5.578		1.548						7.746
CONSORZIO UNIVERSITARIO (COR.LA.)						6.595					4.338		1.563						91.271
DIOCESI PATRIARCATO DI VENEZIA (3)						12.394													12.496
DIOCESI DI CHIOGGIA (6)											10.699		28.488						51.581
FONDAZIONE CINI (5)					3.098						725		4.501		1.200				7.746
FONDAZIONE CINI (4)											16.347		9.134		6.889				9.521
MUSEO DI VENEZIA (4)						13.428					12.395								32.370
LOCALI POSTE CHIOGGIA (6)								1.559					8.057		1.856				25.823
EURO	1.033																		11.266
ENTI E ATTIVITA' CULTURALI	8.522																		1.033
DELEGATO AL TRAFFICO ACQUEO																			8.522
TOTALE PER LEGGE E TOTALE GENERALE	1.133.822	1.380.253	324.030	1.152.784	673.564	134.808	791.201	657.757			490.884		681.423		19.000		1.583.674	9.002.899	115.000

(1) L'art. 3 della Legge 139/92 prevede che una quota pari al 10% delle disponibilità derivanti dai fondi di impiego autorizzati per la Regione Veneto venga destinata alla realizzazione del progetto integrato per l'area di Venezia, mediante "Accordi di programma" con il Comune di Venezia. Pertanto, gli importi riferiti alla Regione Veneto comprendono le somme destinate al Comune di Venezia per il "progetto integrato n°

(2) Gli importi indicati non tengono conto delle somme provenienti dalla Regione Veneto per il "progetto integrato n°

(3) A seguito della delibera del Consiglio ex art. 4 Legge n. 798/84 del 4 febbraio 2003, relativamente alla legge 388/00, la Regione Veneto ha rinunciato ad una quota pari al 7,5% dei fondi di impegno con decorrenza dal 2003 ed essa assegnati, a favore della Diocesi Patriarcato di Venezia per le necessità derivanti dal restauro e mantenimento di immobili religiosi (Palazzo Patriarcale di Venezia) di competenza detta Diocesi. Relativamente alla legge 448/01 il Comune di Chioggia ha rinunciato ad una quota complessiva di limiti di impegno di euro 250.000 con decorrenza 2004 che vengono assegnati per 150.000 euro all'AULSS 14 e per 100.000 euro alla Diocesi di Chioggia

(4) Attraverso il Comune di Venezia sono stati finanziati
- l'Archivio Marco Polo relativamente alla Legge 448/98,
- la Biennale di Venezia e l'Azienda Consorzio Trasporti Veneziano relativamente alla legge 388/00 (importi finanziati non specificati dal Comune di Venezia),
- la Biennale di Venezia, l'Azienda Consorzio Trasporti Veneziano, la Fondazione Querini Stampalia e la Fondazione Uga e Olga Levi relativamente alla legge 448/01 (importo finanziato non specificato dal Comune di Venezia)

(5) Per la Fondazione Giorgio Cini relativamente alla Legge 433/91, i limiti di impegno con decorrenza dal 2001, e quindi i finanziamenti, sono stati concessi attraverso il Consorzio Venezia Nuova. Vedere il Contratto ex art. 4 Legge n. 798/84 nella seduta del 6.12.2001 ha deliberato di destinare direttamente alla Fondazione Cini una quota parte dell'importo di impegno destinato al Consorzio Venezia Nuova, con decorrenza dal 2002, su indicazione del Presidente del Magistrato alle Acque in data 5 luglio 2002

(6) Attraverso il Comune di Chioggia sono stati finanziati
- la Diocesi di Chioggia e l'Azienda Speciale Porto Chioggia relativamente alla Legge 448/98,
- la AULSS 14, l'Istituto Cavanis, l'Istituto Salesiano S. Giusto, la Diocesi di Chioggia e il Circolo Nautico relativamente alla Legge 488/99 (dati dettagliati solo da Diocesi di Chioggia),
- la AULSS 14, l'Istituto Cavanis, Azienda Servizi Pubblici, l'Istituto per Anziani di Chioggia e la Diocesi di Chioggia relativamente alla Legge 388/00 (dati dettagliati solo da Diocesi di Chioggia)

NOTE RENE

Si riporta che in situazione della Legge Obiettivo (L. n. 443/01), in data 03.08.2007, il CIPE ha destinato la quota assegnazione di fondi (243 Meuro) per il "Sistema MOSE" a valere sulla Legge 296/06 - Finanziaria per il 2007. Il totale generale dei finanziamenti assegnati non tiene conto di tali fondi, in quanto destinati nel corso del 2007 e disponibili dal 2008. Inoltre, il Comitato ex art. 4 Legge 798/84, nella seduta del 3 maggio 2007, ha ripartito la somma di 115 Meuro accantonata in conto capitale dalla Legge 296/06. Il totale generale non tiene conto di tali fondi, in quanto destinati nel corso del 2007 e disponibili dal 2008. Inoltre, il Comitato ex art. 4 Legge 798/84, nella seduta del 3 maggio 2007, ha ripartito la somma di 115 Meuro accantonata in conto capitale dalla Legge 296/06. Il totale generale non tiene conto di tali fondi, in quanto destinati ai diversi Soggetti nel corso del 2007. Tale importo sarà anche assegnato nell'ambito della Legge 296/06, lo Stato ha versato dal 1984 ad oggi ha assegnato alla Salvaguardia di Venezia 9.381 Meuro

Venezia, 3 settembre 2007

Allegato n. 2

INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA

QUADRO RIEPILOGATIVO DEI FINANZIAMENTI ASSEGNATI E DEGLI IMPORTI SPESI

RELATIVAMENTE ALLE LEGGI 798/84 E SUCCESSIVI REFINANZIAMENTI: 139/92; 535/95; 51/96; 345/97; 295/96; 445/00; 488/99; 388/00; 448/01; 166/02; 350/03 E 266/05

SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2006

IMPORTI LORDI IN MIGLIAIA DI EURO

	LEGGE SPECIALE PER VENEZIA														LEGGE OBIETTIVO (443/01)		TOTALE PER ENTE E TOTALE GENERALE	
	LEGGE N. 798/84 E RIFINANZ.		LEGGE N. 139/92		LEGGE N. 535/95		LEGGE N. 61/96		LEGGE N. 345/97		LEGGE N. 295/96		LEGGE 448/98		LEGGE N. 488/99		LEGGE N. 388/00		LEGGE N. 448/01		LEGGE N. 350/03		LEGGE N. 166/02 E REFINANZ. FONDO OPERE STRATEGICHE		FINANZIAMENTI ASSEGNATI	IMPORTI SPESI
	FINANZIAMENTI ASSEGNATI IN CONTO CAPITALE	IMPORTI SPESI	FINANZIAMENTI ASSEGNATI	IMPORTI SPESI	FINANZIAMENTI ASSEGNATI	IMPORTI SPESI	FINANZIAMENTI ASSEGNATI	IMPORTI SPESI	FINANZIAMENTI ASSEGNATI	IMPORTI SPESI	FINANZIAMENTI ASSEGNATI	IMPORTI SPESI	FINANZIAMENTI ASSEGNATI	IMPORTI SPESI	FINANZIAMENTI ASSEGNATI	IMPORTI SPESI	FINANZIAMENTI ASSEGNATI	IMPORTI SPESI	FINANZIAMENTI ASSEGNATI	IMPORTI SPESI	FINANZIAMENTI ASSEGNATI	IMPORTI SPESI	FINANZIAMENTI ASSEGNATI	IMPORTI SPESI
	(A1)	(A2)	(B1)	(B2)	(C1)	(C2)	(D1)	(D2)	(E1)	(E2)	(F1)	(F2)	(G1)	(G2)	(H1)	(H2)	(I1)	(I2)	(L1)	(L2)	(M1)	(M2)	(N1)	(N2)			(O1) = (A1)+(B1)+(C1)+(D1)+(E1)+(F1)+(G1)+(H1)+(I1)+(L1)+(M1)+(N1)	(O2) = (A2)+(B2)+(C2)+(D2)+(E2)+(F2)+(G2)+(H2)+(I2)+(L2)+(M2)+(N2)
STATO																												
STATO DELL'AMMINISTRAZIONE DIRETTA	170.000	158.845																	27.800	8.195	19.000	1.033			216.913	179.094		
Presidenza del Consiglio	362	362																			19.000	1.033			19.362	1.395		
Ministero dell'interno	7.775	7.232																							7.775	7.232		
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	1.964	1.964																							29.469	10.180		
Ministero dell'economia e delle finanze	77.975	77.975																	27.800	8.195					77.975	77.975		
Agenzia del demanio	12.352	12.352																							17.352	12.352		
Provveditorati interregionali per le opere pubbliche	49.643	49.643																							49.643	49.643		
Corpo forestale dello Stato	9.413	9.413																							9.413	9.413		
Patrimonio mobiliare pubblico	4.662	4.662																							4.662	4.662		
Università Ca'Foscari	6.747	6.747																							6.747	6.747		
STATO CONCESSIONARI (CONSORZIO VENEZIA NUOVA)	401.404	388.317	660.260	586.615	176.600	121.923	478.000	439.283	248.900	213.781			253.784	217.154	215.000	161.383	182.800	139.117	234.600	126.287			1.468.100	1.014.212	4.164.448	2.342.215		
Opere alla bocche di porto	85.545	85.252	25.332	24.711	8.418	8.418	2.790	2.790	9.873	9.873			18.638	19.328	50.612	48.763	93.470	86.735	14.435	12.738			1.468.100	1.014.212	1.776.560	1.315.967		
Opere complementari	15.725	15.606	85.061	85.061	0	0	6.964	6.964	0	0			0	0	75	36	0	0	0	0					107.805	107.763		
Chioggia	112.221	111.618	169.064	168.720	21.501	21.050	209.761	186.117	102.437	80.530			115.242	83.265	58.344	33.625	2.981	2.301	118.700	44.455					910.843	379.396		
Malamocco - Alberoni e mare esterno	118.658	118.659	136.739	135.995	43.504	41.214	165.691	155.101	102.114	92.214			90.066	75.371	94.064	67.429	55.137	35.705	69.327	34.795					888.330	756.478		
Lavori di conservazione	12.863	12.863	14.145	13.883	3.447	3.145	15.715	3.099	3.052	0			12.826	11.965	10.679	10.363	9.127	8.078	8.451	5.197					81.305	66.978		
Studi e sperimentazioni	7.414	7.414	7.748	7.748	0	0	0	0	300	0			0	0	0	0	0	0	0	0					15.462	15.162		
Conca di Malamocco	43.865	43.705	119.181	119.181	47.630	47.000	72.860	70.310	29.033	29.033			17.156	15.836	999	999	4.774	4.103	21.948	19.196					358.736	348.882		
Bocche e difesa lagune	4.042	4.008	3.005	3.005	0	0	770	30	2.060	1.991			2.541	2.541	0	0	0	0	0	0					12.408	11.913		
REGIONE VENETO	274.393	191.683	388.376	251.641	80.433	46.944	181.862	126.223	142.826	84.145			236.865	109.866	206.633	62.236	87.782	7.883	188.123	16.288					1.762.496	866.454		
Ca' Tron - Fusina	208.791	171.144	380.376	251.641	47.078	47.327	181.862	125.273	118.351	45.314			201.853	89.695	194.704	49.135	69.867	5.838	172.958	11.303					1.634.862	792.872		
Opere complementari	20.656	6.496							1.453	0			33.570	19.868	10.326	3.099	6.813	2.044	13.187	3.956					107.232	55.301		
Cavallino SS. Gonfo e Ortazo	12.944	13.944		3.357	3.355				22.675	19.832					1.029		1.029		1.978						29.301	17.281		
COMUNE DI VENEZIA	203.941	193.200	308.000	298.877	97.371	81.351	315.618	269.370	195.884	144.633	13.618	13.498	245.381	178.445	152.845	109.362	133.920	91.346	167.648	81.400			81.678	20.310	1.524.465	1.464.796		
Salvaguardia ambientale			167.016	163.928	70.886	57.945	199.105	177.743	91.527	73.517	13.618	13.498	97.167	79.851	64.262	41.995	71.838	47.770	45.878	27.672								
Urbanistica e vivibilità storica			23.803	22.875	12.501	9.753	44.282	38.365	34.357	29.901			49.254	39.081	30.423	18.612	19.781	13.167	44.153	24.498								
Cavallino e isolani			30.700	29.503	9.296	8.142	41.701	25.402	35.092	13.888			25.070	12.915	28.559	21.317	4.609	3.695	27.197	13.343								
Tradizioni produttive			31.961	29.329	3.739	3.515	12.575	10.888	18.306	9.864			29.410	4.786	11.356	2.446	13.227	6.664	4.347	1.326								
Progetti speciali			54.436	54.338	9648	9648	11.760	11.760	27.772	20.522			43.441	42.703	27.505	24.952	25.486	22.446	46.074	24.908								
COMUNE DI CHIOGGIA	32.960	26.322	35.887	34.426	14.781	12.945	46.706	30.447	24.535	19.852	2.605	686	40.864	24.376	23.396	10.107	18.631	12.178	29.940	11.626			18.665	2.876	286.491	186.888		

Destinazione annuale Urbanizzazione primaria Contributo straord. Infrastrutture Contributi acquisiti 1° casa Ente vigilanza straordinaria Comune di Chioggia																														
COMUNE DI CAVALLINO - TREPORTI																														
ALTRI ENTI:	61.616	49.688	88.935	64.928	35.962	33.234	150.858	111.061	64.714	48.323	118.234	78.885	4.617	4.277	51.888	39.799	74.901	24.130	23.972	6.140			10.168	10.188		635.664	464.018			
PROVINCIA DI VENEZIA	1.756	1.756	14.828	9.653	8.953	5.959	42.866	29.382	13.428	3.252	15.464	121					4.648	0	1.356	0						107.720	47.809			
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VENEZIA	12.811	12.430	17.991	17.991	8.237	8.643	22.134	21.633	29.568	17.231	26.177	8.400					3.818	0	3.607	875						220.517	87.355			
ISTITUTO UNIVERSITARIO ARCHITETTURA VENEZIA MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA			10.493	10.493	6.746	6.246	9.878	9.878	12.039	12.039	12.562	9.175							3.024	3.024						54.742	50.899			
	10.329	9.212																								10.329	9.212			
PROSOVRINTENDENZA DI SAN MARCO	4.670	4.670																								17.454	17.433			
AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA	10.846	10.846					36.738	34.215				13.985	6.993				4.332	1.765	3.040	598					69.607	54.378			
TENENZA DI COLLEGIO STAMPANIA	516	516										7.230	6.751													7.746	6.767			
AEROPORTO MARCO POLO	1.033	1.033	29.512	29.512	17.716	17.716	18.944	18.944	17.701	17.701	12.739	12.968					5.578	0	1.540	0						81.271	80.774			
CONSORZIO POLIZIA STRADALE LAGUNARE												6.595					4.338	2.216	1.987	1.985						12.496	10.443			
DIOCESI PATRIARCATO DI VENEZIA											12.394				10.699	10.699	28.486	12.144								51.581	35.237			
DIOCESI DI CHIOGGIA															3.098	2.716	725	674	4.900	4.900	1.200	0				9.923	7.990			
FONDAZIONE Cini																	16.347	7.295	9.134	2.902	6.889	125				32.370	9.459			
BIENNALE DI VENEZIA											13.428	13.428			12.395	9.605										25.823	23.033			
AZIENDA SPECIALE PORTO CHIOGGIA															1.550	1.550	8.957	182	1.950	0						11.766	1.732			
MINISTERO DEL TESORO	1.033	1.033																								1.033	1.033			
MINISTERO BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	8.072	8.072																								8.522	8.072			
COMMISSARIO DELEGATO AL TRAFFICO ACQUEO																							10.168	10.168		10.168	10.168			
TOTALE PER LEGGE E TOTALE GENERALE	1.133.822	999.924	1.360.283	1.205.383	324.030	265.093	1.152.794	976.444	673.664	489.616	134.508	85.777	791.201	536.088	667.757	372.751	490.884	276.711	691.423	253.118	19.000	1.033	1.583.674	1.047.779		9.002.899	6.542.645			
																												% 1999/98 spesa totale		73%

Allegato n. 3

LEGGE N. 798/84 E SUCCESSIVI RIFINANZIAMENTI

Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti

(importi in migliaia di euro)

Soggetti	IMPORTI FINANZIATI	IMPORTI ASSEGNATI E DISPONIBILI	IMPORTI IMPEGNATI	IMPORTI SPESI
STATO:				
Stato in amministrazione diretta - dati al 31.12.2006	176.067	170.408	169.865	169.865
L. 798/84, art. 3 lett. a) Riequilibrio Idrogeologico	362	362	362	362
L. 798/84, art. 3 lett. b) Serv. Antinquinamento	11.199	7.775	7.232	7.232
L. 798/84, art. 3 lett. c) Marginamenti lagunari	3.445	1.984	1.984	1.984
L. 798/84, art. 3 lett. e) Restauro edifici demaniali	77.975	77.975	77.975	77.975
L. 798/84, art. 3 lett. f) Recupero Arsenale	12.352	12.352	12.352	12.352
L. 798/84, art. 3 lett. g) Ponti, canali, fondamenta	49.643	49.643	49.643	49.643
L. 798/84, art. 3 lett. h) Sistemaz. corsi d'acqua	10.188	9.413	9.413	9.413
L. 798/84, art. 3 lett. i) Patrimonio mobiliare pubblico	4.662	4.662	4.662	4.662
L. 798/84, art. 3 lett. m) Università Architettura	6.242	6.242	6.242	6.242
Stato in concessione (Consorzio Venezia Nuova) - dati al 31.12.2006	401.404	401.404	401.404	399.287
L. 798/84, art. 3 lett. a) Opere alle bocche	85.648	85.648	85.648	85.230
L. 798/84, art. 3 lett. a), d) Rinforzo moli	15.705	15.705	15.705	15.699
L. 798/84, art. 3 lett. a), c) Difesa abitati, insulae, margin.	112.221	112.221	112.221	111.610
L. 798/84, art. 3 lett. a) Morfologia e arresto degrado	119.638	119.638	119.638	118.697
L. 798/84, art. 3 lett. a) Servizio Informativo	12.893	12.893	12.893	12.893
L. 798/84, art. 3 lett. d) Ausilii alla navigazione	7.414	7.414	7.414	7.414
L. 798/84, art. 3 lett. d) Difesa litorali	43.846	43.846	43.846	43.708
L. 798/84, art. 3 lett. l) Petroli e valli da pesca	4.040	4.040	4.040	4.036
ALTRI ENTI	57.065	51.616	51.616	49.668
Provincia di Venezia - dati al 31.12.2000	2.041	1.756	1.756	1.756
Autorità Portuale già Provveditorato al Porto	10.846	10.846	10.846	10.846
Ministero BB.CC.AA. - dati al 31.12.98	8.522	8.522	8.522	8.072
Ministero Industria	5.165			
Ministero Ricerca Scientifica - dati al 21.02.97	10.329	10.329	10.329	9.312
Ministero del Tesoro	1.033	1.033	1.033	1.033
Procuratoria di S. Marco	4.670	4.670	4.670	4.670
Università degli Studi - dati al 31.12.2006	12.911	12.911	12.911	12.430
Aeroporto Marco Polo - dati al 31.12.2006	1.033	1.033	1.033	1.033
Fond. Querini Stampalia	516	516	516	516
Ministero Ambiente				
IUAV				
REGIONE VENETO - dati al 31.12.2006	274.393	274.393	246.918	191.583
L. 798/84, art. 5 lett. a) e L. 360/91, art. 2 lett. b) Disinquinamento	239.791	239.791	212.315	171.141
L. 798/84, art. 5 lett. a) - Acquedotti	20.658	20.658	20.658	6.498
L. 798/84, art. 5 lett. b) Osp. SS. Giovanni e Paolo	13.944	13.944	13.944	13.944
COMUNE DI VENEZIA - dati al 30.06.97	203.941	203.941	203.941	163.200
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento Immobili				
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria				
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati				
L. 798/84, art. 6 lett. d) Insediamenti produttivi				
L. 360/91, art. 2 lett. c) Infrastrutture				
L. 360/91, art. 2 lett. d) Contributi acquisto 1^ casa				
COMUNE DI CHIOGGIA - dati al 31.12.2006	32.060	32.060	31.961	26.322
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento Immobili				
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria				
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati				
L. 360/91, art. 2 lett. c) Infrastrutture				
L. 360/91, art. 2 lett. d) Contributi acquisto 1^ casa				
TOTALE	1.144.931	1.133.822	1.105.704	999.924

NOTE

1) Per i rifinanziamenti della Legge 798/84, sono stati considerati gli importi risultanti dalle successive rimodulazioni e al netto delle riduzioni di cui al D.M. Tesoro n. 114758 del 21.02.1994.

2) IMPORTI IMPEGNATI.

- per Stato in Amministrazione diretta, Regione Veneto, Comuni di Venezia e di Chioggia e per gli altri Enti Pubblici, sono gli importi destinati con delibera degli organi competenti.
- per Stato in Concessione, sono gli importi destinati mediante convenzioni tra l'Amministrazione Concedente e il Concessionario Consorzio Venezia Nuova e già registrati da parte della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto

Allegato n. 4

LEGGE N. 139/92

Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti

(importi in migliaia di euro)

Soggetti	LIMITI DI IMPEGNO EX LEGE 139/92	IMPORTI ASSEGNATI E DISPONIBILI	IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO		IMPORTI IMPEGNATI	IMPORTI SPESI
STATO:						
Stato in concessione (Consorzio Venezia Nuova) - dati al 31.12.2006	47.772	560.260	(1)	560.260	560.260	555.613
L. 798/84, art. 3 lett. a) Opere alle bocche		25.332		25.332	25.332	24.731
L. 798/84, art. 3 lett. a), d) Rinforzo moli		85.061		85.061	85.061	85.061
L. 798/84, art. 3 lett. a), c) Difesa abitati, insulae, margin.	35.016	169.048		169.048	169.048	166.202
L. 798/84, art. 3 lett. a) Morfologia e arresto degrado		136.739		136.739	136.739	135.995
L. 798/84, art. 3 lett. a) Servizio Informativo		14.148		14.148	14.148	13.693
L. 798/84, art. 3 lett. d) Ausilii alla navigazione	12.447	7.746		7.746	7.746	7.746
L. 798/84, art. 3 lett. d) Difesa litorali		119.181		119.181	119.181	119.181
L. 798/84, art. 3 lett. l) Petroli e valli da pesca	310	3.005		3.005	3.005	3.005
ALTRI ENTI :	6.714	69.925		69.925	67.772	64.628
Provincia di Venezia - dati al 18.02.98	1.291	14.928	(1)	14.928	12.776	9.632
Università degli Studi - dati al 31.12.2006	2.066	17.991	(1)	17.991	17.991	17.991
Aeroporto Marco Polo - dati al 31.12.2006	2.066	26.512	(1)	26.512	26.512	26.512
IUAV - dati al 31.12.2004	1.291	10.493	(1)	10.493	10.493	10.493
REGIONE VENETO - dati al 31.12.2006 (*)	36.927	386.376		386.376	321.473	251.841
L. 798/84, art. 5 lett. a) e L. 360/91, art. 2 lett. b) Disinquinamento	36.927	386.376	(1)	386.376	321.473	251.841
COMUNE DI VENEZIA - dati al 31.12.2006	34.020	308.005	(2)	308.005	307.308	298.877
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento immobili		167.016			166.319	163.828
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria		23.803			23.803	22.875
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati		30.790			30.790	29.503
L. 798/84, art. 6 lett. d) Insediamenti produttivi		31.961			31.961	28.339
L. 139/92, art. 5 Progetto integrato rii (**)		54.435			54.435	54.332
COMUNE DI CHIOGGIA - dati al 31.12.2006	4.132	35.687	(2)	35.687	35.687	34.424
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento Immobili	3.062					
L. 360/91, art. 2 lett. c) Infrastrutture						
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria	401					
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati	669					
TOTALE	129.565	**1.360.253**		1.360.253	**1.292.500**	**1.205.383**

NOTE

- IMPORTI ASSEGNATI E DISPONIBILI : gli importi attivati a valere sui limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla legge.
  - I limiti di impegno con decorrenza dal 1994 autorizzati per la Regione Veneto, il Comune di Venezia e il Comune di Chioggia dalla Legge 139/92 e successivo D.M. n. 140503 del 21.05.1992 sono stati rimodulati dal Decreto Legge n. 659 del 30 novembre 1994 spostandone in parte la decorrenza al 1995 e/o al 1996.
- IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO: gli importi perfezionati con i relativi contratti di mutuo :
  (1) Importo dei contratti di mutuo stipulati a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1993 e dal 1994.
  (2) Importo dei contratti di mutuo stipulati a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1993, dal 1994, dal 1995 e dal 1996.

- IMPORTI IMPEGNATI:
  - per Stato in Amministrazione diretta, Regione Veneto, Comuni di Venezia e di Chioggia e per gli altri Enti Pubblici, sono gli importi destinati con delibera degli organi competenti.
  - per Stato in Concessione, sono gli importi destinati mediante convenzioni tra l'Amministrazione Concedente e il Concessionario Consorzio Venezia Nuova e già registrati da parte della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto.
- Finanziamenti per progetto integrato rii (Legge n. 139/92, art. 5):
  (*) L'art. 3 della Legge n. 139/92 prevede che una quota pari al 10% delle disponibilità derivanti dai limiti di impegno autorizzati per la Regione Veneto venga destinata alla realizzazione del progetto integrato per i rii di Venezia mediante accordi di programma con il Comune di Venezia. Pertanto, gli importi assegnati, impegnati e spesi riferiti alla Regione Veneto comprendono le somme destinate al Comune di Venezia per il progetto integrato rii.

  (**) Agli importi assegnati indicati vanno sommati gli importi provenienti dalla Regione Veneto per il progetto integrato rii.

Allegato n. 5

LEGGE N. 539/95

Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti

(importi in migliaia di euro)

Soggetti	LIMITI DI IMPEGNO EX LEGE 539/95	IMPORTI ASSEGNATI E DISPONIBILI	IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO		IMPORTI IMPEGNATI	IMPORTI SPESI
STATO:						
Stato in concessione (Consorzio Venezia Nuova) - dati al 31.12.2006	9.908	125.500	(1)	125.500	125.500	121.822
L. 798/84, art. 3 lett. a) Opere alle bocche		9.418		9.418	9.418	9.418
L. 798/84, art. 3 lett. a), d) Rinforzo moli						
L. 798/84, art. 3 lett. a), c) Difesa abitati, insulae, margin.		21.501		21.501	21.501	21.036
L. 798/84, art. 3 lett. a) Morfologia e arresto degrado		43.504		43.504	43.504	41.214
L. 798/84, art. 3 lett. a) Servizio Informativo		3.447		3.447	3.447	3.145
L. 798/84, art. 3 lett. d) Ausilii alla navigazione						
L. 798/84, art. 3 lett. d) Difesa litorali		47.630		47.630	47.630	47.009
L. 798/84, art. 3 lett. l) Petroli e valli da pesca						
ALTRI ENTI :	3.460	35.962		35.962	34.826	33.234
Provincia di Venezia dati al 31.12.2000	952	8.263	(1)	8.263	7.127	5.929
Università degli Studi - dati al 31.12.2006	962	9.237	(1)	9.237	9.237	8.843
Aeroporto Marco Polo dati al 31.12.2006	953	12.216	(1)	12.216	12.216	12.216
IUAV - dati al 31.12.2004	593	6.246	(1)	6.246	6.246	6.246
REGIONE VENETO - dati al 31.12.2006 (*)	4.663	50.435	(1)	50.435	46.481	45.644
L. 798/84, art. 5 lett. a) e L. 360/91, art. 2 lett. b) Disinquinamento		47.078		47.078	43.124	42.327
L. 798/84, art. 5 lett. b) Ospedali		3.357		3.357	3.357	3.317
COMUNE DI VENEZIA - dati al 31.12.2006	9.129	97.371	(1)	97.371	94.677	81.361
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento immobili		70.886			68.503	57.848
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria		12.501			12.190	9.763
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati		9.296			9.296	9.190
L. 798/84, art. 6 lett. d) Insediamenti produttivi		3.739			3.739	3.615
L. 139/92, art. 5 Progetto integrato rii (**)		949			949	945
COMUNE DI CHIOGGIA - dati al 31.12.2006	1.503	14.761	(1)	14.761	13.531	12.948
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento Immobili						
L. 360/91, art. 2 lett. c) Infrastrutture						
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria						
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati						
TOTALE	28.664	324.030		324.030	315.015	295.009

NOTE

- IMPORTI ASSEGNATI TOTALI : stima degli importi attivabili con i limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla legge con decorrenza dal 1996 e dal 1997.

- IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO: gli importi perfezionati con i relativi contratti di mutuo :
  (1) Importo dei contratti di mutuo stipulati a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1996 e dal 1997.

- IMPORTI IMPEGNATI:
  - per Stato in Amministrazione diretta, Regione Veneto, Comuni di Venezia e di Chioggia e per gli altri Enti Pubblici, sono gli importi destinati con delibera degli organi competenti.
  - per Stato in Concessione, sono gli importi destinati mediante convenzioni tra l'Amministrazione Concedente e il Concessionario Consorzio Venezia Nuova e già registrati da parte della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto.

- Finanziamenti per progetto integrato rii (Legge n. 139/92, art. 5):
  (*) L'art. 3 della Legge n. 139/92 prevede che una quota pari al 10% delle disponibilità derivanti dai limiti di impegno autorizzati per la Regione Veneto venga destinata alla realizzazione del progetto integrato per i rii di Venezia mediante accordi di programma con il Comune di Venezia. Pertanto, gli importi assegnati, impegnati e spesi riferiti alla Regione Veneto comprendono le somme destinate al Comune di Venezia per il progetto integrato rii.
  (**) Agli importi assegnati indicati vanno sommati gli importi provenienti dalla Regione Veneto per il progetto integrato rii.

Allegato n. 6

LEGGE N. 515/96

Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti

(importi in migliaia di euro)

Soggetti	LIMITI DI IMPEGNO EX LEGE 515/96	IMPORTI ASSEGNATI E DISPONIBILI	IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO		IMPORTI IMPEGNATI	IMPORTI SPESI
STATO:						
Stato in concessione (Consorzio Venezia Nuova) - dati al 31.12.2006	35.997	478.000	(1)	478.000	478.000	439.293
L. 798/84, art. 3 lett. a) Opere alle bocche		2.790		2.790	2.790	2.790
L. 798/84, art. 3 lett. a), d) Rinforzo moli		6.964		6.964	6.964	6.964
L. 798/84, art. 3 lett. a), c) Difesa abitati, insulae, margin.		209.761		209.761	209.761	186.117
L. 798/84, art. 3 lett. a) Morfologia e arresto degrado		165.691		165.691	165.691	155.101
L. 798/84, art. 3 lett. a) Servizio Informativo		15.715		15.715	15.715	15.422
L. 798/84, art. 3 lett. d) Ausilii alla navigazione						
L. 798/84, art. 3 lett. d) Difesa litorali		76.310		76.310	76.310	72.860
L. 798/84, art. 3 lett. l) Petroli e valli da pesca		770		770	770	39
ALTRI ENTI :	11.207	130.558		130.558	122.378	111.061
Provincia di Venezia - dati al 31.12.2000	3.822	42.866	(1)	42.866	34.686	26.393
Università degli Studi - dati al 31.12.2006	1.833	22.134	(1)	22.134	22.134	21.631
Autorità Portuale - dati al 31.12.2004	3.099	36.736	(1)	36.736	36.736	34.215
Aeroporto Marco Polo dati al 31.12.2006	1.524	18.944	(1)	18.944	18.944	18.944
IUAV - dati al 31.12.2005	930	9.878	(1)	9.878	9.878	9.878
REGIONE VENETO - dati al 31.12.2006 (*)	15.907	181.902		181.903	155.158	125.273
L. 798/84, art. 5 lett. a) e L. 360/91, art. 2 lett. b) Disinquinamento		181.902	(1)	181.902	155.158	125.273
COMUNE DI VENEZIA - dati al 31.12.2006	27.942	315.618	(1)	315.618	309.749	269.370
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento immobili		199.188			194.974	177.743
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria		44.282			43.067	38.395
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati		41.781			41.781	25.202
L. 798/84, art. 6 lett. d) Insediamenti produttivi		12.575			12.136	10.886
L. 139/92, art. 5 Progetto integrato rii (**)		17.792			17.791	17.144
COMUNE DI CHIOGGIA - dati al 31.12.2006	4.492	46.706	(1)	46.706	41.245	30.447
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento Immobili						
L. 360/91, art. 2 lett. c) Infrastrutture						
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria						
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati						
TOTALE	95.545	1.152.784		1.152.784	1.106.530	975.444

NOTE

- IMPORTI ASSEGNATI: stima degli importi attivabili con i limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla legge con decorrenza dal 1997 e dal 1998.

- IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO: gli importi perfezionati con i relativi contratti di mutuo :
  (1) Importo dei contratti di mutuo stipulati a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1997 e dal 1998.

- IMPORTI IMPEGNATI:
  - per Stato in Amministrazione diretta, Regione Veneto, Comuni di Venezia e di Chioggia e per gli altri Enti Pubblici, sono gli importi destinati con delibera degli organi competenti.
  - per Stato in Concessione, sono gli importi destinati mediante convenzioni tra l'Amministrazione Concedente e il Concessionario Consorzio Venezia Nuova e già registrati da parte della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto.

- Finanziamenti per progetto integrato rii (Legge n. 139/92, art. 5):
  (*) L'art. 3 della Legge n. 139/92 prevede che una quota pari al 10% delle disponibilità derivanti dai limiti di impegno autorizzati per la Regione Veneto venga destinata alla realizzazione del progetto integrato per i rii di Venezia mediante accordi di programma con il Comune di Venezia. Pertanto, gli importi assegnati, impegnati e spesi riferiti alla Regione Veneto comprendono le somme destinate al Comune di Venezia per il progetto integrato rii.
  (**) Agli importi assegnati indicati vanno sommati gli importi provenienti dalla Regione Veneto per il progetto integrato rii.

Allegato n. 7

LEGGE N. 345/97

Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti

(importi migliaia di euro)

Soggetti	LIMITI DI IMPEGNO EX LEGE 345/97	IMPORTI ASSEGNATI E DISPONIBILI	IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO		IMPORTI IMPEGNATI	IMPORTI SPESI
STATO:						
Stato in concessione (Consorzio Venezia Nuova) - dati al 31.12.2006	18.076	246.000	(1)	246.000	246.000	213.781
L. 798/84, art. 3 lett. a) Opere alle bocche		9.973		9.973	9.973	9.973
L. 798/84, art. 3 lett. a), d) Rinforzo moli						
L. 798/84, art. 3 lett. a), c) Difesa abitati, insulae, margin.		102.427		102.427	102.427	80.520
L. 798/84, art. 3 lett. a) Morfologia e arresto degrado		102.114		102.114	102.114	92.214
L. 798/84, art. 3 lett. a) Servizio Informativo		3.099		3.099	3.099	3.052
L. 798/84, art. 3 lett. d) Ausilii alla navigazione						
L. 798/84, art. 3 lett. d) Difesa litorali		26.337		26.337	26.337	26.032
L. 798/84, art. 3 lett. l) Petroli e valli da pesca		2.050		2.050	2.050	1.991
ALTRI ENTI :	5.165	64.714		64.714	61.057	45.223
Provincia di Venezia - dati al 31.12.2000	1.033	13.428	(1)	13.428	9.771	3.252
Università degli Studi - dati al 31.12.2006	2.066	26.546	(1)	26.546	26.546	17.231
Aeroporto Marco Polo dati al 31.12.2006	1.033	12.701		12.701	12.701	12.701
IUAV - dati al 31.12.2005	1.033	12.039	(1)	12.039	12.039	12.039
REGIONE VENETO - dati al 31.12.2006 (*)	10.329	142.026	(1)	142.026	99.627	66.149
L. 798/84, art. 5 lett. a) Acquedotti		22.675		22.675	22.675	19.835
L. 798/84, art. 5 lett. a) e L. 360/91, art. 2 lett. b) Disinquinamento		119.351		119.351	76.952	46.314
COMUNE DI VENEZIA - dati al 31.12.2006	16.224	195.994	(1)	195.994	193.758	144.633
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento immobili		91.622			89.748	78.517
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria		24.397			24.035	21.901
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati		35.895			35.895	13.808
L. 798/84, art. 6 lett. d) Insediamenti produttivi		16.308			16.308	9.884
L. 139/92, art. 5 Progetto integrato rii (**)		27.772			27.772	20.523
COMUNE DI CHIOGGIA - dati al 31.12.2006	1.852	24.830	(1)	24.830	22.988	19.830
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento Immobili						
L. 360/91, art. 2 lett. c) Infrastrutture						
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria						
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati						
TOTALE	51.646	**673.564**		673.564	**623.430**	**489.616**

NOTE

- IMPORTI ASSEGNATI: stima degli importi attivabili con i limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla legge con decorrenza dal 1998 e dal 1999.

- IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO: gli importi perfezionati con i relativi contratti di mutuo:
  (1) Importo dei contratti di mutuo stipulati a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1998 e dal 1999.

- IMPORTI IMPEGNATI:
  - per Stato in Amministrazione diretta, Regione Veneto, Comuni di Venezia e di Chioggia e per gli altri Enti Pubblici, sono gli importi destinati con delibera degli organi competenti.
  - per Stato in Concessione, sono gli importi destinati mediante convenzioni tra l'Amministrazione Concedente e il Concessionario Consorzio Venezia Nuova e già registrati da parte della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto.

- Finanziamenti per progetto integrato rii (Legge n. 139/92, art. 5):
  (*) L'art. 3 della Legge n. 139/92 prevede che una quota pari al 10% delle disponibilità derivanti dai limiti di impegno autorizzati per la Regione Veneto venga destinata alla realizzazione del progetto integrato per i rii di Venezia mediante accordi di programma con il Comune di Venezia. Pertanto, gli importi assegnati, impegnati e spesi riferiti alla Regione Veneto comprendono le somme destinate al Comune di Venezia per il progetto integrato rii.
  (**) Agli importi assegnati indicati vanno sommati gli importi provenienti dalla Regione Veneto per il progetto integrato rii.

Allegato n. 8

LEGGE N. 295/98

Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti

(importi in migliaia di euro)

Soggetti	LIMITI DI IMPEGNO EX LEGE 295/98		IMPORTI ASSEGNATI E DISPONIBILI			IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO		IMPORTI IMPEGNATI	IMPORTI SPESI
	anno 1999	anno 2000	anno 1999	anno 2000	totale				
Stato in concessione (Consorzio Venezia Nuova)	=	=	=	=	=		=	=	=
L. 798/84, art. 3 lett. a) Opere alle bocche L. 798/84, art. 3 lett. a), d) Rinforzo moli L. 798/84, art. 3 lett. a), c) Difesa abitati, insulae, margin. L. 798/84, art. 3 lett. a) Morfologia e arresto degrado L. 798/84, art. 3 lett. a) Servizio Informativo L. 798/84, art. 3 lett. d) Ausilii alla navigazione L. 798/84, art. 3 lett. d) Difesa litorali L. 798/84, art. 3 lett. l) Petroli e valli da pesca									
ALTRI ENTI :	4.391	4.648	57.071	61.231	118.304		118.304	102.625	75.689
Provincia di Venezia - dati al 31.12.2000	516	516	7.747	7.747	15.494	(1)	15.494	2.040	121
Università degli Studi - dati al 31.12.2006	776	1.033	10.044	14.133	24.177	(1)	24.177	24.177	8.400
Autorità Portuale di Venezia - dati al 31.12.2004	516	516	6.843	6.843	13.685	(1)	13.685	11.638	6.953
Aeroporto Marco Polo - dati al 31.12.2006	516	516	6.369	6.369	12.739	(1)	12.739	12.739	12.368
CO.RI.LA. - dati al 31.12.2005	258	258	3.262	3.333	6.595	(1)	6.595	6.595	6.595
Diocesi Patriarcato di Venezia al 31.12.2006	516	516	6.197	6.197	12.394	(1)	12.394	12.394	12.394
Biennale di Venezia - dati al 31.12.2002	516	516	6.714	6.714	13.428	(1)	13.428	13.428	13.428
Querini Stampalia - dati al 31.12.2006	258	258	3.615	3.615	7.230	(1)	7.230	7.230	6.251
IUAV - dati al 31.12.2005	516	516	6.281	6.281	12.562	(1)	12.562	12.384	9.179
REGIONE VENETO L. 798/84, art. 5 lett. a) e L. 360/91, art. 2 lett. b) Disinquinamento	=	=	=	=	=		=	=	=
COMUNE DI VENEZIA - dati al 31.12.2006	658	439	8.255	5.443	13.698	(1)	13.698	13.585	13.494
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento immobili L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati L. 798/84, art. 6 lett. d) Insediamenti produttivi L. 139/92, art. 5 Progetto integrato rii			8.255	5.443	13.698			13.585	13.494
COMUNE DI CHIOGGIA - dati al 31.12.2006	116	77	1.476	1.030	2.506	(1)	2.506	2.506	594
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento Immobili L. 360/91, art. 2 lett. c) Infrastrutture L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati									
TOTALE	5.166	5.165	66.802	67.704	**134.508**		134.508	**118.716**	**89.777**

NOTE

- IMPORTI ASSEGNATI: stima degli importi attivabili con i limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla legge con decorrenza dal 1999 e dal 2000.

- IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO: gli importi perfezionati con i relativi contratti di mutuo.
  (1) Importo dei contratti di mutuo stipulati a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1999 e dal 2000.

- IMPORTI IMPEGNATI:
  - per Stato in Amministrazione diretta, Regione Veneto, Comuni di Venezia e di Chioggia e per gli altri Enti Pubblici, sono gli importi destinati con delibera degli organi competenti.
  - per Stato in Concessione, sono gli importi destinati mediante convenzioni tra l'Amministrazione Concedente e il Concessionario Consorzio Venezia Nuova e già registrati da parte della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto.

Allegato n 9

LEGGE N. 448/98

Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti

(importi in migliaia di euro)

Soggetti	LIMITI DI IMPEGNO EX LEGE 448/98			IMPORTI ASSEGNATI E DISPONIBILI				IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO		IMPORTI IMPEGNATI	IMPORTI SPESI
	anno 1999	anno 2000	anno 2001	anno 1999	anno 2000	anno 2001	totale				
Stato in concessione (Consorzio Venezia Nuova) - dati al 31.12.2006	11.362	3.099	5.165	154.000	40.284	69.500	263.784	(2)	263.784	263.784	217.534
L. 798/84, art. 3 lett. a) Opere alle bocche							19.630		19.630	19.630	19.328
L. 798/84, art. 3 lett. a), d) Rinforzo moli											
L. 798/84, art. 3 lett. a), c) Difesa abitati, insulae, margin.							115.242		115.242	115.242	93.293
L. 798/84, art. 3 lett. a) Morfologia e arresto degrado							96.086		96.086	96.086	75.371
L. 798/84, art. 3 lett. a) Servizio Informativo							12.826		12.826	12.826	11.165
L. 798/84, art. 3 lett. d) Ausilii alla navigazione							303		303	303	0
L. 798/84, art. 3 lett. d) Difesa litorali							17.156		17.156	17.156	15.836
L. 798/84, art. 3 lett. l) Petroli e valli da pesca							2.541		2.541	2.541	2.541
ALTRI ENTI :	344	0	0	4.657	0	0	4.657		4.657	4.277	4.277
Provincia di Venezia											
Azienda speciale porto Chioggia dati al 31.12.2005 (°)	129			1.559			1.559	(1)	1.559	1.559	1.559
Aeroporto Marco Polo dati al 31.12.2006 (°°)											
Diocesi di Chioggia - dati al 31.12.2006 (°)	215			3.098			3.098	(1)	3.098	2.718	2.718
REGIONE VENETO - dati al 31.12.2006 (*)	11.362	3.099	5.165	136.345	37.185	61.975	235.505	(2)	235.505	167.969	109.564
L. 798/84, art. 5 lett. a) e L. 360/91, art. 2 lett. b) Disinquinamento							201.935		201.935	145.354	89.695
L. 798/84, art. 5 lett. a) Acquedotti							33.570		33.570	22.615	19.869
COMUNE DI VENEZIA - dati al 31.12.2006 (°°)	11.414	3.511	4.389	143.540	45.288	57.523	246.351	(2)	246.351	240.691	179.443
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento immobili							93.187			91.851	79.831
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria							49.234			46.870	39.087
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati							25.070			24.830	12.978
L. 798/84, art. 6 lett. d) Insediamenti produttivi							29.419			27.699	4.780
L. 139/92, art. 5 Progetto integrato ri (**)							49.441			49.441	42.767
COMUNE DI CHIOGGIA - dati al 31.12.2006 (°)	1.670	620	775	22.591	8.242	10.071	40.904	(2)	40.904	37.291	25.271
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento Immobili											
L. 360/91, art. 2 lett. c) Infrastrutture											
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria											
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati											
TOTALE	36.152	10.328	15.493	461.133	130.999	199.069	791.201		791.201	714.012	536.089

NOTE

- IMPORTI ASSEGNATI: stima degli importi attivabili con i limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla legge con decorrenza dal 1999, dal 2000 e dal 2001.

- IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO: gli importi perfezionati con i relativi contratti di mutuo :
  (1) Importo dei contratti di mutuo stipulati a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1999.
  (2) Importo dei contratti di mutuo stipulati a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1999, dal 2000 e dal 2001
  Per il Comune di Venezia non si è tenuto conto delle "riserve"

- IMPORTI IMPEGNATI.
  - per Stato in Amministrazione diretta, Regione Veneto, Comuni di Venezia e di Chioggia e per gli altri Enti Pubblici, sono gli importi destinati con delibera degli organi competenti.
  - per Stato in Concessione, sono gli importi destinati mediante convenzioni tra l'Amministrazione Concedente e il Concessionario Consorzio Venezia Nuova e già registrati da parte della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto.

- Finanziamenti per progetto integrato ri (Legge n. 139/92, art. 5):
  (*) L'art 3 della Legge n. 139/92 prevede che una quota pari al 10% delle disponibilità derivanti dai limiti di impegno autorizzati per la Regione Veneto venga destinata alla realizzazione del progetto integrato per i ri di Venezia mediante accordi di programma con il Comune di Venezia. Pertanto, gli importi disponibili, impegnati e spesi riferiti alla Regione Veneto comprendono le somme destinate al Comune di Venezia per il progetto integrato ri.
  (**) Agli importi assegnati indicati vanno sommati gli importi provenienti dalla Regione Veneto per il progetto integrato ri.

- Finanziamenti per Enti diversi:
  (°) I limiti di impegno all'Azienda Speciale Porto Chioggia e alla Diocesi di Chioggia, del valore indicato, sono stati concessi attraverso il Comune di Chioggia. Gli importi disponibili, impegnati e spesi riferiti al Comune di Chioggia non comprendono, pertanto, tali somme
  (°°) I limiti di impegno all'Aeroporto Marco Polo di Venezia, sono stati concessi attraverso il Comune di Venezia. Gli importi disponibili, impegnati e spesi riferiti al Comune di Venezia comprendono tali somme.

Allegato n. 10

LEGGE N. 488/99

Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti

(importi in migliaia di euro)

Soggetti	LIMITI DI IMPEGNO EX LEGE 488/99		IMPORTI ASSEGNATI E DISPONIBILI			IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO		IMPORTI IMPEGNATI	IMPORTI SPESI
	anno 2001	anno 2002	anno 2001	anno 2002	totale				
STATO:									
Stato in concessione (Consorzio Venezia Nuova) - dati al 31.12.2006 (°)	9.141	7.928	115.000	100.000	215.000	(2)	215.000	215.000	161.255
L. 798/84, art. 3 lett. a) Opere alle bocche					50.812		50.812	50.812	48.783
L. 798/84, art. 3 lett. a), d) Rinforzo moli					75		75	75	39
L. 798/84, art. 3 lett. a), c) Difesa abitati, insulae, margin					58.344		58.344	58.344	33.625
L. 798/84, art. 3 lett. a) Morfologia e arresto degrado					94.094		94.094	94.094	67.428
L. 798/84, art. 3 lett. a) Servizio Informativo					10.679		10.679	10.679	10.383
L. 798/84, art. 3 lett. d) Ausilii alla navigazione							0		
L. 798/84, art. 3 lett. d) Difesa litorali					997		997	997	997
L. 798/84, art. 3 lett. l) Petroli e valli da pesca									
ALTRI ENTI	1.346	2.143	23.941	27.747	51.688		51.688	51.639	39.799
Provincia di Venezia									
Diocesi Patriarcato di Venezia - dati al 31.12.2006	413	516	4.750	5.949	10.699	(2)	10.699	10.699	10.699
Biennale di Venezia dati al 31.12.2006	465	516	5.681	6.714	12.395	(2)	12.395	12.395	9.603
Procuratoria di S. Marco - dati al 31.12.2005	413	516	5.040	6.484	11.524	(2)	11.524	11.524	11.524
Fondazione Giorgio Cini (°) dati al 31.12.2006		594	7.747	8.600	16.347	(2)	16.347	16.347	7.299
Diocesi di Chioggia (°°) dati al 31.12.2006	55		723		723	(1)	723	674	674
REGIONE VENETO - dati al 31.12.2006 (*)	8.005	7.747	104.065	100.969	205.033	(2)	205.033	118.847	52.238
L. 798/84, art. 5 lett. a) e L. 360/91, art. 2 lett. b) Disinquinamento					194.704		194.704	108.518	49.139
L. 798/84, art. 5 lett. a) Acquedotti					10.329		10.329	10.329	3.099
COMUNE DI VENEZIA - dati al 31.12.2006	6.352	6.972	83.622	79.018	162.640	(2)	162.640	154.313	109.362
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento immobili					64.262			60.296	41.990
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria					30.473			27.237	18.912
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati					28.569			28.444	21.317
L. 798/84, art. 6 lett. d) Insediamenti produttivi					11.756			10.756	2.948
L. 139/92, art. 5 Progetto integrato ri (**)					27.580			27.580	24.195
COMUNE DI CHIOGGIA - dati al 31.12.2006 (°°)	978	1.033	9.968	13.428	23.396	(2)	23.396	19.170	10.107
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento Immobili									
L. 360/91, art. 2 lett. c) Infrastrutture									
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria									
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati									
TOTALE	25.823	25.823	336.596	321.162	657.757		657.757	558.969	372.761

NOTE

- IMPORTI ASSEGNATI: stima degli importi attivabili con i limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla legge con decorrenza dal 2001 e dal 2002.

- IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO: gli importi perfezionati con i relativi contratti di mutuo:
  (1) Importo dei contratti di mutuo stipulati a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 2001
  (2) Importo dei contratti di mutuo stipulati a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 2001 e dal 2002.
  Per il Comune di Venezia non si è tenuto conto delle "riserve".

- IMPORTI IMPEGNATI:
  - per Stato in Amministrazione diretta, Regione Veneto, Comuni di Venezia e di Chioggia e per gli altri Enti Pubblici, sono gli importi destinati con delibera degli organi competenti.
  - per Stato in Concessione, sono gli importi destinati mediante convenzioni tra l'Amministrazione Concedente e il Concessionario Consorzio Venezia Nuova e già registrati da parte della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto.

- Finanziamenti per progetto integrato ri (Legge n. 139/92, art. 5):
  (*) L'art. 3 della Legge n. 139/92 prevede che una quota pari al 10% delle disponibilità derivanti dai limiti di impegno autorizzati per la Regione Veneto venga destinata alla realizzazione del progetto integrato per i ri di Venezia mediante accordi di programma con il Comune di Venezia. Pertanto, gli importi disponibili, impegnati e spesi riferiti alla Regione Veneto comprendono le somme destinate al Comune di Venezia per il progetto integrato ri
  (**) Agli importi assegnati indicati vanno sommati gli importi provenienti dalla Regione Veneto per il progetto integrato ri.

- Finanziamenti per Enti diversi:
  (°) Attraverso il Consorzio Venezia Nuova, sulla base di quanto deliberato dal Comitato ex art. 4 Legge n. 798/84, a valere sul finanziamento attivato con limite di impegno decorrente dal 2001, è stata finanziata la Fondazione Giorgio Cini per il restauro del compendio immobiliare ubicato nell'isola di San Giorgio Maggiore nella laguna di Venezia. Inoltre, poiché il Comitato ex art. 4 Legge n. 798/84, nella seduta del 6.12.2001, ha deliberato di destinare direttamente alla Fondazione Cini una quota parte del limite di impegno destinato già al Consorzio Venezia Nuova, su indicazione del Presidente del Magistrato alle Acque in data 5 luglio 2002 è stata destinata alla Fondazione Giorgio Cini anche la quota di limite di impegno pari a euro 593.925,43. Di conseguenza la quota di limite di impegno con decorrenza 2002 destinata al Consorzio Venezia Nuova è variata da euro 8.521.538,83 a euro 7.927.613,40
  (°°) Attraverso il Comune di Chioggia, sono stati finanziati l'AULSS 14, l'Istituto Cavanis, l'Istituto Salesiano S. Giusto, la Diocesi di Chioggia e il circolo Nautico per interventi volti alla rivitalizzazione socio - economica e culturale della città di Chioggia. Solo la Diocesi di Chioggia ha fornito i dati sullo stato di attuazione, non compresi pertanto, tra quelli del Comune di Chioggia

Allegato n 11

LEGGE N. 388/00

Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti

(importi in migliaia di euro)

Soggetti	LIMITI DI IMPEGNO EX LEGE 388/00		IMPORTI ASSEGNATI E DISPONIBILI			IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO		IMPORTI IMPEGNATI	IMPORTI SPESI
	anno 2002	anno 2003	anno 2002	anno 2003	totale				
STATO:									
Stato in concessione (Consorzio Venezia Nuova) - dati al 31.12.2006	5.061	7.913	62.500	99.500	162.000	(2)	162.000	162.000	139.117
L. 798/84, art. 3 lett. a) Opere alle bocche					90.420		90.420	90.420	88.753
L. 798/84, art. 3 lett. a), d) Rinforzo mobi									
L. 798/84, art. 3 lett. a), c) Difesa abitati, insulae, margin.					2.591		2.591	2.591	2.528
L. 798/84, art. 3 lett. a) Morfologia e arresto degrado					55.137		55.137	55.137	35.705
L. 798/84, art. 3 lett. a) Servizio Informativo					9.127		9.127	9.127	8.028
L. 798/84, art. 3 lett. d) Ausili alla navigazione									
L. 798/84, art. 3 lett. d) Difesa litorali					4.724		4.724	4.724	4.103
L. 798/84, art. 3 lett. l) Petroli e valli da pesca									
ALTRI ENTI:	1.790	4.337	21.870	52.331	74.201		69.530	69.446	24.130
Provincia di Venezia	181	207	2.169	2.479	4.648				
Diocesi Patriarcato di Venezia dati al 31.12.2006 (°°°)		2.374		28.488	28.488	(3)	28.488	28.488	12.144
Procuratoria di S. Marco - dati al 31.12.2005		103		1.239	1.239	(3)	1.239	1.239	1.239
Università degli studi Ca' Foscari - dati al 31.12.2006		310		3.918	3.918	(3)	3.918	3.918	0
Autorità Portuale - dati al 31.12.2004		362		4.300	4.300	(3)	4.300	4.216	1.765
Aeroporto Marco Polo - dati al 31.12.2006	258	207	3.099	2.479	5.578	(2)	5.578	5.578	0
Azienda Speciale Porto Chioggia dati al 31.12.2005	465	207	5.578	2.479	8.057	(2)	8.035	8.035	162
Fondazione Giorgio Cini - dati al 31.12.2006	516	207	6.524	2.610	9.134	(2)	9.134	9.134	2.035
Consorzio Universitario (CO RI LA) - dati al 31.12.2006		362		4.338	4.338	(3)	4.338	4.338	2.285
Diocesi di Chioggia (°°) - dati al 31.12.2006	370		4.500		4.500	(1)	4.500	4.500	4.500
REGIONE VENETO - dati al 31.12.2006 (*) (°°°)	3.693	5.189	40.619	57.082	97.702	(2)	97.702	36.271	7.883
L. 798/84, art. 5 lett. a) e L. 360/91, art. 2 lett. b) Disinquinamento					89.867			34.017	5.839
L. 798/84, art. 5 lett. a) - Acquedotti					6.813			2.044	2.044
L. 798/84, art. 5 lett. b) Ospedali					1.022			210	
COMUNE DI VENEZIA - dati aggiornati al 31.12.2006 (*)	3.925	6.972	43.920	90.000	133.920	(2)	133.920	126.342	93.346
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento immobili					71.838			67.070	47.770
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria					19.283			16.474	13.167
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati					4.669			4.669	3.905
L. 798/84, art. 6 lett. d) Insediamenti produttivi					12.522			12.521	6.062
L. 139/92, art. 5 Progetto integrato ri (**)					25.608			25.608	22.442
COMUNE DI CHIOGGIA - dati al 31.12.2006 (°°)	301	1.102	3.612	13.219	16.831	(2)	16.831	16.782	12.179
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento Immobili L. 360/91, art. 2 lett. c) Infrastrutture L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati		1.102		13.219	13.219		13.219	13.170	8.567
Enti vari finanziati attraverso il Comune di Chioggia (°°)	301		3.612		3.612		3.612	3.612	3.612
COMUNE DI CAVALLINO - TREPORTI - dati al 31.12.2004	207	310	2.494	3.736	6.230	(2)	6.230	6.230	56
TOTALE	14.977	25.823	175.015	315.868	490.884		486.213	417.071	276.711

NOTE

- IMPORTI ASSEGNATI: stima degli importi attivabili con i limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla legge con decorrenza dal 2002 e dal 2003

- IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO: gli importi perfezionati con i relativi contratti di mutuo.
  (1) Importo dei contratti di mutuo stipulati a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 2002.
  (2) Importo dei contratti di mutuo stipulati a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 2002 e dal 2003.
  (3) Importo dei contratti di mutuo stipulati a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 2003.
  Per il Comune di Venezia non si è tenuto conto delle "riserve".

- IMPORTI IMPEGNATI:
  - per Stato in Amministrazione diretta, Regione Veneto, Comuni di Venezia e di Chioggia e per gli altri Enti Pubblici, sono gli importi destinati con delibera degli organi competenti.
  - per Stato in Concessione, sono gli importi destinati mediante convenzioni tra l'Amministrazione Concedente e il Concessionario Consorzio Venezia Nuova e già registrati da parte della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto.

- Finanziamenti per progetto integrato ri (Legge n. 139/92, art. 5):
  (*) L'art. 3 della Legge n. 139/92 prevede che una quota pari al 10% delle disponibilità derivanti dai limiti di impegno autorizzati per la Regione Veneto venga destinata alla realizzazione del progetto integrato per i ri di Venezia mediante accordi di programma con il Comune di Venezia. Pertanto, gli importi disponibili, impegnati e spesi riferiti alla Regione Veneto comprendono le somme destinate al Comune di Venezia per il progetto integrato ri.
  (**) Agli importi assegnati indicati vanno sommati gli importi provenienti dalla Regione Veneto per il progetto integrato rii.

- Finanziamenti per Enti diversi
  (°) Attraverso il Comune di Venezia, sono stati finanziati La Biennale di Venezia e l'Azienda Consorzio Trasporti Veneziano
  (°°) Attraverso il Comune di Chioggia, sono stati finanziati l'AULSS 14, l'Istituto Cavanis, Azienda Servizi Pubblici, l'Istituto per Anziani di Chioggia e la Diocesi di Chioggia, per interventi volti alla rivitalizzazione socio - economica e culturale della città di Chioggia. Solo la Diocesi ha fornito i dati sullo stato di attuazione, non compresi, pertanto, in quelli del Comune di Chioggia
  (°°°) A seguito della delibera del Comitato ex art 4 Legge n. 798/84 del 4 febbraio 2003 la Regione Veneto rinuncia ad una quota pari al 7,5% dei limiti di impegno con decorrenza 2003 ad essa assegnati, a favore della Diocesi Patriarcato di Venezia per le necessità derivanti dal restauro e mantenimento di immobili religiosi (Palazzo Patriarcale di Venezia) di competenza della Diocesi

Allegato n 12

LEGGE N. 448/01

Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti

(importi in migliaia di euro)

Soggetti	LIMITI DI IMPEGNO EX LEGE 448/01			IMPORTI ASSEGNATI E DISPONIBILI				IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO		IMPORTI IMPEGNATI	IMPORTI SPESI
	anno 2002	anno 2003	anno 2004	anno 2002	anno 2003	anno 2004	totale				
STATO											
Stato in amministrazione diretta - dati al 31 12 2006				8 459	8.459	10 587	27 505	(3)		17 813	8.196
L. 798/84, art. 3 lett. a) Riequilibrio Idrogeologico L. 798/84, art. 3 lett. b) Serv. Antinquinamento L. 798/84, art. 3 lett. c) Marginamenti lagunari L. 798/84, art. 3 lett. e) Restauro edifici demaniali L. 798/84, art. 3 lett. f) Recupero Arsenale L. 798/84, art. 3 lett. g) Ponti, canali, fondamenta L. 798/84, art. 3 lett. h) Sistemaz. corsi d'acqua L. 798/84, art. 3 lett. i) Patrimonio mobiliare pubblico L. 798/84, art. 3 lett. m) Università Architettura				8.459	8459	10587	27 505			17.813	8 196
Stato in concessione (Consorzio Venezia Nuova) - dati al 31 12 2006	3 254	5 268	10 329	43 000	68 500	123 000	234 500	(1)	234 500	234 500	120 297
L. 798/84, art. 3 lett. a) Opere alle bocche							14 465		14.465	14 465	12 739
L. 798/84, art. 3 lett. a), d) Rinforzo moli											
L. 798/84, art. 3 lett. a), c) Difesa abitati, insulae, margin							119 708		119 708	119 708	44 455
L. 798/84, art. 3 lett. a) Morfologia e arresto degrado							69 327		69 327	69.327	34 751
L. 798/84, art. 3 lett. a) Servizio Informativo							9 451		9 451	9.451	9 197
L. 798/84, art. 3 lett. d) Ausilii alla navigazione											
L. 798/84, art. 3 lett. d) Difesa litorali							21 549		21 549	21 549	19 156
L. 798/84, art. 3 lett. l) Petroli e valli da pesca											
ALTRI ENTI	655	278	982	8 149	3 418	12 305	23 872		19 768	18 413	6 140
Provincia di Venezia	113			1 356			1 356				
Università degli studi Ca' Foscari - dati al 31 12 2006	155		129	2 014		1.588	3 602	(2)	3.602	3.602	829
IUAV dati al 31 12.2005		149	103		1 788	1.236	3 024	(2)	3.024	3.024	3 024
Autorità Portuale di Venezia - dati al 31 12 2004	129		129	1 520		1 520	3.040	(2)	3.040	1 685	599
Aeroporto Marco Polo dati al 31.12 2006			129			1 548	1 548				
Azienda Speciale Porto Chioggia dati al 31 12 2005			134			1 650	1 650	(2)	1 650	1 650	
Fondazione Giorgio Cini dati al 31 12 2006	258	129	129	3 259	1 630	2 000	6 889	(1)	6 889	6 889	125
Consorzio Universitario (CO RI LA.) dati al 31 12 2006			129			1 563	1 563	(2)	1 563	1 563	1 563
Diocesi di Chioggia dati al 31 12 2006 (**)			100			1 200	1 200				
REGIONE VENETO dati al 31.12 2006 (*)	3 254	4 932	9 007	35 794	54 252	99 077	189 123	(1)	189.123	70.210	15 259
L. 798/84, art. 5 lett. a) e L. 360/91, art. 2 lett. b) Disinquinamento							173 958			65 848	11 303
L. 798/84, art. 5 lett. a) - Acquedotti							13 187			3 956	3 956
L. 798/84, art. 5 lett. b) Ospedali							1 978			406,6	
COMUNE DI VENEZIA dati al 31 12 2006 (*)	2 505	4 170	8 780	27 372	45 448	94 824	167 645	(1)	167 645	158 142	91 400
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento immobili							45 879			42 780	27 672
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria							44 183			38 748	24 498
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati							27 297			26 796	13 340
L. 798/84, art. 6 lett. d) Insediamenti produttivi							4 252			3 784	1 208
L. 139/92, art. 5 Progetto integrato ri (**)							46 034			46 034	24 682
COMUNE DI CHIOGGIA - dati al 31.12 2006 (**)	387	658	1 450	4 644	7.896	17.400	29 940	(1)	28 140	27 938	11 808
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento Immobili L. 360/91, art. 2 lett. c) Infrastrutture L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati	387	658	1 300	4 644	7.896	15 600	28 140		28 140	27.938	11 808
Enti vari finanziati attraverso il Comune di Chioggia (**)			150			1 800	1 800				
COMUNE DI CAVALLINO - TREPORTI dati al 31 12 2004	110	186	439	1 350	2 220	5 268	8 838	(1)	8 838	8 838	18
TOTALE	10.165	15 492	30.987	128 768	190 193	362 461	681.422		648 014	535.854	253.118

NOTE

- IMPORTI ASSEGNATI stima degli importi attivabili con i limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla legge con decorrenza dal 2002, dal 2003 e dal 2004.
- Finanziamenti per lo Stato in amministrazione diretta

  l'importo indicato è stato finanziato in conto capitale per "spese in gestione al Magistrato alle Acque di Venezia per il servizio di polizia lagunare e la manutenzione straordinaria dei beni demaniali in fregio alla laguna" sul cap 8620 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e assegnato in conto competenza per € 10 587 366,00 nel 2002 e € 10 587.366,00 nel 2003

- IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO gli importi perfezionati con i relativi contratti di mutuo
  (1) Importo dei contratti di mutuo stipulati a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 2002, dal 2003 e dal 2004
  (2) Importo dei contratti di mutuo stipulati a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 2002 e/o dal 2003 e/o dal 2004.
  (3) Fondi in conto capitale
  Per il Comune di Venezia non si è tenuto conto delle "riserve".

- IMPORTI IMPEGNATI
  - per Stato in Amministrazione diretta, Regione Veneto, Comuni di Venezia e di Chioggia e per gli altri Enti Pubblici, sono gli importi destinati con delibera degli organi competenti.
  - per Stato in Concessione, sono gli importi destinati mediante convenzioni tra l'Amministrazione Concedente e il Concessionario Consorzio Venezia Nuova e già registrati da parte della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto

- Finanziamenti per progetto integrato ri (Legge n 139/92, art. 5)
  (*) L'art. 3 della Legge n 139/92 prevede che una quota pari al 10% delle disponibilità derivanti dai limiti di impegno autorizzati per la Regione Veneto venga destinata alla realizzazione del progetto integrato per i ri di Venezia mediante accordi di programma con il Comune di Venezia Pertanto, gli importi disponibili, impegnati e spesi riferiti alla Regione Veneto comprendono le somme destinate al Comune di Venezia per il progetto integrato ri
  (**) Agli importi assegnati indicati vanno sommati gli importi provenienti dalla Regione Veneto per il progetto integrato ri

- Finanziamenti per Enti diversi
  (*) Attraverso il Comune di Venezia, sono stati finanziati La Biennale di Venezia, Azienda Consorzio Trasporti Veneziano, Fondazione Querini Stampalia e Fondazione Ugo ed Olga Levi, per interventi volti alla rivitalizzazione socio - economica e culturale della città di Venezia
  (**) A seguito della delibera del Comitato ex art 4 Legge n 798/84 del 4 febbraio 2003 il Comune di Chioggia rinuncia ad una quota complessiva di limiti di impegno con decorrenza 2004, pari a 250 000 euro che viene assegnata per 150.000 euro all'AULSS 14 di Chioggia per la prosecuzione delle opere a favore dell' Ospedale Civile di Chioggia e per 100 000 euro alla Diocesi di Chioggia per la prosecuzione delle opere di risanamento delle chiese dei Centri Storici di Chioggia e Sottomarina

Allegato n. 13

LEGGE N. 166/02 (Collegato Infrastrutture) e LEGGE N. 448/01

Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti

(importi in migliaia di euro)

Soggetti	LIMITI DI IMPEGNO EX LEGE 166/02	IMPORTI ASSEGNATI E DISPONIBILI	IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO	IMPORTI IMPEGNATI	IMPORTI SPESI
	anno 2003	anno 2003			
STATO:					
Stato in concessione (Consorzio Venezia Nuova) - dati al 31.12.2006	36.333	450.000	450.000	450.000	376.000
L. 798/84, art. 3 lett. a) Opere alle bocche (*)		450.000	450.000	450.000	376.000
L. 798/84, art. 3 lett. a), d) Rinforzo moli					
L. 798/84, art. 3 lett. a), c) Difesa abitati, insulae, margin					
L. 798/84, art. 3 lett. a) Morfologia e arresto degrado					
L. 798/84, art. 3 lett. a) Servizio Informativo					
L. 798/84, art. 3 lett. d) Ausilii alla navigazione					
L. 798/84, art. 3 lett. d) Difesa litorali					
L. 798/84, art. 3 lett. l) Petroli e valli da pesca					
COMUNE DI VENEZIA dati al 31.12.2006 (°)	3.652	30.152	30.152	20.121	11.505
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento immobili		14.287	14.287	8.313	2.984
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria		6.674	6.674	4.951	3.900
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati		5.576	5.576	5.456	3.947
L. 798/84, art. 6 lett. d) Insediamenti produttivi		3.465	3.465	1.251	670
L. 139/92, art. 5 Progetto integrato ri		150	150	150	4
COMUNE DI CHIOGGIA dati al 31.12.2006 (°)	685	8.224	8.224	8.224	1.205
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento Immobili					
L. 360/91, art. 2 lett. c) Infrastrutture					
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria					
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati					
COMUNE DI CAVALLINO - TREPORTI - dati al 31.12.2004 (°)	228	1.856	1.856	1.856	211
ALTRI ENTI		10.168	10.168	10.168	10.168
Commissario delegato al traffico acqueo - dati al 31.12.2006 (°)		10.168	10.168	10.168	10.168
TOTALE	40.898	500.400	500.400	490.369	399.089

NOTE

- IMPORTI ASSEGNATI: stima degli importi attivabili con i limiti di impegno quindicennali assegnati dal CIPE con decorrenza dal 2003
- IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO: gli importi perfezionati con i relativi contratti di mutuo
- IMPORTI IMPEGNATI:
  - per le Amministrazioni comunali di Venezia, Chioggia e Cavallino - Treporti, sono gli importi destinati con delibera degli organi competenti;
  - per Stato in Concessione, sono gli importi destinati mediante convenzioni tra l'Amministrazione Concedente e il Concessionario Consorzio Venezia Nuova e già registrati da parte della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto.

- Si ricorda che il primo elenco delle opere strategiche di cui alla delibera del CIPE del 21.12.2001, in attuazione della Legge Obiettivo (L. n. 443/01), ricomprende il "Sistema MOSE", per il quale è intervenuta una assegnazione di limiti di impegno con decorrenza dal 2002, dal 2003 e dal 2004 per l'attivazione di una prima tranche di finanziamenti da parte del CIPE con deliberazione n. 109 del 29.11.2002, a valere sul "fondo" per le opere strategiche di cui all'art. 13 della Legge n. 166/02. Per i suddetti limiti di impegno è intervenuta la ripartizione da parte del Comitato ex art. 4 Legge 798/84 nella seduta del 4 febbraio 2003, che ne ha destinato una quota parte alle Amministrazioni Comunali di Venezia, Chioggia e Cavallino - Treporti in base alle previsioni di cui all'art. 80, comma 28, della Legge n. 289/2002. Con deliberazioni del CIPE n. 63 del 25 luglio 2003 e n. 72 del 29 settembre 2003, a modifica e integrazione della precedente delibera n. 109 del 29.11.2002, è stato assegnato un unico limite di impegno di importo pari a 40,898 M€ decorrente dal 2002 differito al 2003, ripartito secondo le indicazioni del Comitato.

- (*) Gli importi indicati comprendono le attività strettamente connesse alla realizzazione delle opere alle bocche di porto (morfologia e servizio informativo).

- (°) Con il limite di impegno assegnato dal CIPE (4,566 M€), il Comune di Venezia, quale soggetto aggiudicatore ai sensi del decreto interministeriale n. 5279 del 20.03.2003, ha attivato finanziamenti in nome e per conto anche del Comune di Chioggia e di Cavallino - Treporti provvedendo a trasferire le somme di loro spettanza (10,080 M€)
  Per quanto attiene la quota degli importi assegnati al Comune di Venezia per il finanziamento delle attività del Commissario delegato al traffico acqueo nella laguna di Venezia, importo pari a 10,168 M€, la devoluzione è avvenuta con apposito provvedimento.

Allegato n. 14

LEGGE N. 350/03 per il rifinanziamento fondo opere strategiche e LEGGE N. 166/02

Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti

(importi in migliaia di euro)

Soggetti	CONTRIBUTO EX LEGE 350/03	IMPORTI ASSEGNATI	IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO	IMPORTI IMPEGNATI	IMPORTI SPESI
	anno 2005	anno 2005			
STATO:					
Stato in concessione (Consorzio Venezia Nuova) - dati al 31.12.2006	58.399	638.100	638.100	638.100	530.212
L. 798/84, art. 3 lett. a) Opere alle bocche (*) l. 798/84, art. 3 lett. a), d) Rinforzo moli L. 798/84, art. 3 lett. a), c) Difesa abitati, insulae, margin L. 798/84, art. 3 lett. a) Morfologia e arresto degrado L. 798/84, art. 3 lett. a) Servizio Informativo L. 798/84, art. 3 lett. d) Ausilii alla navigazione l. 798/84, art. 3 lett. d) Difesa litorali L. 798/84, art. 3 lett. l) Petroli e valli da pesca		638.100	638.100	638.100	530.212
COMUNE DI VENEZIA dati al 31.12.2006 (°)	5.240	51.526	51.526	44.275	8.805
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento immobili			19.671	14.914	3.543
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria			8.768	6.327	1.665
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati			4.909	4.909	200
L. 798/84, art. 6 lett. d) Insediamenti produttivi			2.810	2.757	594
l. 139/92, art. 5 Progetto integrato ri			15.368	15.368	2.803
COMUNE DI CHIOGGIA dati al 31.12.2006 (°°)	973	10.635	10.635	9.138	1.673
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento Immobili L. 360/91, art. 2 lett. c) Infrastrutture L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati					
COMUNE DI CAVALLINO - TREPORTI - dati al 31.12.2004 (°)	276	3.013			
TOTALE	64.888	703.274	700.261	691.513	540.690

NOTE

- IMPORTI ASSEGNATI stima degli importi attivabili con il contributo pluriennale per 15 anni assegnato dal CIPE con decorrenza dal 2005
- IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO. gli importi perfezionati con i relativi contratti di mutuo
- IMPORTI IMPEGNATI.
- per le Amministrazioni comunali di Venezia, Chioggia e Cavallino - Treporti, sono gli importi destinati con delibera degli organi competenti;
- per Stato in Concessione, sono gli importi destinati mediante convenzioni tra l'Amministrazione Concedente e il Concessionario Consorzio Venezia Nuova e già registrati da parte della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto.

- La Legge n. 350/03 rifinanzia il "fondo" per le opere strategiche (art. 13 Legge n. 166/02) di cui al primo programma deliberato dal CIPE (21.12.2001) in attuazione della Legge Obiettivo (Legge n. 443/01). Si ricorda che tale primo programma ricomprende il "Sistema MOSE" per il quale è intervenuta l'assegnazione di un contributo quindicennale con decorrenza dal 2005 per l'attivazione di una seconda tranche di finanziamento da parte del CIPE con deliberazione n. 40 del 29.09.2004, a valere sul suddetto "fondo". Per i summenzionati contributi è intervenuta la ripartizione da parte del Comitato ex art. 4 Legge 798/84 nella seduta del 4 novembre 2004, che ne ha destinato una quota parte alle Amministrazioni Comunali di Venezia, Chioggia e Cavallino - Treporti in base alle disposizioni di cui all'art. 80, comma 28, della Legge n. 289/02 prorogata dall'art. 23 quater della Legge n. 47/04, e una quota parte al Consorzio Venezia Nuova. Con deliberazione n. 75 del 20 dicembre 2004, il CIPE ha recepito tale ripartizione
La legge n. 350/03 finanzia anche, in conto capitale, 19 milioni di euro per il Magistrato alle Acque di Venezia. Essendo stato reso effettivamente disponibile solo alla fine del 2004, l'importo non viene considerato in quanto l'impegno e la spesa saranno possibili solo a partire dal 2005

- (*) Gli importi indicati comprendono le attività strettamente connesse alla realizzazione delle opere alle bocche di porto (morfologia e servizio informativo). Gli importi spesi tengono conto anche delle somme sostenute per attività non ancora contabilizzabili nonché per acquisti e investimenti vari, nell'ambito del contratto "a prezzo chiuso".
- (°) Al Comune di Cavallino - Treporti, in base alla delibera CIPE n. 75 del 20.12.2004, che recepisce la ripartizione proposta dal Comitato ex art. 4 Legge 798/84, viene attribuito il 5% dell'importo assegnato al Comune di Venezia
- (°°) A seguito della delibera del Comitato ex art. 4 Legge n. 798/84 del 4.11.2004 dalla quota spettante al Comune di Chioggia verranno scorporati 3,7 milioni di euro per finanziare attività dell'AULSS 14, della Diocesi di Chioggia, della Provincia di Venezia, della Congregazione Serve di Maria Addolorata e dell'Istituto Cavanis di Chioggia

Allegato n. 15

LEGGE N. 350/03

Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti

(importi in migliaia di euro)

Soggetti	IMPORTI FINANZIATI	IMPORTI ASSEGNATI E DISPONIBILI	IMPORTI IMPEGNATI	IMPORTI SPESI
STATO				
Stato in amministrazione diretta - dati al 31.12.2006	19.000	19.000	13.397	1.033
L. 798/84, art. 3 lett. a) Riequilibrio Idrogeologico	19.000	19.000	13.397	1.033
L. 798/84, art. 3 lett. b) Serv. Antinquinamento				
L. 798/84, art. 3 lett. c) Marginamenti lagunari				
L. 798/84, art. 3 lett. c) Restauro edifici demaniali				
L. 798/84, art. 3 lett. f) Recupero Arsenale				
L. 798/84, art. 3 lett. g) Ponti, canali, fondamenta				
L. 798/84, art. 3 lett. h) Sistemaz. corsi d'acqua				
L. 798/84, art. 3 lett. i) Patrimonio mobiliare pubblico				
L. 798/84, art. 3 lett. m) Università Architettura				
TOTALE	**19.000**	**19.000**	**13.397**	**1.033**

Allegato n. 16

LEGGE N. 266/05 per il rifinanziamento fondo opere strategiche e LEGGE N. 166/02

Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti

(importi in migliaia di euro)

Soggetti	CONTRIBUTO EX LEGE 266/05	IMPORTI ASSEGNATI	IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO	IMPORTI IMPEGNATI	IMPORTI SPESI
	anno 2007	anno 2007			
STATO					
Stato in concessione (Consorzio Venezia Nuova) - dati al 31.12.2006	33.972	380.000			108.000
L. 798/84, art. 3 lett. a) Opere alle bocche (*) L. 798/84, art. 3 lett. a), d) Rinforzo moli L. 798/84, art. 3 lett. a), c) Difesa abitati, insulae, margin. L. 798/84, art. 3 lett. a) Morfologia e arresto degrado L. 798/84, art. 3 lett. a) Servizio Informativo L. 798/84, art. 3 lett. d) Ausili alla navigazione L. 798/84, art. 3 lett. d) Difesa litorali L. 798/84, art. 3 lett. l) Petroli e valli da pesca		380.000			108.000
TOTALE	33.972	380.000	0	0	108.000

NOTE

- IMPORTI ASSEGNATI: stima degli importi attivabili con il contributo pluriennale per 15 anni assegnato dal CIPE con decorrenza dal 2007
- IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO: gli importi perfezionati con i relativi contratti di mutuo
- IMPORTI IMPEGNATI:
- per Stato in Concessione, sono gli importi destinati mediante convenzioni tra l'Amministrazione Concedente e il Concessionario Consorzio Venezia Nuova e già registrati da parte della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto.

- La Legge n. 266 del 23.12.2005 - Finanziaria per il 2006, assicura il rifinanziamento dell'art. 13 della legge 166/02, autorizzando per interventi infrastrutturali, tra i quali anche le opere strategiche, un "contributo annuale" di 200 Meuro per 15 anni con decorrenza dall'anno 2007. Il provvedimento non assegna, invece, nuovi finanziamenti alla Legislazione Speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna. A valere su tale rifinanziamento stanziato da detta legge, il CIPE, con deliberazione n. 74 del 29.03.2006, ha assegnato al Consorzio Venezia Nuova un "contributo" quindicennale, decorrente dal 2007, in base al quale potrà essere attivato un finanziamento pari ad almeno 380 Meuro

- (*) Gli importi indicati comprendono le attività strettamente connesse alla realizzazione delle opere alle bocche di porto (morfologia e servizio informativo). Gli importi spesi tengono conto anche delle somme sostenute per attività non ancora contabilizzabili nonché per acquisti e investimenti non effettuati dal concessionario nelle more della effettiva disponibilità dei finanziamenti, nell'ambito del contratto "a prezzo chiuso".

RELAZIONE AL PARLAMENTO SUGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA

Aggiornamento al 31 dicembre 2006

TABELLA DI SINTESI DEI FINANZIAMENTI ASSEGNATI, IMPEGNATI E SPESI

CON LE LEGGI 798/84 E SUCCESSIVI RIFINANZIAMENTI, 139/92, 539/95, 515/96, 345/97, 295/98, 448/98, 488/99, 388/00, 448/01, 166/02, 350/03 E 296/06

Importi lordi in migliaia di euro

	IMPORTI ASSEGNATI (A)	Importi assegnati rispetto al totale generale (%)	IMPORTI IMPEGNATI (B)	Importi impegnati rispetto importi disponibili (%) (B/A)	IMPORTI SPESI (C)	Importi spesi rispetto importi disponibili (%) (C/A)
STATO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	216.913		201.075		179.094	
STATO IN CONCESSIONE (CONSORZIO VENEZIA NUOVA)	4.154.548		3.774.548		3.382.211	
REGIONE VENETO (*)	1.762.495		1.262.954		865.433	
COMUNE DI VENEZIA (*)	1.926.861		1.866.902		1.464.796	
COMUNE DI CHIOGGIA	286.481		266.461		186.808	
COMUNE DI CAVALLINO - TREPORTI (**)	19.937		16.924		285	
ALTRI ENTI	635.664		584.049		464.018	
TOTALE GENERALE	**9.002.899**	**100%**	**7.972.913**	**89%**	**6.542.645**	**73%**

(*) L'art. 3 della Legge 139/92 prevede che una quota pari al 10% delle disponibilità derivanti dai limiti di impegno autorizzati per la Regione Veneto venga assegnata al Comune di Venezia per la realizzazione del progetto integrato per i rii. I valori indicati per il Comune di Venezia sono al netto di tale quota.

(**) Non forniti i dati al 31.12.2006

Venezia, 3 settembre 2007

Allegato n. 17

CONFRONTO DELLO STATO DI ATTUAZIONE

Importi lordi in migliaia di euro

	IMPORTI TOTALI ASSEGNATI	SOMME SPESE				
		Stato attuazione al 31.12.2005		Stato attuazione al 31.12.2006		Variazione in percentuale
	(A)	Importi spesi (B)	% (B/A)	Importi spesi (C)	% (C/A)	(D)
STATO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	216.913	176.094		179.094		
STATO IN CONCESSIONE (CONSORZIO VENEZIA NUOVA)	4.154.548	2.461.356		3.382.211		
REGIONE VENETO	1.762.495	787.513		865.433		
COMUNE DI VENEZIA	1.926.861	1.378.205		1.464.796		
COMUNE DI CHIOGGIA	286.481	144.853		186.808		
COMUNE DI CAVALLINO - TREPORTI (*)	19.937	285		285		
ALTRI ENTI	635.664	433.720		464.018		
TOTALE	**9.002.899**	**5.382.025**	**60%**	**6.542.645**	**73%**	**+13%**

(*) Non forniti i dati al 31.12.2006

Venezia, 3 settembre 2007

ELENCO DOCUMENTI

Documento A — *Ministero delle Infrastrutture - Magistrato alle Acque*
Le attività del Magistrato alle Acque in amministrazione diretta – Aggiornamento al 31 dicembre 2006

Documento B — *Consorzio Venezia Nuova*
Stato di attuazione degli interventi di competenza dello Stato in concessione al Consorzio Venezia Nuova – Aggiornamento al 31 dicembre 2006

Documento C — *Regione del Veneto*
Stato di attuazione degli interventi finanziati con fondi della legge speciale per Venezia – Aggiornato al 31 dicembre 2006

Documento D — *Comune di Venezia*
Stato di attuazione delle attività finanziate con fondi di legislazione speciale per Venezia – Aggiornamento al 31 dicembre 2005

Documento E — *Comune di Chioggia*
Stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia – Aggiornamento al 31 dicembre 2006

Documento F — *Università Ca' Foscari di Venezia*
Stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia – Aggiornamento al 31 dicembre 2006

Documento G — *Consorzio per la gestione del Centro di Coordinamento delle attività di ricerca inerenti il sistema lagunare di Venezia – CO.RI.LA*
Stato di attuazione delle attività finanziate dalla legge speciale per Venezia – Aggiornamento al 31 dicembre 2006

Documento H — *SAVE Aeroporto di Venezia Marco Polo*
Attività svolte a fronte dei finanziamenti ottenuti con la legislazione speciale – Aggiornamento al 31 dicembre 2006

Documento I — *La Biennale di Venezia*
Stato di attuazione delle attività svolte a fronte dei finanziamenti ottenuti sulla legge per la salvaguardia di Venezia – Aggiornamento al 31 dicembre 2006

Documento L — *Fondazione Scientifica Querini Stampalia*
Stato di attuazione interventi finanziati dalla legislazione speciale – Aggiornamento al 31 dicembre 2006

Documento M *Fondazione Giorgio Cini*
Stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia – Dati consuntivi delle attività svolte – Aggiornamento al 31 dicembre 2006

Documento N *Curia Patriarcale di Venezia*
Stato di attuazione interventi finanziati dalla legislazione speciale – Aggiornamento al 31 dicembre 2006

Documento O *Diocesi di Chioggia*
Stato di attuazione interventi finanziati dalla legislazione speciale – Aggiornamento al 31 dicembre 2006

PAGINA BIANCA

Documento A ***Ministero delle Infrastrutture – Magistrato alle Acque***

Le attività del Magistrato alle Acque in amministrazione diretta – Aggiornamento al 31 dicembre 2006

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

MAGISTRATO ALLE ACQUE

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLO STATO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

Aggiornamento al 31 dicembre 2006

Importi lordi in migliaia di euro

COMPETENZA	OBIETTIVI		LEGGE N. 798/84 E SUCCESSIVI RIFINANZIAMENTI (910/86 - 67/88 - 360/91 - 415/92 - 724/94)					
			IMPORTI FINANZIATI (A)	IMPORTI ASSEGNATI (B)	IMPORTI IMPEGNATI (C)	% (C/B)	IMPORTI EROGATI (D)	% (D/B)
Isp. Gen. lagune Venezia, Marano e Grado	L. 798/84, art. 3 lett. a)	Riequilibrio idrogeologico	362	362	362	100%	362	100%
Isp. Gen. lagune Venezia, Marano e Grado	L. 798/84, art. 3 lett. b)	Servizio vigilanza e Anti-inquinamento (*)	11.199	7.775	7.232	93%	7.232	93%
Isp. Gen. lagune Venezia, Marano e Grado	L. 798/84, art. 3 lett. c)	Marginamenti lagunari	3.445	1.984	1.984	100%	1.984	100%
Provv. Reg. alle OO.PP.	L. 798/84, art. 3 lett. e)	Restauro di edifici demaniali	77.975	77.975	77.975	100%	77.975	100%
Provv. Reg. alle OO.PP.	L. 798/84, art. 3 lett. f)	Recupero dell'Arsenale	12.352	12.352	12.352	100%	12.352	100%
Isp. Gen. lagune Venezia, Marano e Grado	L. 798/84, art. 3 lett. g)	Sistemazione di ponti, canali e fondamenta	49.643	49.643	49.643	100%	49.643	100%
Isp. Gen. lagune Venezia, Marano e Grado	L. 798/84, art. 3 lett. h)	Sistemazione dei corsi d'acqua	10.188	9.413	9.413	100%	9.413	100%
Provv. Reg. alle OO.PP.	L. 798/84, art. 3 lett. i)	Restauro del patrimonio mobiliare pubblico	4.662	4.662	4.662	100%	4.662	100%
Provv. Reg. alle OO.PP.	L. 798/84, art. 3 lett. m)	Edilizia per Università Architettura	6.242	6.242	6.242	100%	6.242	100%
		TOTALI	**176.067**	**170.408**	**169.865**	**100%**	**169.865**	**100%**

(*) La differenza tra l'assegnato e l'impegnato è dovuto all'accantonamento di euro 170.430,78 e al trasferimento di parte dei fondi ad altro capitolo per il pagamento dei contrattisti.

Tabella n. 1

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

MAGISTRATO ALLE ACQUE

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLO STATO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

Aggiornamento al 31 dicembre 2006

Importi lordi in migliaia di euro

COMPETENZA	OBIETTIVI		LEGGE N. 448/01						LEGGE N. 350/03					
			IMPORTI FINANZIATI (A)	IMPORTI ASSEGNATI (B)	IMPORTI IMPEGNATI (C)	% (C/B)	IMPORTI EROGATI (D)	% (D/B)	IMPORTI FINANZIATI (A)	IMPORTI ASSEGNATI (B)	IMPORTI IMPEGNATI (C)	% (C/B)	IMPORTI EROGATI (D)	% (D/B)
Isp Gen. lagune Venezia, Marano e Grado	L. 798/84, art. 3 lett. a)	Riequilibrio idrogeologico												
Isp Gen. lagune Venezia, Marano e Grado	L. 798/84, art. 3 lett. b)	Servizio vigilanza e Anti-inquinamento												
Isp Gen. lagune Venezia, Marano e Grado	L. 798/84, art. 3 lett. c)	Marginamenti lagunari	27.505	27.505	17.813	65%	8.196	30%	19.000	19.000	13.397	71%	1.033	5%
Provv. Reg. alle OO.PP.	L. 798/84, art. 3 lett. e)	Restauro di edifici demaniali												
Provv. Reg. alle OO.PP.	L. 798/84, art. 3 lett. f)	Recupero dell'Arsenale												
Isp Gen. lagune Venezia, Marano e Grado	L. 798/84, art. 3 lett. g)	Sistemazione di ponti, canali e fondamenta												
Isp Gen. lagune Venezia, Marano e Grado	L. 798/84, art. 3 lett. h)	Sistemazione dei corsi d'acqua												
Provv. Reg. alle OO.PP.	L. 798/84, art. 3 lett. i)	Restauro del patrimonio mobiliare pubblico												
Provv. Reg. alle OO.PP.	L. 798/84, art. 3 lett. m)	Edilizia per Università Architettura												
		TOTALI	**27.505**	**27.505**	**17.813**	**65%**	**8.196**	**30%**	**19.000**	**19.000**	**13.397**	**71%**	**1.033**	**5%**

L'importo finanziato con la Legge 448/01 per il Magistrato alle Acque a seguito di specifica richiesta avanzata in sede di Comitato ex art. 4 L. 798/84 nella seduta del 6.12.2001 per "spese in gestione al Magistrato alle Acque per il servizio di polizia lagunare e la manutenzione straordinaria dei beni demaniali in fregio alla laguna" - cap. 7671 ex 8620 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, può essere utilizzato nel periodo 2002-2005.

L'importo finanziato con la Legge 350/03 è relativo al capitolo 7197 i cui fondi vengono assegnati al Magistrato alle Acque tramite il Ministero dell'Ambiente - Difesa del suolo e possono essere utilizzati nel periodo 2004-2006.

Tabella n. 2

Documento B ***Consorzio Venezia Nuova***

Stato di attuazione degli interventi di competenza dello Stato in concessione al Consorzio Venezia Nuova – Aggiornamento al 31 dicembre 2006

PAGINA BIANCA

CONSORZIO VENEZIA NUOVA

Venezia, 26 APR. 2007
Prot. n. 15798 spc/ndo/gol

Spettabile
Magistrato alle Acque
Palazzo X Savi
San Polo, 19
30124 Venezia

Alla c.a.: dott. ing. Maria Giovanna Piva

Oggetto*: *"Stato di attuazione degli interventi di competenza dello Stato in concessione al Consorzio Venezia Nuova. Aggiornamento al 31 dicembre 2006".

In risposta alla Vs. nota prot. n. 262/GAB del 04 aprile 2007, con la presente Vi inviamo il documento in oggetto per la redazione dell'annuale "Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia".

Cordiali saluti.

CONSORZIO VENEZIA NUOVA

All.: c.s.

PAGINA BIANCA


Ministero delle Infrastrutture
Magistrato alle Acque di Venezia
Consorzio Venezia Nuova
Stato di attuazione degli interventi di competenza dello Stato in concessione al Consorzio Venezia Nuova
Aggiornamento al 31 dicembre 2006
Aprile 2007

PAGINA BIANCA

Indice

1 **Le attività di salvaguardia di venezia e della sua laguna di competenza dello Stato e il Piano Generale degli Interventi**

7 **I Finanziamenti**

11 ***Tabella n. 1*** *Stato di attuazione dei finanziamenti assegnati al Consorzio Venezia Nuova*

12 ***Tabella n. 2*** *Stato di Attuazione degli Atti Attuativi sottoscritti tra Magistrato alle Acque e Consorzio Venezia Nuova*

13 ***Tabella n. 3*** *Attuazione del Piano Generale degli Interventi da eseguire in concessione dal Consorzio Venezia Nuova*

14 ***Grafici*** *Diagrammi generali*

16 ***Tabella n. 4*** *Le quantità realizzate e in corso di realizzazione*

17 **Lo stato di attuazione delle attività**

17 3.1 Studi e sperimentazioni

21 3.2 Difesa dalle acque alte eccezionali

42 3.3 Difesa locale acque medio-alte

52 3.4 Ristrutturazione dei moli foranei

55 3.5 Difesa dalle mareggiate

64 3.6 Recupero morfologico

73 3.7 Arresto del degrado dell'ecosistema lagunare

88 3.8 Allontanamento del traffico petrolifero dalla laguna

91 3.9 Ausilii luminosi alla navigazione

93 3.10 Apertura delle valli da pesca

96 3.11 Costituzione e potenziamento del Servizio Informativo

106 ***Appendice***

113 ***Elenchi – Mappe - Foto***

PAGINA BIANCA

1 *Le attività di salvaguardia di Venezia e della sua laguna di competenza dello Stato e il Piano Generale degli Interventi*

Il Consorzio Venezia Nuova è il soggetto attuatore, per conto del Ministero delle Infrastrutture - Magistrato alle Acque di Venezia, delle attività di salvaguardia di competenza dello Stato in attuazione della legge 798/84 (art. 3, lettere a), c), d) e l).
Per svolgere il proprio compito di concessionario di studi, sperimentazioni, progetti e opere, il Consorzio Venezia Nuova é dotato di una struttura in grado di pianificare, organizzare e gestire le diverse attività nel loro complesso e in tutte le fasi di attuazione.
Il Consorzio è costituito da imprese nazionali, da cooperative e da imprese locali. La sua operatività è iniziata nella seconda metà degli anni '80, quando sono stati avviati i primi interventi previsti dalla legislazione speciale per Venezia.

Al fine di perseguire gli obiettivi di competenza dello Stato, il Ministero delle Infrastrutture - Magistrato alle Acque di Venezia agisce, quindi, tramite il concessionario Consorzio Venezia Nuova in base a una Convenzione Generale[1] e in base a una serie di obiettivi indicati dalla legge, organizzati in un *Piano Generale degli Interventi*.

1 La "Convenzione Generale" rep. n. 7191, sottoscritta nell'ottobre del 1991, disciplina il rapporto fra l'Amministrazione concedente e il Consorzio concessionario in ordine all'insieme degli interventi affidati in concessione per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, come prefigurato dal Comitato ex art. 4 legge n. 798/84.

Il *Piano*, redatto sin dal 1985 come allegato alla Convenzione rep. n. 6479, è stato successivamente adeguato e formulato sugli indirizzi forniti dal Comitato ex art. 4 Legge n. 798/84 nel 1987 ed approvato, nella seduta dell'11.03.1987, dal Comitato stesso; nella successiva versione adeguata e aggiornata del 1991, è stato approvato dal Magistrato alle Acque di Venezia, su parere del Comitato Tecnico di Magistratura, e dallo stesso Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo nel 1991.
Il *Piano* è stato espressamente richiamato dall'art. 3 della Legge

139/1992, quale strumento di pianificazione dell'azione del Ministero dei Lavori Pubblici (ora delle Infrastrutture). Esso contiene le conclusioni di anni di confronti, di studi e di progettazioni generali con i quali sono state esaminate alternative diverse ed è stata valutata la fattibilità del sistema delle opere e di ciascuna di esse con riguardo alla loro compatibilità ambientale ed alla loro reciproca influenza.
Tale documento è articolato secondo linee di azione distinte, ma in reciproca relazione: la difesa dalle acque alte eccezionali e medio-alte; la difesa dalle mareggiate; il recupero della morfologia lagunare; il riequilibrio ambientale.

Al Piano fanno riferimento otto specifici progetti generali:

Progetto di massima delle opere di regolazione delle maree alle bocche di porto lagunari: approvato nel novembre 1992 e valutato positivamente dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nell'ottobre 1994 e nel febbraio 1999;
Progetto per la difesa locale delle "insulae" dalle acque medio-alte: approvato nel luglio 1992;
Progetto per il rinforzo dei litorali: approvato nel settembre 1990;
Progetto per la ristrutturazione dei moli foranei: approvato nel luglio 1991;
Progetto per il recupero morfologico: approvato nel luglio 1993;
Progetto per l'arresto e l'inversione del degrado: approvato nel luglio 1994;
Progetto di fattibilità per la riapertura delle valli da pesca: approvato nel luglio 1993;
Progetto operativo per l'allontanamento del traffico petrolifero dalla laguna di Venezia: una prima soluzione approvata nel settembre 1994 ed una seconda nel luglio 1997.

L'attuazione dei progetti generali è avvenuta negli anni, e avviene tuttora, attraverso la definizione dei singoli interventi con appositi progetti esecutivi che vengono a loro volta approvati dall'Amministrazione Concedente e dai diversi enti competenti. Detti interventi in parte sono stati realizzati, in parte sono in corso di esecuzione, in parte devono essere avviati, mediante Atti Attuativi della Convenzione Generale, sottoscritti tra l'Amministrazione Concedente e il Consorzio concessionario sulla base dei finanziamenti via via disponibili. Altri interventi debbono essere ancora finanziati e, pertanto, sulla base delle future disponibilità dovranno essere oggetto di nuovi, specifici, Atti

Attuativi.
Il *Piano Generale degli Interventi* ha subìto negli anni una evoluzione nei contenuti degli interventi previsti, anche per una sempre maggiore conoscenza del sistema lagunare e dei meccanismi alla base delle problematiche che lo investono, consentendo di mettere in atto le più avanzate soluzioni progettuali nel rispetto delle situazioni ambientali, urbanistiche e artistiche del luogo di realizzazione dell'intervento.

Il *Piano*, pertanto, è un documento programmatorio in continua specificazione, che prevede lo sviluppo temporale parallelo di più attività tra loro diversificate ma fortemente interconnesse e che si realizza progressivamente cumulando le esperienze acquisite nelle fasi attuative precedenti.

Nel corso del 2002, si è pervenuti alla ridefinizione del *Piano Generale degli Interventi* a seguito degli accordi intercorsi tra il Governo italiano e la Commissione Europea.
Si ricorda, infatti, che, proprio nel corso del 2002, la Commissione Europea ha proceduto all'archiviazione della procedura di infrazione a suo tempo avviata nei confronti dello Stato Italiano in ordine alla presunta incompatibilità, rispetto alla normativa comunitaria, dell'affidamento da parte del Ministero dei Lavori Pubblici (ora Infrastrutture) al Consorzio Venezia Nuova della concessione per l'esecuzione delle attività ricomprese nel *Piano Generale degli Interventi* per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna.

All'archiviazione della procedura di infrazione, che riafferma il ruolo svolto dal concessionario nell'ambito delle peculiari attività unitariamente finalizzate alla salvaguardia fisica e ambientale di Venezia e della sua laguna, nonché la validità della concessione ad esso affidata dallo Stato italiano, la Commissione Europea è pervenuta dopo l'esame dello specifico documento contrattuale stipulato tra il Magistrato alle Acque e il Consorzio Venezia Nuova in data 21 giugno 2002, ammesso al visto e alla conseguente registrazione da parte della Sezione per il Veneto della Corte dei Conti in data 25 ottobre 2002, che recepisce gli accordi intercorsi tra le Autorità Italiane e la Commissione Europea, volti alla ridefinizione del perimetro degli interventi la cui esecuzione è affidata in concessione.

In base a tali accordi, sono state stralciate dal *Piano Generale*

degli Interventi affidati in concessione le opere di difesa dei centri urbani dalle acque alte e le difese per "insulae", se non ricomprese in finanziamenti già stanziati a favore del Consorzio Venezia Nuova, per essere appaltate dal Magistrato alle Acque di Venezia mediante procedure concorsuali. Inoltre, il Consorzio Venezia Nuova dovrà eseguire le opere elettromeccaniche, necessarie per la realizzazione dell'intervento di regolazione delle maree alle bocche di porto, mediante appalti di fornitura i cui esecutori dovranno essere individuati per mezzo di gare da indire ed esperire dal Consorzio stesso, secondo le direttive comunitarie.

La ridefinizione del *Piano Generale degli Interventi* che recepisce tali accordi è stata favorevolmente esaminata dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque nella seduta del 20 dicembre 2002.

Si ricorda che, successivamente, il *Piano* è stato presentato, aggiornato al 31 dicembre 2002, dal Presidente del Magistrato alle Acque, quale Segretario del Comitato ex art. 4 Legge 798/84, nella seduta del 3 aprile 2003 al Comitato stesso, che ne ha preso atto e ha deliberato:

"1. di prendere atto del documento "Piano dei Finanziamenti relativi al Piano Generale degli Interventi" nella versione 31.12.2002, invitando a provvedere al suo adeguamento anche sulla base di quanto già deliberato da questo Comitato relativamente alla redazione del progetto esecutivo e alla realizzazione delle opere di regolazione delle maree del "Sistema Mo.S.E.";

2. di prendere formale impegno affinché si provveda ad attivare tutte le iniziative utili a garantire senza soluzione di continuità i flussi finanziari, indicati nel documento "Piano dei finanziamenti relativi al Piano Generale degli Interventi", necessari per la realizzazione del "Sistema Mo.S.E." nonché per ulteriori attività, di competenza dello Stato in concessione al Consorzio Venezia Nuova, tendenti al recupero ambientale della laguna di Venezia ed alla sua salvaguardia".

Si segnala che, nel corso del 2005, la Convenzione Generale rep. n. 7191/1991 è stata oggetto di un importante atto modificativo per l'introduzione del *criterio "a prezzo chiuso" per gli interventi necessari al completamento delle opere alle bocche di porto per la*

regolazione dei flussi di marea ("Sistema MOSE").

In data 11 maggio 2005, infatti, è stato sottoscritto tra Magistrato alle Acque di Venezia e Consorzio Venezia Nuova l'atto aggiuntivo rep. n. 8067 alla Convenzione Generale rep. n. 7191/1991, che introduce il criterio del "prezzo chiuso" per completare il "Sistema MOSE" al fine di poter contare sulla disponibilità di finanziamenti ulteriori complessivi definiti a fronte della determinazione "certa" del fabbisogno residuo e del relativo programma di esecuzione dell'opera.
L'atto e i relativi allegati (*Piano di esecuzione degli interventi*, *Cronoprogramma* e *Piano dei finanziamenti*), esaminato preliminarmente con parere favorevole dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque nella seduta del 29 aprile 2005 e approvato, quindi, con Decreto Presidenziale n. 3638 del 23 maggio 2005, è stato registrato dalla Sezione per il Veneto della Corte dei Conti in data 8 luglio 2005.
Si tratta di un importante risultato che permette, in modo efficace, la programmazione e la realizzazione degli interventi di completamento del "Sistema MOSE" nell'ambito di un quadro temporale ed economico definito, idoneo a consentire la conseguente programmazione dei fabbisogni finanziari ancora necessari per il completamento dell'opera. Di tale accordo ha preso atto il CIPE nell'ambito della deliberazione n. 74/2006 di assegnazione di una nuova "tranche" di finanziamento al "Sistema MOSE" quale opera strategica di cui al programma deliberato dal CIPE stesso (delibera n. 121/2001), in attuazione della c.d. Legge Obiettivo (n. 448/2001).

Si segnala che, nel corso del 2006, si è avuta una importante conferma delle scelte progettuali operate nel corso degli anni dal Magistrato alle Acque di Venezia per la realizzazione del sistema di opere volto alla difesa di Venezia e della sua laguna dalle acque alte.

In data 22 novembre 2006, infatti, si è riunito a Roma il Comitato ex art. 4 legge 798/84 che, sulla base degli approfondimenti tecnici effettuati e dei pareri espressi da parte degli organi tecnici degli Enti interpellati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su alcuni progetti alternativi al "Sistema MOSE" proposti dal Comune di Venezia, tenuto conto della relazione sul "Sistema MOSE" presentata dal Ministro delle Infrastrutture al Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 2006, fatta propria dal Governo a

maggioranza, con il voto favorevole di 20 Ministri, ha deliberato, con il solo voto contrario del Sindaco di Venezia:

"di procedere al completamento della costruzione delle opere del "Sistema MOSE" e delle opere morfologiche connesse, assicurando la disponibilità dei finanziamenti, nel rispetto degli impegni e del cronoprogramma stabiliti nell'atto aggiuntivo rep. N. 8067/2005 alla Convenzione Generale rep. N. 7191/1991 tra Magistrato alle Acque di Venezia e il Concessionario, che ha introdotto il criterio "a prezzo chiuso" per l'esecuzione dei lavori stessi."

Si tratta evidentemente di una decisione molto rilevante che consente di garantire lo sviluppo degli interventi di salvaguardia di Venezia e della sua laguna di competenza dello Stato secondo le linee progettuali e gli strumenti programmatici definiti contrattualmente.

2 *I Finanziamenti*

Gli interventi dello Stato in concessione al Consorzio Venezia Nuova riguardano i seguenti obiettivi, richiamati dall'art. 3 lettere a), c), d) e l) della Legge n. 798/84 e dall'art. 2, 1° comma lettera a) della Legge n. 360/91 nonché dall'art. 3 della Legge n. 139/92:

- difesa dalle acque alte eccezionali;
- difesa locale dalle acque medio-alte;
- ristrutturazione dei moli foranei alle tre bocche lagunari;
- difesa dalle mareggiate;
- recupero della morfologia lagunare;
- arresto del degrado dell'ecosistema lagunare;
- allontanamento del traffico petrolifero dalla laguna;
- ausilii luminosi alla navigazione;
- apertura delle valli da pesca;
- costituzione e potenziamento del Servizio Informativo.

Lo stato di attuazione dei finanziamenti stanziati per la realizzazione dei suddetti interventi in concessione al Consorzio Venezia Nuova viene di seguito riportato in alcune tabelle che evidenziano per ciascuna legge e per ciascun obiettivo l'avanzamento aggiornato al 31 dicembre 2006.

In riferimento alla *Tabella n.* 1, per **importi finanziati** si intendono gli importi complessivamente stanziati in favore delle attività del Consorzio Venezia Nuova dal 1984 al 31.12.2006. Essi ammontano a 4.748 milioni di euro, importo che tiene conto della terza assegnazione di fondi da parte del CIPE per la realizzazione delle opere di regolazione delle maree alle bocche di porto ("Sistema MOSE"), ricompreso nel primo programma delle opere strategiche di cui alla delibera CIPE n. 121/2001 in attuazione della Legge Obiettivo.

Nell'ambito della Legislazione Speciale per Venezia, a partire dalla Legge n. 139/92, i finanziamenti vengono attivati con contratti di finanziamento a valere sui "limiti di impegno", recati anno dopo anno dalle Leggi Finanziarie, destinati in quota-parte allo Stato per gli interventi in concessione, per l'ammortamento delle rate (per capitali ed interessi) relative ai mutui contratti dal Consorzio Venezia Nuova, mediante specifica ripartizione proposta dal Comitato ex art. 4 Legge n. 798/84 e operata con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Nell'ambito della Legge Obiettivo n. 443/2001, per il "Sistema MOSE", i finanziamenti vengono attivati con contratti di mutuo a valere sui "limiti di impegno" ovvero sui "contributi" pluriennali recati dalle Leggi finanziarie per il rifinanziamento del fondo per le opere strategiche di cui all'art. 13 della Legge n. 166/2002, destinati mediante deliberazione del CIPE in quota-parte alle opere di regolazione delle maree alle bocche di porto, quale opera strategica di cui alla delibera CIPE n. 121/2001.

Le risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi a Porto Marghera di competenza dello Stato derivano sia dalle somme attivate nell'ambito della Legislazione speciale per Venezia, sia dalle somme messe a disposizione dal Ministero dell'Ambiente, a valere sulla legge n. 641/1996, sia da accordi transattivi e di cooperazione tra lo Stato e alcuni Soggetti privati che operano a Porto Marghera, finalizzati ad accelerare la realizzazione delle opere di messa in sicurezza progettate dallo Stato/Magistrato alle Acque di Venezia.

Per **importi sottoscritti** si intendono gli importi relativi ad Atti Attuativi della Convenzione Generale rep. n. 7191/1991 sottoscritti tra Magistrato alle Acque e Consorzio Venezia Nuova alla data del 31 dicembre 2006. Tali importi sono pari a 4.342 milioni di euro.

Per **importi spesi** al 31.12.2006 si intendono gli importi prodotti a tale data. **Al 31.12.2006 risulta speso l'81% degli importi sottoscritti.**

Nella *Tabella n. 2* è riportato l'elenco degli Atti Attuativi sottoscritti tra Magistrato alle Acque e Consorzio Venezia Nuova e il loro avanzamento.

Nella *Tabella n. 3* viene riportato sinteticamente, per ciascun obiettivo indicato dalle Leggi n. 798/84 e n. 139/92 il fabbisogno totale, gli importi finanziati, gli importi sottoscritti, gli importi impegnati in attività già realizzate, in corso di realizzazione e di prossimo avvio, nonché gli importi spesi.
Di seguito alcuni *grafici* che mettono in evidenza i dati riportati nelle tabelle precedenti.

Il **fabbisogno totale** viene valutato sulla base di documenti tecnici già prodotti, di stime provenienti da lavori analoghi, di indicazioni di massima, qualora si tratti di interventi non ancora sufficientemente delineati, da preventivi più dettagliati per interventi il cui progetto si trova già in fase di sviluppo. Per quegli interventi il cui progetto esecutivo è già stato approvato dall'Amministrazione concedente, il fabbisogno totale coincide con l'importo approvato.
Per tale motivo, l'importo indicato quale fabbisogno totale subisce delle evoluzioni nel tempo, tenendo conto di quanto definitosi progressivamente con l'approvazione dei singoli progetti esecutivi.

Si ricorda che il fabbisogno totale tiene conto di quanto definito con l'atto aggiuntivo rep. n. 8067/2005 alla "Convenzione Generale", che ha introdotto il criterio del "prezzo chiuso" per gli interventi da realizzare per il completamento del "Sistema MOSE".
In particolare, con tale atto aggiuntivo il Magistrato alle Acque e il Consorzio Venezia Nuova hanno definito specifiche modalità esecutive per gli interventi ancora necessari per il completamento delle opere di regolazione delle maree: se ne prevede la realizzazione con l'applicazione di un "prezzo chiuso" - comprensivo dei lavori, delle prestazioni di ingegneria, degli obblighi e oneri di competenza del concessionario - con conseguente contabilizzazione dei lavori "a corpo", fermo restando che le opere diverse da quelle finalizzate alla regolazione delle maree, ma a queste strettamente connesse, nonché gli studi, le sperimentazioni e le attività del Servizio Informativo saranno contabilizzati "a misura", in quanto non ricompresi nel "prezzo chiuso".

Il **fabbisogno residuo da finanziare**, per ciascun obiettivo, indicato nelle tabelle riportate alla fine di ogni paragrafo, è dato dalla differenza tra il fabbisogno totale e gli importi già stanziati a favore del Consorzio Venezia Nuova.

Con il fabbisogno residuo si dovrà trovare copertura finanziaria per quegli interventi:

- che costituiscono ulteriori stralci di interventi già realizzati o in corso di realizzazione;
- che costituiscono ulteriori fasi di sviluppo di attività che, per loro natura, si sviluppano nel corso di più anni (monitoraggi, manutenzioni di interventi già realizzati, gestione del Servizio Informativo);
- che non hanno trovato copertura finanziaria nell'ambito degli atti convenzionali già sottoscritti, in quanto non particolarmente urgenti o comunque rinviabili rispetto ad altri interventi;
- la cui progettazione è ancora in fase di sviluppo e, poiché richiede tempi lunghi di completamento e di successiva procedura approvativa, si è ritenuto opportuno rinviare il finanziamento delle relative opere;
- che costituiscono nuovi studi e sperimentazioni da realizzare in funzione di alcune esigenze specifiche di approfondimento emerse nel corso di attività progettuali.

La maggior parte del fabbisogno residuo è rappresentata dagli importi valutati necessari per il completamento della realizzazione del sistema delle opere per la regolazione dei flussi di marea alle bocche di porto lagunari.
L'altra parte rilevante del fabbisogno residuo è rappresentata dagli interventi ambientali per molti dei quali, nell'ambito dei finanziamenti disponibili, si è preferito finanziare le sole progettazioni, richiedendo tempi di sviluppo e iter approvativi molto lunghi.

La *Tabella n. 4* infine, dà contezza di quanto già realizzato anche in termini di "quantità" ovvero dello sviluppo dei lavori effettuati, sia nel campo della salvaguardia fisica (difesa dalle acque medio-alte, difesa dalle mareggiate, rinforzo dei moli foranei) che nel campo della salvaguardia ambientale (interventi per il recupero morfologico e per l'arresto del degrado del bacino lagunare).

Tabella n. 1 - Stato di attuazione dei finanziamenti assegnati al Consorzio Venezia Nuova. Aggiornamento al 31 dicembre 2006 -

Importi lordi in milioni di Euro

	DECORRENZA LIMITI DI IMPEGNO/ CONTRIBUTI	IMPORTI FINANZIATI (A)	IMPORTI SOTTOSCRITTI (B)	% (B)/(A)	IMPORTI SPESI (C)	% (C)/(B)	
LEGGE 798/84	(1)	401,405	401,405	100%	399,286	99%	
LEGGE 139/92	1993 - 1994	560,260	560,260	100%	555,613	99%	
LEGGE 539/95	1996 - 1997	125,500	125,500	100%	121,822	97%	
LEGGE 515/96	1997 - 1998	478,000	478,000	100%	439,292	92%	
LEGGE 345/97	1998 - 1999	246,000	246,000	100%	213,781	87%	
LEGGE 448/98	1999 - 2000 -2001	263,784	263,784	100%	217,535	82%	
FONDI CIPE PER INTERVENTI AMBIENTALI	(1)	50,096	50,096	100%	14,731	29%	
LEGGE 488/99	2001 - 2002	215,000	215,000	100%	161,254	75%	
LEGGE 388/00	2002 - 2003	162,000	162,000	100%	139,118	86%	
LEGGE 448/01	2002 - 2003 - 2004	234,500	234,500	100%	120,297	51%	
LEGGI 443/01 – 166/02 E SUCCESSIVI RIFINANZIAMENTI: ASSEGNAZIONI CIPE PER "SISTEMA MOSE"	2003 - 2005 - 2007	1.468,100	1.088,100	74%	1.014,212	93%	(2)
FINANZIAMENTO DA ACCORDO STATO - MONTEDISON (ora Edison S.p.A.) PER PORTO MARGHERA	(1)	287,401	287,401	100%	85,460	30%	
FINANZIAMENTO DA ACCORDO STATO - SOGGETTI PRIVATI per Porto Marghera	(1)	89,557	89,557	100%	34,072	38%	
FINANZIAMENTO DA ACCORDO STATO - SYNDIAL - ENI PER PORTO MARGHERA	(1)	140,000	140,000	100%	4,440	3%	
FINANZIAMENTO DA ACCORDO STATO - SOGGETTI PRIVATI PER PORTO MARGHERA (3)	(1)	26,053			0,058		
TOTALE GENERALE		4.747,656	4.341,603	91%	3.520,971	81%	

LEGENDA

Negli importi indicati non sono compresi i fondi provenienti da Accordi di Programma con altri Enti.

IMPORTI FINANZIATI: gli importi complessivamente stanziati a favore del Consorzio Venezia Nuova alla data del 31.12.2006.

IMPORTI SOTTOSCRITTI AL 31.12.2006: gli importi relativi ad Atti Attuativi sottoscritti a tale data tra Magistrato alle Acque e Consorzio Venezia Nuova.

IMPORTI SPESI AL 31.12.2006: gli importi prodotti a tale data.

NOTE

(1) Fondi in conto capitale.

(2) Gli importi finanziati tengono conto della 3^ assegnazione di fondi da parte del CIPE (380 Meuro, deliberazione n. 74 del 29.03.2006) che si renderanno disponibili nel corso del 2007. Gli importi spesi tengono conto delle somme sostenute non ancora contabilizzate.

(3) L'Atto Attuativo verrà sottoscritto tra Magistrato alle Acque e Consorzio Venezia Nuova nel corso del 2007.

Tabella n. 2 - Stato di attuazione degli Atti Attuativi sottoscritti tra Magistrato alle Acque e Consorzio Venezia Nuova. Aggiornamento al 31 dicembre 2006 -

importi lordi in milioni di Euro

ATTO ATTUATIVO rep. n°	DATA SOTTOSCRIZIONE	LEGGE DI FINANZIAMENTO	IMPORTO DELL' ATTO ATTUATIVO	AVANZAMENTO AL 31/12/2006 %	
6479 (*)	12-lug-85	798/84 - 910/86	139,380	100%	
6745 (*)	23-dic-87	910/86 - 67/88	98,823	100%	
7025 (*)	15-dic-89	67/88	64,144	100%	
7138 (*)	21-feb-91	67/88 - 360/91	41,317	100%	
7191 (*)	04-ott-91	67/88	2,582	100%	
7295 (*)	05-giu-92	67/88	30,740	100%	
1568 (**)	21-nov-87	798/84	3,892	100%	
1685 (**)	20-apr-89	910/86	20,527	100%	
7322 (*)	03-dic-92	139/92	388,260	100%	
7395 (*)	23-nov-93	139/92	172,000	98%	
7601 (*)	20-mar-96	539/95	44,000	97%	
7637 (*)	29-ott-96	539/95	81,500	97%	
7649 (*)	18-dic-96	515/96	333,000	94%	
7695 (*)	28-lug-97	515/96	145,000	88%	
7725 (*)	23-dic-97	345/97	111,000	93%	
7760 (*)	14-lug-98	345/97	135,000	82%	
7818 (*)	01-dic-99	448/98	154,000	85%	
7844 (*)	24-feb-00	448/98	40,284	94%	
7867 (*)	03-nov-00	CIPE 1996	50,096	29%	
7868 (*)	03-nov-00	448/98	69,500	70%	
7894 (*)	30-mar-01	488/99	115,000	71%	
7923 (*)	01-ago-01	488/99	100,000	79%	
7952 (*)	21-giu-02	388/00	62,500	97%	
7953 (*)	27-giu-02	448/01	43,000	48%	
7962 (*)	21-ott-02	388/00	99,500	79%	
7980 (*)	18-dic-02	448/01	68,500	55%	
8007 (*)	01-ott-03	448/01	123,000	50%	
8014 (*)	22-dic-03	448/01-166/02 CIPE	136,000	84%	(***)
8015 (*)	22-dic-03	448/01-166/02 CIPE	314,000	84%	(***)
8022 (*)	31-mar-04	FONDI EDISON	287,401	30%	
8062 (*)	23-mar-05	FONDI SOGG. PRIVATI	89,557	38%	
8100 (*)	19-dic-05	166/02-350/03 CIPE	638,100	83%	(***)
8149 (*)	10-mag-06	FONDI SYNDIAL -ENI	140,000	3%	
TOTALE			**4.341,603**	**79%**	

(*) Atti Attuativi sottoscritti tra il Ministero Lavori Pubblici (ora Infrastrutture e Trasporti) - Magistrato alle Acque e Consorzio Venezia Nuova. Non sono comprese le attività finanziate da altri Enti nell'ambito di specifici "Accordi di programma".

(**) Atti Attuativi sottoscritti tra il Ministero Lavori Pubblici (ora Infrastrutture) - Genio Civile Opere Marittime e Consorzio Venezia Nuova.

(***) L'avanzamento tiene conto anche degli investimenti e degli importi sostenuti non ancora consuntivati.

Tabella n. 3 - Attuazione del Piano Generale degli Interventi da eseguire in concessione dal Consorzio Venezia Nuova. Aggiornamento al 31 dicembre 2006 -

Importi lordi in milioni di Euro

			fabbisogno totale	importi finanziati	importi sottoscritti	importi impegnati	importi realizzati, in corso di realizzazione e di prossimo avvio	importi spesi	fabbisogno residuo da finanziare
1	difesa dalle acque alte eccezionali: attività propedeutiche		196,759	196,759	196,759	196,759	196,759	193,752	0,000
2	difesa dalle acque alte eccezionali: realizzazione opere alle bocche e attività strettamente connesse	(1)	4.271,626	(2) 1.579,829	1.199,829	1.199,829	(3) 1.351,558	1.122,205	2.691,797
3	difesa locale dalle acque medio alte		910,842	910,842	910,842	910,842	884,822	739,385	0,000
4	ristrutturazione dei moli foranei		107,806	107,806	107,806	107,806	107,725	107,762	0,000
5	difesa dalle mareggiate		411,789	357,730	357,730	357,730	354,900	348,881	54,059
6	recupero morfologico	(4)	706,634	470,998	470,998	470,998	449,519	391,883	235,636
7	arresto del degrado dell'ecosistema lagunare	(5)	1.285,019	1.002,646	976,593	976,593	837,270	501,557	282,373
8	allontanamento del traffico petrolifero dalla laguna		31,811	8,556	8,556	8,556	7,784	7,764	23,255
9	ausilii luminosi alla navigazione		20,660	15,463	15,463	15,463	15,160	15,160	5,197
10	apertura valli da pesca		3,848	3,848	3,848	3,848	3,848	3,848	0,000
11	servizio informativo	(4)	144,779	93,178	93,178	93,178	93,178	88,772	51,601
	TOTALE		**8.091,574**	**4.747,656**	**4.341,603**	**4.341,602**	**4.302,523**	**3.520,971**	**3.343,918**
	VALORI %				**91%** degli importi finanziati	**100%** degli importi sottoscritti	**99%** degli importi sottoscritti	**81%** degli importi sottoscritti	**41%** del fabbisogno totale

NOTE

(1) Il fabbisogno indicato tiene conto, tra l'altro, di quanto definito con l'atto aggiuntivo rep. 8067 del 11 maggio 2005 alla convenzione generale rep. 7191/91, che introduce il criterio del "prezzo chiuso" per il completamento del "Sistema MOSE".

(2) Gli importi finanziati tengono conto della 3^ assegnazione di fondi da parte del CIPE (380 Meuro, deliberazione n. 74 del 29.03.2006) che si renderanno disponibili nel corso del 2007.

(3) L'importo tiene conto anche di attività già approvate, cantierizzabili, con finanziamento ancora non perfezionato.

(4) Gli importi indicati sono al netto delle attività strettamente connesse alla realizzazione delle opere alle bocche di porto, già inserite al punto 2 nell'ambito del citato "prezzo chiuso".

(5) Parte del fabbisogno (906 Meuro) è relativo alla messa in sicurezza delle "macroisole" a Porto Marghera.

Grafici

Composizione del fabbisogno totale (8.091,574 Mln €)

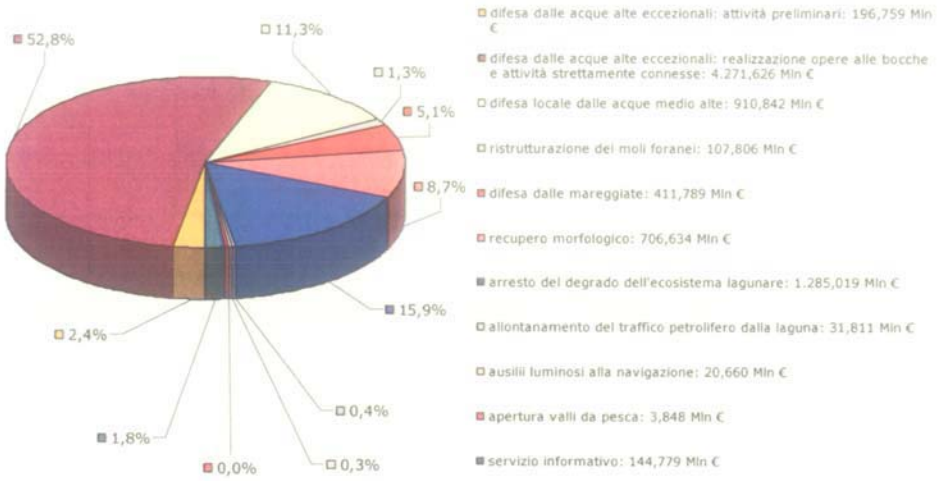

Distribuzione degli importi sottoscritti (4.341,603 Mln €)

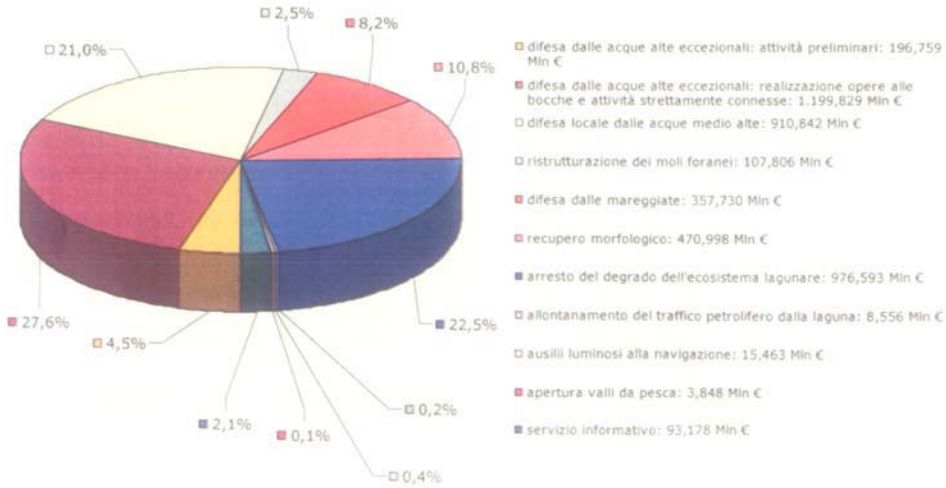

Confronto fra importi sottoscritti (4.341,603 Mln €), importi realizzati, in corso di realizzazione e di prossimo avvio (4.302,523 Mln €) e importi spesi (3.520,971 Mln €)



Tabella n. 4 - Le quantità realizzate e in corso di realizzazione. Aggiornamento al 31 dicembre 2006 -

SALVAGUARDIA FISICA

DIFESA DALLE ACQUE ALTE, INSULAE E MARGINAMENTI

Consolidamento, ristrutturazione e rialzo rive urbane e sponde lagunari

Sviluppo lavori	90 km
Superficie totale aree difese	1200 ettari

DIFESA DALLE MAREGGIATE

Rinforzo dei litorali

Sviluppo lavori di ricostruzione o ampliamento spiagge	45 km
Sviluppo dune ricostruite e naturalizzate	8 km
Sabbia impiegata	9,9 milioni di m^3

Ristrutturazione dei moli foranei

Sviluppo lavori	11 km

SALVAGUARDIA AMBIENTALE

RECUPERO MORFOLOGICO

Ricalibratura di canali

Sviluppo lavori	168 km
Sedimenti dragati	10 milioni di m^3

Ricostruzione di velme e barene

Sviluppo lavori	1190 ettari
Sedimenti impiegati	17 milioni di m^3

Protezione di barene, velme e bassifondali

Sviluppo palificate o burghe a protezione del bordo delle barene	22 km
Sviluppo fascinate di sedimentazione	8 km
Aree di trapianto vegetazione alofila e fanerogame	n. 38

Recupero isole

Isole oggetto di intervento	n. 12

ARRESTO DEL DEGRADO

Messa in sicurezza delle ex discariche

Discariche oggetto di intervento	n. 5
Superficie totale aree messe in sicurezza	182 ettari

Messa in sicurezza di sponde dei canali industriali

Sviluppo lavori	34,7 km

Asportazione di sedimenti inquinati dai canali industriali

Sviluppo lavori	322.000 m^3

Copertura di fondali inquinati

Sviluppo lavori	12 ettari

Ripristino di aree umide di fitobiodepurazione

Aree di intervento	n. 2

Raccolta di macroalghe

Biomassa raccolta	221.000 m^3

3 *Lo stato di attuazione delle attività*

3.1 Studi e sperimentazioni
(interventi di cui all'art. 3 lettera a) legge n. 798/84)

Obiettivo

Acquisire le conoscenze sul sistema fisico e sul sistema ambientale della laguna e sulle loro problematiche, al fine di poter disporre in un quadro unitario, di tutti gli elementi necessari alla fase di progettazione degli interventi.

Descrizione degli interventi

La grande rilevanza attribuita dal Magistrato alle Acque e dal suo concessionario Consorzio Venezia Nuova all'attività di studio trova la sua origine nella complessità insita nella definizione di un insieme di interventi con forti contenuti innovativi e inquadrati in una concezione sistemica dell'ambiente lagunare.
Dall'inizio della sua attività ad oggi, il Consorzio Venezia Nuova ha portato a compimento un rilevante programma di studi, compiutamente definito con il Piano generale degli studi del 1988, successivamente aggiornato in base alle conoscenze via via acquisite, riguardante circa 260 attività, già sostanzialmente realizzate.

La caratteristica principale della realizzazione di questo piano di studi è l'interdisciplinarietà dell'approccio adottato, che consente per la prima volta di inquadrare in una visione unitaria le complesse interrelazioni tra l'ambiente fisico, l'ambiente naturale e l'economia del territorio lagunare.

Il Consorzio Venezia Nuova, per realizzare questo compito, si è dotato di un nucleo di coordinamento altamente qualificato composto da esperti, interni alla struttura e consulenti, che definisce e programma le diverse fasi di sviluppo del piano di attività e garantisce il controllo della qualità dei risultati raggiunti.

Gli studi e le sperimentazioni realizzati nell'ambito del progetto di salvaguardia di Venezia hanno prevalentemente un carattere applicato e una finalità operativa strettamente connessa alla progettazione.
Questi studi si differenziano notevolmente dall'attività condotta dagli enti, come il CNR o le Università, che hanno svolto e svolgono ricerche relative al territorio lagunare. Generalmente, infatti, l'obiettivo di tale attività di ricerca non è la formazione di una conoscenza di tipo interdisciplinare con finalità operative, come è nel caso del Magistrato alle Acque e del Consorzio Venezia Nuova, bensì lo sviluppo di linee settoriali di ricerca su specifici aspetti di interesse dei singoli ricercatori o delle strutture cui essi fanno riferimento.
In questo senso, i risultati delle ricerche di enti e istituzioni sono il fondamento su cui si basano gli studi promossi dal Magistrato alle Acque per gli obiettivi della salvaguardia, i quali, invece, hanno principalmente lo scopo di fornire i necessari input all'attività di progettazione.

Lo sforzo compiuto con l'attuazione del Piano degli studi[2] non solo ha contribuito allo sviluppo della conoscenza dell'ecosistema veneziano, ma ha soprattutto consentito di mettere a punto un insieme di progetti ad alto contenuto innovativo al fine di affrontare compiutamente e in modo unitario tutte le grandi questioni della salvaguardia di Venezia.
Il Piano degli studi è stato concepito in maniera flessibile, per essere periodicamente aggiornato a seconda delle esigenze che si manifestano nello sviluppo dell'attività di sperimentazione e di progettazione.

2 La realizzazione del programma degli studi e delle sperimentazioni dello Stato tramite il Consorzio Venezia Nuova richiede il contributo di alcune Università, di centri di ricerca pubblici e privati operanti a livello nazionale e internazionale, dei maggiori laboratori in Italia e all'estero, di società di ingegneria, di studi professionali, oltre che dei principali esperti del settore.

Dal punto di vista del loro contenuto, gli studi possono essere classificati in:

Studi propedeutici agli interventi di salvaguardia fisica

Si tratta di *studi propedeutici alla progettazione* del sistema di interventi volti alla difesa fisica della laguna.

Riguardano, pertanto, le *opere di regolazione delle maree alle bocche di porto*, la *ristrutturazione dei moli* alle bocche di porto, il *rinforzo dei litorali*, le *difese locali dei centri abitati e delle "insulae"*.

Per questa tipologia di interventi, gli studi propedeutici sono già conclusi, trattandosi di interventi già tutti passati alla fase di progettazione esecutiva e realizzazione.
In questo modo, la realizzazione degli interventi, in relazione alla natura delle opere, è stata preceduta da approfondimenti storici con riferimento ai metodi costruttivi e ai materiali utilizzati ed è stata supportata da analisi, ricerche, sperimentazioni con modelli matematici e fisici con le quali sono stati valutati i complessi processi di interazione tra gli elementi fisici e la struttura delle opere, per l'ottimizzazione delle loro caratteristiche e per il loro dimensionamento.
Il complesso degli studi svolti per la progettazione preliminare, di massima e definitiva si può suddividere nelle tipologie di seguito elencate:

a) *campagne di indagini geognostiche, di rilievi batimetrici, correntometrici e ondametrici* svolte in laguna, alle bocche di porto, lungo i litorali e in prossimità dei moli foranei;

b) studi finalizzati alla conoscenza dell'idrodinamica e della propagazione del moto ondoso in laguna mediante *modelli matematici* della laguna di Venezia e delle tre bocche di Lido, Malamocco e Chioggia. In tale contesto è stato avviato lo sviluppo di un sistema di previsione dell'acqua alta e delle condizioni meteomarine, indispensabile alla gestione delle opere mobili. I modelli matematici nelle diverse tipologie oggi disponibili, con l'ulteriore fondamento che potrà ottenersi con nuove osservazioni e misure, potranno anche essere utilizzati per la futura gestione del sistema lagunare nei vari aspetti e implicazioni che presenta;

c) *modelli fisici* presso il Centro sperimentale per modelli idraulici di Voltabarozzo (Padova), che proprio a seguito dell'attività svolta per la salvaguardia di Venezia, oggi dispone di una attrezzatura che sicuramente lo qualifica come il più importante centro di ricerca italiano in questo campo.

Nel corso dello sviluppo dell'attività, sia per la modellistica matematica che per quella fisica, sono stati utilizzati, oltre al Centro sperimentale per modelli idraulici di Voltabarozzo (Padova), anche altri centri sperimentali specializzati in Italia e all'estero quali: Estramed (Pomezia - Roma), Danish Hydraulics Laboratory (Danimarca), Delft Hydraulics Institute (Olanda) e Hydraulics Research di Wallingford (Inghilterra), Danish Maritime Institute

L'insieme di queste attività ha consentito di acquisire un bagaglio di conoscenze non immaginabile fino a pochi anni fa per gli approfondimenti raggiunti, ma soprattutto per la coerenza con cui sono stati affrontati. Ciò ha consentito anche di mettere a punto e di calibrare sofisticati modelli matematici con i quali prevedere gli effetti prodotti con gli interventi.

Studi propedeutici agli interventi di salvaguardia ambientale

L'importanza che hanno assunto, nel quadro dell'azione di salvaguardia, gli interventi di riequilibrio ambientale trova una precisa corrispondenza nel piano degli studi sviluppato dal Magistrato alle Acque tramite il concessionario Consorzio Venezia Nuova, nell'ambito del quale un elevato numero di studi riguarda direttamente l'analisi dei processi inquinanti e delle condizioni dell'ecosistema.
E' stato, pertanto, possibile definire un programma generale di interventi di risanamento ambientale che non ha precedenti in Italia e che, per la sua qualità e dimensione, si colloca tra le esperienze più avanzate a livello internazionale.
Gli studi di carattere strettamente ambientale possono essere distinti in *studi di identificazione delle problematiche generali* e in *studi su aspetti specifici* dell'ecosistema, sia per quanto riguarda la morfologia lagunare, sia per quanto riguarda il processo di degrado ambientale. I primi costituiscono degli studi di inquadramento delle conoscenze e di ridefinizione in termini sistemici dell'approccio all'intervento di risanamento. Questi studi costituiscono il punto di arrivo di una serie molto ampia di analisi e di campagne di rilievi delle condizioni dell'ecosistema lagunare che riguardano la tendenza evolutiva della morfologia della laguna e le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche delle acque e dei sedimenti; i secondi riguardano, invece, aree della laguna o elementi settoriali dell'ambiente sui quali è necessario, a fini progettuali, condurre degli approfondimenti. Rientrano in questo ambito, ad esempio, lo studio degli effetti della navigazione interna sulla morfologia

lagunare o le prove condotte presso il centro Sperimentale di Voltabarozzo per verificare le strutture da collocare lungo le rive e i bordi delle barene, idonee ad assorbire il moto ondoso prodotto dai natanti e dal vento.
Maggiori dettagli sullo stato di attuazione sono riportati nelle singole schede per obiettivo.

3.2 Difesa dalle acque alte eccezionali
(interventi di cui all'art. 3 lettera a) legge n. 798/84)

Obiettivo
Attuare la difesa della laguna e dei centri abitati dalle alte maree eccezionali - ovvero quando il livello della marea in laguna supera la quota delle difese dei centri abitati -, fino a raggiungere i massimi livelli prevedibili in futuro, mediante la realizzazione di opere che separano, momentaneamente, la laguna dal mare.

Descrizione degli interventi
Il fenomeno delle acque alte a Venezia ha registrato, negli ultimi 50 anni, una rilevante evoluzione negativa, sia sotto il profilo della frequenza, sia dal punto di vista della sua durata e intensità.
La causa è da tempo nota: si tratta, principalmente, dell'effetto congiunto tra l'abbassamento del livello del suolo -23 cm (in parte dovuto a processi naturali ma soprattutto, fino agli anni '70, all'estrazione di acque per uso industriale dalle falde sotterranee), e l'innalzamento del livello medio del mare registrato in questo secolo.
A questi fenomeni se ne sono aggiunti altri che hanno contribuito a peggiorare le condizioni generali della morfologia lagunare: le alterazioni ambientali provocate dalle opere realizzate a fini industriali, come lo scavo del c. d. "canale dei petroli" e i vasti imbonimenti delle aree umide; il diffondersi di attività distruttive dell'ambiente, come la circolazione dei natanti a motore e la pesca secondo modalità non consentite.

La conseguenza di tutto ciò è stato l'aumento del rischio cui sono esposti Venezia e gli altri insediamenti storici del bacino lagunare di fronte a eventi mareali eccezionali e alla continua azione disgregatrice delle alte maree, che si verificano con crescente frequenza.

E' inoltre prevedibile che la situazione possa diventare ancora più critica in futuro per il sovrapporsi degli effetti del riscaldamento dell'atmosfera.
La complessità delle cause che nel tempo hanno messo a rischio i centri abitati lagunari ha indirizzato lo studio e la scelta della soluzione in grado di ricreare adeguate condizioni di sicurezza.
Si è previsto di attuare la difesa attraverso un piano organico di interventi che comprende le difese locali dagli allagamenti (vedi scheda specifica), gli interventi morfologici che, pur se in modo molto limitato, attenuano i livelli del mare in laguna (vedi scheda specifica) e le opere per isolare momentaneamente la laguna dal mare quando il livello di marea in laguna supera comunque la quota delle difese locali, fino a raggiungere i massimi livelli prevedibili in futuro.

Gli interventi previsti per la protezione di Venezia e della sua laguna dagli effetti delle alte maree eccezionali si incentrano sul sistema di opere mobili alle bocche di porto ("*Sistema MOSE*"), in grado di separare la laguna dal mare per il tempo necessario a evitare gli allagamenti degli abitati lagunari.

Il sistema delle opere di regolazione delle maree alle bocche di porto rappresenta nel campo dell'ingegneria un progetto originale e complesso. Il progetto di massima, presentato nel 1992, fu elaborato nel rispetto dei criteri indicati dal voto n. 209, espresso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nel 1982, secondo il quale le opere non devono alterare lo scambio idrico tra mare e laguna, per evitare effetti ambientali negativi, non devono costituire un ostacolo alla navigazione e, quindi, una penalizzazione delle importanti attività economiche ad essa collegate, non devono, infine, costituire un'alterazione del paesaggio.
Il progetto, formulato sulla base degli indirizzi e dei pareri originariamente espressi dal Comitato ex art. 4 Legge n. 798/84, tiene conto degli elementi, delle prescrizioni e delle indicazioni emerse in sede di approvazione del progetto di massima del 1992 e successivamente; di anni di confronti, approfondimenti e studi; dei recenti pareri e dei nuovi criteri espressi dalle Istituzioni competenti sul progetto definitivo.

Le opere progettate consistono, per ciascuna bocca di porto, nell'installazione di *dispositivi mobili* che si sollevano dalla posizione di riposo negli alloggiamenti sul fondale del canale di

bocca che si attivano quando il livello di marea supera i 110 cm rispetto al livello misurato al mareografo di Punta della Salute, e nella realizzazione di opere fisse, cosiddette *opere complementari*, (in ottemperanza a quanto richiesto dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 15 marzo 2001) atte ad aumentare gli attriti nei canali di bocca al fine di smorzare la vivacità delle correnti di marea, attenuando i livelli di quelle più frequenti.

I dispositivi mobili, collocati nei canali di bocca, rappresentano il cuore del sistema e sono costituiti da paratoie a ventola a spinta di galleggiamento, a scomparsa, ciascuna delle quali è costituita da un cassone in acciaio a sezione rettangolare, vuoto all'interno. Le paratoie, quando si trovano in posizione di riposo, sono trattenute sul fondo dal proprio peso e da quello dell'acqua che contengono e sono incernierate lungo un lato sulla struttura di fondazione. In caso di attivazione, le paratoie vengono svuotate dell'acqua mediante immissione di aria compressa e si sollevano per effetto della spinta di galleggiamento, formando una barriera contro la marea.
Il numero totale delle paratoie è 78 per le quattro schiere (Lido-Treporti 21, Lido S. Nicolò 20, Malamocco 19 e Chioggia 18). Il tempo medio di chiusura è di 4 o 5 ore, compresi i tempi di manovra per l'apertura e la chiusura delle paratoie. Con le paratoie in funzione, l'operatività del porto sarà sempre garantita dalla conca di navigazione per le grandi navi già in costruzione alla bocca di Malamocco.
Il sistema è in grado di proteggere la laguna e le sue città da maree fino a 3 metri, per cui potrà essere efficace anche in presenza di un rilevante aumento del livello del mare nei prossimi decenni. Il "Sistema MOSE", oltre alle opere sopra descritte in corso di realizzazione alle bocche di porto lagunari, comprende interventi complementari e connessi, quali le dighe foranee di fronte alle bocche di porto e le opere di ripristino morfologico all'interno del bacino lagunare.

Stato di attuazione al 31 dicembre 2006

Attività finanziate
Il "Sistema MOSE", in corso di realizzazione, riguarda la contemporanea costruzione delle opere relative alla regolazione delle maree alle bocche di porto della laguna di Venezia (Lido, Malamocco e Chioggia), delle opere complementari (dighe foranee

di fronte alle bocche di porto) e degli interventi morfologici strettamente connessi e funzionali alle opere alle bocche.

Fino al 31.12.2003, i finanziamenti resi via via disponibili per le opere alle bocche di porto sono stati impegnati e spesi per: la *progettazione preliminare di massima*; per la successiva *progettazione di massima*; per la realizzazione del prototipo in scala reale di una paratoia (*Modulo Sperimentale Elettromeccanico - MOSE*) e per l'effettuazione di prove sul campo, dal 1988 al 1992; per lo svolgimento dello *studio di impatto ambientale* (S.I.A.) delle opere stesse; per le *attività di approfondimento del progetto di massima* richieste dal Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo nella seduta dell'8 marzo 1999 e dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 15 marzo 2001; per la *progettazione definitiva* delle opere alle bocche di porto secondo quanto deliberato dal Comitato ex art. 4 Legge n. 798/84 nella seduta del 6 dicembre 2001; per una complessa e articolata serie di *studi e di sperimentazioni* propedeutici alle suddette progettazioni e attività; infine, per *avviare la progettazione esecutiva*, secondo quanto deliberato dal Comitato stesso nella seduta del 3 aprile 2003.

Si ricorda che il "Sistema MOSE" viene realizzato nell'ambito del rapporto concessorio in essere tra Ministero delle Infrastrutture - Magistrato alle Acque di Venezia e il Consorzio Venezia Nuova (Convenzione Generale rep. n. 7191/1991 e allegato Piano Generale degli Interventi) ed è ricompreso nel programma delle opere strategiche (delibera CIPE n. 121/2001 e successiva rivisitazione con delibera CIPE n. 130/2006) in attuazione della "Legge Obiettivo" n. 443/2001.
Si ritiene opportuno ripercorrere, in *Appendice*, i principali momenti approvativi del progetto delle opere di regolazione delle maree alle bocche di porto.

Per quanto riguarda la *progettazione esecutiva* del "Sistema MOSE", si ricorda che, nel 2003, il Magistrato alle Acque di Venezia, a seguito della deliberazione del Comitato ex art. 4 legge n. 798/84 del 3 aprile 2003, ha dato incarico al Consorzio Venezia Nuova di avviare la progettazione esecutiva per fasi.
Già nel corso del 2003, quindi, la progettazione esecutiva è stata avviata e, per le fasi i cui conseguenti lavori erano previsti con avvio nel 2004, era stata portata a completamento.

Nel corso del 2004, si sono quindi potute avviare le *prime opere alle bocche di porto*, una volta completato l'iter approvativo dei singoli stralci del progetto esecutivo.

Nel corso del 2005 e del 2006, sono proseguiti a pieno ritmo i lavori, contemporaneamente nelle bocche di porto, per la costruzione delle opere di regolazione delle maree. In particolare, la progettazione esecutiva delle opere finanziate nell'ambito della 1^ assegnazione di fondi al "Sistema MOSE", quale opera strategica, da parte del CIPE, è stata completata, tutte le relative opere sono già in corso di esecuzione, i lavori sono in pieno sviluppo e le principali attività si sono completate nel corso del 2006; è stata anche completata la progettazione esecutiva relativa a quelle opere che trovano finanziamento nell'ambito della 2^ assegnazione di fondi da parte del CIPE: tutte le relative opere sono in corso di esecuzione e le principali lavorazioni verranno sostanzialmente ultimate nel corso del 2007.
Dal 2007 si renderanno disponibili i fondi di cui alla 3^ assegnazione da parte del CIPE, garantendo così continuità ai cantieri in corso di realizzazione e consentendo di avviarne di nuovi, i cui stralci di progettazione esecutiva hanno già iniziato l'esame da parte dell'Amministrazione concedente alla fine del 2006.

La *costruzione del sistema di difesa dalle acque alte* prevede tre fasi di lavoro: la prima fase, già completata, consiste nella costruzione delle opere complementari e nell'esecuzione di una serie di interventi propedeutici (campi prove per il consolidamento dei fondali, indagini subacquee per rilevare eventuali presenze archeologiche, bonifiche da ordigni bellici, ecc.).
La seconda fase dei lavori, in avanzata realizzazione, comporta la costruzione delle opere cosiddette "di spalla" delle schiere di paratoie mobili (barriere) nelle bocche di porto, che comprendono anche i porti rifugio; le conche di navigazione per i pescherecci, per le imbarcazioni da diporto e per i mezzi di soccorso alle bocche di porto di Lido e Chioggia; la conca di navigazione per grandi navi alla bocca di porto di Malamocco.
La terza e ultima fase dei lavori, in corso di realizzazione, comporta la costruzione delle opere cosiddette "di barriera", che comprendono le protezioni dei fondali, i cassoni di alloggiamento delle paratoie e le opere civili funzionali ai cassoni stessi nonché la realizzazione e la messa in opera delle paratoie vere e proprie.

I lavori stanno procedendo contemporaneamente nelle tre bocche di porto. In particolare, sono in corso di realizzazione 32 fasi/stralci costruttivi, mentre 10 sono già stati completati.

Nella **bocca di Lido** si stanno realizzando i seguenti elementi strutturali:

1."PORTO RIFUGIO E CONCA DI NAVIGAZIONE"

1.1 Porto rifugio e conca di navigazione a Lido - Treporti: il porto rifugio di Treporti consentirà il ricovero e il transito, attraverso la conca di navigazione, delle imbarcazioni da diporto e dei mezzi di soccorso durante l'esercizio delle opere. Tale struttura comprende due bacini, uno lato mare, di più ampie dimensioni, e uno lato laguna, situati nella zona di Punta Sabbioni, collegati da una conca di navigazione, per consentire il transito delle imbarcazioni minori dalla bocca di porto di Lido verso Treporti, durante la chiusura dei varchi di Treporti e di S. Nicolò con le barriere mobili. Durante la fase di costruzione del porto rifugio, la parte lato mare verrà utilizzata provvisoriamente (tura) per la prefabbricazione dei cassoni di alloggiamento della schiera di paratoie da installarsi nel canale di Treporti. Relativamente al porto rifugio ed alla conca di navigazione, sono in corso di realizzazione le seguenti fasi/stralci dell'opera:

- *"Lido Treporti – Tura e porto rifugio, prima fase (OP/299)".* Finanziamento: 1^ assegnazione CIPE; progetto esaminato favorevolmente dal Comitato Tecnico di Magistratura nella seduta del 30 gennaio 2004; i lavori, in corso di esecuzione, prevedono: il rinforzo della sponda tra il molo nord ed il porto rifugio; la formazione di due terrapieni protetti da due dighe in massi naturali; le strutture provvisorie per l'utilizzo dell'area del futuro porto rifugio quale tura per la prefabbricazione dei cassoni di alloggiamento delle paratoie di Treporti; la prima fase del bacino rifugio nord; la formazione di due riempimenti nell'area della futura conca di navigazione.
- *"Lido Treporti – Porto rifugio, seconda fase – 1° stralcio (OP/360-1)". Finanziamento: 2^ assegnazione CIPE;* progetto esaminato nella seduta del 23 settembre 2005; i lavori, consistenti nei dragaggi all'interno del bacino nord (lato laguna) del porto rifugio e la protezione della sponda lato terra mediante la realizzazione di una scogliera, si sono conclusi nel mese di luglio 2006.
- *"Lido Treporti – Porto rifugio 2^ fase – Predisposizioni per la prefabbricazione dei cassoni(OP/360-2)".* Finanziamento: 3^

assegnazione CIPE; progetto esaminato nella seduta del 24 novembre 2006; i lavori consistono nella realizzazione delle piastre di fondazione dei cassoni di spalla e di soglia nella tura di prefabbricazione di Treporti.

- *"Lido Treporti – Conca per piccole imbarcazioni – Opere civili: porte e opere elettromeccaniche – 1° stralcio (OP/378-1)".* Finanziamento: 2^ assegnazione CIPE; progetto esaminato nella seduta del 26 gennaio 2006; vengono realizzati i palancolati metallici per la formazione delle pareti longitudinali della camera della conca, predisposte opere provvisionali per creare un piano di lavoro continuo intorno alle testate della conca e sostenere lo scavo, nonché la prima fase delle fondazioni delle testate.

2. "OPERE DI SPALLA"

2.1 Isola artificiale: "spalla" ovest di Treporti e "spalla" nord di S. Nicolò: si ricorda che, data l'ampiezza della bocca di porto e la presenza di due canali con profondità diverse, al Lido sono previste due schiere di paratoie: una sul canale di Treporti e una sul canale di San Nicolò, separate da un'isola artificiale che, oltre a costituire la "spalla" ovest della barriera di Treporti e la "spalla" nord della barriera di S. Nicolò, ospiterà anche gli edifici di controllo e gli impianti per il funzionamento delle opere. Relativamente all'isola artificiale, sono in corso di realizzazione le seguenti fasi/stralci dell'opera:

- *"Lido – Isola tra S. Nicolò e Treporti – prima fase A (OP/306)".* Finanziamento: 1^ assegnazione CIPE; progetto esecutivo esaminato favorevolmente dal Comitato Tecnico di Magistratura nella seduta del 23 aprile 2004. I lavori, consistenti sostanzialmente nella predisposizione delle opere di scogliera che delimitano il nucleo centrale dell'isola, si sono conclusi nel mese di luglio 2006.
- *"Lido – Isola tra S. Nicolò e Treporti - prima fase B (OP/353)".* Finanziamento: 2^ assegnazione CIPE; progetto esecutivo esaminato nella seduta del 21 luglio 2005. I lavori, consistenti nella realizzazione del canale di navigazione a tergo dell'isola, lato laguna, al fine di consentire il collegamento tra S. Nicolò e Treporti, e nel contemporaneo riempimento dell'isola, si sono conclusi nel mese di settembre 2006.
- *"Lido – Isola tra S. Nicolò e Treporti – seconda fase: Spalla lato Ovest della barriera di Treporti - 1° stralcio (OP/365-1)".* Finanziamento: 2^ assegnazione CIPE; progetto esecutivo esaminato nella seduta del 21 ottobre 2005. I lavori consistono nella realizzazione delle opere di sostegno, lungo l'isola artificiale

lato canale di Treporti, con funzioni di contenimento del terrapieno dell'isola, nel tratto che sarà interessato dal cassone di spalla, lato ovest, della barriera di Treporti.

- *"Lido – Isola tra S. Nicolò e Treporti – terza fase: Spalla Nord della barriera di S. Nicolò: cassoni andatori e scogliera lato mare (OP/388-1)".* Finanziamento: 2^ assegnazione CIPE; progetto esecutivo esaminato nella seduta del 24 marzo 2006; i lavori consistono nella costruzione e l'installazione dei cassoni cellulari prefabbricati in c.a. che permettono di realizzare le sponde dell'isola lato canale di S. Nicolò, quale spalla nord della barriera. Inoltre, vengono realizzate le opere in scogliera fino al raccordo con quella già realizzata lato mare. La soluzione messa a punto nel progetto per la spalla nord tiene conto della configurazione definita dallo IUAV nell'ambito dello "Studio di inserimento architettonico delle opere mobili alle bocche lagunari".

2.2 "Spalla" sud di S. Nicolò: la "spalla" sud della barriera che verrà realizzata a Lido – S. Nicolò interessa un tratto del molo sud della bocca di Lido. I principali edifici e dispositivi troveranno alloggio nella "spalla" nord situata sull'isola artificiale, tuttavia anche qui sono necessari importanti lavori di rinforzo e consolidamento e di creazione di "cassoni andatori" e di terrapieni in corrispondenza e a ridosso della zona ove la schiera di paratoie si congiungerà con il litorale. La soluzione messa a punto nel progetto per la spalla sud tiene conto della configurazione definita dallo IUAV nell'ambito dello "Studio di inserimento architettonico delle opere mobili alle bocche lagunari" e prevede la realizzazione di una piccola darsena per l'attracco delle imbarcazioni. Relativamente alla "spalla" sud, sono in corso di esecuzione le seguenti fasi/stralci dell'opera:

- *"Lido S. Nicolò – Spalla sud: rinforzo molo sud esistente (OP/301-301bis)".* Finanziamento: 1^ assegnazione CIPE; progetto esecutivo esaminato favorevolmente dal Comitato Tecnico di Magistratura nella seduta del 30 gennaio 2004. E' in corso la realizzazione di una nuova opera in scogliera, parallela a quella esistente, e il riempimento dello spazio intermedio con materiale proveniente da dragaggi. Le opere interessano la parte iniziale del molo per circa 1300 metri.
- *"Lido S. Nicolò – spalla sud 1^ stralcio (OP/367-1)".* Finanziamento: 2^ assegnazione CIPE; progetto esecutivo esaminato dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque nella seduta del 25 novembre 2005. Sono stati avviati i lavori di dragaggio e di consolidamento del fondale; verranno poi affondati

e zavorrati 34 cassoni prefabbricati in calcestruzzo armato (tra i quali i "cassoni andatori") che costituiscono la parte strutturale dell'opera, verso laguna e verso mare rispetto al cassone di spalla, che fungerà da raccordo con la barriera. Viene, infine, realizzato il terrapieno tra i cassoni e il molo sud, con le relative opere in scogliera.

2.3 "Spalla" est di Treporti: la "spalla" est di Treporti è costituita dalle opere di raccordo tra il futuro cassone di spalla ed i moli del porto rifugio di Treporti e assicura un prolungamento verticale a monte ed a valle della barriera, mediante la realizzazione di terrapieni e scogliere di collegamento. Relativamente alla spalla est, sono in corso di realizzazione le seguenti fasi/stralci dell'opera:

- *"Lido Treporti – Spalla Est e sistemazione – Opere civili 1^ fase (OP/410-1)".* Finanziamento: 3^ assegnazione CIPE; progetto esecutivo esaminato nella seduta del 29 settembre 2006. I lavori consistono nella realizzazione delle strutture che caratterizzano i terrapieni d'ala della spalla.

3. "OPERE DI BARRIERA"

3.1 Protezione dei fondali delle bocche di Lido - Treporti e Lido - S. Nicolò: gli interventi consistono nell'esecuzione dei dragaggi dei fondali e nel successivo versamento di materiale lapideo al fine di realizzare, sia verso mare che verso laguna, in adiacenza all'area dove troveranno alloggiamento i cassoni prefabbricati e le relative schiere di paratoie, la protezione dei fondali alle bocche di Treporti e di San Nicolò, predisposta al fine di evitare fenomeni di erosione dei fondali stessi in occasione delle operazioni di apertura e chiusura delle paratoie. Sono in corso le seguenti fasi/stralci dell'opera:

- *"Lido S. Nicolò - Barriera: protezione del fondale – 1^ fase (OP/312)".* Finanziamento: 1^ assegnazione CIPE; progetto esecutivo esaminato favorevolmente dal Comitato Tecnico di Magistratura nella seduta del 22 giugno 2004. Si tratta delle protezioni dei fondali della bocca di S. Nicolò, ad esclusione delle aree immediatamente adiacenti alle spalle e alla zona ove verranno ubicati i cassoni di alloggiamento delle paratoie; vengono anche realizzati dragaggi per raccordare il livello di progetto con quello attuale.
- *Lido S. Nicolò – Barriera: protezione del fondale – 2^ fase (OP/390-1)".* Finanziamento: 2^ assegnazione CIPE; progetto esecutivo esaminato favorevolmente dal Comitato Tecnico di

Magistratura nella seduta del 24 marzo 2006. Si tratta delle protezioni dei fondali nella zona adiacente alla spalla sud, sia lato mare che lato laguna, e nella zona in prossimità della spalla nord lato mare.

- *"Lido Treporti - Barriera: protezione del fondale", (OP/359-1).* Finanziamento: 2^ assegnazione CIPE; progetto esecutivo esaminato favorevolmente dal Comitato Tecnico di Magistratura nella seduta del 23 settembre 2005; lavori relativi alla protezione dei fondali della bocca di Treporti, ad esclusione delle aree immediatamente adiacenti alle spalle e alla zona ove verranno ubicati i cassoni di alloggiamento delle paratoie.

3.2 Infissione dei palancolati, preparazione dei recessi e opere civili della barriera: le opere consistono nell'infissione dei palancolati di sostegno agli scavi di fondazione, nella realizzazione dei recessi, nel consolidamento dei terreni di fondazione e nella costruzione e posa dei cassoni in c.a., sui quali verranno poi alloggiate le paratoie mobili. Relativamente alle opere funzionali alla barriera di Lido-S. Nicolò, sono in corso di esecuzione le seguenti fasi/stralci dell'opera:

- *"Lido S. Nicolò – Barriera: Palancolato per i recessi (OP/389-1)".* Finanziamento: 2^ assegnazione CIPE; progetto esecutivo esaminato dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque nella seduta del 24 marzo 2006; i lavori sono relativi alla realizzazione del palancolato di sostegno agli scavi di fondazione per le strutture di barriera, allo scavo all'interno del palancolato e al consolidamento del terreno di fondazione, lato mare e lato laguna, dei cassoni "andatori" previsti a ridosso del palancolato della spalla nord.

ATTIVITA' FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE
Realizzazione di aree di produzione funzionali alla costruzione delle opere: si tratta di strutture da utilizzarsi quale base logistica e operativa delle attività di cantiere, nonché per lo stoccaggio dei materiali e l'accosto dei natanti da lavoro.
Sono in corso di esecuzione le seguenti fasi/stralci dell'opera:

- *"Lido - S. Nicolò: aree di produzione: realizzazione banchina accosto natanti (OP/354-1)".* Finanziamento: 2^ assegnazione CIPE; progetto esecutivo esaminato dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque nella seduta del 21 luglio 2005. I lavori, consistenti nella realizzazione di una banchina per lo stoccaggio e la movimentazione dei materiali e le opere di cantiere connesse, si sono conclusi nel mese di giugno 2006.

- *"Lido - S. Nicolò: aree di produzione: base operativa trasferimento cassoni da Taranto a Venezia (OP/354-2)".* Finanziamento: 2^ assegnazione CIPE; progetto esecutivo esaminato dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque nella seduta del 21 aprile 2006, che consiste nel trasporto fino in laguna dei cassoni andatori prefabbricati in un impianto fisso situato nel porto di Taranto.

Realizzazione di campi prova sperimentali: si tratta di una serie di prove in sito e in laboratorio progettate per verificare la metodologia dei trattamenti studiati per i terreni di fondazione delle opere alle bocche, tesi a migliorarne le caratteristiche geotecniche.
E' stata eseguita la seguente opera:

- *"Lido Campo prova pali di fondazione (OP/294)".* Finanziamento: fondi Legge Speciale per Venezia; lavori conclusi ad agosto 2005, relativi al progetto esecutivo esaminato dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque nella seduta del 17 ottobre 2003. Sono stati realizzati un campo prove a mare ed uno a terra, a S. Nicolò.

Nella **bocca di Malamocco** si stanno realizzando i seguenti elementi strutturali:

1. "DIGA FORANEA E CONCA DI NAVIGAZIONE"

1.1 Diga foranea: la diga foranea di fronte alla bocca di Malamocco svolge una duplice funzione: contribuire ad aumentare l'effetto dissipativo della marea entrante, come richiesto dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 15.03.2001 e dalla deliberazione del Comitato ex art. 4 legge 798/1984 nella seduta del 6.12.2001; proteggere la conca di navigazione e il relativo canale di accesso dal moto ondoso.

- *"Malamocco – Diga foranea di fronte alla bocca di porto (OP/269 e OP/269 bis)".* Finanziamento: fondi Legge Speciale per Venezia. I lavori, in corso dal 2003, si sono conclusi nel mese di ottobre 2006.

1.2. Conca di navigazione per grandi navi: la conca di navigazione alla bocca di porto di Malamocco è prevista, come richiesto dall'Autorità Portuale di Venezia, per consentire il passaggio delle grandi navi durante l'operatività del sistema di difesa dalle acque alte. La conca è predisposta per accogliere, sia le grandi navi, che i rimorchiatori di appoggio e consente il transito

a imbarcazioni con lunghezza fino a 280 metri, larghezza massima di 39 metri e pescaggio fino a 12 metri.

L'opera si presenta costituita dai seguenti componenti principali:

- camera della conca;
- porte e relativo sistema di movimentazione;
- strutture di alloggiamento e soglie di scorrimento delle porte;
- strutture guida alle imboccature;
- sistemi di alimentazione, manovra e controllo delle porte e relativi locali tecnici e cabina di controllo;
- arredi marini, impianti ausiliari e di servizio;
- opere di sostegno del territorio lungo il canale di accesso lato laguna.

Sono in corso di realizzazione le seguenti fasi/stralci dell'opera:

- *"Malamocco – Conca di navigazione: opere civili della camera della conca (OP/300)".* Finanziamento: 1^ assegnazione CIPE; progetto esaminato favorevolmente dal Comitato Tecnico di Magistratura nella seduta del 30 gennaio 2004. La realizzazione della conca è iniziata con la costruzione della "camera", che ne rappresenta l'elemento strutturale principale attraverso il quale transitano, appunto, le navi. La camera ha dimensioni interne di 380 metri x 50 metri ed è delimitata da pareti longitudinali laterali chiuse alle estremità da porte in acciaio.
- *"Malamocco – Opere di protezione della sponda del territorio lato Forte S. Pietro, prima fase (OP/316)".* Finanziamento: 1^ assegnazione CIPE; progetto esaminato favorevolmente da parte del Comitato Tecnico di Magistratura nella seduta del 19 luglio 2004. Gli interventi riguardano la realizzazione di opere di sostegno del terreno lungo il canale di accesso alla conca, lato laguna, e, in particolare, di una protezione in scogliera al piede del murazzo storico e del muro del Forte di S. Pietro, sull'isola di Pellestrina.
- *"Malamocco – Opere di protezione della sponda del territorio lato Forte S. Pietro, seconda fase (OP/326)".* Finanziamento: 1^ assegnazione CIPE; progetto esaminato favorevolmente dal Comitato Tecnico di Magistratura nella seduta del 21 dicembre 2004. Sono in corso le attività di esecuzione dei micropali in corrispondenza dello sperone del Forte San Pietro e il restauro statico-architettonico del muro storico. Le altre fasi dei lavori sono conseguenti alla risoluzione di alcune interferenze con sottoservizi situati nella bocca di Malamocco.
- *"Malamocco – Conca di navigazione: opere civili per l'alloggiamento delle porte e delle strutture guida (OP/355-1)".* Finanziamento: 2^ assegnazione CIPE; progetto esaminato nella

seduta del 21 luglio 2005. I lavori consistono nella realizzazione delle strutture delle soglie e di alloggiamento delle porte, quando aperte, lato mare e lato laguna.

- *"Malamocco - Conca di navigazione: opere civili per l'alloggiamento delle porte e delle strutture guida (OP/355-2A)".* Finanziamento: 3^ assegnazione CIPE; progetto esaminato nella seduta del 19 dicembre 2006. I lavori consistono nella realizzazione delle opere in cemento armato della testata lato mare della conca, il sistema di puntonamento, l'impianto di aggottamento e la gestione dell'aggottamento per tutto il periodo necessario alla realizzazione di tali opere e il dragaggio previsto in corrispondenza della testata lato mare.
- *"Malamocco - Conca di navigazione: dragaggio bacino di evoluzione della conca (OP/413-1)".* Finanziamento: 3^ assegnazione CIPE; progetto esaminato nella seduta del 20 ottobre 2006. I lavori consistono nel completamento del dragaggio fino a quota -14,00 m s.l.m.m del bacino precedentemente dragato per la realizzazione del terrapieno per la prefabbricazione dei cassoni.

2. "OPERE DI SPALLA"

2.1 "Spalla" sud della barriera di Malamocco: la spalla sud costituisce la spalla principale della barriera di Malamocco, ove saranno ubicati gli edifici e gli impianti per la gestione sia della barriera che della conca di navigazione. Si tratta di una struttura nuova da realizzarsi tra la costruenda conca di navigazione e il prolungamento, in fase di costruzione, del molo sud nel tratto parallelo alla conca stessa. E' in corso di realizzazione il seguente stralcio dell'opera:

- *"Malamocco: spalla sud della barriera - 1° stralcio (OP/374-1)".* Finanziamento: 2^ assegnazione CIPE; i lavori, relativi al progetto esecutivo esaminato dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque nella seduta del 20 dicembre 2005. Consistono nella realizzazione del palancolato e nelle opere di completamento e rinforzo del tratto di molo a ridosso e in corrispondenza della zona ove si innesterà la barriera di Malamocco.

2.2 "Spalla" nord della barriera di Malamocco: la spalla nord si compone delle opere di conterminazione del recesso di barriera, della spalla propriamente detta, nonché dei lavori necessari per il rinforzo del molo nord esistente, nel tratto verso laguna.
Sono in corso di realizzazione i seguenti stralci dell'opera:

- *"Malamocco: spalla nord della barriera - 1° stralcio (OP/391-1)"*. Finanziamento: 2^ assegnazione CIPE; i lavori, relativi al progetto esecutivo esaminato dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque nella seduta del 24 marzo 2006; consistono nella realizzazione del rinforzo del molo nord esistente.
- *Malamocco: spalla nord della barriera - 1° stralcio (OP/391-2)"*. Finanziamento: 2^ assegnazione CIPE; i lavori, relativi al progetto esecutivo esaminato dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque nella seduta del 21 aprile 2006; consistono nella costruzione del palancolato di ancoraggio.

3. "OPERE DI BARRIERA"

3.1 Opere per la prefabbricazione dei cassoni di alloggiamento delle barriere: si tratta della realizzazione del sito ove troverà ubicazione l'impianto per la prefabbricazione dei cassoni di spalla e di alloggiamento delle barriere di Malamocco e Lido S. Nicolò. Il sito dove sorgerà il cantiere è ubicato a ridosso della radice del molo sud della bocca di Malamocco, in adiacenza alla costruenda conca di navigazione. E' in corso il seguente stralcio dell'opera:

- *"Infrastrutture per la prefabbricazione dei cassoni di Malamocco e di S. Nicolò - 1° stralcio (OP/373-1)"*. Finanziamento: 2^ assegnazione CIPE: il progetto è stato esaminato dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque nella seduta del 20 dicembre 2005; i lavori consistono nella realizzazione del rilevato, e delle opere di conterminazione, utilizzando il materiale dragato alla bocca di Malamocco per la costruzione dei canali di accesso alla conca di navigazione, nella zona a mare a ridosso del molo foraneo sud esistente a Malamocco, per realizzare il piazzale adibito ad area di prefabbricazione, stoccaggio e movimentazione dei cassoni di spalla e di soglia delle barriere di Malamocco e di S. Nicolò.

3.2 Protezione dei fondali della bocca di Malamocco: gli interventi consistono nell'esecuzione dei dragaggi dei fondali e nel successivo versamento di materiale lapideo al fine di realizzare, sia verso mare che verso laguna, in adiacenza all'area dove troveranno alloggiamento i cassoni prefabbricati e le relative schiere di paratoie, la protezione dei fondali, predisposta al fine di evitare fenomeni di erosione dei fondali stessi in occasione delle operazioni di apertura e chiusura delle paratoie. Sono in corso le seguenti fasi/stralci dell'opera:

- *"Malamocco – Barriera: protezione dei fondali (OP/414-1)". Finanziamento:* 3^ assegnazione CIPE; progetto esecutivo esaminato favorevolmente dal Comitato Tecnico di Magistratura nella seduta del 24 novembre 2006. Si tratta delle protezioni dei fondali della bocca di Malamocco, ad esclusione delle aree immediatamente adiacenti alle spalle, alla sponda del forte S. Pietro e alla zona ove verranno ubicati i cassoni di alloggiamento delle paratoie.

3.3 Infissione dei palancolati, preparazione dei recessi e opere civili della barriera: le opere consistono nell'infissione dei palancolati di sostegno agli scavi di fondazione, nella realizzazione dei recessi, nel consolidamento dei terreni di fondazione e nella costruzione e posa dei cassoni in c.a., sui quali verranno poi alloggiate le paratoie mobili. Relativamente alle opere funzionali alla barriera di Malamocco, sono in corso di esecuzione le seguenti fasi/stralci dell'opera:

- *"Malamocco – Barriera: Palancolato per i recessi 1^ fase (OP/415-1)".* Finanziamento: 2^ assegnazione CIPE; progetto esecutivo esaminato dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque nella seduta del 24 novembre 2006; i lavori sono relativi alla realizzazione del palancolato di sostegno agli scavi di fondazione per le strutture di barriera di Malamocco.

ATTIVITA' FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE

Realizzazione di aree di produzione funzionali alla costruzione delle opere: si tratta di realizzare le strutture da utilizzarsi quale base logistica-operativa delle attività di cantiere, nonché per lo stoccaggio dei materiali e l'accosto dei natanti da lavoro. Sono in corso di esecuzione i lavori relativi a:

- *"Malamocco – Aree di produzione, primo stralcio: piarda di selezione dei materiali (OP/356-1)".* Finanziamento: 2^ assegnazione CIPE; progetto esecutivo esaminato nella seduta del 21 luglio 2005; i lavori, consistenti nella costruzione di un piazzale provvisionale attrezzato, alla radice del molo nord, per la selezione e la movimentazione del materiale, si sono conclusi nel mese di agosto 2006.
- *"Malamocco – Aree di produzione, secondo stralcio: Terminal di Malamocco (OP/356-2)".* Finanziamento: 2^ assegnazione CIPE; progetto esecutivo esaminato nella seduta del 21 ottobre 2005. Viene realizzata una banchina di attracco, di scarico e di stoccaggio temporaneo, in corrispondenza del molo sud della bocca, lato mare.

Risoluzione interferenze con sottoservizi: si tratta di provvedere allo spostamento dei servizi (linee elettriche, acqua e gas) che risultano interferenti con la realizzazione delle opere alla bocca di Malamocco e il passaggio delle linee elettriche di alimentazione degli impianti della bocca di Malamocco e dell'anello di distribuzione e collegamento con le altre bocche:

- *"Malamocco – Cavidotti di attraversamento per linee elettriche (OP/397)".* Finanziamento: 1^ assegnazione CIPE; progetto esecutivo esaminato nella seduta del 21 aprile 2006; i lavori consistono nella realizzazione, mediante trivellazione teleguidata, di una polifora per il contenimento dei cavi elettrici ENEL e di altri a supporto della barriera di Malamocco.
- *"Malamocco – Cavidotti di attraversamento per linee elettriche, acqua e gas (OP/401)".* Finanziamento: 2^ assegnazione CIPE; progetto esecutivo esaminato nella seduta del 26 maggio 2006; i lavori consistono nella realizzazione, mediante trivellazione teleguidata, delle polifore contenenti i tubi dell'acquedotto e del gas, oltre a ulteriori cavidotti per linee elettriche necessarie al funzionamento della barriera di Malamocco.

Nella **bocca di Chioggia** si stanno realizzando i seguenti elementi strutturali:

1. "DIGA FORANEA, PORTO RIFUGIO E CONCHE DI NAVIGAZIONE"

1.1 Diga foranea: la diga foranea di fronte alla bocca di Chioggia contribuisce ad aumentare l'effetto dissipativo della marea entrante, conformemente a quanto richiesto dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 15.03.2001 e dalla deliberazione del Comitato ex art. 4 legge 798/1984 nella seduta del 6.12.2001.

- *"Chioggia – Diga foranea di fronte alla bocca di porto (OP/276 e OP/276 bis)".* Finanziamento: fondi Legge Speciale per Venezia e 1^ assegnazione CIPE. I lavori, in corso dal 2003, si sono conclusi nel mese di ottobre 2006.

1.2 Porto rifugio: Il porto rifugio, situato sulla sponda nord della bocca di porto, è stato previsto per consentire il ricovero e il transito, attraverso due conche di navigazione affiancate, dei pescherecci, delle imbarcazioni da diporto e dei mezzi di soccorso durante la temporanea chiusura della bocca di porto in situazione di acqua alta. Il porto rifugio è diviso dalle conche di navigazione in due bacini, uno lato mare e uno lato laguna. Il bacino lato mare verrà provvisoriamente utilizzato come "tura" per la

prefabbricazione dei cassoni di alloggiamento della barriera di Chioggia.

Sono in corso di realizzazione le seguenti fasi/stralci dell'opera:

- *"Chioggia – Porto Rifugio: scogliera sud del porto rifugio – 1^ fase (OP/298)".* Finanziamento: 1^ assegnazione CIPE; progetto esaminato favorevolmente da parte del Comitato Tecnico di Magistratura nella seduta del 30 gennaio 2004. Sono in corso i lavori, per la realizzazione della scogliera che delimiterà, lungo il canale di bocca, il bacino lato mare, per lo sviluppo di circa 260 metri.
- *"Chioggia – Porto Rifugio: bacino lato laguna (OP/334)".* Finanziamento: 2^ assegnazione CIPE; progetto esaminato nella seduta del 21 gennaio 2005; vengono realizzate le opere che delimitano il bacino lato laguna del porto rifugio, sia verso il canale di bocca che verso il territorio di Caroman, nonché i riempimenti dei terrapieni necessari a raccordare l'opera con le altre strutture. Viene realizzato anche il dragaggio del bacino interno.
- *"Chioggia – Porto rifugio: bacino lato mare/tura (OP/357-1)".* Finanziamento: 2^ assegnazione CIPE; progetto esecutivo esaminato dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque nella seduta del 23 settembre 2005. Il progetto riguarda sia la realizzazione del bacino lato mare del porto rifugio, sia la sua configurazione e predisposizione come "tura" per la prefabbricazione dei manufatti in calcestruzzo di alloggiamento della barriera di Chioggia; in particolare questo stralcio prevede la costruzione delle scogliere lato mare e lato canale, delle banchine sud e ovest della tura, dei palancolati di conterminazione, la demolizione del molo esistente.
- *"Chioggia – Porto rifugio: bacino lato mare/tura (OP/357-2A)".* Finanziamento: 2^ assegnazione CIPE; progetto esecutivo esaminato dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque nella seduta del 15 giugno 2006. Questo stralcio prevede in particolare la realizzazione del palancolato e lo scavo del bacino creato.
- *"Chioggia – Porto rifugio: bacino lato mare/tura (OP/357-2B)".* Finanziamento: 2^ assegnazione CIPE; progetto esecutivo esaminato dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque nella seduta del 20 ottobre 2006. Questo stralcio prevede in particolare lo svuotamento del bacino e le opere di finitura.

1.3. Conche di navigazione per pescherecci: nel porto rifugio da realizzare nella bocca di Chioggia sono previste due conche di navigazione affiancate, per piccole imbarcazioni e pescherecci,

aventi lunghezza utile di 134 m, larghezza di 16 m e profondità di 5,00 m s.l.m.m.. La lunghezza è stata definita in modo tale da permettere il transito di un numero di pescherecci pari al valore di punta dei rientri nella situazione attuale, per garantire, cioè, il passaggio di circa 100 pescherecci all'ora, come richiesto dal Comune di Chioggia. La larghezza di 16 m permette di affiancare, all'interno della conca, un'imbarcazione da 26 x 6,5 m a due da 15 x 4 m. Sono in corso di realizzazione le seguenti fasi/stralci dell'opera:

- *"Chioggia - Conche: opere civili (OP/303)".* Finanziamento: 1^ assegnazione CIPE; progetto esaminato favorevolmente dal Comitato Tecnico di Magistratura nella seduta del 27 febbraio 2004. Gli interventi riguardano la costruzione delle "camere", ovvero degli elementi strutturali principali delle conche, quelli attraverso i quali transitano le imbarcazioni. Le camere hanno dimensioni interne nette di 130 x 16 metri e sono delimitate da pareti longitudinali laterali chiuse alle estremità da porte.

2. "OPERE DI SPALLA"

2.1 "Spalla" nord della barriera di Chioggia: la "spalla" nord della barriera della bocca di Chioggia dovrà raccordarsi con le strutture di nuova costruzione, lungo il canale di bocca lato Cà Roman, relative al porto rifugio, nel tratto in cui verranno realizzate le due conche di navigazione parallele. E' in corso il seguente stralcio dell'opera:

- *"Chioggia - Spalla lato Nord", (OP/352-1).* Finanziamento: 2^ assegnazione CIPE; progetto esecutivo esaminato nella seduta del 21 luglio 2005; i lavori consistono nella realizzazione di banchine e strutture di raccordo fra la zona che ospiterà il cassone di "spalla" della barriera e i terrapieni in fase di costruzione per le conche di navigazione.

3. "OPERE DI BARRIERA"

3.1 Protezione del fondale in prossimità della barriera di Chioggia: gli interventi consistono nella realizzazione di una protezione in materiale lapideo da predisporre, sia lato mare che lato laguna, sul fondale del canale di bocca in prossimità della zona dove verrà installata la schiera di paratoie, al fine di evitare fenomeni di erosione in occasione delle manovre di apertura e chiusura delle paratoie stesse. E' in corso il seguente stralcio dell'opera:

- *"Chioggia - Protezione del fondale", (OP/358-1A).* Finanziamento: 2^ assegnazione CIPE; progetto esecutivo

esaminato dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque nelle sedute del 23 settembre 2005 e del 15 giugno 2006. In questo stralcio, come ridefinito, si esegue il dragaggio limitatamente alla parte centrale dell'area di bocca.

ATTIVITA' FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE

Realizzazione di aree di produzione funzionali alla costruzione delle opere: si tratta di realizzare le strutture da utilizzarsi quale base logistica-operativa delle attività di cantiere, nonché per lo stoccaggio dei materiali e l'accosto dei natanti da lavoro.

Sono in corso i lavori relativi a:

- *"Chioggia – Aree di produzione e segnalamenti luminosi – 1° stralcio (OP/372-1)".* Finanziamento: 2^ assegnazione CIPE; progetto esecutivo esaminato dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque nella seduta del 20 dicembre 2005. Si tratta della realizzazione di una piarda provvisoria per la movimentazione, lo stoccaggio e la selezione dei materiali.

Realizzazione di campo prova sperimentale: si tratta di una serie di prove in sito e in laboratorio progettate per verificare la metodologia dei trattamenti studiati per i terreni di fondazione delle opere alle bocche, tesi a migliorarne le caratteristiche geotecniche.

Sono in corso i lavori relativi a:

- *"Chioggia – Campo prova (OP/379)".* Finanziamento: 2^ assegnazione CIPE; progetto esecutivo esaminato dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque nella seduta del 21 gennaio 2006. Si tratta della realizzazione del campo prova per la realizzazione del consolidamento dei terreni di fondazione dei cassoni di alloggiamento delle paratoie.

Risoluzione interferenze con sottoservizi: si tratta di provvedere allo spostamento dei servizi (linee elettriche) che risultano interferenti con la realizzazione delle opere alla bocca di Chioggia e il passaggio delle linee elettriche di alimentazione degli impianti della bocca di Chioggia:

- *"Chioggia – Cavidotti di attraversamento per linee elettriche (OP/349)".* Finanziamento: 1^ assegnazione CIPE; progetto esecutivo esaminato nella seduta del 20 maggio 2005; i lavori, relativi alla realizzazione, mediante trivellazione teleguidata, di una polifora per il contenimento dei cavi elettrici ENEL e di altri a

supporto della barriera di Chioggia, si sono conclusi nel mese di maggio 2006.

Il progetto delle opere alle bocche di porto per la difesa dalle acque alte e la realizzazione dei relativi interventi hanno sempre tenuto conto, tra l'altro, dell'attività portuale, sia in termini di accessibilità attraverso i canali di bocca, che in relazione alla sicurezza della navigazione. Fin dalle prime fasi progettuali si è proceduto confrontando tra loro le necessità funzionali del porto e le necessità costruttive e operative della "salvaguardia", in modo da assicurare la massima compatibilità tra le differenti esigenze. Il Magistrato alle Acque, d'intesa con i Soggetti che operano in ambito portuale, ha messo a punto una serie di accorgimenti gestionali, di sistemi di sicurezza, di strumenti informatici, in grado di migliorare le condizioni operative del porto stesso e di ottimizzarne le potenzialità, rappresentando al tempo stesso un elemento di qualificazione professionale per gli operatori coinvolti. Il Magistrato alle Acque, pertanto, attraverso il Consorzio Venezia Nuova, ha realizzato al Lido di Venezia (in località Alberoni) un Centro di Simulazione della Navigazione, con il duplice obiettivo di rendere disponibile uno strumento indispensabile durante le fasi di costruzione e di gestione delle opere mobili alle bocche di porto, in quanto in grado di verificare la sicurezza della navigazione nei canali di accesso alla laguna nelle diverse condizioni ambientali, nonché di istituire una sede attrezzata in grado di raccogliere le esigenze di formazione e addestramento dei piloti per l'intera area mediterranea. Il Centro è stato inaugurato il 4 maggio del 2005 ed è dotato di un simulatore *Full Mission*, appartenente alla famiglia dei *Real Time Simulator* che consente l'esecuzione delle manovre da un ponte di comando "virtuale" dove sono riprodotti i comandi e gli strumenti di navigazione presenti nelle sale di comando reali.

Attività da finanziare

Al 31 dicembre 2006 risulta da finanziare il completamento dei lavori alle bocche di porto per la regolazione dei flussi di marea, e degli interventi connessi, secondo il piano di realizzazione e di finanziamento definiti nell'ambito dell'atto aggiuntivo rep. n. 8067/2005 alla Convenzione Generale che introduce il "prezzo chiuso".

Di seguito il dettaglio degli importi finanziati e il grafico con lo stato di attuazione dei finanziamenti (importi espressi in Mln di €).

DIFESA DALLE ACQUE ALTE ECCEZIONALI

Importi in milioni di €

	Fabbisogno Totale	Importi finanziati	Importi realizzati, in corso di realizzazione e di prossimo avvio	Importi spesi	Fabbisogno residuo da finanziare
Attività propedeutiche già concluse prima dell'avvio dell'esecutivo (a misura)	195,724	195,724	195,724	192,718	0,000
Somme disposizione / Revisione prezzi	1,034	1,034	1,034	1,034	0,000
TOTALE PARZIALE	196,759	196,759	196,759	193,752	0,000
Progettazione esecutiva (parte) e realizzazione opere complementari (a misura)	111,729	111,729	107,992	107,992	0,000
Progettazione esecutiva (parte) e prime fasi di realizzazione delle opere alle bocche di porto, comprese attività connesse (1^ Delibera CIPE a misura)	450,000	450,000	438,638	376,000	0,000
Progettazione esecutiva (parte), realizzazione opere alle bocche di porto, interventi morfologici e altre attività strettamente connesse e collegate (da prezzo chiuso)	3.709,897	(*) 1.018,100	804,928	638,213	2.691,797
TOTALE PARZIALE	4.271,626	1.579,829	1.351,558	1.122,205	2.691,797
TOTALE GENERALE	**4.468,385**	**1.776,588**	**1.548,317**	**1.315,958**	**2.691,797**

(*) Gli importi finanziati tengono conto della 3^ assegnazione di fondi da parte del CIPE (380 Meuro, deliberazione n. 74 del 29.03.2006) che si renderanno disponibili nel corso del 2007.

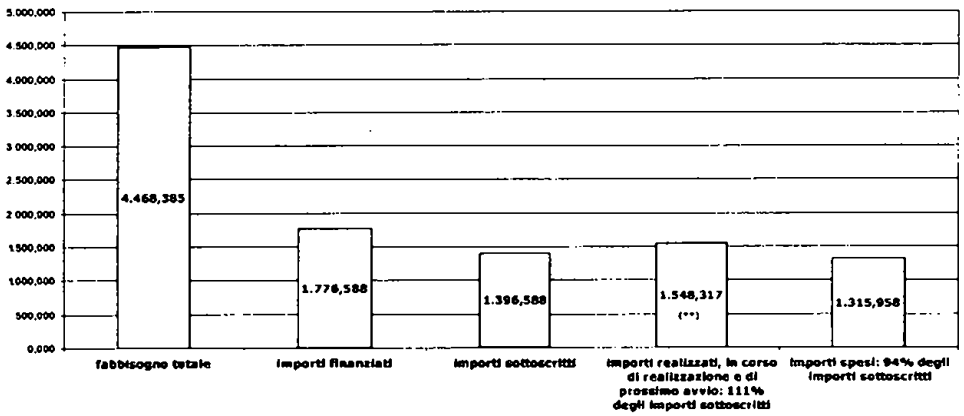

(**) L'importo tiene conto anche di attività già approvate, cantierizzabili, con finanziamento ancora non perfezionato.

3.3 Difesa dalle acque medio-alte
(Interventi di cui all'art. 3 lettera a); c) legge n. 798/84)

Obiettivo

Gli interventi di difesa locale degli abitati lagunari e dei centri storici di Venezia e di Chioggia sono finalizzati alla difesa dalle acque medio-alte fino alla quota di salvaguardia assicurata dalla futura gestione degli interventi alle bocche di porto per la regolazione delle maree.

Descrizione degli interventi

La difesa locale dei centri urbani è un ampio e articolato piano di messa in sicurezza degli abitati correlato alla futura gestione delle opere mobili.

Negli ultimi decenni, le maree superiori a +80 centimetri sul livello medio del mare misurato a Punta della Salute si sono verificate, in media, 45 volte all'anno rispetto alle 7-8 volte dell'inizio del secolo. Piazza San Marco viene, in parte, già allagata quando la marea supera +60 centimetri sul livello medio del mare misurato a Punta della Salute, assunto come riferimento. Il ripetersi degli allagamenti causa numerosissimi disagi per la popolazione, una pericolosa e lenta aggressione alle strutture architettoniche ed edilizie e impedimenti alle attività economiche.

Le opere mobili alle bocche di porto sono in grado di difendere Venezia dalle alte maree per qualsiasi livello di marea. Una limitazione della frequenza di chiusura delle bocche può, tuttavia, consentire di ridurre la penalizzazione della navigazione e dello scambio idrico mare-laguna. Per questo motivo è stato progettato un insieme di interventi di difesa locale dei centri abitati lagunari. Essi consentono la difesa da alte maree fino a quote compatibili con la struttura degli abitati attraverso il rinforzo e il rialzo delle sponde, talvolta della quota delle pavimentazioni, e mediante la realizzazione di barriere antinfiltrazione.

La tematica delle difese locali delle terre emerse è stata considerata già anche in sede di definizione dello studio di fattibilità e progetto di massima delle opere di salvaguardia di Venezia e della laguna ultimato nel 1981, il cosiddetto "Progettone".
Nell'esame del "Progettone", effettuato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e conclusosi con il voto di approvazione del 27 maggio 1982 (voto n. 209), le difese locali delle terre emerse vennero già da allora considerate complementari alle opere di controllo delle maree da realizzare alle bocche di porto.

Analoghi orientamenti riguardanti la complementarietà di interventi locali ed interventi alle bocche di porto sono sempre stati ribaditi in modo esplicito da tutti gli atti legislativi e dai documenti che hanno accompagnato le fasi di progettazione degli interventi di salvaguardia, dopo l'approvazione della Legge 798/84.

Il *Piano Generale degli Interventi* del 1991 a questo riguardo prevede l'esecuzione di interventi sulle "insulae" del centro storico di Venezia, la cui fattibilità tecnico-economica è stata successivamente verificata mediante uno specifico studio, e la realizzazione degli interventi di difesa locale nelle zone di Treporti, Pellestrina, Malamocco, S. Pietro in Volta, Sottomarina, Burano, S. Erasmo, nonché la realizzazione di marginamenti lagunari in zone residenziali e in zone agricole.

Gli studi, le indagini e gli interventi eseguiti in questi anni hanno avuto lo scopo di individuare, mettere a punto e realizzare le soluzioni appropriate per la difesa delle preziosissime tipologie urbane storiche lagunari, sulla base di un'attenta analisi della plurisecolare tradizione di trasformazione e di riadeguamento delle quote e dei marginamenti delle isole di cui i centri urbani lagunari sono composti.
In particolare, il Magistrato alle Acque di Venezia, tramite il concessionario Consorzio Venezia Nuova, ha condotto, in modo propedeutico alla progettazione e alla realizzazione delle opere, numerose indagini fisiche; indagini storiche; indagini socio-economiche; indagini sulla mobilità delle persone e delle merci; definizione delle tipologie di intervento; verifica dell'applicabilità delle tipologie di intervento; verifica dell'impatto architettonico; definizione della quota ottimale di rialzo.

In sintesi, sono state individuate due situazioni tipiche cui corrispondono due diverse modalità di intervento e due differenti possibilità di difesa locale.
La prima riguarda i centri abitati lagunari, insulari e *situati lungo il cordone litoraneo,* ove l'edificato, più rado e meno fragile, ha consentito maggiori rialzi e, dunque, una quota di difesa relativamente alta (compresa tra 130 e 180 cm).
La seconda situazione interessa i *centri storici* interni alla laguna e dunque le zone più basse delle città di *Venezia* e di *Chioggia*, dove gli interventi risultano molto più delicati e complessi e anche la soglia di difesa raggiungibile è molto più bassa rispetto a quella degli abitati del litorale. I progetti approvati e gli interventi finora

realizzati sono stati impostati in modo da non alterare in modo inaccettabile gli elementi architettonici delle città e i rapporti compositivi tra di essi, realizzando le difese a una quota generalizzata e omogenea, quindi funzionale alla gestione delle opere mobili.

La deliberazione del Consiglio dei Ministri del 15 marzo 2001 ha espresso l'indirizzo di realizzare le difese, nel centro storico di Venezia e delle isole minori, fino alle quote massime compatibili con il contesto storico, architettonico, monumentale e paesaggistico, comunque tendendo alla quota +120 cm a Venezia e +140 cm a Chioggia, alla luce delle risultanze delle Indagini e delle verifiche di fattibilità del rialzo fino a tale quota, condotte nel corso del 1999 a seguito di specifica richiesta da parte del Comitato ex art. 4 Legge 798/1984 nella seduta dell'8 marzo 1999.
Lo stesso indirizzo è stato recepito anche dal Comitato stesso nel parere espresso nel corso della seduta del 6 dicembre 2001, nonché nella seduta del 3 aprile 2003, recependo una specifica richiesta del Comune di Venezia.
Mettere in sicurezza il centro storico di Venezia con interventi localizzati di sollevamento della pavimentazione fino a +120 cm significherebbe intervenire su circa il 35-40% del territorio.

A seguito degli accordi intervenuti tra le Autorità Italiane e la Commissione Europea (atto aggiuntivo rep. n. 7950 del 21 giugno 2002 alla Convenzione Generale rep. 7191/91), rimangono tra le attività affidate in concessione al Consorzio Venezia Nuova le difese locali dei centri urbani lagunari e delle "insulae" di Venezia e di Chioggia finanziate nell'ambito di finanziamenti già destinati al concessionario.
Nel *Piano Generale degli Interventi*, aggiornato al 31 dicembre 2002, pertanto, non sono previsti ulteriori finanziamenti per procedere con la realizzazione delle difese locali che non trovano allocazione nell'ambito degli Atti Attuativi della "Convenzione Generale" già finanziati; né gli interventi di difesa delle "insulae" del centro storico di Venezia e di Chioggia fino a una quota tendente a +120 cm e a +140 rispettivamente.
Tali interventi, stralciati dal *Piano* affidato al concessionario, troveranno esecuzione mediante gare da indire da parte del Magistrato alle Acque di Venezia secondo la normativa europea.

Stato di attuazione al 31 dicembre 2006

Il Magistrato alle Acque e il Consorzio Venezia Nuova, fin dal 1988, hanno sviluppato specifici progetti generali di intervento di difesa, sia dei centri storici di Venezia e di Chioggia, sia dei centri abitati lagunari.

Da allora a oggi molto è stato fatto intervenendo, in pratica, in ogni località lagunare, mettendola in condizioni di sicurezza, ciascuna a una quota di salvaguardia compatibile con il particolare contesto urbanistico e architettonico che la caratterizza.

In tempi più recenti, in base a quanto previsto dalla Legge n. 139/92, questi interventi hanno avuto particolare sviluppo tramite gli "Accordi di programma": strumenti operativi che assicurano l'esecuzione coordinata e unitaria di interventi che coinvolgono Enti e Istituzioni diversi.

Tale strumento si è rivelato indispensabile qualora, in presenza di interventi particolarmente complessi, si debba *"garantire l'omogeneità tecnico-progettuale, il coordinamento nella fase realizzativa e la necessaria integrazione delle risorse finanziarie"*.

Le attività relative alla *difesa dei centri abitati lungo il litorale e gli abitati insulari*, sviluppate sin dal 1986, hanno consentito di realizzare la difesa dei principali abitati lagunari, fino ad una quota di salvaguardia compatibile con il particolare contesto urbanistico ed architettonico che li caratterizza, spesso ricorrendo ai già citati "Accordi di programma".

Sono ormai posti in sicurezza gli abitati di *Treporti, Malamocco, Alberoni, Pellestrina, San Pietro in Volta* e *Sottomarina*; si sta ancora lavorando a *Murano, Torcello* e *Sant'Erasmo*.

Caso per caso è stato necessario individuare tipologie costruttive e modalità di intervento adeguate e coerenti rispetto a un territorio molto vasto e diversificato con assetto, caratteristiche fisico-morfologiche e funzioni diverse (aree urbane, zone agricole, valli da pesca, ecc.) e con una varietà di condizioni particolari (livello del suolo, natura dei terreni, stato delle strutture preesistenti, esposizione al moto ondoso, ecc.). Le soluzioni esecutive adottate sono state messe a punto in modo da mantenere, per aree omogenee, un disegno architettonico unitario.

Allo scopo di assicurare la completa difesa idraulica delle singole aree, gli interventi hanno spesso comportato anche la realizzazione di una serie di opere complementari come, per esempio, la sistemazione delle chiaviche di regolazione idraulica così da migliorarne gli aspetti funzionali e impiantistici.

Per quanto riguarda i *centri abitati lagunari*, a *Treporti*, sono proseguiti i lavori relativi alla terza fase del quinto stralcio, che implicano ulteriori interventi di protezione di sponde e di difesa dell'abitato e i lavori, relativi al primo stralcio del progetto per la sistemazione del marginamento del *canale Pordelio*. Questo primo stralcio prevede la realizzazione di un ponte stradale apribile di collegamento tra la località *Cà Savio e l'isola Sud*.

Al *Lido*, si segnala la prosecuzione degli interventi per la riqualificazione ambientale e urbana degli abitati di *Malamocco* e *Alberoni*, primo stralcio (centro urbano di Malamocco). L'opera riguarda interventi di marginamento e riqualificazione ambientale (consolidamento e valorizzazione ambientale di sponde e rive, vivificazione e bonifica dei canali, predisposizione del sistema fognario), interventi di riqualificazione urbana (riqualificazione delle piazze e sistemazione delle pavimentazioni, predisposizione di percorsi e passerelle pedonali, adeguamento dell'illuminazione pubblica e dei sottoservizi, realizzazione di un parcheggio). Questo intervento si sviluppa secondo uno specifico "Accordo di programma" intervenuto tra il Magistrato alle Acque e l'Amministrazione comunale di Venezia.

A *Pellestrina*, si segnala la prosecuzione dei lavori lungo il tratto tra Portosecco e il cantiere De Poli. I lavori riguardano la ricostruzione del marginamento esistente, in precarie condizioni dovute all'erosione delle strutture di sponda e ai forti moti di filtrazione innescati da fenomeni di sifonamento al di sotto delle strutture stesse.

A *Murano*, si segnala l'avvio, ad aprile 2005, dei lavori relativi alla sistemazione del canale *San Mattia*. L'intervento prevede il rinforzo e l'adeguamento delle rive, la ricalibratura dei fondali e la sostituzione dell'attuale ponte in legno, di accesso a San Mattia, con un nuovo ponte in pietra.

A *Sant'Erasmo*, sono proseguiti gli importanti lavori di difesa e di riqualificazione ambientale dell'isola, mediante l'esecuzione di due stralci funzionali: uno, avviato nel mese di febbraio del 2002, riguarda principalmente il restauro e la realizzazione di rive attrezzate lungo la sponda nord ovest dell'isola, il ripristino delle darsene e la predisposizione di spazi organizzativi di interscambio terra/acqua, l'adeguamento della rete viaria e il riordino dei sottoservizi, la riqualificazione ambientale del paesaggio e la

ricalibratura dei canali interni; l'altro, avviato alla fine del 2005, prevede, principalmente, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale dei marginamenti in corrispondenza del centro urbano (località tra la darsena della remiera e la località Cà Ragazzi per circa 1 km) e la sistemazione delle chiaviche di regolazione idraulica presenti nell'area di intervento.

Per quanto riguarda i centri storici, gli interventi a Venezia e Chioggia, in particolare, risultano molto più delicati e complessi, rispetto a quelli sugli abitati del litorale, così come la soglia di difesa raggiungibile molto più bassa. I progetti approvati e gli interventi finora realizzati mostrano come, senza alterare in modo inaccettabile gli elementi architettonici delle città e i rapporti compositivi tra di essi, nei centri storici ci si può difendere a una quota fino a circa +100 / +110 cm a Venezia e fino a circa +110 / +120 cm a Chioggia.
Queste quote (funzionali anche alla gestione delle opere mobili) sono quelle assunte nel progetto "insulae" e adottate e realizzate, per esempio, nell'"insula" dei *Tolentini* e nel Progetto esecutivo per la difesa dell'"*insula" di S. Marco*, che è stato approvato, tra gli altri, anche dalla Amministrazione Comunale di Venezia, dalla Soprintendenza ai Beni e alle Attività Culturali di Venezia e dalla Commissione per la Salvaguardia. Ciò conferma, di fatto, come le zone più preziose e più antiche non possano essere rialzate o comunque protette oltre a tale livello.
Contestualmente ai lavori di difesa locale dalle acque alte, si è proceduto e si procede alla realizzazione di opere di riqualificazione urbana, definite in appositi "Accordi di programma" con le Amministrazioni comunali: oltre al rialzo di rive e pavimentazioni, gli interventi hanno quindi comportato anche una serie di opere complementari quali l'adeguamento di piani terra alle nuove quote del piano di calpestio, il riordino dei sottoservizi, l'adeguamento del sistema fognario, mediante co-finanziamento con gli Enti interessati.

In particolare, nel *centro storico di Venezia* sono proseguiti numerosi e importanti interventi per la difesa locale di rive e marginamenti.
Alle *Zattere*, gli interventi, nel loro complesso, hanno interessato l'intero percorso della fondamenta, da Punta della Salute fino alla Stazione Marittima, per 1,3 chilometri, mentre alla *Giudecca* si sono sviluppati dall'estremità est della fondamenta, all'interno della caserma della Guardia di Finanza, fino al rio di San Biagio,

per 1,7 chilometri.

Sono ancora in corso gli interventi per la ristrutturazione, il consolidamento o il restauro di rive e muri di sponda alla *Giudecca, lato sud* e a *sacca Fisola, lato nord*, con la realizzazione di rive urbane percorribili e ripristino di muri di cinta di spazi pubblici e privati, la ricalibratura dei fondali a ridosso delle rive, la predisposizione degli impianti per l'installazione dell'illuminazione pubblica.

Sono proseguiti i lavori di sistemazione dei marginamenti lungo il *fronte est dell'isola di S. Elena*. Il progetto prevede il restauro, il consolidamento e la ristrutturazione delle rive fra il Collegio Navale Morosini e l'Imbocco del canale Quintavalle, compreso il molo frangiflutti che delimita la darsena grande antistante il canale dei Marani, la ricalibratura dei fondali della darsena grande e in corrispondenza della darsena del collegio Morosini e infine, alcuni lavori complementari. Il progetto di primo stralcio prevede la sistemazione di tutte le rive previste dal progetto generale, ad eccezione di quelle, interne ed esterne, in corrispondenza della zona della darsena grande di pertinenza dell'ACTV e di quelle del lato ovest della stessa darsena, realizzazione di una parte dei lavori di dragaggio e dei lavori complementari.

Nel corso del 2006, si segnala, inoltre, la prosecuzione del primo stralcio degli importanti lavori di difesa dell'*"insula" di San Marco* dalle acque alte più frequenti. I lavori relativi al primo stralcio, avviati nel mese di marzo del 2003, comprendono il rialzo, il restauro e il consolidamento della riva, anche a protezione dal moto ondoso, l'intercettazione degli scarichi per la predisposizione della nuova rete per lo smaltimento delle acque piovane e il restauro della pavimentazione. Sempre nel contesto degli interventi di difesa delle rive del bacino di San Marco, sono proseguiti i *lavori nel tratto di riva compreso tra il ponte della Paglia e il ponte del Vin*. I lavori consistono nel restauro, consolidamento e rialzo del marginamento, nell'adeguamento, restauro e rialzo della pavimentazione retrostante e nella sistemazione della rete per lo smaltimento delle acque e nel riordino dei sottoservizi.

Sono proseguite, inoltre, sia in fase di progettazione, che in fase di esecuzione, le importanti attività intraprese da Magistrato alle Acque tramite il proprio concessionario Consorzio Venezia Nuova, riguardanti la ricostruzione dei marginamenti dell'area dell'*Arsenale di Venezia* e la messa in sicurezza e il restauro dei fabbricati prospicienti lo specchio acqueo, le cui murature perimetrali costituiscono il bordo del marginamento. In particolare,

nel corso del 2006, sono proseguiti i lavori relativi alla ricostruzione del muro di sponda dell'area edificata a nord dell'Arsenale, cosiddetta "riva delle Casermette"; i lavori di somma urgenza di ripristino statico di due capannoni denominati "della Novissima"; l'intervento di messa in sicurezza di dieci capannoni delle Tese della Novissima, avviato a febbraio del 2006. E' intervenuta , inoltre, l'ultimazione, nel corso del 2006, dei lavori di messa in sicurezza dei tre capannoni denominati di S. Cristoforo, degli interventi di messa in sicurezza delle sommità dei muri perimetrali delle Galeazze e dei lavori di messa in sicurezza definitiva del Capannone n. 111 e del Capannone n. 110.
Per la zona nord dell'Arsenale, inoltre, nel corso del 2006, si è conclusa l'elaborazione del piano attuativo per l'inserimento delle attività di costruzione, di gestione e di manutenzione del "Sistema MOSE", nell'area assentita in concessione dall'Agenzia del Demanio e al Consorzio Venezia Nuova quale concessionario del Magistrato alle Acque, con atto sottoscritto in data 28.09.2005 e relativo atto aggiuntivo del 07.04.2006.
Nel centro storico, infine, sono proseguiti il primo e il secondo stralcio dei lavori di ripristino delle rive delle *Fondamente Nuove.* Il progetto generale prevede il restauro, il consolidamento e il rialzo delle rive comprese tra la "sacca" della Misericordia e il rio di Santa Giustina, oltre al tratto di fondamenta dei Giurati nell'area antistante l'attracco dell'ACTV a S. Alvise, e al tratto di fondamenta delle Case Nuove nell'area antistante l'attracco ACTV alla Celestia. Il progetto prevede, inoltre, l'adeguamento altimetrico delle soglie di unità immobiliari al piano terra rispetto alla nuova quota della pavimentazione esterna, il risanamento igienico ambientale del sistema fognario e il riordino dei sottoservizi. Con il primo stralcio vengono eseguiti interventi nel tratto di marginamento compreso tra la "sacca" della Misericordia e la fondamenta antistante il Palazzo Donà, oltre al tratto di fondamenta antistante l'attracco ACTV a S. Alvise. Con il secondo stralcio vengono eseguiti interventi nel tratto di riva che va dalla fondamenta antistante il Palazzo Donà al rio dei Mendicanti.

Anche nella *zona di Chioggia,* nel corso del 2006, sono proseguite numerose attività finalizzate alla difesa dalle acque medio – alte e alla riqualificazione del centro storico. I lavori vengono realizzati mediante un "Accordo di programma" siglato il 17 settembre 1998, tra il Magistrato alle Acque di Venezia e l'Amministrazione comunale di Chioggia. Si tratta di un programma di opere finalizzato a un complessivo riassetto del territorio urbano che

renda più semplice per i cittadini abitare, vivere e lavorare nella propria città.
Nel corso del 2006, in particolare, sono proseguiti i lavori di difesa locale dalle acque alte avviati nel 1998 con l'intervento pilota di rialzo della *fondamenta S. Domenico,* mediante due stralci funzionali, il primo si è concluso a settembre del 2006 mentre il secondo è ancora in corso di esecuzione. E' proseguito, inoltre, lo sviluppo dei progetti per la protezione della parte centrale della città (*Corso del Popolo e Canal Vena - in parte già conclusa*) e la progettazione delle principali opere di riqualificazione urbana. Gli interventi potranno essere avviati non appena si saranno espressi i diversi Enti competenti.
Sono proseguiti i lavori di restauro funzionale ed architettonico dei ponti pedonali sul *Canal Vena*: con il primo stralcio progettuale, sviluppato sulla scorta del progetto definitivo generale, si procede con il restauro statico e architettonico del *Ponte della Pescheria* e del *Ponte Scarpa*. Si tratta di quelli che, allo stato attuale, versano nelle peggiori condizioni statiche. E' oggetto della progettazione anche un piccolo tratto di riva urbana (circa 30 metri) posto nelle immediate vicinanze del Ponte Scarpa, in parte crollata.
E' proseguita l'esecuzione dell'Intervento per la riapertura del *canale Perottolo* e la riqualificazione urbana delle aree limitrofe – Quartiere Tombola. Anche questi lavori sono realizzati in "Accordo di programma" con l'Amministrazione comunale di Chioggia.

A *Sottomarina* sono stati sostanzialmente ultimati, nel corso degli esercizi precedenti, gli interventi di difesa locale dagli allagamenti che hanno comportato, mediante quattro stralci funzionali, il rialzo delle rive fino a quota + 130 centimetri per 900 metri di riva, congiuntamente agli interventi realizzati dal Magistrato alle Acque - Consorzio Venezia Nuova, d'intesa con il Comune di Chioggia, volti a valorizzare l'intero tratto del marginamento lungo la laguna e le piazzette che vi si affacciano. Nel corso del 2006, sono proseguiti i lavori relativi al *quinto stralcio* che riguardano il consolidamento e il rialzo della *riva del forte San Felice* e l'estremità nord del centro urbano.

Lo sviluppo di questo tipo di interventi è molto avanzato: non soltanto per il numero di lavori eseguiti o che sono in corso di esecuzione, quanto per la realizzazione di interventi risolutivi, riguardanti quasi tutti i centri abitati della laguna, destinati ad evitare allagamenti fino ai livelli di salvaguardia, o di sicurezza, compatibili con la loro struttura edilizia e urbana, nonché

all'eliminazione totale degli allagamenti di qualsiasi entità in concorso con la protezione offerta, in futuro, dalle opere mobili alle bocche di porto lagunari.

I finanziamenti disponibili per le difese locali degli abitati sono appena sufficienti per portare a completamento le opere ancora in corso. Una volta esauriti tali fondi la continuità operativa dovrà essere garantita dal Magistrato alle Acque di Venezia che, in base a quanto stabilito negli accordi tra Autorità italiane e Commissione Europea, dovrà proseguire nella realizzazione della opere di difesa non ancora, allora, oggetto di finanziamento, mediante procedure concorsuali per l'affidamento dei lavori.

Di seguito il dettaglio degli importi finanziati e il grafico con lo stato di attuazione dei finanziamenti (importi espressi in Mln di €).

DIFESA DALLE ACQUE MEDIO ALTE

Importi in milioni di €

	Fabbisogno Totale	Importi finanziati	Importi realizzati, in corso di realizzazione e di prossimo avvio	Importi spesi	Fabbisogno residuo da finanziare
Studi propedeutici alla progettazione	3,946	3,946	3,946	3,946	0,000
Indagini propedeutiche	23,549	23,549	23,549	22,786	0,000
Difesa insediamenti urbani situati lungo i litorali	256,254	256,254	247,551	228,806	0,000
Rive e marginamenti nella gronda lagunare	29,170	29,170	29,170	29,170	0,000
Protezione degli abitati insulari	177,721	177,721	177,721	147,135	0,000
Interventi di difesa delle rive, marginamenti e insulae nel centro storico di Venezia	227,137	227,137	220,106	175,589	0,000
Difesa insediamenti urbani, marginamenti e rive nell'area di Chioggia; difesa dell'insula di Chioggia	161,283	161,283	159,883	109,058	0,000
Altri interventi	18,782	18,782	18,782	18,782	0,000
Somme a disposizione / Rev. Prezzi / Espropri	13,000	13,000	4,114	4,114	0,000
TOTALE	**910,842**	**910,842**	**884,822**	**739,385**	**0,000**

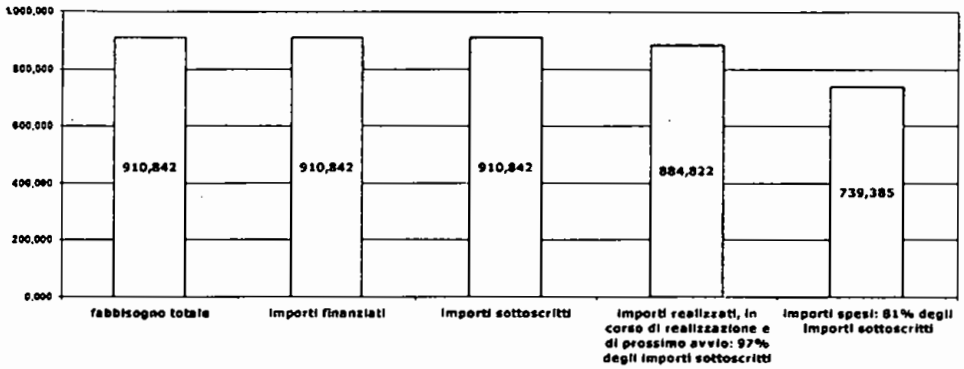

3.4 Ristrutturazione dei moli foranei
(Interventi di cui all'art. 3 lettera a) legge n. 798/84)

Obiettivo

L'obiettivo dell'intervento è il rinforzo della struttura dei moli per assicurare la continuità della difesa della laguna dal mare in coerenza con gli interventi necessari per rinforzare il cordone litoraneo e per difendere i centri abitati lagunari dalle alte maree anche nei casi eccezionali.

Descrizione degli interventi

La laguna è collegata al mare attraverso le tre bocche di porto e ciascuna di esse è "armata" con due moli guardiani la cui lunghezza varia tra 2 e 4 km.

I moli sono stati costruiti tra il 1840 e il 1934 in modo da creare un aumento della profondità dei fondali dei canali di bocca (a causa dell'aumento della velocità della corrente) per adeguarli alla stazza sempre maggiore delle navi moderne.

Le strutture dei moli e le loro funzioni sono diverse procedendo da mare verso terra.

Lato mare i moli hanno la tipica struttura di opera marittima che si deve opporre all'azione del moto ondoso; lato laguna i moli coincidono con le opere di contenimento del territorio.

I moli foranei alle bocche di porto, che costituiscono un fattore di sicurezza per la navigazione, necessitavano di importanti lavori di ristrutturazione.

I moli sono stati realizzati ricorrendo a pietrame di grande dimensione che ha subìto, per l'azione delle correnti e del moto

ondoso, continui sprofondamenti nel tempo. Questi fenomeni avevano finito per compromettere la stabilità dell'intera struttura. I lavori di manutenzione ordinaria eseguiti in passato avevano fronteggiato i dissesti più immediati senza però eliminare il problema.
La ricostruzione dei moli è stata supportata da analisi, ricerche, sperimentazioni con modelli matematici e fisici con le quali sono state valutate le caratteristiche del moto ondoso lungo ciascuno dei moli, l'intensità delle correnti di marea al piede delle scogliere, la natura geotecnica dei terreni di fondazione, la profondità dei fondali lungo i moli e la loro tendenza evolutiva, la stabilità della struttura e delle mantellate in roccia.
La realizzazione delle opere non ha comportato modifiche dimensionali e ha fatto ricorso, per le parti a vista, a materiali omogenei a quelli esistenti.

Stato di attuazione al 31 dicembre 2006

Attività finanziate
Il progetto di massima degli interventi per il rinforzo dei moli, che era stato preceduto da specifiche attività di studio e sperimentazione, è stato assentito dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque di Venezia nel luglio del 1991.

Durante il 1994 sono iniziati quasi tutti gli interventi previsti.
Nel 1996 sono stati completati i lavori sul *molo nord di Malamocco* mentre sono proseguiti quelli relativi agli altri moli.
Nel 1997 sono stati completati anche i lavori relativi ai *moli nord e sud di Chioggia e sud di Lido*, mentre nel 1998 sono terminati i lavori relativi al *molo sud di Malamocco*.
Nel 1998 sono anche state completate le opere per la messa in sicurezza e l'adeguamento dei *fari sulle testate dei moli* nord di Lido e di Malamocco, lavori segnalati dal Genio Civile per le Opere Marittime su indicazione del Comando zona fari di Venezia.
I lavori relativi al *molo nord di Lido* sono stati completati nel 1999.
Nel corso del 1999 sono stati avviati i lavori relativi alle *radici dei moli sud di Chioggia,* completati nel corso del 2002, e *nord di Malamocco*, sostanzialmente finiti nel corso del 2003; qui i lavori si collocano in interventi più ampi che interessano l'intera zona e comprendono anche la difesa dalle acque medio-alte dell'abitato di Alberoni sud retrostante e si raccordano con le opere di rinforzo del molo già realizzate.

I lavori realizzati sono stati condotti secondo tre tipologie di intervento sostanzialmente comuni a tutti i sei moli foranei: rinforzo e risagomatura delle mantellate (gli strati di blocchi di roccia o calcestruzzo posti a difesa del molo dall'azione del moto ondoso); rifacimento dei tratti danneggiati dei massi di coronamento; protezione dei fondali mediante una platea di blocchi di roccia collocata sopra un filtro costituito da geotessili sintetici.

Di seguito il dettaglio degli importi finanziati e il grafico con lo stato di attuazione dei finanziamenti (importi espressi in Mln di €).

RISTRUTTURAZIONE DEI MOLI FORANEI

Importi in milioni di €

	Fabbisogno Totale	Importi finanziati	Importi realizzati, in corso di realizzazione e di prossimo avvio	Importi spesi	Fabbisogno residuo da finanziare
Studi	0,620	0,620	0,620	0,620	0,000
Indagini e altri interventi minori	3,011	3,011	3,011	3,011	0,000
Moli bocca di Lido	21,516	21,516	21,440	21,478	0,000
Moli bocca di Malamocco	48,568	48,568	48,568	48,568	0,000
Moli bocca di Chioggia	34,086	34,086	34,086	34,086	0,000
Somme disposizione / Revisione prezzi	0,006	0,006	0,000	0,000	0,000
TOTALE	**107,806**	**107,806**	**107,725**	**107,762**	**0,000**

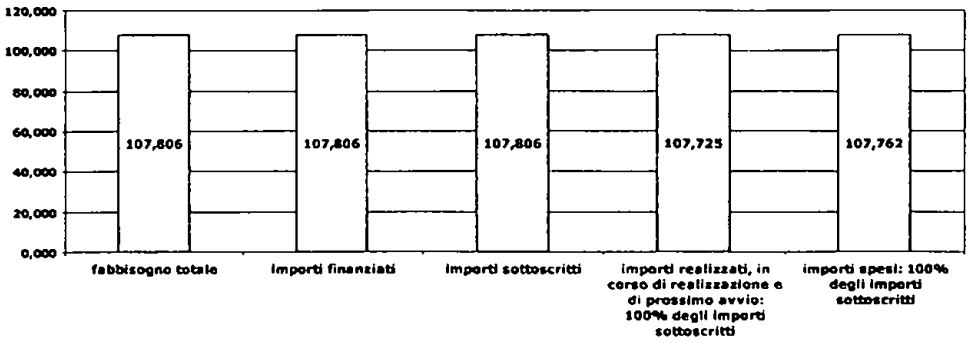

3.5 Difesa dalle mareggiate
(interventi di cui all'art. 3 lettera d) legge n. 798/84)

Obiettivo

L'obiettivo dell'intervento è il rinforzo del cordone litoraneo che divide la laguna dal mare per proteggere i centri abitati dei litorali dall'azione diretta del moto ondoso e assicurare la continuità della difesa della laguna nel suo complesso da tutte le acque alte, anche dagli eventi estremi.

Descrizione degli interventi

Il cordone litoraneo che separa l'Adriatico dalla laguna, lungo circa 45 chilometri, rappresenta la prima e naturale difesa di Venezia e dei centri urbani lagunari dal mare. Il rinforzo dei litorali ha assunto un carattere di assoluta necessità e d'urgenza. Infatti, il cordone litoraneo si è fatto sempre più sottile e fragile a causa della quasi assenza di apporti fluviali, dei processi erosivi, delle azioni disgregatrici del moto ondoso e del vento e del degrado delle strutture storiche in pietra (i "murazzi") che sono state erette nel corso del XVIII secolo a protezione dalle mareggiate. L'insieme dei fenomeni ha determinato il generale arretramento della linea di costa e la scomparsa del cordone di dune che costituiva un'ulteriore difesa dei territori e degli abitati retrostanti. Il fenomeno è stato particolarmente evidente, fin dai secoli scorsi, nel caso dei litorali di Pellestrina e di Lido per interessare, più recentemente, anche i litorali di Jesolo, Cavallino, Sottomarina e Isola Verde. Il sistema di opere, in gran parte realizzato, persegue molteplici obiettivi: la protezione della laguna e dei suoi abitati; il ripristino delle difese naturali mediante la creazione di nuove spiagge e l'ampliamento di quelle divenute inadeguate; la formazione, dove possibile, di un nuovo fronte di dune, il restauro dei "murazzi" e la ristrutturazione delle opere di difesa degradate.

Il Magistrato alle Acque di Venezia, tramite il concessionario Consorzio Venezia Nuova, ha, da tempo, messo in atto una serie di interventi per il rinforzo dei litorali veneziani, anche mediante la realizzazione di ripascimenti, finalizzati a difendere dalle mareggiate la laguna di Venezia, rafforzando opportunamente i punti più deboli lungo il cordone litoraneo.

La difesa di un litorale mediante la costruzione di una nuova spiaggia è senza dubbio la soluzione che, tra quelle possibili, è più compatibile con l'ambiente costiero in quanto ne riprende, anche se in modo artificiale, i caratteri naturali. Benché sia già stata adottata in altri casi, la soluzione mantiene, per la particolarità della zona, un elevato carattere di novità. Gli effetti conseguiti vanno

attentamente monitorati poiché dipendono strettamente dalle caratteristiche fisiche e dalle condizioni meteomarine della zona.
La progettazione è stata supportata da numerosi approfondimenti di carattere scientifico, ma è stata possibile solo associando ad essa approfondimenti altrettanto completi e rigorosi riguardo alla ricerca delle cave per l'approvvigionamento delle sabbie, ai metodi costruttivi per il prelievo, il trasporto e il deposito delle sabbie in grado di limitare l'impatto sull'ambiente circostante alle zone di lavoro e riguardo ai controlli da effettuare sia in corso d'opera, che nei mesi e negli anni successivi all'intervento.

Stato di attuazione al 31 dicembre 2006

Attività finanziate
A oggi si è intervenuti o si sta intervenendo su sei litorali per un tratto complessivo di costa di circa 45 chilometri, utilizzando per l'ampliamento o la ricostruzione delle spiagge circa 8,5 milioni di m^3 di sabbia.

Litorale di Cortellazzo – Eraclea
I fenomeni erosivi nel corso degli ultimi anni, si sono resi particolarmente accentuati sul tratto di litorale compreso tra le foci dei fiumi Piave e Livenza in relazione, soprattutto, all'esposizione particolare del paraggio alle mareggiate di scirocco nonché alla significativa carenza di apporto sedimentario "naturale" dal fiume Piave.
Nel corso degli ultimi anni, il Magistrato alle Acque è, pertanto, intervenuto lungo il litorale di Cortellazzo realizzando piccole opere di emergenza per contrastare il grave fenomeno erosivo in atto.
Anche la Regione Veneto, in attuazione del Decreto Legislativo n. 112 del 1998, relativo ai trasferimenti delle competenze in materia di difesa e gestione delle coste dallo Stato alle Regioni, ha da tempo avviato interventi per la protezione delle spiagge venete.
In data 7 novembre 2001, è stato siglato un Accordo di Programma tra la Regione Veneto e il Magistrato alle Acque finalizzato a gestire in modo coordinato l'assetto della foce del fiume Piave e gli interventi di difesa dei litorali di competenza delle due Amministrazioni.
In base a quanto sopra, il Magistrato alle Acque ha ravvisato la necessità di anticipare i tempi di realizzazione del ripascimento del litorale di Eraclea mediante il proprio concessionario e con co-finanziamento della Regione del Veneto, in quanto funzionale alla

protezione del litorale di Cortellazzo, e, pertanto, ricompreso nel Piano Generale degli Interventi in quanto consente la difesa fisica del litorale veneziano.
Il progetto generale per il rinforzo del litorale di *Cortellazzo* prevede: la sistemazione e il riallineamento delle testate dei 4 "pennelli" esistenti e la realizzazione di 2 nuovi "pennelli" lungo il litorale, in funzione di lavori di ripascimento che verranno realizzati successivamente; il ripascimento del litorale di Eraclea; il rinforzo del molo sud della foce del Piave. Sono previsti quattro stralci di intervento. Nel corso del 2003 sono stati avviati il primo e il secondo stralcio, prima fase. Nell'intervento di primo stralcio, terminato nel maggio del 2003, si è proceduto all'adeguamento di "pennelli" esistenti e alla realizzazione di nuovi "pennelli" in funzione dei lavori di ripascimento successivamente previsti. Il secondo stralcio, prima fase, ultimato a gennaio del 2006, ha riguardato il ripascimento del litorale di Eraclea, realizzato con sabbie provenienti da cave marine già autorizzate dal Ministero dell'Ambiente e già parzialmente utilizzate per il ripascimento del litorale di Jesolo.

Litorale di Jesolo
Nell'autunno del 1998 sono state avviate le opere per la difesa del litorale di Jesolo che è soggetto a un significativo fenomeno di erosione; le opere, in fase di massimo sviluppo nel corso del 2001, sono state sostanzialmente terminate nel corso del 2002. Nel corso del 2003 e del 2004 sono state realizzate alcune attività complementari per l'accessibilità e la fruizione della spiaggia.
Il litorale di Jesolo si estende per 12 chilometri tra le foci dei fiumi Piave, a nord, e Sile, a sud. A partire dagli anni '40 si è determinato un rapido sviluppo turistico che ha raggiunto la massima intensità dopo il 1970. La conseguente urbanizzazione e infrastrutturazione del territorio ha profondamente modificato l'aspetto originario dell'ambiente litoraneo e ha contribuito alla progressiva erosione della spiaggia.
La situazione di erosione ha determinato la necessità, espressa anche dagli abitanti del litorale, oltre che dagli operatori economici locali, di un programma generale e unitario di opere, definite in accordo con il Comune di Jesolo. A questa necessità risponde il progetto esecutivo realizzato dal Magistrato alle Acque –tramite il proprio concessionario Consorzio Venezia Nuova.
Il *ripascimento della spiaggia* lungo 10 chilometri di riva, con la movimentazione di un milione di metri cubi di sabbia, è avvenuto secondo criteri progettuali analoghi a quelli già adottati a Cavallino

e Pellestrina.
A riva, per contenere il ripascimento, è stata prolungata la metà dei pontili su pali già esistenti (34 su 68), in relazione all'allargamento della spiaggia, e ne sono stati realizzati 16 nuovi.
I lavori hanno permesso di ottenere una larghezza omogenea di almeno 50 metri, con un avanzamento della riva, nelle zone più critiche, di circa 30 metri.
Complementare al ripascimento è stata la realizzazione, per complessivi 3,9 chilometri, della struttura di difesa tra la spiaggia e le aree abitate retrostanti, costituita da un'ampia *gradonata*.
Il progetto ha previsto anche la *ricostruzione delle dune*: i lavori hanno uno sviluppo di quasi 2,5 chilometri, a partire dalla foce del Piave.
Per quanto riguarda, infine, i lavori alla *foce del Sile*, sono stati realizzati lavori di rinforzo della scogliera attorno al faro sulla sponda destra; di rinforzo della scogliera che delimita la sponda sinistra; lavori di dragaggio.

Litorale di Cavallino
Nel corso del 1990 è stato eseguito *l'intervento sperimentale* di difesa del litorale di Cavallino, *in località Ca' Pasquali*: si è messo in opera un tratto di barriera sommersa longitudinale, parallela alla costa e ne è stata misurata l'efficacia nell'evitare la dispersione della sabbia.

Nel 1999 sono state completate le attività iniziate nel gennaio 1994. Il progetto ha consentito la *realizzazione dell'ampliamento e del rafforzamento di 11 chilometri di spiagge già esistenti*. La spiaggia ricostruita è difesa da 31 "pennelli", 5 di nuova realizzazione e 26 ottenuti dalla ristrutturazione di parte dei 65 "pennelli" preesistenti. Di questi, la metà circa è stata demolita. I lavori di ripascimento del litorale sono stati eseguiti in progressione da sud verso nord e il versamento della sabbia è stato effettuato dopo la realizzazione di tutti i "pennelli". Sono stati versati complessivamente circa 2 milioni di metri cubi di sabbia prelevata in mare al largo della bocca di Malamocco.
I lavori per la formazione della spiaggia sono stati integrati da una serie di interventi complementari; in particolare, lungo sei tratti del litorale, per complessivi 4,8 chilometri, la protezione del territorio alle spalle della spiaggia è stata completata, mediante la *ricostruzione del fronte delle dune*, che da sempre costituisce la naturale difesa dal mare ma che ora è assai degradato e, in molti punti, è ormai scomparso.

Nel corso del 2000 sono state completate alcune attività, specifiche, finalizzate a garantire la manutenzione delle specie vegetative messe a dimora sulle dune di Ca' Savio, Ca' Ballarin e valle Dolce, al fine di dare corso a eventuali sostituzioni e/o trattamenti delle piante sofferenti.

Litorale di Lido

Durante il 2000 sono state completate le attività relative alla progettazione esecutiva delle opere di difesa del litorale di Lido; nel corso del 2001, l'Amministrazione Comunale di Venezia ha richiesto al Magistrato alle Acque di procedere a una revisione del progetto esecutivo, recependo le istanze del Consiglio di Quartiere di Lido e di alcuni gruppi e associazioni di cittadini. Si è proceduto, pertanto, alla revisione del progetto esecutivo, che è stato favorevolmente esaminato dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque nella seduta del 17 ottobre 2003. Nel febbraio del 2004, è stato avviato un primo stralcio dei lavori che si è concluso nel corso del 2006. Ad ottobre del 2005, è stato avviato il secondo stralcio, che al 31 dicembre 2006 risulta sostanzialmente ultimato.

La zona di intervento si estende per circa 5 chilometri a nord della spiaggia di Alberoni, di fronte al murazzo storico.

La soluzione individuata, prevede la realizzazione di una barriera sommersa a distanza media dalla costa di circa 300 metri, in grado di abbattere l'energia del moto ondoso, provocando il frangimento dell'onda, e quindi di ridurre il moto ondoso contro i murazzi in modo da rendere non pericolosa la tracimazione, anche in caso di eventi eccezionali. La barriera si estende per una lunghezza di circa 4.700 metri, ed è realizzata in massi naturali

Per aumentare ulteriormente la dissipazione dell'energia associata alle onde si è previsto il versamento sommerso di sabbia nella zona retrostante la barriera (lato murazzo), conseguendo anche l'obiettivo di ricostituire i fondali storici soggetti a continua erosione. Si prevede il versamento di circa 680.000 metri cubi di sabbia, con la formazione di cumuli trasversali rispetto alla barriera sommersa, con sommità intorno alla -2 metri.

Il progetto prevede inoltre la realizzazione di quattro nuovi pennelli, di lunghezza emersa variabile tra 160 e 220 metri, collegati alla barriera sommersa da setti sommersi, e la realizzazione di ulteriori due setti sommersi in corrispondenza di pennelli esistenti.

A completamento dell'intervento di difesa, come richiesto dal Comune di Venezia, si prevede infine un intervento di tutela

ambientale delle dune nella zona di Alberoni, attualmente in condizioni precarie e soggette ad un pesante carico antropico.

Litorale di Pellestrina

Nel 1991 sono iniziati i lavori per il *rinforzo della scogliera* nel punto più fragile del litorale di Pellestrina, l'ansa *di Caroman*, dove solo pochi metri separano il mare dalla laguna, completati nel 1995.

Nel corso del 1992 sono stati avviati i lavori per il *rinforzo* di 5 chilometri *di "murazzo"* a Pellestrina, completati nel 1997.

Il *rafforzamento del litorale* di Pellestrina, per conformazione fisiografica e per importanza dei fenomeni erosivi in atto, ha comportato l'esecuzione di un sistema di opere mai attuato prima in Italia. I lavori realizzati consistono nella formazione di nuove ampie spiagge protette, nel rinforzo della scogliera, nel rifacimento o restauro della lastricatura del murazzo per quasi 5 chilometri.
I lavori di *ripascimento* a Pellestrina sono stati eseguiti secondo una concezione di intervento e criteri esecutivi analoghi a quelli messi a punto per il litorale di Cavallino. La formazione della spiaggia è avvenuta con l'impiego di quasi 5 milioni di metri cubi di nuova sabbia prelevata da una draga in mare, a una distanza di circa 20 chilometri dalla costa.
Al fine di assicurare la stabilità della spiaggia, si sono costruiti 18 *"pennelli" in pietrame* collegati, mediante setti di prolungamento sommersi, a una *berma continua*, anch'essa *sommersa,* messa in opera a circa 300 metri dalla costa. In questo modo si sono formate delle aree (celle) di ripascimento.
Dal 1994 al 1999 sono stati realizzati otto stralci dell'opera mediante i quali sono stati costruiti 18 pennelli, circa 6 chilometri di berma sommersa e il ripascimento di 19 celle, realizzando così la nuova spiaggia che si estende per poco più di 9 chilometri.
Sono in corso di realizzazione delle opere complementari che consentiranno agli abitanti l'accesso alla spiaggia mediante il superamento attrezzato del "murazzo" preesistente.

Litorale di Sottomarina

Nel 1997 è stata completata la progettazione esecutiva della difesa del litorale di Sottomarina ed è stata approvata dall'Amministrazione concedente; le relative opere sono state avviate nel mese di maggio del 1998 e sono state completate nel corso del 2000 mentre sono state ultimate nel 2002 le opere di

riqualificazione urbana previste dall'Accordo di Programma intervenuto tra il Magistrato alle Acque e l'Amministrazione Comunale di Chioggia. Nel corso del 2005 si sono realizzati alcuni nuovi lavori richiesti dall'Amministrazione Comunale, oggetto di una apposita perizia di variante esaminata favorevolmente dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque nel mese di giugno del 2003.

Il litorale di Sottomarina si sviluppa per più di 5 chilometri tra la bocca di porto di Chioggia e la foce del fiume Brenta.

Gli obiettivi degli interventi progettati sono la difesa fisica dell'ambiente costiero, la protezione delle abitazioni e dei territori a ridosso della spiaggia e, indirettamente, la tutela delle attività che vi si svolgono. Contemporaneamente, così come è avvenuto per i litorali di Cavallino e di Pellestrina, si risponde anche all'esigenza di valorizzazione della costa dal punto di vista naturalistico e paesaggistico.

Nella parte nord del litorale il progetto ha riguardato, essenzialmente, la realizzazione di un *"muro paraonde"* con sommità a circa +3 metri – a una quota, cioè, di assoluta sicurezza – sul livello del medio mare. Il muretto, che si sviluppa dalla fine dell'attuale Lungomare Adriatico fino a Via S. Felice, è affiancato da un ampio marciapiede che prolunga quello esistente sul lungomare, configurando una passeggiata continua che raggiunge il centro abitato.

Nella parte sud del litorale è già stato realizzato il *ripascimento* dell'arenile (500 metri), mediante il quale è stata riportata la spiaggia a una quota adeguata. Il ripascimento ha richiesto il versamento di circa 120.000 metri cubi di sabbia ed è contenuto da un'opera foranea in scogliera sulla sponda sinistra della foce del Brenta.

Litorale di Isola Verde

Nel corso del 1998, sono stati avviati gli interventi di difesa del litorale di Isola Verde a Chioggia che si sono conclusi nel 2002.

Isola Verde si trova nel Comune di Chioggia, tra la foce del fiume Brenta, a nord; la foce dell'Adige, a sud; il canale Vecchio Adigetto, a ovest; l'Adriatico a est. Il litorale si estende per 2,7 chilometri ed ha alle spalle un territorio fortemente urbanizzato.

Da tempo il litorale è investito da processi erosivi che provocano l'arretramento della linea di riva.

Il Consorzio Venezia Nuova ha, quindi, realizzato il *ripascimento protetto* della parte meridionale del litorale (2 chilometri) mediante il versamento di circa 450.000 metri cubi di sabbia e la

realizzazione di 7 "pennelli" di roccia.
Sono stati eseguiti lavori complementari di difesa a terra con la costruzione di un *muro "paraonde"*, che ha uno sviluppo di circa 700 metri, con il rinforzo della sponda destra della foce del Brenta e di quella sinistra della foce dell'Adige.
Nel corso del 2004 è stato avviato il progetto per la realizzazione di interventi integrativi per la difesa del litorale, quali ad esempio camminamenti, piste ciclabili e/o collegamenti, per permettere una migliore fruizione delle aree in questione nel rispetto delle realtà locali.
Nel primo semestre del 2005 è stato avviato l'intervento, attualmente in corso, di *rafforzamento delle testate dei pennelli del settore sud del litorale* che implica la sistemazione e l'adeguamento di due "pennelli" in pietrame e massi naturali e l'esecuzione di un monitoraggio dello stato del mare e dei fondali davanti alla foce del fiume Sile, mediante l'impiego di tecniche fotogrammetriche.
Uno specifico "Accordo di programma" tra la Regione del Veneto, il Magistrato alle Acque, il Comune di Chioggia e il Comune di Rosolina, ha permesso, infine, l'esecuzione coordinata e unitaria degli interventi alle *foci del Brenta e dell'Adige*, necessari per allontanare dal litorale di Sottomarina e di Isola Verde le acque dolci inquinate e tutelare la balneabilità delle spiagge. Questi interventi consistono nella realizzazione di lunghi palancolati metallici che, "prolungando" le sponde delle foci, sono in grado di veicolare verso il largo, per alcune centinaia di metri, le acque dolci superficiali.

Nel corso del 2006, è stato avviato un secondo stralcio dell'intervento di manutenzione dei litorali, mediante il ripristino del ripascimento in sabbia degli interventi realizzati sul litorale da Jesolo a Isola Verde.

E' proseguito lo studio "*Monitoraggio dei litorali da Eraclea a Isola Verde*" che è articolato su rilievi dei parametri meteomarini (moto ondoso, correnti, vento e livelli di marea), rilievi batimetrici, rilievi fotografici, analisi dei dati e valutazione delle tendenze evolutive dei litorali e degli interventi di ripascimento.

.

Gli interventi già realizzati e in corso di realizzazione sono monitorati con continuità: i controlli effettuati mostrano che gli obiettivi di progetto sono stati raggiunti, con una generale approvazione e soddisfazione dell'autorità marittima e delle

Amministrazioni locali interessate; la stabilità delle nuove opere, già completate, dopo un periodo sufficientemente lungo di "stress" da parte del mare e degli agenti atmosferici, conferma pienamente la validità delle scelte progettuali e dei metodi costruttivi.

Attività da finanziare

Con gli ulteriori finanziamenti che verranno resi disponibili, si completerà l'intervento generale di difesa dei litorali veneziani; in particolare, gli interventi lungo il litorale di Lido, di Cortellazzo, e di Eraclea per completare alcune attività precedentemente avviate.
Dovrà essere garantito il finanziamento per le attività di monitoraggio e di gestione degli interventi già realizzati, con particolare riguardo ai ripascimenti che dovranno essere oggetto di manutenzione negli anni futuri.

Di seguito il dettaglio degli importi finanziati e il grafico con lo stato di attuazione dei finanziamenti (importi espressi in Mln di €).

DIFESA DALLE MAREGGIATE

Importi in milioni di €

	Fabbisogno Totale	Importi finanziati	Importi realizzati, in corso di realizzazione e di prossimo avvio	Importi spesi	Fabbisogno residuo da finanziare
Studi	19,681	19,681	19,681	18,945	0,000
Indagini, monitoraggi e gestione dei litorali	45,833	20,774	20,774	19,583	25,059
Litorale di Jesolo - Cortellazzo - Eraclea	57,321	39,321	39,321	39,027	18,000
Litorale di Cavallino	54,605	54,605	54,605	54,605	0,000
Litorale di Lido	40,752	29,752	29,752	27,094	11,000
Litorale di Pellestrina	162,931	162,931	162,302	161,907	0,000
Litorale di Sottomarina	7,284	7,284	7,284	7,284	0,000
Litorale di Isola Verde	21,092	21,092	21,030	20,285	0,000
Somme a disposizione / Revisione Prezzi	2,289	2,289	0,150	0,150	0,000
TOTALE	**411,789**	**357,730**	**354,900**	**348,881**	**54,059**

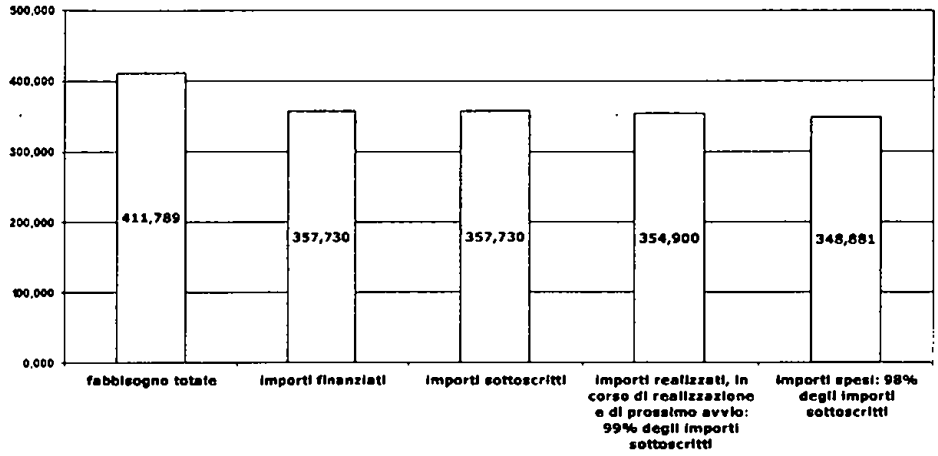

3.6 Recupero morfologico
(Interventi di cui all'art. 3 lettera a) legge n. 798/84)

Obiettivo

Obiettivo generale del recupero morfologico è la conservazione delle caratteristiche del sistema fisico ed ambientale della laguna contrastando l'erosione e la perdita di quota del territorio, ripristinando o tutelando le strutture morfologiche preesistenti, indirizzando i flussi mareali nelle diverse aree della laguna per migliorare di volta in volta le condizioni di vivificazione degli specchi acquei, confinando gli apporti di nutrienti e di sedimenti.
Gli interventi individuati hanno anche sempre l'obiettivo del ripristino dei dinamismi naturali tipici delle aree umide lagunari. Il principale riguarda il processo di accrescimento naturale delle zone umide e dei fondali per effetto congiunto di interventi atti a catturare i sedimenti e a favorire lo sviluppo della vegetazione, opponendosi cosi alla naturale perdita di quota del territorio lagunare per subsidenza, compattazione dei suoli superficiali e crescita del livello del mare.

Descrizione degli interventi

La Legge n. 798/84 e, particolarmente, la Legge n. 139/92 dispongono che gli interventi ambientali siano integrati e contestuali alle opere per la difesa dalle acque alte.

Condizione per la sopravvivenza della laguna di Venezia è, infatti, il suo riequilibrio ambientale.
Due fenomeni hanno contribuito al rapido degrado dell'ecosistema lagunare:

- l'erosione, che sottrae sabbia e sedimenti con una dinamica che provoca l'appiattimento dei fondali e la scomparsa delle strutture fisiche proprie dell'ambiente lagunare (canali, bassifondi, velme e barene);
- l'inquinamento che, divenuto imponente negli ultimi quarant'anni, ha causato il progressivo decadimento della qualità delle acque.

Le opere per contrastare i fenomeni suddetti sono state definite in due diversi progetti: quello del recupero morfologico e quello dell'arresto del degrado (v. paragrafo 3.7).

La ricchezza e la complessità morfologica dell'ecosistema lagunare vanno via via scomparendo per effetto di una serie di fattori che si alimentano tra loro. Erosione, acque alte e moto ondoso stanno gradualmente trasformando la laguna: essa sta perdendo le sue caratteristiche fisiche di zona umida per assumere, invece, quelle semplificate e indifferenziate dell'ambiente marino.
Contrastare l'erosione, trattenendo in laguna parte dei sedimenti che, per cause naturali o artificiali, si disperderebbero a mare o nella laguna stessa è il primo obiettivo degli interventi per il recupero morfologico, che sono finalizzati a ripristinare le funzioni ambientali, idrodinamiche e naturalistiche dei singoli elementi dell'ambiente lagunare, concorrendo a una complessiva rinaturalizzazione dell'ambiente.

Il programma degli interventi va dalla ricalibratura dei fondali dei canali lagunari soggetti all'interrimento, al riuso dei sedimenti dragati per la realizzazione di zone umide a marea (velme e barene); dalla protezione dei bordi e della vegetazione delle barene esistenti con le più avanzate tecniche dell'ingegneria naturalistica, al sovralzo dei fondali per contrastare il moto ondoso e al consolidamento dei fondali attraverso il trapianto di fanerogame. Di questo programma fanno parte anche i lavori per il ripristino delle sponde delle isole minori, degradatesi a causa della crescita del livello del mare e del moto ondoso.
Le aree di intervento vengono individuate anche sulla base di una serie di studi specifici che hanno consentito una suddivisione della

laguna in aree omogenee definite a seconda delle locali condizioni idrodinamiche, morfologiche, del valore ambientale ed a seconda degli usi.

Tutti gli interventi sulla morfologia mantengono nel loro insieme un carattere di costante attività locale con contenuti di innovazione e di sperimentalità.
Un continuo monitoraggio degli effetti consente di ottimizzarne via via l'efficacia. Le attività di monitoraggio, infatti, costituiscono l'indispensabile supporto ad alcuni tra i principali lavori realizzati e in corso e forniscono un quadro completo e dettagliato della situazione preesistente nelle aree in cui si opera, dei criteri e dei sistemi esecutivi adottati, degli effetti degli interventi a breve e lungo termine e della loro congruenza con le ipotesi progettuali.
Solamente attraverso il monitoraggio protratto per lunghi periodi (dell'ordine dei 5-10 anni) è possibile acquisire le conoscenze che consentono di raggiungere gli obiettivi di ricostruzione dell'ambiente lagunare attraverso progressivi affinamenti dei progetti, dei materiali impiegati e dei mezzi d'opera.

Stato di attuazione al 31 dicembre 2006

Attività finanziate
Specifici *interventi sperimentali* sono stati realizzati anche nell'ambito degli interventi di riequilibrio ambientale. In tali sperimentazioni, uniche nel loro genere eseguite in questo campo, sono state applicate strategie operative del tutto originali e tecnologie, per molti aspetti, innovative.

Anche sulla base dei primi risultati ottenuti con gli interventi sperimentali, il Magistrato alle Acque tramite il Consorzio Venezia Nuova ha, successivamente, predisposto un *progetto generale di massima per il ripristino della morfologia lagunare*, approvato dall'Amministrazione Concedente nel 1992, che prevede la realizzazione di una serie di interventi, già realizzati o in corso di realizzazione come più oltre descritto.

Si ritiene importante segnalare che, nel corso del 2004, è stato completato l'elaborato *Studi di base, linee-guida e proposte di intervento del Piano morfologico* redatto preliminarmente all'aggiornamento del *Piano Generale degli Interventi per il recupero morfologico*.

Le linee-guida per l'aggiornamento del Piano sono state illustrate alla Commissione degli Esperti del Magistrato alle Acque e, successivamente, sottoposte all'esame del Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque nelle sedute del 20 ottobre 2004 e del 24 novembre 2004. In quest'ultima seduta, il Comitato, con voto n. 165, ha espresso parere favorevole sul documento presentato, con raccomandazioni e osservazioni. In parallelo, l'*Ufficio di Piano* (ex D.P.C.M. 13 febbraio 2004) ha esaminato la documentazione prodotta, chiedendo un'estensione delle attività connesse all'aggiornamento del piano morfologico da svolgere con la partecipazione di tutti i soggetti interessati all'uso e alla gestione del territorio.
Queste ulteriori attività sono state oggetto di un disciplinare esaminato dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque nel dicembre 2006. Entro i primi mesi del 2007 saranno avviate le attività richieste, avvalendosi della collaborazione dei principali organi di ricerca.
Il recupero della morfologia lagunare è un processo in itinere che, da un lato, prevede la continuazione degli interventi la cui efficacia è già stata documentata e, dall'altro, introduce nuovi interventi che verranno definiti attraverso un processo di concertazione tra il Magistrato alle Acque e gli altri Enti preposti alla gestione della laguna.
L'Ufficio di Piano, nelle more della definizione finale dell'adeguamento del piano morfologico, ha espresso il parere che comunque prosegua l'azione di recupero morfologico già in atto da parte del Magistrato alle Acque e, in particolare, la realizzazione di quegli interventi che prevedono il riutilizzo dei sedimenti provenienti dalle attività di dragaggio alle bocche di porto.

Al 31 dicembre 2006, i principali interventi realizzati e in via di realizzazione sono i seguenti, raggruppati secondo i principali obiettivi:

a) *Ricalibratura dei canali, sollevamento dei bassi fondali e ricostruzione di velme e barene, anche attraverso il riuso dei sedimenti dragati e reintroducendo sedimenti in laguna; ricostruzione morfologica degli argini di conterminazione lagunare.*
   A seguito dell'approvazione da parte del Magistrato alle Acque dei relativi progetti esecutivi, gli interventi di ricalibratura hanno riguardato circa 170 km di canali lagunari e gli interventi

di ricostruzione delle strutture morfologiche lagunari hanno riguardato circa 125 aree di intervento.

Il quantitativo di sedimenti riutilizzato ha permesso di realizzare circa 1.190 ettari di velme, barene e sovralzi di fondale.

Nelle opere di recupero morfologico di questo tipo si utilizzano i sedimenti presenti in laguna, i quali hanno caratteristiche chimiche e fisiche fortemente variabili da zona a zona, il cui riutilizzo è regolato dal Protocollo d'Intesa del 08.04.1993.

In questo ambito, nel corso del 2006, sono proseguiti gli interventi di protezione delle barene in erosione attraverso la realizzazione di *cordoni sabbiosi sommersi in laguna centrale*. Attualmente è in corso di esecuzione il secondo stralcio di attività dei due cordoni sabbiosi che si prevede di ultimare nei primi mesi del 2007 e il ripascimento di due barene in località "Punta Vecia".

Sono proseguite le attività che riguardano la ricostruzione del tessuto morfologico di zone lagunari in situazioni particolarmente critiche, quali le zone delle *Casse di colmata D/E e del canale Fossetta dei Barambani* e dell'area lungo il canale *Cornio*.

Si fa rilevare, inoltre, la prosecuzione, nel corso del 2006, degli interventi di ripristino morfologico dell'area *Lago Teneri*, primo e secondo stralcio. Il primo stralcio prevede la ricalibratura del canale "Taglio vecchio" e il ripristino di quattro barene lungo il canale "Taglio vecchio" e il canale "Tezze fonde" con sedimenti idonei, provenienti dal lavori di dragaggio previsti nell'ambito di questo progetto e di ulteriori progetti morfologici. Il secondo stralcio riguarda il ripristino di due barene in corrispondenza di valle Zappa, con sedimenti provenienti dai dragaggi in corso per i lavori alle bocche di porto.

Si segnala anche che è stato completato l'intervento di protezione dei fondali adiacenti il canale *S. Leonardo – Marghera*, primo stralcio - prima fase pilota: la zona lungo il canale Malamocco - Marghera è una delle porzioni della laguna che ha subìto, in quest'ultimo trentennio, la maggiore evoluzione morfologica dovuta, soprattutto, allo scavo del "canale dei Petroli", tra la bocca di Malamocco e il porto S. Leonardo, che ha comportato un profondo mutamento del regime delle correnti di marea, provocando un progressivo appiattimento della laguna centrale per erosione dei bassofondali e sedimentazione dei canali naturali adiacenti, alcuni dei quali sono oggi, ormai, completamente scomparsi.

Con gli stralci successivi, si prevede la realizzazione di altre quattro strutture morfologiche a barena lungo i bassofondali adiacenti il canale.

Sempre in questo ambito di attività, si segnala la prosecuzione dell'intervento di recupero morfologico dell'area lungo il canale *Novissimo*. Il progetto riguarda la realizzazione delle 5 barene Otregan site nell'area di Valle della Dolce, in adiacenza al canale Novissimo. Tali barene sono realizzate mediante refluimento di sedimenti idonei, provenienti da altri interventi in corso di realizzazione in aree limitrofe e dagli interventi alla bocca di porto di Chioggia.

b) *Protezione delle barene; riavvio dei dinamismi naturali nei bassifondi e nelle barene; naturalizzazione delle barene già realizzate.*

La naturalizzazione dell'ambiente lagunare di fondale e di barena è un obiettivo importante per il recupero morfologico, in quanto consente di potenziare le capacità di automantenimento e di riorganizzazione del sistema lagunare attraverso processi naturali di accrescimento, sedimentazione e sviluppo della vegetazione che garantiscono la conservazione dell'identità del territorio. Le barene artificiali una volta completate mediante il refluimento dei sedimenti sono oggetto di processi naturali (l'assestamento della quota, le variazioni delle caratteristiche pedologiche, lo sviluppo della vegetazione) che trasformano il deposito dei sedimenti in un ambiente che, progressivamente, acquista i caratteri e le funzioni tipiche delle zone umide lagunari (elevata biodiversità, alta produzione biologica, capacità di automantenimento).

Gli interventi avviati in tal senso in questi anni sono:

- *protezione barene*: ad oggi gli interventi in corso di esecuzione o già realizzati hanno riguardato 54 aree.

  Negli interventi di protezione delle barene naturali vengono impiegati materiali diversi a seconda del grado di esposizione ai processi erosivi e nel rispetto dei vincoli di natura archeologica e paesaggistica.

  In generale sono state impiegate: palificate; burghe (strutture modulari cilindriche realizzate con geogriglia a diversa resistenza riempite in pietrame, sabbia, argilla o conchiglie); sovralzi sabbiosi; piantumazione di specie vegetali alofile secondo tipologie operative e modalità costruttive che ben si inseriscono nel paesaggio lagunare,

senza rinunciare ad una loro sufficiente durata; in alcuni casi si è iniziato a sperimentare i materiali biodegradabili;

- *interventi di riavvio dei dinamismi naturali*: sono stati realizzati interventi in 17 aree con fascinate di sedimentazione (aree confinate da fascine compatte di pioppo, salice, ecc., trattenute da una griglia in poliestere che favorisce la cattura dei sedimenti sospesi); in 38 aree con trapianto di vegetazione.

- *naturalizzazione delle barene artificiali*: si è intervenuti su 20 barene.
  Allo scopo di accelerare i processi di naturalizzazione delle barene artificiali, si è proceduto alla rimozione delle palificate di contenimento, una volta completato il consolidamento del materiale refluito. Ciò per facilitare lo scambio con le acque circostanti e, quindi, lo sviluppo naturale della vegetazione. Sono stati eseguiti anche scavi di "ghebi" e "chiari" all'interno delle barene artificiali per aumentare la diversificazione degli "habitat".
  E' stata infine, completata la realizzazione del vivaio dell'Isola dei Laghi (Torcello) per la produzione di piante di laguna che vengono utilizzate per rinaturalizzare le barene artificiali, accelerando i processi di sviluppo delle specie vegetali stabilizzanti.
  Il vivaio è ora in piena attività rifornendo costantemente di piante le aree d'intervento

c) *Arresto dell'erosione e del degrado ambientale delle isole minori.*
   E' stata completata, ovvero è in corso di esecuzione, la protezione di 12 isole (Campalto, Fisolo, San Servolo, Isola dei Laghi, Certosa, Lazzaretto Nuovo San Lazzaro degli Armeni, San Giacomo in Paludo, Poveglia,- completate; Lazzaretto Vecchio, San Francesco del Deserto, Mazzorbetto e S. Caterina, - in corso).
   Sono in fase di progettazione gli interventi riguardanti le isole di Vignole, San Giorgio in Alga, Madonna del Monte, Isola Campana, S. Angelo delle Polveri.

   Gli interventi riguardano il rinforzo di margini di isole in cui non era possibile ridurre l'azione erosiva del moto ondoso generato dal vento con interventi di protezione e sollevamento dei

fondali lagunari ed in cui non era nemmeno eliminabile il moto ondoso da natanti.

Anche nel corso del 2006 sono proseguite numerose *attività di studio, sperimentazione e monitoraggio* nel settore ambientale.
A seguito degli approfondimenti richiesti dalle Amministrazioni Comunali di Venezia e di Chioggia in sede di Comitato ex art. 4 Legge 798/84 nella seduta del 03.04.2003, nel corso del 2006 si è concluso lo studio *"Interventi per immettere in laguna acqua dolce e sedimenti trasportati dai fiumi. Analisi della disponibilità di sedimenti nel fiume Piave"*.
Proseguono, infine, le *attività di monitoraggio* che costituiscono l'indispensabile supporto ad alcuni tra i principali lavori, realizzati e in corso di realizzazione. Tali attività forniscono un quadro completo e dettagliato della situazione preesistente nelle aree in cui si opera, dei criteri e dei sistemi esecutivi adottati, degli effetti degli interventi a breve e lungo termine e della loro congruenza con le ipotesi progettuali.
Tra i principali monitoraggi realizzati e in corso si segnalano quelli della subsidenza dei suoli e della crescita del livello del mare; dell'andamento delle risorse alieutiche (pesci, crostacei e molluschi) in relazione allo sforzo di pesca; dell'avifauna, che ha dimostrato il valore ambientale delle barene di neoformazione con percentuali di frequentazione di specie di pregio a livello nazionale molto significative.

Attività da finanziare

Si segnala la necessità di disporre di ulteriori finanziamenti per poter proseguire, senza soluzione di continuità, gli interventi di ripristino morfologico nelle zone lagunari più critiche, secondo i nuovi indirizzi delineati nell'ambito dell'aggiornamento del Piano Morfologico.
In particolare è necessario disporre di finanziamenti per: sviluppare le attività di rinaturalizzazione e riattivazione dei dinamismi naturali del bacino lagunare; effettuare interventi di mitigazione degli effetti della pesca con mezzi meccanici e della navigazione; valutare l'efficacia di alcune soluzioni sperimentali di intervento per mettere a punto nuove tecniche costruttive delle strutture morfologiche; il completamento di ricostruzione morfologica e ambientale nelle zone critiche della laguna.

E' necessario, infine, disporre di finanziamenti per continuare i monitoraggi dei processi idro-morfologici e biologici, delle attività di pesca e della navigazione, degli esiti dei processi di rinaturalizzazione, condividendo, a livello scientifico, tali conoscenze con gli enti di ricerca e con gli enti territoriali competenti.

Di seguito il dettaglio degli importi finanziati e il grafico con lo stato di attuazione dei finanziamenti (importi espressi in Mln di €).

RECUPERO MORFOLOGICO

Importi in milioni di €

	Fabbisogno Totale	Importi finanziati	Importi realizzati, in corso di realizzazione e di prossimo avvio	Importi spesi	Fabbisogno residuo da finanziare
Studi e interventi sperimentali	53,305	41,601	41,601	35,348	11,704
Progetto generale, indagini	15,494	15,494	12,834	12,876	0,000
Ricalibratura canali, sollevamento bassi fondali e ricostruzione velme e barene, sistemazione argini di contenimnazione	318,352	241,086	238,521	225,775	77,266
Protezione barene, riavvio di dinamismi naturali, naturalizzazione barene	169,156	71,736	56,765	30,474	97,420
Interventi per l'arresto dell'erosione e del degrado ambientale delle isole minori	145,703	96,457	96,047	83,657	49,246
Somme disposizione / Revisione prezzi	4,624	4,624	3,752	3,752	0,000
TOTALE	**706,634**	**470,998**	**449,519**	**391,883**	**235,636**

Il fabbisogno totale e il finanziato non comprendono gli importi relativi a interventi morfologici strettamente connessi con la realizzazione delle opere alle bocche di porto, ricompresi, pertanto, nel "prezzo chiuso" (vedi scheda "Difesa dalle acque alte eccezionali").

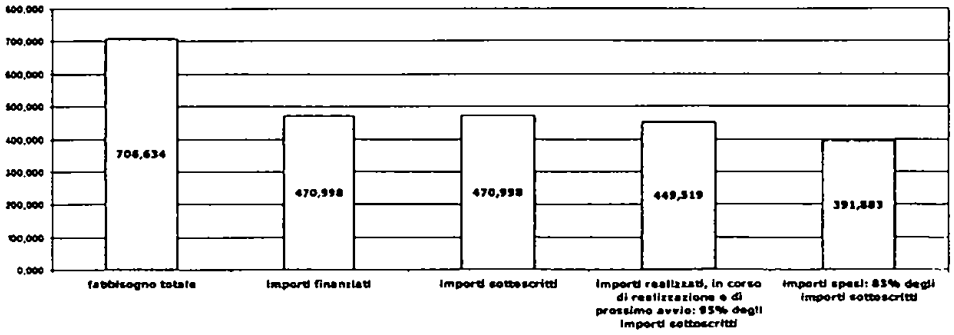

3.7 Arresto del degrado dell'ecosistema lagunare
(interventi di cui all'art. 3 lettera a) legge n. 798/84)

Obiettivo

Gli obiettivi degli interventi per l'arresto e l'inversione del degrado sono così raggruppabili:

- difesa della qualità delle acque, eliminando o limitando gli apporti di inquinanti provenienti dai depositi di rifiuti abbandonati;

- difesa della qualità delle acque, limitando la disponibilità delle sostanze inquinanti presenti nei sedimenti lagunari e dai fondali dei canali portuali;

- difesa della qualità delle acque, eliminando o limitando gli apporti di inquinanti provenienti dalle sponde delle "macroisole" a Porto Marghera;

- difesa della qualità, delle acque controllando gli apporti inquinanti provenienti dal bacino scolante in laguna.

In accordo con la Direttiva 2000/60/EC del Parlamento e del Consiglio Europeo, pubblicata il 22 Dicembre 2000 sulla GUCE, che ha istituito un quadro di riferimento comunitario per le politiche dell'acqua, la qualità delle acque non si definisce più solo in base alle caratteristiche chimiche e fisiche delle stesse ma sulla base dell'insieme degli aspetti che ne definiscono i caratteri e sostengono i processi ecologici. Gli obiettivi degli interventi devono quindi tener adeguatamente conto anche degli aspetti biologici e delle interazioni tra gli ecosistemi costituenti il Sistema lagunare.

Descrizione degli interventi

La situazione di degrado ambientale degli ecosistemi della laguna dovuta all'inquinamento ancora significativo (ancorché il picco degli apporti sia ormai stato superato da circa vent'anni) è indicata in modo macroscopico da: riduzione del numero delle specie animali e vegetali; distorsioni dei processi trofici; alterazioni nei processi metabolici, nelle capacità riproduttive e nella durata tipica della vita di molte specie animali; morie occasionali di pesci per scarsità di ossigeno nell'acqua; torbidità dell'acqua e conseguente ridislocazione della vegetazione acquatica (comprese le fanerogame, che con il loro apparato radicale, contrastano l'erosione dei fondali).

Gli studi condotti in questi anni, principalmente dal Magistrato alle Acque, hanno permesso di mettere gradualmente a fuoco anche gli aspetti meno appariscenti ma sempre significativi del degrado ambientale, e di affinare quindi gli interventi di contrasto ed eliminazione degli apporti inquinati e di correzione degli effetti indotti sul Sistema lagunare.

La scomparsa di una fascia di transizione tra terraferma e laguna, ai margini del bacino lagunare, ha aggravato la situazione, in quanto tale fascia catturava una grande quantità di nutrienti ed altre sostanze realizzando una "depurazione" naturale degli apporti e sosteneva "habitat" caratteristici e complementari di quelli lagunari per molta parte della fauna superiore.
Il disinquinamento delle acque che pervengono nel bacino lagunare dall'entroterra è, prevalentemente, di competenza della Regione del Veneto. Gli interventi di competenza del Magistrato alle Acque si attuano all'interno della conterminazione lagunare ed hanno come obiettivo la difesa e/o il miglioramento della qualità delle acque e dei sedimenti e, quindi, della biosfera lagunari.

Il Progetto Generale sviluppato dal Magistrato alle Acque tramite il concessionario Consorzio Venezia Nuova per l'arresto dei processi di degrado prevede diversi tipi di intervento che:

- eliminano, o limitano, gli apporti al sistema lagunare di inquinanti provenienti:
  - dai siti inquinati emersi interni alla conterminazione lagunare e dalle fonti puntuali e diffuse dislocate nel bacino scolante in laguna a questa recapitati tramite i corsi d'acqua superficiali e sotterranei;
  - dai sedimenti lagunari.

- migliorano la capacità delle diverse componenti di sopportare l'azione degli inquinanti, di reagire e di eliminare e disperdere gli inquinanti stessi.

Le azioni devono svilupparsi secondo una strategia volta, parallelamente, a:

- contrastare ed eliminare le situazioni critiche che possono causare collassi e crisi irreversibili del sistema, almeno localmente;
- ridurre, fino ad eliminarli, gli apporti inquinanti indesiderati e, successivamente, eliminare gli accumuli di inquinanti interni al sistema, intervenendo infine anche per reindirizzare la produttività biologica del sistema e ripristinare l'habitat e i processi ecologici che erano stati alterati dall'inquinamento, in stretto coordinamento con gli interventi di recupero e ripristino morfologico.

Mentre procede la riduzione degli apporti dai corsi d'acqua del bacino scolante e dagli scarichi diretti in laguna, l'azione del Magistrato alle Acque si è concentrata sulla difesa delle acque lagunari dal degrado causato dagli inquinanti provenienti da:

- rilasci, erosioni e dispersioni di materiali contaminanti dalle discariche incontrollate (ante DPR 915/1984), utilizzate in passato per smaltire rifiuti di diversa origine, tra cui scorie delle produzioni industriali, che ora si trovano abbandonate all'interno della conterminazione lagunare;
- rilasci, risospensioni e dispersioni di inquinanti e sedimenti in ambito portuale nonché esterni all'area critica di Porto Marghera: nuove tecniche di risanamento dei fondali vengono sperimentate in zone lagunari esterne alle aree più critiche per bloccare il rilascio di inquinanti via via accumulatisi nei sedimenti;
- rilasci, erosioni e dispersioni di materiali contaminanti dalle sponde delle "macroisole" di Porto Marghera afferenti suoli artificiali realizzati utilizzando anche residui delle lavorazioni industriali;
- apporti inquinanti provenienti dal bacino scolante in laguna.

Gli interventi di salvaguardia di Venezia e della sua laguna sono stati avviati dal Magistrato alle Acque attraverso il suo concessionario sulla base di quanto previsto nel *"Piano generale degli interventi"* allegato alla Convenzione Generale rep. n. 7191/1991, richiamato all'art. 3 della legge 139/1992 e, in particolare, sulla base del *"Progetto generale di massima degli interventi per l'arresto e l'inversione del degrado"* del settembre 1993.
Tale Piano prevede una serie di linee di intervento finalizzate all'arresto e all'inversione dei processi di degrado dell'ambiente lagunare: tra queste sono ricomprese le opere di protezione delle acque lagunari e quindi dell'ecosistema dai rilasci di sostanze alteranti provenienti da sedimenti inquinati e da depositi di rifiuti collocati all'interno della conterminazione lagunare. Ciò, pertanto, riguarda, in particolare, la zona delle "macroisole" e dei canali a Porto Marghera.

Le *"Schede per il coordinamento degli interventi di salvaguardia ambientale"* prodotte nell'autunno del 1995 dal Magistrato alle Acque e dalla Regione del Veneto, favorevolmente accolte dal Comitato ex art. 4 legge n. 798/84 nell'adunanza del 12.12.1995,

in linea con i contenuti del progetto generale del 1993, prevedono la realizzazione di specifici interventi nella zona di Porto Marghera, tra i quali: i marginamenti delle sponde dei canali, l'asportazione di sedimenti inquinati dagli stessi, la copertura dei sedimenti inquinati esistenti tra Venezia e Porto Marghera.

L'urgenza di tali interventi e la competenza del Magistrato alle Acque di Venezia sono state ribadite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (già Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio), sia con propria Ordinanza n. 4498 del 1.10.1996, sia con l'approvazione del programma di interventi per la sistemazione di tutte le sponde dei canali di Porto Marghera presentato dal Magistrato alle Acque in data 11.09.1996, da attuarsi nell'ambito degli interventi di cui alla deliberazione del CIPE del 12.07.1996.

L'approvazione, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12.02.1999, **dell'Accordo di Programma sulla Chimica a Porto Marghera (AdPCPM)**, dell'ottobre 1998, ha determinato un'accelerazione degli interventi programmati, consolidando il coordinamento tra Magistrato alle Acque e l'Autorità Portuale di Venezia e con le aziende industriali con affacci in concessione sui canali. Quest'ultime, in particolare, hanno l'obbligo di provvedere, a loro spese, alla messa in sicurezza di emergenza e alla bonifica delle proprie aree inquinate e delle relative falde, in modo tale da arrestare ed impedire la fuoriuscita di inquinanti dai terreni o dalle falde sottostanti le aree in concessione o di loro proprietà; per tale motivo, lo Stato (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Ministero delle Infrastrutture - Magistrato alle Acque di Venezia) ha sottoscritto atti di transazione e cooperazione con le aziende interessate, con i quali le stesse assumono, irrevocabilmente, irripetibilmente e incondizionatamente, l'obbligo di contribuire, in modo predeterminato, alla accelerazione del piano di realizzazione delle opere di messa in sicurezza delle aree avviato dallo Stato - Magistrato alle Acque di Venezia. Si ricorda che l'Accordo di Programma per la Chimica a Porto Marghera (AdPCPM) prevede, in particolare, al punto 3.1.a, che il Magistrato alle Acque e l'Autorità Portuale "*provvedano alle preliminari e necessarie opere di conterminazione dei siti, eventualmente integrandole con le opere di banchinamento*" e che il Magistrato alle Acque realizzi, anticipandone la spesa, gli interventi di marginamento dei canali industriali nell'area di Porto Marghera, provvedendo poi a "*ripetere quanto anticipato presso le Aziende che risultassero, in sede giurisdizionale o transattiva, responsabili dell'inquinamento*".

Gli interventi di conterminazione vengono attuati, quindi, dal Magistrato alle Acque secondo un piano concordato con la Regione del Veneto, che con il Progetto Integrato Fusina (PIF) sta riorganizzando e potenziando il sistema di captazione, recapito e trattamento delle acque reflue civili ed industriali, e con l'Autorità Portuale di Venezia, mediante specifici atti d'intesa che riguardano, principalmente, la realizzazione di opere di conterminazione delle sponde delle "macroisole" di Porto Marghera individuate dal "Master Plan delle bonifiche di Porto Marghera", dichiarato sito di interesse nazionale ex art. 1, legge 426/1998 (D.M. Ambiente 23.02.2000) e il dragaggio dei sedimenti inquinati depositati sul fondale e sulle rive dei canali industriali.

In data 7.4.2006 è stato sottoscritto l'"Accordo di Programma Quadro" tra Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture (già Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) - Magistrato alle Acque di Venezia e il Commissario Delegato per l'Emergenza Socio Economica Ambientale relativa ai Canali Portuali di grande Navigazione, per l'attuazione degli interventi di confinamento, tramite marginamento delle sponde, delle aree a terra incluse nel perimetro del Sito di Bonifica di Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera e di gestione dei sedimenti più inquinati presenti nei canali industriali e portuali.
L'Accordo di Programma Quadro ha riorganizzato competenze e programmi, attribuendo al Magistrato alle Acque la competenza ad eseguire tutte le opere di conterminazione delle macroisole, con i relativi drenaggi, non già attribuite ad altri soggetti privati (per esempio: Fincantieri) o pubblici (per esempio: Autorità Portuale), mentre gli scavi e i dragaggi per la portualità e la bonifica dei sedimenti dei canali, con le opere associate, vengono attribuiti all'Autorità Portuale di Venezia e al Commissario Delegato per l'Emergenza Socio Economico Ambientale relativa ai Canali Portuali di Grande navigazione.

Stato di attuazione al 31 dicembre 2006

Attività finanziate
I primi *interventi sperimentali* di riequilibrio ambientale sono stati realizzati nella *zona tra i canali S. Spirito e delle "Scoasse"*, una zona di fronte all'isola di Lido caratterizzata da abnorme crescita di macroalghe, nel *Lago dei Teneri*, un tratto di laguna retrostante le

casse di colmata, e in *Palude della Rosa*, vicino all'isola di Torcello. Si è potuta verificare la risposta locale dell'ecosistema ai trattamenti compiuti per il miglioramento della qualità dei sedimenti del fondale.

Il Magistrato alle Acque di Venezia tramite il proprio concessionario Consorzio Venezia Nuova ha redatto un *progetto di massima degli interventi per l'arresto del degrado* che è stato approvato dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque nel 1993.

La progressiva realizzazione del progetto generale degli interventi per l'arresto ed inversione dei processi di degrado prevede una serie di *interventi* secondo le seguenti principali tipologie:

a) difesa della qualità delle acque eliminando o limitando gli apporti di inquinanti provenienti dai depositi di rifiuti abbandonati all'interno della conterminazione lagunare;
Tra i compiti che lo Stato ha affidato al Magistrato alle Acque - Consorzio Venezia Nuova vi è la realizzazione di interventi volti alla messa in sicurezza di discariche abbandonate e, in particolare, delle discariche realizzate come ampliamento di isole esistenti o come nuove isole. Infatti, il loro stato di degrado provoca, tra l'altro, il rilascio e la dispersione in laguna delle sostanze inquinanti depositate in passato. Le discariche, delle quale deve essere assicurato anche il reinserimento nell'ambiente e nel paesaggio circostante, vengono rese sicure dotandole di conterminazioni stabili e resistenti al fenomeni erosivi e di opere di impermeabilizzazione adeguate, caso per caso, alle diverse necessità locali. Sono già stati realizzati interventi di messa in sicurezza nelle discariche di Val da Rio a sud del centro storico di Chioggia, nel quartiere di Borgo S. Giovanni e dell'isola dell'ex Inceneritore, all'estremità ovest dell'isola della Giudecca, a Venezia.

b) difesa della qualità delle acque mediante interventi che limitano la disponibilità delle sostanze inquinanti presenti nei sedimenti lagunari e nei sedimenti situati sui fondali dei canali portuali.
Nell'area industriale di Porto Marghera, si sta svolgendo *l'attività di asportazione dei sedimenti inquinanti dal fondale del canale industriale Nord:* l'intervento, avviato nel 1996, con una prima fase completata nel 2000, risponde alla finalità di realizzare uno scavo dello specchio acqueo in prossimità della banchina in concessione alla Fincantieri S.p.A., allontanando dal sito il materiale inquinante

ivi depositato che, nel tempo, continuava a rilasciare sostanze provenienti dalle lavorazioni industriali.
Nel corso del 2001 sono state completate anche le lavorazioni relative alla seconda fase e sono state avviate le lavorazioni relative al secondo stralcio, la cui prima fase è in corso di esecuzione.

Inoltre, nel corso del 2006 è stata avviata una prima fase di attività di indagini e monitoraggi nelle aree lagunari tra Venezia e Porto Marghera, prevista nell'ambito dello specifico Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare e il Magistrato alle Acque, siglato in data 7.03.2006.
L'Accordo prevede la realizzazione di specifici interventi di arresto ed inversione dei processi di degrado e di ripristino idrogeomorfologico dell'ambiente lagunare nell'estesa zona di laguna compresa tra Venezia e Porto Marghera (3.700 ettari).
Si tratta di interventi di competenza del Magistrato alle Acque ex art. 3 legge n. 798/84 ed art. 3, comma 1, legge n. 139/1992, da questo programmati nell'ambito del Piano Generale degli Interventi affidati in concessione, nonché di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in quanto interventi di bonifica dei sedimenti relativamente alla porzione di zona di laguna compresa nel perimetro del Sito di Interesse Nazionale di Venezia – Porto Marghera (2.200 ettari).
Tali interventi hanno come obiettivo il risanamento durevole delle matrici (acqua, sedimento e biota) degli ecosistemi della zona, caratterizzata da inquinamento proveniente da Porto Marghera, garantendo "habitat" adatti all'insediamento duraturo delle specie vegetali ed animali caratteristiche dei bassi fondali, dei canali e delle barene della laguna centrale ed assicurando al contempo il mantenimento degli usi legittimi e delle attività lagunari tradizionali.
In particolare, gli interventi sono rivolti ad ottenere il complessivo obiettivo di ricostruzione morfologica e di bonifica dell'area, con evidenti ricadute positive in termini ambientali ed economici.

Al di fuori dell'area critica di Porto Marghera, gli interventi del Piano Generale già realizzati, in corso e in fase di progettazione sono:

- confinamento mediante ricopertura dei sedimenti dei bassifondali inquinati riguardanti volumi di sedimenti tali da non poter essere asportati e sostituiti, ricostruendo così habitat

adatti alla flora e alla fauna lagunari (interventi effettuati con interessanti risultati nel corso degli anni '90 ma ormai non più realizzabili con le nuove norme di tutela ambientale);
- realizzazione di installazioni di messa in riserva temporanea dei sedimenti inquinati in attesa del loro trattamento;
- realizzazione di impianti di condizionamento dei sedimenti inquinati a supporto dei successivi processi di trattamento e di smaltimento;
- raccolta selettiva delle macroalghe nitrofile e riutilizzo delle stesse.

In particolare a partire dal 1989, il Consorzio Venezia Nuova ha svolto periodiche *campagne di raccolta delle macroalghe*, predisponendo anche un sistema di monitoraggi che indirizzano gli interventi nelle aree maggiormente a rischio (Burano, Tessera, Campalto, Lido, Giudecca e Chioggia). Fino ad oggi sono stati raccolti 221.000 metri cubi di alghe, con un massimo di 50.000 metri cubi nel 1989.

Parte del materiale raccolto è stato utilizzato, per la prima volta, nella produzione di carta. Ne è stato studiato, tra l'altro, anche il possibile uso come ammendante in agricoltura.

c) difesa della qualità delle acque eliminando o limitando gli apporti di inquinanti provenienti dalle sponde delle "macroisole" a Porto Marghera;

Con riguardo alle fonti di inquinamento che Porto Marghera determina per le acque e per gli ecosistemi lagunari, è opportuno ricordare che le aree industriali di Porto Marghera sono state realizzate, negli anni dal 1920 al 1960, imbonendo zone lagunari di barene con riporti di materiali eterogenei quali terre da dragaggi portuali, residui di lavorazioni industriali e rifiuti solidi urbani.

Oggi in alcuni casi, lungo le sponde dei canali industriali, tali materiali sono a contatto con le acque lagunari, per cui si verifica il rilascio di sostanze inquinanti per effetto del moto ondoso, della marea e del dilavamento da parte delle piogge. Sui fondali dei canali, inoltre, si sono via via accumulate sostanze inquinanti provenienti dai reflui delle lavorazioni portuali e industriali: un problema che solo da alcuni anni è apparso in tutta la sua gravità e viene oggi affrontato in modo sistematico e organico.

Gli interventi previsti consistono, pertanto, nella realizzazione del marginamento delle sponde, collegato con interventi di drenaggio dei suoli retrostante e con il collettamento delle acque meteoriche,

con la sistemazione e messa a norma degli scarichi e nella realizzazione dei retromarginamenti per la completa "cinturazione delle macroisole" lungo il perimetro.
Si eliminano così:

- l'erosione e la dispersione dei materiali di sponda inquinati;
- gli apporti di acque di falda (superficiale e 1^ falda);
- gli apporti di acque meteoriche dilavanti i suoli inquinati.

Una volta eliminati gli apporti di inquinanti dalle sponde dei canali si potrà procedere al progressivo risanamento dei loro fondali.

La progettazione degli interventi di conterminazione e di messa in sicurezza delle "macroisole" è stata avviata da tempo ed è ormai già completata o in avanzata fase di sviluppo; numerosi lavori sono già stati realizzati o sono in corso di realizzazione.

Gli interventi cosiddetti di 1^ fase sono quelli a maggiore priorità ambientale (messa in sicurezza delle sponde e completamento della messa in sicurezza) e consentono, attraverso sistemi di confinamento, di isolare acque e suoli inquinati dall'ambiente lagunare.
I sistemi di messa in sicurezza delle sponde prevedono generalmente marginamenti costituiti da serie di palancole metalliche infisse lungo l'asse del filo della sponda, individuato dal "Piano Regolatore Portuale"; le palancole sono tra loro strutturalmente collegate e sigillate con apposite guarnizioni poliuretaniche e spinte fino alla quota necessaria ad assicurare l'intercettazione delle acque della prima falda in pressione. Qualora la quota del fondale del canale antistante la schiera di palancole sia maggiore di -4 metri sul l.m.m., il palancolato metallico prevede un rinforzo strutturale costituito da tirantature ed ancoraggi. Qualora sia prevedibile la trasformazione del marginamento in una banchina portuale, il sistema di palancole viene opportunamente dimensionato per fornire la necessaria resistenza strutturale ai maggiori carichi derivanti dalla prospettata successiva asportazione del materiale antistante, lato canale, fino alla profondità prevista dal "Piano Regolatore Portuale".
La quota superiore del marginamento è compresa tra +2,1 e +2,5 metri sul l.m.m.; la profondità di infissione delle palancole varia da -14 a -28 metri dal l.m.m..
Gli interventi di completamento della messa in sicurezza delle sponde prevedono, poi, sistemi di drenaggio delle acque di falda retrostanti i marginamenti per mantenere invariato il regime

piezometrico; le acque di falda drenate vengono allontanate, a gravità o con pompaggio, in cunicoli di adduzione e recapitate all'impianto di depurazione multifunzionale di Fusina, in fase di realizzazione da parte della Regione del Veneto (Progetto Integrato Fusina - PIF) anche mediante lo specifico Accordo di Programma siglato nel corso del 2005 con il Magistrato alle Acque.

Gli interventi di 1^ fase eseguiti, in corso di esecuzione e di prossimo avvio (esecutivo approvato) al 31.12.2006, riguardano:

- lungo la "macroisola" di San Giuliano: la sponda nord, verso la laguna e il canale delle Rotte, la sponda est verso la laguna e parte della sponda sud, lungo il canale di San Giuliano;

- lungo la "macroisola" di Passo Campalto: *tutte le sponde* lato laguna, lato canali Osellino / Marzenego e lato canale delle Rotte (lavori ultimati);

- lungo la "macroisola" 1^ Zona industriale: la sponda ovest del *canale Brentella*; la sponda nord del *canale industriale nord*;

- lungo la "macroisola" Portuale: la *sponda est del canale industriale Ovest*;

- lungo la "macroisola" delle Raffinerie: le sponde del *canale industriale Brentella*; la sponda nord del *canale Vittorio Emanuele III*; la sponda lagunare detta *III Argine*; la sponda lagunare dell'area cosiddetta dei *Pili*; la sponda sud del canale *S. Giuliano*. In questa "macroisola", in particolare, si segnala l'avvio degli importanti lavori di bonifica, con misure di sicurezza, delle aree dei Pili e del III Argine;

- lungo la "macroisola" dei Serbatoi petroliferi: *tutte le sponde* della "macroisola": ovest, nord e sud;

- lungo la "macroisola" del Vecchio Petrolchimico: la sponda nord del *canale Lusore Brentelle*; la sponda nord della *darsena della Rana*; un tratto della *sponda ovest del canale industriale ovest;*

- lungo la "macroisola" del Nuovo Petrolchimico: la *sponda nord del canale industriale sud,* ove l'erosione della riva e i rilasci di inquinanti, soprattutto fanghi di bauxite, i cosiddetti "fanghi rossi", erano particolarmente evidenti; la sponda ovest del

canale S. Leonardo - Marghera; la *sponda sud del canale industriale Ovest; la sponda sud della darsena della Rana; la sponda sud del canale Lusore-Brentelle;*

- lungo la "macroisola" delle Tresse: *tutte le sponde* lato laguna e lato canale S. Leonardo – Marghera (lavori ultimati);

- lungo la "macroisola" di Malcontenta: la *darsena terminale del canale industriale sud:la sponda nord* in corrispondenza dell'area in concessione a Sirma S.p.A. e la *sponda ovest (Alles)*;

- lungo la "macroisola" di Fusina, per 2.205 metri di sponda: la *sponda sud* del *canale industriale sud,* in corrispondenza dell'area già di proprietà Abibes S.p.A., del tratto "Pagnan-Colacem", del tratto "Fassa ex Edison", del tratto "Syndial Polimeri Europa" e in corrispondenza del compendio di proprietà del Comune di Venezia denominato "area 43 ettari". In questa zona l'area, sostanzialmente formata da rifiuti industriali, la cui sponda non ha nessuna protezione, rappresenta una delle principali fonti di inquinamento del canale; la sistemazione della *sponda ovest del canale San Leonardo - Marghera* compresa tra il il bacino di evoluzione 4 e l'area ex Alumix in cui il Porto prevede la realizzazione di un nuovo terminal RoRo.

Gli interventi di conterminazione di 2^ fase sono quelli volti ad aumentare, ove necessario, le prestazioni e l'efficacia delle opere di confinamento già esistenti che evitano l'erosione ed intercettano la falda superficiale e le acque meteoriche dilavanti suoli inquinati.
L'Accordo di Programma del 7 aprile 2006 (art. 5) fa rientrare i seguenti retromarginamenti tra gli interventi di 2^ fase:

- Retromarginamento "1^ Zona Industriale";
- Retromarginamento "Vecchio Petrolchimico";
- Retromarginamento "Nuovo Petrolchimico";
- Retromarginamento "Malcontenta";
- Retromarginamento "Fusina";

le relative progettazioni sono state avviate ma per potersi concludere devono ricevere i dati delle indagini specificamente avviate.

d) difesa della qualità delle acque lagunari mediante interventi di controllo degli apporti inquinanti dal bacino scolante.

Gli apporti di inquinanti dal bacino scolante in laguna, compreso il territorio delle isole lagunari e delle isole del litorale, si sono significativamente ridotti negli ultimi due decenni per effetto degli interventi di collettamento e depurazione degli scarichi civili e del miglioramento della gestione dei reflui degli impianti produttivi.

I livelli di inquinanti, nutrienti e bioalteranti (inorganici ed organici di sintesi) immessi in laguna dai corsi d'acqua sono tuttavia ancora significativi, per cui appare necessario sviluppare interventi volti ad integrare, agendo sull'interfaccia tra laguna e bacino scolante, l'importante programma che la Regione del Veneto sta attuando secondo un proprio "Piano Direttore", periodicamente aggiornato.

Gli interventi affidati al Magistrato alle Acque riguardano:

- realizzazione di strutture morfologiche in prossimità delle foci atte a favorire i processi di sedimentazione degli apporti solidi e dei residui dei processi di flocculazione dei soluti quando le acque da dolci diventano salmastre, in modo da confinare e ridurre le aree di influenza degli apporti inquinanti e, al contempo, realizzare zone a vegetazione palustre salmastra, un tipo di habitat lagunare in progressiva perdita di area;
- regolazione ed eventuale diversione temporanea dei flussi idraulici immessi in laguna in condizioni di piena, quando è massimo il carico di inquinanti veicolato dalle acque immesse;
- trasferimento di parte delle acque dolci che arrivano in laguna in bacini di sedimentazione e fitodepurazione, prima della loro definitiva immissione in laguna.

Sono state ultimate o sono in corso di realizzazione alcune *aree umide in zone di transizione*, localizzate alla foce del fiume Dese in Palude di Cona, a lato del canale Nuovo e alla foce Cavaizza e delle *aree sperimentali di fitodepurazione* a lato del fiume Brenta, nel ramo abbandonato del canale Novissimo, a servizio delle acque provenienti dal canale Montalbano; un impianto sperimentale è stato in parte realizzato nell'ambito dell'isola demaniale del Lazzaretto Nuovo, per evitare l'immissione di scarichi civili non trattati in laguna.

Inoltre sono stati realizzati, e sono in corso di realizzazione, manufatti di regolazione delle immissioni in laguna delle acque dolci nella zona di Botte Trezze.

Con gli interventi di regolazione dei manufatti idraulici, sarà invece possibile controllare nel tempo le quantità di acqua dolce da

immettere in laguna, aumentando così l'estensione delle aree a canneto.

Si segnala che le progettazioni esecutive degli interventi realizzati, in corso di realizzazione e di prossimo avvio possono avvalersi di importanti dati acquisiti mediante specifiche campagne di indagine che consentono di:

- definire e mantenere aggiornato lo stato degli ecosistemi lagunari e delle loro linee di evoluzione tendenziale, individuando priorità, opportunità e sinergie di intervento;
- ottenere una mappatura delle caratteristiche chimiche, fisiche, mineralogiche, idrogeologiche e geotecniche dei depositi di rifiuti e dei sedimi su cui questi giacciono nonché dei sedimenti, sia dei bassifondali, che dei canali, che dei materiali costituenti le sponde dei canali;
- ottenere una mappatura dei popolamenti bentonici, vegetali ed animali degli ecosistemi lagunari che potrebbero essere bersaglio e poi veicolo di propagazione dell'inquinamento
- stabilire le profondità a cui eventualmente scavare e bonificare i fondali, i relativi volumi di sedimenti da prelevare e le modalità di gestione, definendo la possibile destinazione dei sedimenti e le modalità di trattamento;
- acquisire elementi sulla pericolosità per la salute umana e per gli ecosistemi lagunari dei diversi depositi di inquinanti, anche in relazione alla graduale evoluzione dello stato complessivo dell'ecosistema.

Sono stati realizzati, inoltre, e sono in corso importanti monitoraggi "ex ante" e "post ante" che perseguono tre finalità strettamente correlate:

- tenere aggiornate le basi conoscitive generate dalle indagini a supporto della programmazione e della progettazione degli interventi;
- controllare l'efficacia diretta ed indiretta degli interventi realizzati, al fine di migliorare l'efficienza dell'azione del Magistrato alle Acque e di correggere eventuali insufficienze;
- sostenere il Magistrato alle Acque nella sua azione di gestore generale del sistema lagunare attribuitagli dalla legge, in collaborazione con la Regione del Veneto, le Province e i Comuni interessati.

Attività da finanziare

Le attività di monitoraggio degli ambienti lagunari dovranno essere garantite almeno per tutto l'arco di attuazione degli interventi programmati, a supporto della cui progettazione verranno eseguite le necessarie indagini.

Dovrà essere completato il programma di isolamento dalla laguna dei suoli di Porto Marghera, realizzando anche le connesse opere di captazione e convogliamento delle acque retrostanti agli impianti di depurazione.

Verranno anche effettuati interventi sulle falde potenzialmente advettrici di inquinanti al sistema lagunare, sia mediante interventi di puro confinamento, captazione e trattamento, sia mediante realizzazione di barriere semipermeabili capaci di catturare o di modificare gli inquinanti senza alterarne significativamente i flussi.

Una volta realizzato il marginamento di messa in sicurezza, nelle aree demaniali interessate da depositi incontrollati di rifiuti si potrà procedere alla bonifica selettiva, all'isolamento delle aree con particolari caratteristiche di inquinamento e, infine, al completamento della sistemazione ambientale delle aree.

Una volta drasticamente ridotti gli apporti inquinanti al sistema lagunare, si potrà procedere alla sostanziale riduzione degli apporti inquinanti provenienti dai sedimenti lagunari.

Complessivamente gli interventi anzidetti riguarderanno meno del 10% dei 49.000 ettari di laguna aperti all'escursione della marea.

Gli interventi di diversione saltuaria e controllata delle immissioni di acque dolci dal bacino scolante, infine, dovranno interessare diverse foci fino a permettere di regolare almeno il 50% dei flussi annualmente recapitati in laguna.

Le aree di fitobiodepurazione dovranno essere integrate con gli interventi di rinaturalizzazione delle fasce di gronda e di ricostituzione di zone di graduale transizione tra terra ed acqua, estendendosi complessivamente (considerando anche quelle realizzate negli interventi di competenza regionale) per una superficie pari almeno al 5% di quella lagunare.

Di seguito il dettaglio degli importi finanziati e il grafico con lo stato di attuazione dei finanziamenti (importi espressi in Mln di €).

ARRESTO DEL DEGRADO DELL'ECOSISTEMA LAGUNARE

Importi in milioni di €

	Fabbisogno Totale	Importi finanziati	Importi realizzati, in corso di realizzazione e di prossimo avvio	Importi spesi	Fabbisogno residuo da finanziare
Studi	28,179	22,213	22,213	21,525	5,966
Progetti generali, indagini e monitoraggi generali, interventi sperimentali	52,726	50,226	48,226	45,653	2,500
Interventi che limitano gli apporti di inquinanti provenienti da depositi di rifiuti abbandonati	58,106	29,606	29,606	18,705	28,500
Interventi che limitano gli apporti inquinanti provenienti dalle sponde delle Macroisole a Porto Marghera	905,602	725,828	572,013	266,481	179,774
Interventi che limitano la disponibilità di sostanze inquinanti provenienti dai sedimenti lagunari e dai fondali dei canali industriali	127,649	112,649	110,607	110,568	15,000
Interventi di controllo degli apporti inquinanti provenienti dal bacino scolante	105,146	54,513	54,384	38,403	50,633
Somme disposizione / Revisione prezzi	7,611	7,611	0,221	0,221	0,000
TOTALE	**1.285,019**	**1.002,646**	**837,270**	**501,557**	**282,373**

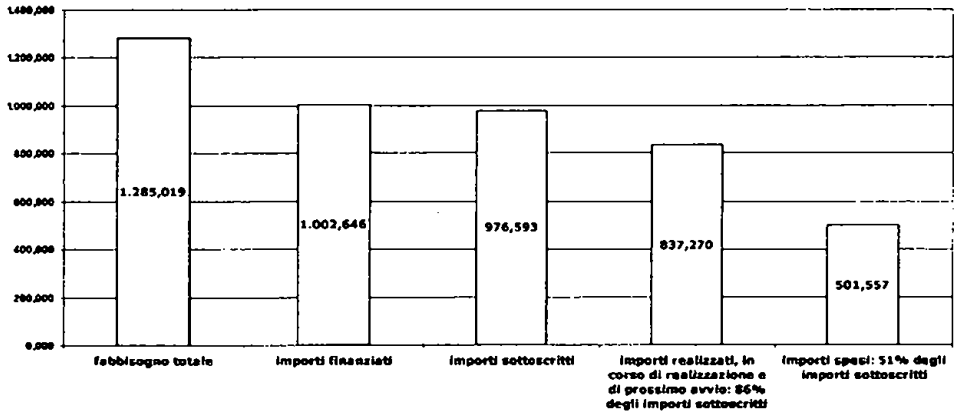

3.8 Allontanamento del traffico petrolifero dalla laguna
(Interventi di cui all'art. 3 lettera l) legge n. 798/84)

Obiettivo

Studiare la fattibilità delle opere necessarie ad evitare il trasporto in laguna di petroli e derivati, al fine di eliminare i rischi derivanti da sversamenti accidentali di prodotti pericolosi per l'ecosistema lagunare.

Descrizione degli interventi

Nella laguna di Venezia transitano mediamente, ogni anno, circa dodici milioni di tonnellate di prodotti petroliferi e chimici liquidi. Oltre 1.200 navi, di diverso tonnellaggio, sono interessate da questo traffico.

Il traffico petrolifero costituisce un rischio potenziale gravissimo per l'ambiente lagunare: per la sua struttura morfologica, la laguna non è in grado di tollerare alcun consistente sversamento di sostanze inquinanti che immediatamente si diffonderebbero nel fitto tessuto delle barene e nei bassi fondali ove è impossibile l'azione dei mezzi di soccorso. I centri abitati lagunari e Venezia subirebbero danni irreversibili.

Si ricorda che per l'eliminazione di rischi derivanti da sversamenti accidentali di prodotti petroliferi all'interno del bacino lagunare, il legislatore, a partire dalla legge n. 171/73 in poi, ha chiaramente indicato la necessità di approfondire la fattibilità di estromettere dalla laguna i traffici di prodotti pericolosi per l'ecosistema lagunare, affidandone la competenza allo Stato; in particolare, la legge n. 798/84 all'Art. 3 lettera l) indica come interventi di competenza dello Stato la realizzazione di "*studi e progettazioni ... per l'aggiornamento degli studi sulla laguna, con particolare riferimento ad uno studio di fattibilità delle opere necessarie ad evitare il trasporto nella laguna di petroli e derivati...*", mentre la legge n. 139/92, prevedendo l'esecuzione degli interventi di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici (ora delle Infrastrutture e dei Trasporti), secondo il Piano Generale degli Interventi approvato dal Comitato ex art. 4 Legge 798/84 nella seduta del 19 giugno 1991, indica, tra gli interventi da realizzarsi secondo il Piano stesso, quelli "*relativi alla sostituzione del traffico petrolifero in laguna*" (cfr. Art. 3 comma 2).

Stato di attuazione al 31 dicembre 2006

Attività finanziate

In questo ambito di attività, il Magistrato alle Acque, attraverso il proprio concessionario, ha nel corso degli anni realizzato numerosi *studi propedeutici* e un *progetto operativo* volti ad esaminare e approfondire le diverse soluzioni possibili di intervento per l'estromissione del traffico petrolifero dalla laguna.

Tra le attività più recenti, si ricorda che il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota del 25.10.2001, ha invitato il Magistrato alle Acque di Venezia a considerare l'ipotesi di realizzare un "punto di scarico" esterno alla laguna e collegato con "pipeline" al Porto di Marghera, per estromettere il traffico petrolifero dalla laguna.

A seguito di tale richiesta, è stata presentata al Comitato ex art. 4 legge n. 798/84, nell'adunanza del 6.12.2001, una scheda progettuale di fattibilità di un *terminale "off-shore" al largo dei lidi veneziani*, collegato a terra con un oleodotto ancorato al fondo del mare fino al cordone litoraneo e posto all'interno di una apposita galleria, in laguna, fino al Porto San Leonardo, per l'estromissione del greggio, in modo da eliminare il rischio connesso al mantenimento del traffico dei petroli in laguna garantendo, comunque, lo svolgimento delle attività produttive presenti.

Il Comitato ex art 4 legge n. 798/84 ha approvato la soluzione proposta; conseguentemente il Magistrato alle Acque ha invitato il Concessionario a sviluppare il progetto preliminare. Nello sviluppo della progettazione e' emersa la necessità di estromettere dalla laguna tutti i prodotti a rischio e, quindi, non solo il greggio ma anche i prodotti chimici derivati dal petrolio. E' stata, pertanto, sviluppata la progettazione di una struttura "off-shore" in collegamento, sempre attraverso pipeline, con la zona industriale di Porto Marghera.

Il progetto preliminare è stato favorevolmente esaminato dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque nell'adunanza del dicembre 2002. Il Comitato ha, altresì, invitato il Magistrato alle Acque a sviluppare un'analisi di costi - benefici della soluzione proposta, le cui conclusioni sono state sottoposte all'attenzione del Comitato ex art. 4 legge n. 798/84 nella seduta del 4.02.2003. In quella sede il Magistrato alle Acque è stato incaricato di avviare la progettazione definitiva della soluzione presentata, provvedendo alla preventiva acquisizione dei pareri di legge in merito alla compatibilità ambientale dell'opera.

In ottemperanza a tale prescrizione, il Magistrato alle Acque ha conferito specifico incarico al concessionario di svolgere il relativo Studio di Impatto Ambientale (SIA) e, una volta concluso lo stesso, ha avviato la procedura di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale), attualmente in corso. In particolare, il Magistrato alle Acque ha predisposto, nel corso del 2006, l'ulteriore documentazione, richiesta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in ordine alla pronuncia di compatibilità ambientale. La Capitaneria di Porto di Venezia, l'Autorità Portuale di Venezia, la Commissione Regionale di V.I.A. e il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali hanno già espresso parere favorevole alla soluzione prospettata.

Attività da finanziare

Il Piano Generale degli Interventi prevede il finanziamento da reperire per l'esecuzione dell'intervento pilota e, successivamente, dell'intervento complessivo per la protezione da sversamenti accidentali mediante la realizzazione di panne di contenimento lungo il canale Malamocco – Marghera. Prevede anche il finanziamento di alcune attività preliminari e la progettazione definitiva ed esecutiva dell'approdo off-shore in Alto Adriatico.

Di seguito il dettaglio degli importi finanziati e il grafico con lo stato di attuazione dei finanziamenti (importi espressi in Mln di €).

ALLONTANAMENTO DEL TRAFFICO PETROLIFERO

importi in milioni di €

	Fabbisogno Totale	Importi finanziati	Importi realizzati, in corso di realizzazione e di prossimo avvio	Importi spesi	Fabbisogno residuo da finanziare
Studi	3,864	3,864	3,864	3,805	0,000
Progetti	14,160	3,904	3,904	3,904	10,255
Interventi sperimentali	13,770	0,770	0,000	0,039	13,000
Somme disposizione / Revisione prezzi	0,017	0,017	0,015	0,015	0,000
TOTALE	**31,811**	**8,556**	**7,784**	**7,764**	**23,255**

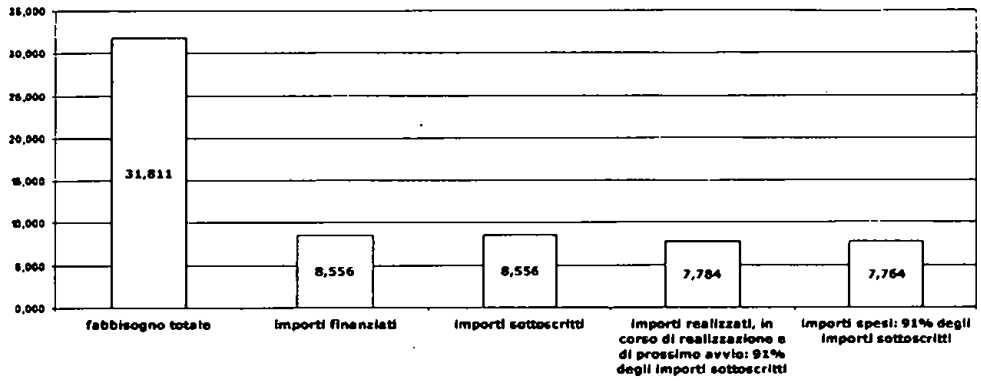

3.9 Ausilii luminosi alla navigazione
(Interventi di cui all'art. 3 lettera d) legge n. 798/84)

Obiettivo

Realizzare un sistema di illuminazione del canale Malamocco - S. Leonardo - Marghera, per consentire la navigazione anche nelle ore notturne e nelle giornate nebbiose in condizioni di sicurezza, quale intervento di mitigazione per recuperare gli eventuali "ritardi" imputabili alla chiusura delle bocche di porto durante i fenomeni di acqua alta.

Descrizione degli interventi

Per rendere più sicura la navigazione in laguna, nelle ore notturne e in caso di scarsa visibilità dovuta alla nebbia, sono stati messi in opera un sistema di illuminazione e una serie di strumentazioni ausiliarie lungo il canale tra la bocca di porto di Malamocco e la zona industriale di Porto Marghera. Il sistema predisposto consente di ridurre i rischi di incidenti e di migliorare la capacità operativa delle aree portuali di Venezia.

In futuro, inoltre, esso potrà soddisfare nuove esigenze: bilanciare i periodi di forzata inagibilità delle bocche lagunari dovuti alla chiusura dei varchi in occasione di alte maree eccezionali e migliorare, comunque, la competitività portuale.

Stato di attuazione al 31 dicembre 2006

Attività finanziate

Mediante l'esecuzione di *studi specifici* sono stati valutati gli interventi in grado di migliorare l'agibilità e la sicurezza complessiva del porto: in questo ambito sono stati forniti gli elementi per la progettazione e la realizzazione dell'intervento detto "*sentiero luminoso*".
Su entrambi i lati del canale tra Malamocco e Marghera, per complessivi 15 km, sono stati disposti 340 segnali luminosi, installati a 80 metri l'uno dall'altro, 111 riflettori radar, collocati sulla sommità dei pali di supporto dei segnali luminosi, e 4 "fog detectors" per rilevare le condizioni di visibilità.
I punti luce, situati a circa 8 metri sopra il livello del mare, sono costituiti da lampade a vapori di sodio a bassa pressione montate su uno stelo di acciaio inossidabile.

L'intero *intervento* è stato completato nel 1996.
Nel corso del 1997 è stata completata l'attività di *videomonitoraggio* che, mediante l'impiego di telecamere equipaggiate con intensificatori di luminosità, ha consentito la memorizzazione delle immagini del traffico in una apposita banca dati.
Il "sentiero luminoso" è stato definitivamente consegnato all'Autorità Portuale nel corso del 1997.

Di seguito il dettaglio degli importi finanziati e il grafico con lo stato di attuazione dei finanziamenti (importi espressi in Mln di €).

AUSILII LUMINOSI ALLA NAVIGAZIONE

Importi in milioni di €

	Fabbisogno Totale	Importi finanziati	Importi realizzati, in corso di realizzazione e di prossimo avvio	Importi spesi	Fabbisogno residuo da finanziare
Studi	0,396	0,396	0,396	0,396	0,000
Interventi sperimentali e monitoraggi	20,264	15,067	14,764	14,764	5,197
TOTALE	**20,660**	**15,463**	**15,160**	**15,160**	**5,197**

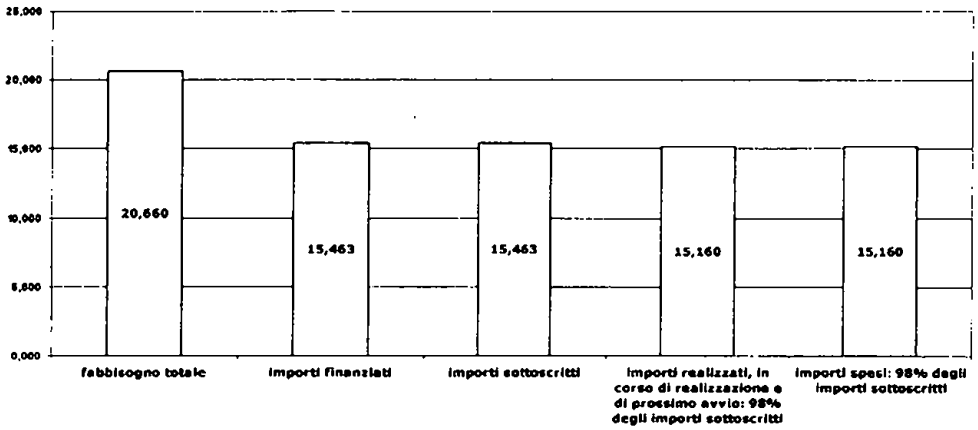

3.10 Apertura delle valli da pesca
(interventi di cui all'art. 3 lettera l) legge n. 798/84)

Obiettivo

Migliorare la qualità delle acque e dei sedimenti nelle zone immediatamente prossime alle valli da pesca nell'ambito del più ampio obiettivo di recupero morfologico e ambientale delle diverse aree della laguna di Venezia

Descrizione degli interventi

Le valli da pesca sono ambienti naturali, da secoli utilizzati per l'allevamento di specie ittiche pregiate e per la maricoltura. Le valli sono separate dalla "laguna viva" mediante argini dotati di aperture che consentono il ricambio dell'acqua al loro interno in modo regolato dagli allevatori sulla base delle esigenze della produzione. Attualmente le aree vallive sono 23 per una superficie complessiva di quasi 9000 ettari: un sesto dell'intero bacino lagunare.

Negli anni passati le valli da pesca sono state oggetto di studio per valutare l'efficacia della loro riapertura, durante le alte maree eccezionali, ai fini della diminuzione del livello dell'acqua in laguna. La questione è stata affrontata fin dal 1981 nel corso dello studio di fattibilità delle opere di difesa dalle acque alte e successivamente, con ulteriori approfondimenti, nell'ambito del progetto preliminare

di massima delle opere mobili alle bocche di porto (progetto REA). In entrambi i casi è risultato che gli effetti della riapertura sono del tutto ininfluenti.
Anche le simulazioni realizzate nell'ambito dello Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) del progetto di massima delle opere mobili hanno portato alle medesime conclusioni.
Negli ultimi anni, quindi, la riapertura delle valli da pesca è stata studiata in relazione all'obiettivo del miglioramento ambientale dell'ecosistema in quanto può produrre effetti positivi sulle condizioni idrodinamiche locali con benefici per ampie zone lagunari.

Stato di attuazione al 31 dicembre 2006

Attività finanziate
Gli *studi* sulla pesca e sulla vallicoltura hanno consentito di evidenziare il rapporto tra interventi di risanamento ambientale e produttività di questo importante settore dell'ecosistema lagunare. Un'attenzione particolare è stata dedicata alla vallicoltura, soprattutto per verificare gli effetti sull'economia valliva del progetto della riapertura delle valli da pesca alla libera espansione delle maree.
Il Consorzio Venezia Nuova ha esaminato diverse soluzioni alternative per consentire l'espansione mareale e mantenere i livelli produttivi qualitativamente e quantitativamente.

A seguito di specifica indicazione del Comitato ex art. 4 Legge 798/84 (riunione del 20.03.1990), il Magistrato alle Acque di Venezia, tramite il Consorzio Venezia Nuova, ha dedicato a questo aspetto del problema un *progetto operativo generale*, approvato dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque nel luglio del 1993, che ha definito criteri, modalità, durata e frequenza dell'apertura delle valli allo scopo di verificare se ciò comporta un effettivo miglioramento della qualità ambientale nelle aree contigue.
Vista la complessità realizzativa e gestionale delle soluzioni di apertura proposte, il progetto operativo suggeriva la necessità di procedere a un intervento sperimentale.

Nel corso del 1995, pertanto, il Consorzio ha redatto anche il progetto esecutivo *dell'intervento sperimentale di apertura di una valle da pesca,* che è stato realizzato e completato nell'estate del 1999.

L'intervento pilota è stato effettuato in valle Figheri, una valle della laguna sud, scelta come campione, seguendo precise modalità di gestione. La valle è stata divisa in due parti tramite un argine di terra ("teragio") lungo oltre 2 chilometri, e le due parti sono state gestite in modo differenziato: una è stata tenuta chiusa e gestita in base agli orientamenti produttivi consolidati; l'altra, più piccola della prima, è stata aperta al flusso di marea.

Le attività hanno anche compreso la realizzazione di un ampio programma di *monitoraggi* eseguiti prima, durante e dopo i lavori. I risultati della sperimentazione hanno dimostrato la possibilità di mantenere la produzione ittica anche nella porzione valliva lasciata aperta al flusso mareale, mentre i miglioramenti nell'ambiente circostante sono risultati poco apprezzabili.

Di seguito il dettaglio degli importi finanziati e il grafico con lo stato di attuazione dei finanziamenti (importi espressi in Mln €).

APERTURA DELLE VALLI DA PESCA

Importi in milioni di €

	Fabbisogno Totale	Importi finanziati	Importi realizzati, in corso di realizzazione e di prossimo avvio	Importi spesi	Fabbisogno residuo da finanziare
Studi	0,412	0,412	0,412	0,412	0,000
Progetti	0,431	0,431	0,431	0,431	0,000
Interventi sperimentali	3,005	3,005	3,005	3,005	0,000
TOTALE	**3,848**	**3,848**	**3,848**	**3,848**	**0,000**

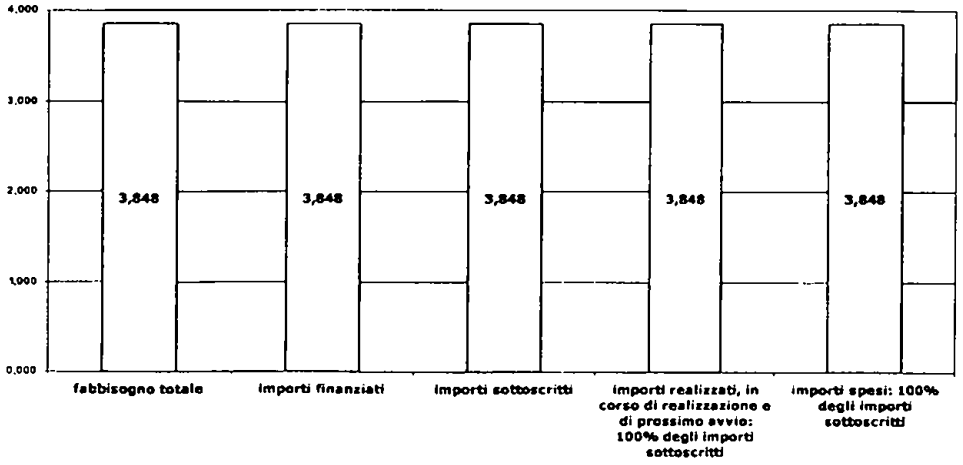

3.11 Costituzione e potenziamento del servizio informativo
(interventi di cui all'art. 3 lettera a) legge n. 798/84)

Obiettivo

Il Servizio Informativo ha il compito di acquisire, ordinare e aggiornare tutte le informazioni sull'ambiente lagunare, cooperando con gli altri Enti che operano sul territorio, in modo da facilitare la definizione delle politiche di intervento in un quadro conoscitivo generale.

Descrizione degli interventi

La conoscenza del territorio, ai fini della sua gestione, può essere completa ed efficace se i diversi strumenti disponibili per la sua conoscenza sono correlati in un sistema informativo completo ed articolato; in sintesi occorre che le risorse disponibili (umane, tecniche, scientifiche ed economiche) concorrano in modo integrato alla creazione delle diverse percezioni del territorio, delle sue dinamiche e dei fenomeni che su di esso avvengono.

Il Servizio Informativo, per assolvere ai compiti di conoscenza dello stato di fatto e di salute dell'ambiente lagunare, di studio del territorio, di progettazione e di esecuzione degli interventi, di gestione dei monitoraggi e dei controlli degli effetti degli interventi stessi, ha utilizzato diversi strumenti tecnologicamente avanzati che, nel corso degli anni, sono diventati strumenti di lavoro e di controllo dei diversi uffici tecnici ed amministrativi preposti.

E' stato creato, quindi, un centro tecnico operativo a supporto dell'intera collettività tecnica che è coinvolta nei diversi progetti di salvaguardia fisica ed ambientale della laguna di Venezia e del suo bacino scolante.

Il Servizio Informativo ha compiuto, in 20 anni di attività, un'evoluzione, oltre che tecnica, anche funzionale in rapporto all'evolversi e allo specializzarsi delle richieste di supporto tecnico ed operativo provenienti dal Magistrato alle Acque e dal Consorzio Venezia Nuova. Questa evoluzione funzionale viene di seguito descritta in modo da essere di supporto alla comprensione delle attività dell'ufficio che ha in gestione una delle banche dati territoriali ed ambientali più complesse ed, al tempo stesso, più interessanti del mondo.

La funzione del Servizio Informativo resta quella di realizzare un quadro conoscitivo generale del territorio e dell'ecosistema a supporto del risanamento e della gestione della laguna di Venezia e può essere così riassunta:

- gestire tutte le informazioni territoriali sull'ecosistema (incluse quelle per il controllo conoscitivo delle tendenze evolutive);

- cooperare con gli altri enti che interagiscono sul territorio;
- costruire il necessario supporto conoscitivo per il futuro Centro Operativo della laguna (struttura che avrà il compito di gestire gli interventi di salvaguardia realizzati dallo Stato e monitorare l'evoluzione dell'ambiente lagunare).

In questo contesto diventa essenziale l'unità, se non della conoscenza, quantomeno del complesso di informazioni che la generano; a tal fine occorre rendere consultabile il patrimonio informativo esistente, occorre cioè ordinare le informazioni territoriali con precisi criteri.
I criteri di ordinamento adottati dal Servizio Informativo perseguono:

- l'ordine fisico dei documenti (Biblioteche dei materiali);
- l'ordine geografico dei dati (Banca Dati Geografica);
- l'ordine funzionale dei dati, finalizzato alla soluzione di specifici problemi (sistemi di supporto alle decisioni).

Il mantenimento della coerenza e dell'integrità di tali "ordini" viene garantito attraverso una serie di attività che si succedono secondo un piano di aggiornamento e di verifica continua che viene perseguito attraverso i seguenti strumenti:

- studi per la verifica dell'efficacia di metodologie e strumenti tecnici e scientifici;
- sistemi di consultazione per l'accessibilità ad utenti differenziati ai diversi stati della conoscenza del territorio;
- centro servizi per la disponibilità di risorse umane, tecniche ed informatiche finalizzate al supporto dell'intero scenario delle attività.

I diversi gradi della conoscenza ed i diversi strumenti operativi creati hanno, quindi, permesso di differenziare le attività del Servizio Informativo secondo le seguenti finalità:

a) *Biblioteche* ovvero raccolta, catalogazione informatica e aggiornamento di informazioni tecniche, scientifiche, storiche e socioeconomiche relative alla documentazione sulla laguna di Venezia, sul suo bacino scolante, sugli studi e sui progetti effettuati, sugli interventi realizzati; queste "informazioni di base" sono state raccolte e mantenute nel loro formato originario (testi storici, mappe, fotografie, diapositive, filmati,

materiale digitale, relazioni tecniche e scientifiche, studi, progetti, leggi, ecc.);

b) *Banca dati* ovvero la trasformazione dei dati cartografici e tecnici in dati informatizzati su computer e rappresentabili mediante i moderni strumenti di analisi e riproduzione del territorio (GIS o Sistemi Informativi Territoriali e strumenti di riproduzione). La base della banca dati territoriale del Servizio Informativo è dotata di circa 30 livelli tematici informatici differenziati (uso del suolo, canali lagunari, reti idrografiche, sezioni di censimento, fanerogame, alghe, sondaggi, reti tecnologiche, ecc.) che vengono aggiornati mediante rilievi da compiersi in proprio o mediante acquisizione dei dati da Enti che ne sono preposti per competenza;

c) *Sistemi di supporto alle decisioni* ovvero utilizzo di sistemi informatici predisposti ad hoc per la gestione dei dati cartografici, modellistici e tecnici finalizzati alla comprensione di fenomeni ambientali, morfologici, socioeconomici in evoluzione e, quindi, alla loro facile comprensione da parte di chi deve prendere decisioni sulla progettazione e realizzazione degli interventi;

d) *Studi* ovvero approfondimenti sugli aspetti tecnici delle attività connesse con il Servizio Informativo; tali studi sono stati svolti in modo integrato con le attività di studio previste ed in corso da parte del Magistrato alle Acque tramite il Consorzio Venezia Nuova;

e) *Sistemi di consultazione* ovvero realizzazione di sistemi informatici personalizzati per la fruizione dei dati archiviati dal Servizio Informativo ed utilizzabili da più utenti della rete Magistrato alle Acque - Consorzio Venezia Nuova;

f) *Centro servizi* ovvero la dotazione e l'utilizzo di strumenti, di persone e di materiali finalizzati al supporto delle attività tecniche ed amministrative del Magistrato alle Acque e del Servizio Informativo; sono parte di questa sezione le attività svolte dal personale del Servizio Informativo presso la sede di Venezia del Magistrato alle Acque e di Voltabarozzo (PD), la creazione e la gestione di due laboratori chimici attrezzati per l'analisi della qualità dell'acqua, dell'aria e dei sedimenti prelevati in laguna di Venezia, la creazione e la gestione di 10

stazioni fisse di monitoraggio ambientale collocate in laguna e dotate di strumentazioni per la misura in tempo reale di parametri chimico-fisici dell'acqua e dell'aria (sonde multiparametriche, autocampionatori, deposimetri, anemometri, ecc.). E' infine da sottolineare la disponibilità all'utilizzo di attrezzature tecniche di rilievo e di misura della morfologia terrestre e lagunare.

Stato di attuazione al 31 dicembre 2006

Attività finanziate

Il lavoro del Servizio Informativo si è articolato fin dalla sua origine in *sezioni di lavoro* ovvero in unità di lavoro singolarmente riconoscibili ed associabili alle finalità di cui si è già riferito (biblioteche, banche dati, sistemi di supporto alle decisioni, sistemi di consultazione, centro servizi).

Le *sezioni di lavoro* hanno, quindi, il significato di singoli progetti per la realizzazione e il conseguimento di obiettivi diversificati. Sino a questo momento sono state sviluppate quasi 80 sezioni di lavoro ciascuna articolata, se necessario, in più fasi.

I risultati fin qui raggiunti dal Servizio Informativo possono essere così sintetizzati:

- E' stata costituita una raccolta ordinata di documenti (libri, mappe, nastri, audiovisivi) attinenti l'ecosistema, raggiungendo l'obiettivo istituzionale che si prefiggeva di raccogliere e conservare in una unica sede il vastissimo patrimonio di conoscenze tecniche, scientifiche, storiche, legislative, ecc., riguardanti il problema di Venezia e della sua laguna;

- E' stata informatizzata insieme ai principali parametri descrittivi del territorio la complessa e stratificata geografia dell'ecosistema che rimane a disposizione (come G.I.S. di base – ovvero sistema informatizzato di gestione ed analisi delle rappresentazioni delle componenti territoriali) per le future applicazioni;

- I sistemi informatici sono basati su una struttura hardware e software che si mantiene all'avanguardia e rimane bilanciata nei suoi componenti anche dopo alcuni anni di lavoro nonostante l'accelerata dinamica evolutiva del mercato dell'informatica. La struttura informatica del Servizio

Informativo è stata, inoltre, integrata alla struttura informatica costituita presso il CED del Magistrato alle Acque di Venezia; da esso è, infine, possibile connettersi al Centro Sperimentale di Voltabarozzo (PD), al Laboratorio di analisi chimiche di Venezia ed al Genio Civile Opere Marittime di Venezia;

- La tipologia dei dati gestiti semplifica e minimizza i tempi di aggiornamento degli stessi, permette di analizzare e rappresentare la loro evoluzione temporale, quantitativa e qualitativa e, infine, può ridurre i costi ed i tempi di operazioni di verifica e controllo degli scenari territoriali necessari per la progettazione degli interventi;

- L'architettura delle strutture informatiche preposte alla gestione dei dati (banche dati) è modulare e flessibile agli ulteriori sviluppi (Sistemi di supporto) ed è adattabile agli obiettivi ampi e complessi che per legge sono assegnati all'intero progetto Venezia.

L'impostazione adottata e i risultati finora ottenuti consentono ulteriori sviluppi verso la gestione vera e propria dell'ecosistema lagunare.

Nel corso degli ultimi anni, lo sviluppo tecnologico del mondo dell'informatica, delle tecnologie di rilievo, di misura e delle telecomunicazioni e, in particolare, l'attendibilità sempre maggiore dei dati territoriali digitali che ha consigliato il loro utilizzo per la progettazione e lo sviluppo degli interventi, hanno indotto il Servizio Informativo a programmare la propria attività in settori produttivi che, sempre attraverso la definizione di sezioni di lavoro, possa permettere di far fronte alle maggiori richieste di "sicurezza" e "certificazione di qualità" delle proprie metodologie e dei processi di lavoro.

Sono in fase di implementazione le procedure per l'ottenimento della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 per i settori tecnici del Servizio Informativo. A tale fine il Servizio Informativo, sulla base delle finalità precedentemente descritte, ha intrapreso un percorso di riorganizzazione delle proprie attività in *settori operativi* che, sottoposti a certificazione secondo gli standard del sistema qualità, permettono di perseguire l'obiettivo dello sviluppo e della gestione delle attività del Servizio Informativo.

I *settori operativi* che si svilupperanno nei prossimi anni a supporto dei processi di controllo e gestione dell'ecosistema lagunare e di progettazione degli 'interventi e degli effetti degli stessi sull'ambiente, sono i seguenti:

a) *Gestione tecnica dei laboratori di analisi chimiche di Venezia e di Voltabarozzo (PD).*
Questo settore riguarda le attività alla gestione tecnica dei laboratori di analisi chimiche siti a Venezia e a Voltabarozzo (Padova). Per il laboratorio di Venezia, le attività riguardano gli adeguamenti tecnici e strutturali, il potenziamento delle attrezzature e la gestione del personale tecnico.
Il laboratorio di Venezia ha già conseguito la certificazione di qualità SINAL, mentre il laboratorio di Voltabarozzo, operativo dall'aprile 2004, ha in corso la procedura per l'ottenimento della stessa certificazione.

b) *Acquisizione e gestione di attrezzature tecniche, informatiche e di rete a Venezia e a Voltabarozzo (PD).*
Nel corso degli anni il Servizio Informativo ha mantenuto aggiornata la propria dotazione informatica e di rete nella sua sede originaria di Campo S. Stefano a Venezia. Le attività informatiche e i sistemi tecnici a supporto di esse sono stati diffusi in altre sedi ed uffici. I dati e i sistemi di consultazione, elaborazione e decisione sono ora implementati presso le seguenti sedi del Magistrato alle Acque: Ispettorato Generale, Centro Elaborazione Dati, Sezione Antinquinamento, Ufficio Concessioni, Centro Sperimentale di Voltabarozzo, Genio Civile Opere Marittime a Venezia.

c) *Attività di rilievi della morfologia terrestre e lagunare.*
La conoscenza puntuale ed estesa della morfologia della laguna di Venezia è condizione essenziale sia per la progettazione degli interventi, sia per il successivo monitoraggio degli effetti degli interventi stessi sull'ambiente e per la verifica delle modificazioni antropiche e naturali.

d) *Programmazione e gestione di monitoraggi ambientali in tempo reale e correlazione con indagini stagionali.*
Il Servizio Informativo, in accordo con la sezione antinquinamento del Magistrato alle Acque, ha predisposto una serie di strumenti di rilievo della qualità dell'acqua e dell'aria; la gestione di tali strumentazioni comporta la dotazione di mezzi

tecnici adeguati, di personale tecnico specializzato e di un programma di manutenzione e di gestione dell'intero sistema. La presenza di 10 stazioni di monitoraggio dell'acqua e dell'aria, di 7 stazioni di misura dei parametri atmosferici, di strumentazioni e di sistemi informatizzati per il controllo remoto degli scarichi in laguna, comporta un adeguato gruppo di tecnici specializzati per la gestione la manutenzione degli strumenti e l'analisi e l'interpretazione dei risultati delle misure.

e) *Gestione dell'informazione tecnica e della diffusione dei dati.*
La gestione del patrimonio informativo implementato dal Servizio Informativo si sviluppa attraverso la predisposizione di strutture tecniche ed informatiche adeguate. Il Servizio Informativo ha costituito un sito internet strutturato per accessi di consultazione, sia generale che tecnica, un centro, aperto al pubblico, dotato di attrezzature, materiali e sistemi di consultazione denominato "Punto laguna", una serie di attività atte alla predisposizione e alla distribuzione dei materiali tecnici cartacei ed informatici.

f) *Predisposizione e gestione di banche dati territoriali e sistemi di consultazione e di elaborazione.*
In tale settore si svolgono attività di costituzione, controllo, validazione e gestione delle banche dati territoriali e dei rispettivi sistemi di analisi, consultazione e supporto alla decisioni. E' il cuore della produzione della base informativa territoriale relativa al Servizio Informativo.

g) *Campagne di rilevamento satellitare ed aereo.*
L'utilizzo dell'esplorazione del territorio attraverso i rilievi satellitari ed aerei ha permesso di evidenziare e controllare un notevole numero di fenomeni di tipo ambientale e morfologico.
Sono normalmente eseguiti i voli annuali fotogrammetrici a colori a media risoluzione ed i voli biennali fotogrammetrici in toni di grigio ad alta risoluzione sull'intera laguna.

Attività da finanziare

a) *Gestione tecnica dei laboratori di analisi chimiche di Venezia e di Voltabarozzo (PD).*
Per i laboratori di Venezia e di Voltabarozzo è prevista la gestione di tutte le procedure di trattamento, preparativa ed analisi dei campioni provenienti dalle campagne di

monitoraggio, dalle stazioni fisse in laguna e dalle attività istituzionali del Magistrato alle Acque. Le tipologie di analisi sono diversificate nei laboratori in funzione della loro specializzazione: in particolare a Venezia vengono trattati i campioni per le analisi di routine e dei parametri inorganici, a Voltabarozzo vengono trattati i campioni per le analisi dei parametri organici e, in particolare, dei microinquinanti organici.

b) *Acquisizione e gestione di attrezzature tecniche, informatiche e di rete a Venezia e a Voltabarozzo (PD).*
Nei prossimi anni si provvederà al mantenimento in efficienza delle attrezzature ed all'acquisto di nuovi e più completi sistemi informatici, all'aggiornamento dei software di base ed applicativi, alla fornitura di servizi tecnici ed informatici e di supporto per la gestione e l'utilizzo delle applicazioni informatiche implementate nei vari uffici. Si svilupperanno in modo coerente ed efficace le tecnologie che consentiranno l'utilizzo delle banche dati e delle cartografie su supporti informatici portatili (palmari dotati di DGPS e schermo grafico) utilizzabili per controlli e verifiche in situ del territorio.

c) *Attività di rilievi della morfologia terrestre e lagunare.*
Nei prossimi anni si procederà all'attuazione di un programma di rilievi basati su utilizzo di strumenti topografici e fotogrammetrici per le zone emerse, e di ecoscandagli per le zone lagunari sotto il livello dell'acqua. Tali rilievi saranno necessari sia per evidenziare il fenomeno dell'erosione e della sedimentazione della morfologia lagunare, sia per rilevare, in zone precedentemente definite, la presenza di aree a rischio archeologico o di particolare pregio geomorfologico e paesaggistico.

d) *Programmazione e gestione di monitoraggi ambientali in tempo reale e correlazione con indagini stagionali.*
E' necessario garantire la gestione e la manutenzione della rete di monitoraggio ambientale e l'analisi e l'implementazione delle misure effettuate.
Dovrà, inoltre, essere gestita ed ampliata l'attuale struttura tecnica a supporto delle campagne di campionamento e di manutenzione delle 10 stazioni fisse di monitoraggio ambientale di acqua ed aria. Si dovrà anche procedere all'analisi ed all'interpretazione dei dati ambientali acquisiti in

Laguna di Venezia.

e) *Gestione dell'informazione tecnica e della diffusione dei dati.*
Questa attività dovrà essere garantita anche nei prossimi anni attraverso un adeguato aggiornamento dei materiali per le diverse tipologie di strumenti di diffusione che verranno utilizzati. In particolare sono da considerare essenziali le strutture: "Punto Laguna" (sede attrezzata al piano terra dell'edificio ove è situato il Servizio Informativo) per il supporto di conoscenza fornito sull'attuazione degli studi, dei progetti e degli interventi di salvaguardia; i siti internet salve.it e magisacque.it per il contributo alla conoscenza ed alla fruizione dei progetti e degli interventi eseguiti ed in corso di esecuzione da parte del Magistrato alle Acque; i portali informatici realizzati e sviluppati per la necessari condivisione tra Magistrato alle Acque e Consorzio Venezia Nuova di tutti gli atti tecnici ed amministrativi relativi alle opere, agli studi ed ai progetti oggetto delle convenzioni.

f) *Predisposizione e gestione di banche dati territoriali e sistemi di consultazione e di elaborazione.*
In questo ambito verranno sviluppate nuove banche dati ed aggiornate quelle ormai datate secondo un progetto di acquisizione controllata di nuove informazioni tecniche, morfologiche e ambientali.

g) *Campagne di rilevamento satellitare ed aereo.*
Nel corso degli anni si procederà alla programmazione di tali rilievi anche utilizzando nuovi sensori e nuove tecnologie che il mercato dell'innovazione tecnologica metterà a disposizione. Vengono previsti, per l'enorme quantità e qualità dell'informazione che ciò rende disponibile, rilievi annuali con satelliti multispettrali ad alta risoluzione (Ikonos o QuickBird).

h) *Gestione dell'interscambio dei dati tra i diversi sistemi ed uffici preposti alla loro gestione ed utilizzo.*
La totalità dei dati e della conoscenza del territorio, organizzata in sistemi di analisi e di consultazione presso il Servizio Informativo, dovrà essere organizzata in modo da poter essere distribuita ad uffici tecnici, società di progettazione e di monitoraggi, organi di controllo ed altri enti preposti alla gestione ed al controllo del territorio stesso. Dovrà essere anche garantito il percorso al contrario, ovvero l'inserimento nei

sistemi del Servizio Informativo di tutti i dati provenienti dalle altre entità.

La contemporaneità nella realizzazione e nella gestione dei succitati programmi di attività del Servizio Informativo serviranno a garantire al Magistrato alle Acque la disponibilità di una struttura tecnica, informatica e documentale sicuramente necessaria per il supporto di un così ampio e complesso sistema di interventi e di gestione dell'ecosistema lagunare.

Di seguito il dettaglio degli importi finanziati e il grafico con lo stato di attuazione dei finanziamenti (importi espressi in Mln di €).

SERVIZIO INFORMATIVO

Importi in milioni di €

	Fabbisogno Totale	Importi finanziati	Importi realizzati, in corso di realizzazione e di prossimo avvio	Importi spesi	Fabbisogno residuo da finanziare
Realizzazione e gestione del Servizio Informativo	144,749	93,148	93,148	88,742	51,601
Somme disposizione / Revisione prezzi	0,030	0,030	0,030	0,030	0,000
TOTALE	**144,779**	**93,178**	**93,178**	**88,772**	**51,601**

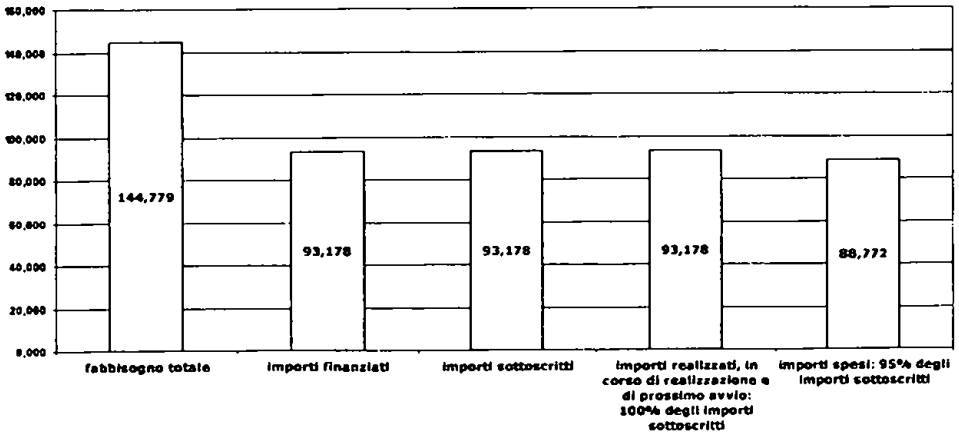

PAGINA BIANCA

Appendice

PAGINA BIANCA

CRONOLOGIA SINTETICA DELL'ITER APPROVATIVO DEL PROGETTO DELLE OPERE DI REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA ALLE BOCCHE DI PORTO LAGUNARI

1989, il *progetto preliminare di massima*[1] (Riequilibrio e Ambiente - REA) viene completato nel mese di luglio ed esaminato dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque di Venezia nello stesso anno e dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nel 1990.

1992, il *progetto di massima*, ultimato nel mese di settembre, viene approvato sulla scorta del parere favorevole del Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque nel mese di novembre e inviato, nel gennaio del 1993, ai Comuni di Venezia e di Chioggia e alla Regione del Veneto.

1994, il progetto di massima viene approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in data 18 ottobre 1994.

1995, il Comitato ex art. 4 legge n. 798/84, nelle sedute del 4 luglio e del 12 dicembre, aderendo a una specifica richiesta dell'Amministrazione Comunale di Venezia, stabilisce di sottoporre il progetto di massima delle opere mobili alle bocche di porto lagunari a una *specifica procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)*, nonostante il progetto non dovesse essere interessato dalla suddetta procedura ai sensi della specifica regolamentazione nazionale e sovranazionale. In particolare, il Comitato decide che si debba sviluppare una speciale procedura di valutazione in cui, tra l'altro, al giudizio della Commissione di V.I.A. costituita secondo la normativa vigente, si affianchi quello di un *"Collegio di esperti di livello internazionale"*, appositamente istituito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Collegio di Esperti internazionali, nel 1998, consegna il proprio rapporto positivo al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dei Lavori Pubblici, al Ministro dell'Ambiente e al Comitato ex art. 4 legge 798/1984.

1995 - 2000, si susseguono numerosi[2] eventi legati allo sviluppo della peculiare procedura che il Comitato ex art. 4 legge n. 798/84 aveva delineato per la valutazione della compatibilità ambientale del progetto delle opere di regolazione delle maree alle bocche di porto.

14 luglio 2000, il TAR del Veneto annulla, per questioni di metodo e di merito, il Decreto di compatibilità ambientale negativo del progetto emesso dal Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali.

15 marzo 2001, il Consiglio dei Ministri delibera in merito all'avvio della fase progettuale esecutiva, subordinandola allo svolgimento di alcune *attività di approfondimento*. La deliberazione recepisce tutte le diverse istanze di approfondimento emerse durante la procedura di V.I.A. e prescrive un ulteriore stadio progettuale che preveda la progettazione, contestualmente a quella delle opere di regolazione delle maree, di interventi atti ad aumentare gli attriti lungo i canali delle bocche di porto per attenuare i livelli delle maree più frequenti (*opere cosiddette complementari*), nonché l'aggiornamento del Piano per il recupero morfologico della laguna per contrastare gli eventuali effetti derivanti da tali

1 Il progetto fa proprie le prescrizioni espresse dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con voto n. 109 del 1982 sul c.d. "Progettone", studio di fattibilità redatto da un gruppo di esperti sulla base dei progetti che parteciparono all'appalto-concorso internazionale del 1975, acquisiti poi dall'allora Ministero dei Lavori Pubblici dato che l'appalto-concorso si concluse senza aggiudicazione.

2 Nel 1998: la Commissione Tecnica Regionale del Veneto approva il Progetto di massima; la Commissione VIA del Ministero dell'Ambiente esprime un parere di valutazione ambientale negativa; l'Ufficio Centrale per i Beni Ambientali e Paesaggistici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali esprime parere favorevole, con prescrizioni; il Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, emana un decreto con il quale esprime "allo stato giudizio di compatibilità ambientale negativo sul progetto".
Nel 1999: il Consiglio Comunale di Chioggia esprime il proprio parere favorevole; il Consiglio Comunale di Venezia esprime il proprio parere sul progetto e richiede "il proseguimento dell'attività progettuale"; il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in Assemblea Generale, presenta il proprio parere sul SIA delle opere mobili riconfermando il parere favorevole sulla soluzione progettata.

interventi complementari.

2001, a seguito dei risultati degli studi condotti, vengono definiti gli interventi necessari per aumentare gli effetti dissipativi lungo i canali di bocca: *tre dighe foranee, con annessa protezione dei fondali, una di fronte a ciascuna delle tre bocche di porto.*

6 dicembre 2001, il Comitato ex art. 4 legge 798/84 prende atto dei risultati delle attività e degli approfondimenti condotti e, quindi, delibera che si dia corso al completamento della progettazione delle opere di regolazione delle maree alle bocche di porto, nonché alla progettazione ed esecuzione delle opere cosiddette complementari e alla progettazione ed esecuzione delle opere tendenti al ripristino morfologico della laguna.

21 dicembre 2001, il CIPE delibera in merito al *primo programma delle infrastrutture strategiche*, di cui alla legge n. 443/01 ("Legge obiettivo"), indicando, tra le infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, il *Progetto per la salvaguardia della laguna e della città di Venezia: "Sistema MOSE".*

8 novembre 2002, il *progetto definitivo* delle opere di regolazione delle maree alle bocche di porto, redatto a seguito della deliberazione del Comitato del 6 dicembre 2001, viene favorevolmente esaminato, con prescrizioni, dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque di Venezia, con voto n. 116.

29 novembre 2002[3], il CIPE prende atto, sia sotto l'aspetto tecnico, sia sotto l'aspetto finanziario, del progetto definitivo del "Sistema MOSE", esaminato sulla base di una specifica relazione istruttoria elaborata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e assegna al "Sistema MOSE", quale opera strategica, un *primo finanziamento di 450 milioni di euro.*

4 febbraio 2003, il Comitato ex art. 4 legge n. 798/84 delibera, tra l'altro, in ordine alla ripartizione dei fondi assegnati dal CIPE al "Sistema MOSE"[4].

3 aprile 2003, il Comitato ex art. 4 legge n. 798/84 delibera, tra l'altro, in ordine all'*avvio della progettazione esecutiva e alla realizzazione delle opere per la regolazione delle maree alle bocche di porto*, nonché allo sviluppo di approfondimenti relativi a specifiche richieste delle Amministrazioni Comunali di Venezia e di Chioggia, sancendo, di fatto, il passaggio dalle fasi propedeutiche alla fase di realizzazione delle opere di regolazione delle maree alle bocche di porto.

20 gennaio 2004, la Commissione per la Salvaguardia di Venezia[5] esprime all'unanimità parere favorevole sul progetto definitivo, impartendo alcune prescrizioni da adottare nella fase di sviluppo della progettazione esecutiva.

Gennaio - dicembre 2004: a seguito del parere positivo della Commissione di Salvaguardia, il Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque, sulla base del Piano - Programma approvato nel giugno del 2003[6], esamina ed esprime parere favorevole sugli stralci del progetto esecutivo delle opere di regolazione delle maree finanziati con la 1^ assegnazione di fondi da parte del CIPE.

13 febbraio 2004, viene istituito l'Ufficio di Piano con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in attuazione alle delibere del Comitato ex art. 4 legge

3 Deliberazione n. 109 del 29.11.2002, successivamente rimodulata con deliberazioni n.63 del 25.07.2003 e n. 72 del 29.09.03.

4 In base a quanto previsto dall'art. 80, legge 289/2002, una quota parte dei fondi assegnati dal CIPE al "Sistema MOSE" viene assegnata per le attività di competenza delle Amministrazioni comunali secondo una ripartizione proposta dal Comitato ex art. 4 legge 798/1984, successivamente recepita dal CIPE.

5 Organo collegiale istituito dalla Legge n. 171/1973, Titolo II, comma 5

6 In data 6.06.2003, il Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque ha esaminato con parere favorevole il programma delle progettazioni e della realizzazione delle opere alle bocche di porto, redatto a seguito delle deliberazioni assunte dal Comitato ex art. 4 legge n. 798/84 nella seduta del 3.04.2003, che prevede lo sviluppo per fasi della progettazione esecutiva e della conseguente realizzazione dei lavori, in relazione ai finanziamenti via via disponibili.

798/1984 del 6 dicembre 2001 e del 3 aprile 2003. L'Ufficio provvede alla massima integrazione tra i piani formulati dalle singole amministrazioni competenti in tema di salvaguardia, al fine di garantire continuità agli interventi programmati e ottimizzare l'impiego delle risorse.

Aprile 2004, intervenuta la registrazione da parte della Corte dei Conti degli Atti contrattuali tra Magistrato alle Acque e Consorzio Venezia Nuova che impegnano il finanziamento di cui alla 1^ deliberazione da parte del CIPE[7], inizia la formalizzazione della consegna dei lavori dal Magistrato alle Acque al Consorzio Venezia Nuova, relativamente agli stralci già esaminati dal Comitato Tecnico di Magistratura. Si avviano, pertanto, a tutti gli effetti, contemporaneamente nelle tre bocche di porto, i lavori per la realizzazione delle opere di regolazione delle maree.

7 Atti Attuativi rep. n. 8014/2003 e n. 8015/2003 alla Convenzione Generale, D.P. n. 9500 e n. 9499 del 29.01.2004, registrati alla Sezione del Veneto della Corte dei Conti in data 30.03.2004

20 e 21 maggio 2004, il TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) per il Veneto esamina e rigetta, con sentenza depositata in data 24 luglio 2004, i numerosi ricorsi avverso provvedimenti amministrativi propedeutici o comunque connessi all'approvazione e all'avvio del "Sistema MOSE", presentati da alcune associazioni ambientaliste, nonché delle Amministrazioni Comunale e Provinciale di Venezia.

29 settembre 2004, il CIPE assegna al "Sistema MOSE" un ulteriore volume di investimento, a valere su un "contributo" quindicennale[8] con decorrenza dal 2005, garantendo così continuità alle opere di regolazione dei flussi di marea avviate alle bocche di porto. In base a tale deliberazione, successivamente rimodulata[9], vengono *assegnati al Consorzio Venezia Nuova 638,1 milioni di euro.*

8 E' necessario segnalare che gli elementi di novità introdotti dal "contributo pluriennale", in sostituzione del "limite di impegno", hanno comportato la necessità di chiarimenti circa la sua "bancabilità", ottenuti solo nel mese di marzo del 2005.

9 Deliberazione n. 40 del 29.09.2004, successivamente rimodulata con deliberazione n.75 del 20.12.2004, che prende atto della ripartizione dei fondi proposta dal Comitato ex art. 4 legge 798/1984 in favore delle Amministrazionei comunali.

4 novembre 2004, il Comitato ex art. 4 legge n. 798/84 prende atto dello stato di avanzamento delle attività alle bocche di porto e degli approfondimenti che il Magistrato alle Acque sta conducendo circa gli argomenti richiesti dalle Amministrazioni comunali di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti. Delibera, tra l'altro, in ordine alla ripartizione dei fondi assegnati dal CIPE.

17 dicembre 2004, il Consiglio di Stato - Sezione VI emette il dispositivo della propria sentenza respingendo i ricorsi presentati in appello da alcune associazioni ambientaliste, nonché dalle Amministrazioni Comunale e Provinciale di Venezia avverso alcuni provvedimenti amministrativi propedeutici all'avvio del "Sistema MOSE".

11 maggio 2005, interviene la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo rep. n. 8067 alla "Convenzione Generale" rep. n. 7191/1991 che introduce il *"prezzo chiuso"* per il completamento delle opere di regolazione delle maree alle bocche di porto, con conseguente revisione dello schema contrattuale tra Magistrato alle Acque e Consorzio Venezia Nuova, al fine di poter contare su finanziamenti ulteriori, complessivi "certi", a fronte della determinazione "certa" del fabbisogno residuo e del relativo programma di esecuzione dell'opera.
L'atto specifica il valore economico delle opere da realizzare nel *Piano di esecuzione degli interventi,* suddivisi in fasi, i tempi di esecuzione nel *Cronoprogramma* e i fabbisogni finanziari nel relativo *Piano dei Finanziamenti.* Il Cronoprogramma prevede la conclusione delle attività finalizzate alla realizzazione delle opere alle bocche di porto entro il 31.12.2012, purché la disponibilità dei finanziamenti ulteriori necessari avvenga nell'entità e con la scansione temporale indicate nel *Piano dei finanziamenti.*

luglio 2005, una volta completato l'iter approvativo[10] dell'atto aggiuntivo rep. n. 8067/2005, inizia la presentazione all'esame del Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque dei progetti esecutivi delle opere finanziate a valere sui fondi di cui alla 2^ assegnazione da parte del CIPE (638,1 milioni di euro), nell'ambito del "prezzo chiuso".

10 In data 8.07.2005, avviene la registrazione, da parte della Sezione di Controllo per il Veneto della Corte dei Conti, del Decreto Presidenziale del 23.05.2005 approvativo dell'atto aggiuntivo che introduce il "prezzo chiuso".

28 settembre 2005, viene sottoscritto dall'Agenzia del Demanio, dal Magistrato alle Acque e dal Consorzio Venezia Nuova l'atto di concessione per l'utilizzo di una porzione del compendio immobiliare dell'area nord dell'Arsenale di Venezia per realizzarvi le strutture finalizzate alla fase di manutenzione e gestione del "Sistema MOSE".

settembre 2005, nelle more della effettiva disponibilità dei fondi di cui alla 2^ assegnazione da parte del CIPE[11], inizia la formalizzazione della consegna dei lavori, sotto le riserve di legge, dal Magistrato alle Acque al Consorzio Venezia Nuova, relativamente agli stralci già esaminati dal Comitato Tecnico di Magistratura, per assicurare continuità ai lavori in corso alle bocche di porto.

11 Solo in data 14.12.2005, una volta ottenuti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Ministero Infrastrutture e Trasporti i chiarimenti sulla natura del "contributo" pluriennale, si stipula il contratto-quadro di mutuo tra Consorzio Venezia Nuova e il Raggruppamento finanziatore che mette a disposizione del Consorzio un volume di investimento di importo pari a 638,1 milioni di euro.
In data 19.12.2005, avviene la sottoscrizione del nuovo Atto Attuativo rep. n. 8100 alla "Convenzione Generale", approvato con D.P. n. del, registrato alle Sezione del Veneto della Corte dei Conti in data 8.01.2006

27 gennaio 2006, la Sezione di Controllo per il Veneto della Corte dei Conti registra il Decreto presidenziale approvativo dell'Atto rep. n. 8100/2005, sottoscritto in data 19.12.2005 tra Magistrato alle Acque e Consorzio Venezia Nuova a valere sui fondi messi a disposizione dal contratto-quadro di mutuo del 14.12.2005 che ha attivato il volume di investimento di 638,1 Meuro stabilito dal CIPE, quale primo stralcio del Piano di esecuzione delle opere necessarie a completare il "Sistema MOSE" secondo il criterio del "prezzo chiuso".

29 marzo 2006, interviene la 3^ delibera zione da parte del CIPE che prende atto degli accordi intervenuti tra Amministrazione Concedente e Concessionario relativamente all'introduzione del "prezzo chiuso" per il completamento del "Sistema MOSE" e assegna al "Sistema MOSE" una ulteriore "tranche" di finanziamento di importo pari a 380 Meuro, a valere sul contributo quindicennale (di importo pari a 33,972 Meuro) con decorrenza dal 2007 di cui al rifinanziamento delle opere strategiche (art. 13 Legge n. 166/2002) disposto dalla Legge Finanziaria per il 2006 (Legge n. 266/2005).

7 aprile 2006, viene sottoscritto dall'Agenzia del Demanio, dal Magistrato alle Acque e dal Consorzio Venezia Nuova l'atto aggiuntivo all'atto di concessione in data 28.09.2005, con il quale viene affidato in concessione al Consorzio per 19 anni l'utilizzo di una porzione - ridefinita con l'atto aggiuntivo stesso - del compendio immobiliare dell'area nord dell'Arsenale di Venezia per realizzarvi le strutture finalizzate alla fase di manutenzione e gestione del "Sistema MOSE". Inoltre, in data 5.06.2006, viene sottoscritto dall'Agenzia del Demanio e dal Consorzio Venezia Nuova il *verbale di consegna del compendio immobiliare dell'area nord dell'Arsenale* di Venezia.

20 luglio 2006, si riunisce a Roma il Comitato ex art. 4 Legge 798/1984. In occasione di tale seduta, il Comitato accoglie la richiesta del Sindaco del Comune di Venezia di prendere in esame delle proposte alternative al "Sistema MOSE" presentate dal Comune di Venezia stesso. Il Comitato definisce la procedura e il programma per realizzare tale esame, affidando al Dipartimento per il

Coordinamento Amministrativo (DICA) della Presidenza del Consiglio dei Ministri lo svolgimento dell'istruttoria e il recepimento dei pareri da parte dei Soggetti istituzionali, con l'obiettivo di poter convocare una nuova seduta del Comitato a fine settembre per recepire le risultanze dell'esame effettuato.

29 settembre 2006, viene avviata la presentazione all'esame del Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque dei progetti esecutivi delle opere alle bocche di porto, a valere sui fondi di cui alla 3^ assegnazione da parte del CIPE (2° stralcio del "prezzo chiuso"), al fine di poter avviare, nel 2007, nuove fasi dei cantieri alle bocche di porto, per assicurare continuità ai lavori in corso.

2 novembre 2006, a seguito dell'esame dei pareri, fino a quel momento ricevuti da parte degli organi tecnici dei Soggetti Istituzionali coinvolti nell'esame dei c.d. progetti alternativi al MOSE proposti dal Comune di Venezia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri convoca un incontro tecnico al quale partecipa anche il Sindaco di Venezia.

8 novembre 2006, la Presidenza del Consiglio dei Ministri riunisce nuovamente il "tavolo tecnico" per l'esame dei pareri ricevuti da parte degli organi tecnici dei Soggetti Istituzionali coinvolti nell'esame dei progetti alternativi proposti dal Comune di Venezia.

10 novembre 2006, il Ministro delle Infrastrutture presenta al Consiglio dei Ministri una relazione sul "Sistema MOSE" che ripercorre l'"iter" tecnico-amministrativo del progetto e riferisce sulle risultanze dell'esame e degli approfondimenti effettuati da tutti gli Enti interpellati dalla Presidenza del Consiglio riguardo alle proposte alternative al MOSE presentate dal Comune di Venezia, nonché sugli esiti degli incontri tecnici tenutisi presso la Presidenza del Consiglio. La relazione rileva che, dall'esame dei parere pervenuti, *"non sono emersi elementi nuovi tali da richiedere la modifica delle opere del "Sistema MOSE", né, d'altra parte, è accettabile un'interruzione anche se breve delle attività in corso per eventuali ulteriori approfondimenti."* La relazione segnala, infine, l'importanza di poter disporre di adeguati finanziamenti per la Legislazione Speciale per Venezia per la prosecuzione dei piani di intervento di competenza dei vari Soggetti coinvolti nella salvaguardia di Venezia e della sua laguna e nello sviluppo socio economico dell'area.
In vista della seduta del Comitato ex art. 4 legge 798/1984, la relazione è stata posta ai voti al fine di chiarire la posizione del Governo al riguardo. La relazione è stata fatta propria dal Governo a maggioranza, con il voto favorevole di venti Ministri.

22 novembre 2006, si riunisce a Roma il Comitato ex art. 4 legge 798/1984. Il Comitato, in particolare, si esprime sullo sviluppo della realizzazione delle opere del "Sistema MOSE", nei termini definiti dalla programmazione recepita dagli strumenti contrattuali in essere e, con il solo voto contrario del Sindaco di Venezia, delibera *"di procedere al completamento della costruzione delle opere del "Sistema MOSE" e delle opere morfologiche connesse, assicurando la disponibilità dei finanziamenti, nel rispetto degli impegni e del cronoprogramma stabiliti nell'Atto Aggiuntivo rep. n. 8067/2005 alla Convenzione Generale rep. n. 7191/1991 tra Magistrato alle Acque di Venezia e il Concessionario, che ha introdotto il criterio "a prezzo chiuso" per l'esecuzione dei lavori stessi"*. Si tratta di una decisione molto rilevante che pone termine anche alle più recenti polemiche sull'opera e che consente di

garantire lo sviluppo delle attività secondo gli strumenti progettuali e programmatici definiti contrattualmente.

Elenchi

Mappe

Foto

PAGINA BIANCA

DIFESA DALLE ACQUE ALTE ECCEZIONALI



Attività finanziate:

Attività propedeutiche e di indagine

- Progettazione preliminare e di massima (ultimata)
- Procedure per la valutazione dell'impatto ambientale delle opere mobili (ultimate)
- Interventi sperimentali (Modulo Sperimentale Elettromeccanico: costruzione, sperimentazione, sorveglianza e dismissione) (ultimati)
- Indagini alla bocca di Lido (ultimate)
- Indagini alla bocca di Malamocco, 1^ e 2^ fase (ultimate)
- Indagini alla bocca di Chioggia (ultimate)
- Campagne di sondaggi per le opere complementari (ultimate)
- Procedure per la valutazione dell'impatto ambientale delle opere complementari e della conca di navigazione a Malamocco (ultimata)
- Studi e Sperimentazioni propedeutici alla progettazione preliminare, di massima e definitiva (ultimati)
- Progetto definitivo delle opere mobili e delle opere complementari (ultimato)
- Indagini archeologiche e bonifica bellica (in corso)

Attività per singola bocca di porto

Vedi dettaglio per bocca

Attività da finanziare:

- Completamento della realizzazione degli interventi di regolazione delle maree alle bocche di porto
- Completamento della realizzazione degli interventi connessi (morfologia e infrastrutturazione del compendio immobiliare dell'area dell'Arsenale per attività di manutenzione del "Sistema MOSE")
- Avvio della fase sperimentale di gestione funzionale delle opere alle bocche di porto

Bocca di Lido

CONFIGURAZIONE OPERE ALLA BOCCA DI PORTO DI LIDO



LAVORI ULTIMATI IN CORSO E DI PROSSIMO AVVIO
PLANIMETRIA GENERALE BOCCA DI LIDO

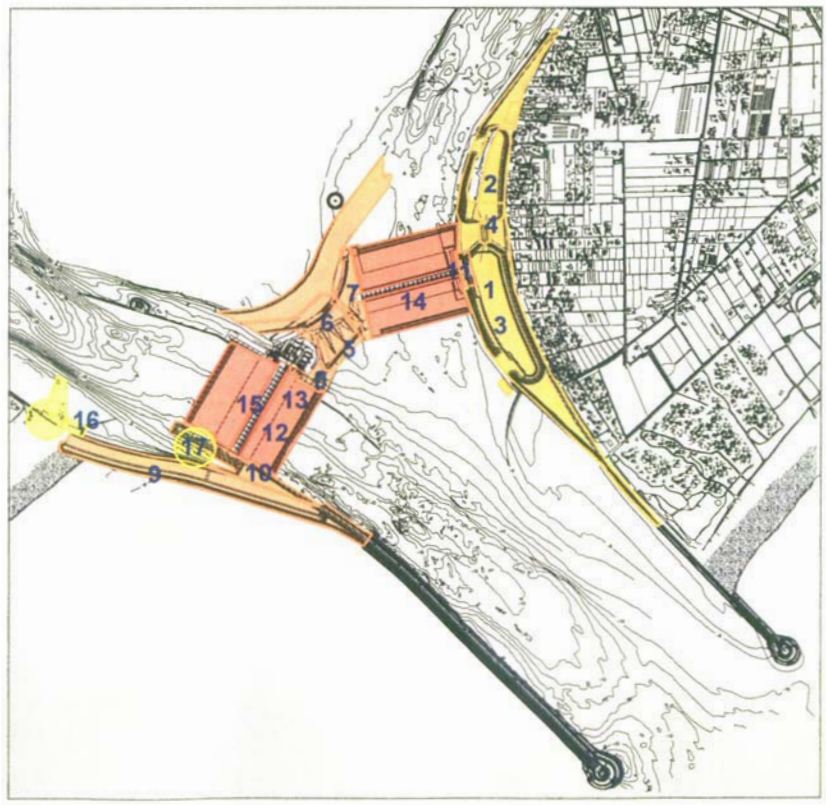

Attività finanziate: lavori ultimati, in corso di realizzazione e di prossimo avvio al 31.12.2006

Porto Rifugio e conca di navigazione

1. Treporti - Tura e porto rifugio 1^ fase
2. Treporti - Porto rifugio 2^ fase bacino nord - dragaggi e protezione sponda (Ultimato)
3. Treporti - Porto rifugio 2^ fase predisposizione per la prefabbricazione dei cassoni
4. Treporti - Conca: opere civili e porte-opere elettromeccaniche - opere civili 1^ fase

Opere di spalla

5. Lido - Isola tra S. Nicolò e Treporti 1^ fase A (Ultimato)
6. Lido - isola tra S. Nicolò e Treporti 1^ fase B (Ultimato)
7. Treporti - Spalla ovest (isola 2^ fase) e sistemazione opere di sostegno e movimento di materie
8. S. Nicolò - Spalla nord (isola 3^ fase) ed edificio di controllo cassoni andatori e scogliera lato mare
9. S. Nicolò - Rinforzo molo sud esistente
10. S. Nicolò - Spalla sud e sistemazione movimenti terra e cassoni prefabbricati
11. Treporti - Spalla est e sistemazione opere civili 1^ fase

Opere di barriera

12. S. Nicolò - Barriera protezione del fondale
13. S. Nicolò - Barriera protezione del fondale 2^ fase - 1° stralcio
14. Treporti - Barriera protezione dei fondali - realizzazione della parte centrale della protezione dei fondali
15. S. Nicolò - Barriera - palancole, preparazione dei recessi, opere civili, palancolato dei recessi

Attività funzionali alla realizzazione delle opere

16. S. Nicolò - aree di produzione - realizzazione banchina accosto natanti (Ultimato)

    Aree di produzione - base operativa: trasferimento dei cassoni da Taranto a Venezia
17. Campo prova (Ultimato)



Bocca di Lido - Porto rifugio e conca di navigazione

Obiettivo: Il porto rifugio di Treporti consentirà il ricovero e il transito, attraverso la conca di navigazione, delle imbarcazioni da diporto e dei mezzi di soccorso durante l'esercizio delle opere

Interventi in corso

Il porto rifugio di Treporti: il bacino lato laguna, di cui è stato completato il dragaggio e la protezione in scogliera della sponda est. La conca e il bacino lato mare, in fase di aggottamento



Il bacino lato mare: in primo piano la piarda di servizio e il terrapieno lato mare. In secondo piano i terrapieni in corrispondenza dell'area della conca e il bacino, con il cofferdam di chiusura predisposto al fine di utilizzare lo stesso bacino come tura di prefabbricazione dei cassoni di alloggiamento delle paratoie. Sullo sfondo il bacino lato laguna



Il porto rifugio lato mare: terrapieni a servizio della conca di navigazione e chiusura della testata in corrispondenza del porto rifugio. Mezzi in attività per la realizzazione dell'aggottamento del bacino lato mare, per la sua messa all'asciutto e utilizzo dello stesso come tura di prefabbricazione dei cassoni di alloggiamento delle paratoie



Bocca di Lido - Isola artificiale

Obiettivo: realizzazione di un isola artificiale che, oltre a costituire la spalla ovest della barriera di Treporti e la spalla nord della barriera di S. Nicolò, ospiterà anche gli edifici di controllo e gli impianti per il funzionamento delle opere

Interventi in corso

L'isola completata: il riempimento dell'isola è stato effettuato mediante il refluimento del materiale proveniente dal dragaggio del canale di navigazione a tergo dell'isola, lato laguna

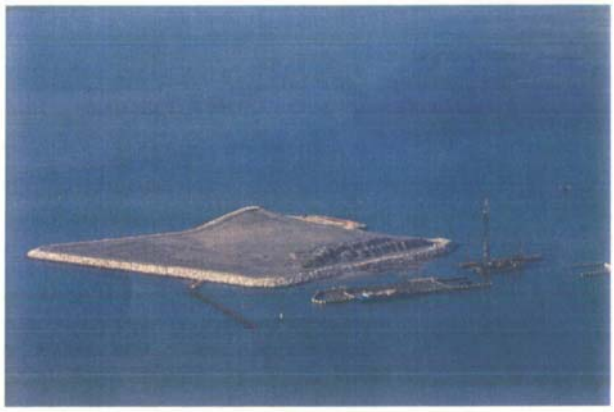

Le strutture della spalla ovest di Treporti: sulla sinistra le opere provvisionali di protezione del cantiere e al centro la parete combinata della spalla ovest e i relativi riempimenti, in fase di realizzazione



Mezzi in azione per l'infissione dei palancolati della spalla ovest e il riempimento al loro interno



Bocca di Lido - Opere di barriera - protezione dei fondali alle bocche di Lido - Treporti e S. Nicolò

Obiettivo: protezione dei fondali alle bocche di Treporti e S. Nicolò al fine di evitare fenomeni di erosione dei fondali stessi in occasione delle operazioni di apertura e chiusura delle paratoie

Interventi in corso

Cantiere di prefabbricazione predisposto in corrispondenza della radice del molo sud a S. Nicolò: confezionamento del materassino filtrante zavorrato da utilizzare come strato di filtro, a contatto con il fondale



Mezzo in azione per la posa del materassino zavorrato



In primo piano il rinforzo del molo sud di S. Nicolò, al centro mezzi in opera per il dragaggio e il versamento del materiale di protezione dei fondali a S. Nicolò

Bocca di Malamocco

CONFIGURAZIONE OPERE ALLA BOCCA DI PORTO DI MALAMOCCO



LAVORI ULTIMATI IN CORSO E DI PROSSIMO AVVIO
PLANIMETRIA GENERALE BOCCA DI MALAMOCCO

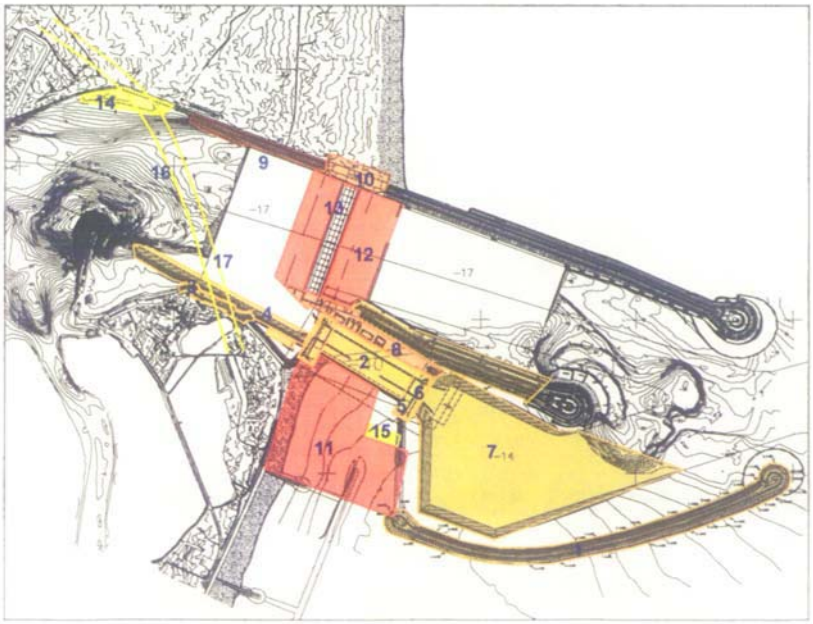

Attività finanziate: lavori ultimati, in corso di realizzazione e di prossimo avvio al 31.12.2006

Diga foranea e conca di navigazione

1. Diga foranea di fronte alla bocca di porto di Malamocco (Ultimato)
2. Conca di navigazione: opere civili della camera della conca
3. Conca di navigazione: opere di protezione della sponda del territorio lato Forte S. Pietro 1^ fase
4. Conca di navigazione: opere di protezione della sponda del territorio lato Forte S. Pietro 2^ fase
5. Conca di navigazione: opere civili dell'alloggiamento porte e strutture guida – infissione dei palancolati, riempimenti e messa in opera dei tiranti
6. Conca di navigazione: opere civili dell'alloggiamento porta e struttura guida – aggottamento, dragaggio e opere di c.a. porta lato mare
7. Conca di navigazione: dragaggio bacino di evoluzione della conca

Opere di spalla

8. Spalla sud della barriera – opere civili 1^ stralcio
9. Spalla nord della barriera 1^ stralcio - rinforzo del molo nord lato laguna
10. Spalla nord della barriera 2^ stralcio - costruzione del palancolato di ancoraggio

Opere di barriera

11. Infrastrutture per la prefabbricazione dei cassoni – opere civili 1^ fase
12. Barriera protezione dei fondali 1^ stralcio
13. Barriera – palancolato per i recessi 1^ fase

Attività funzionali alla realizzazione delle opere

14. Aree di produzione – piarda di selezione materiali (Ultimato)
15. Aree di produzione – terminal Malamocco
16. Cavidotti di attraversamento per linee elettriche – trivellazione orizzontale teleguidata
17. Cavidotti di attraversamento 2^ fase – linee elettriche, acquedotto, gasdotto



Bocca di Malamocco – Diga foranea e conca di navigazione

Obiettivi specifici: realizzazione di una diga foranea che svolge la duplice funzione di protezione della costruenda conca di navigazione, che permetterà il passaggio delle grandi navi durante l'operatività del sistema di difesa dalle acque alte, ed il relativo canale di accesso. Allo stesso tempo, contribuisce a creare l'effetto dissipativo delle correnti nei canali di bocca

Interventi ultimati e in corso

Diga foranea. Vista aerea della diga (ultimato)



Conca di navigazione - opere civili camera: a sinistra il tratto di molo sud oggetto di rinforzo. Al centro le attività in corrispondenza della conca di navigazione. A destra i lavori relativi alle infrastrutture di prefabbricazione dei cassoni di alloggiamento delle paratoie



Conca di navigazione: riempimenti e stesa del materiale all'interno della parete combinata della testata lato mare



Conca di navigazione - opere civili per l'alloggiamento delle porte e delle strutture guida: parete combinata della testata lato mare, in fase di infissione

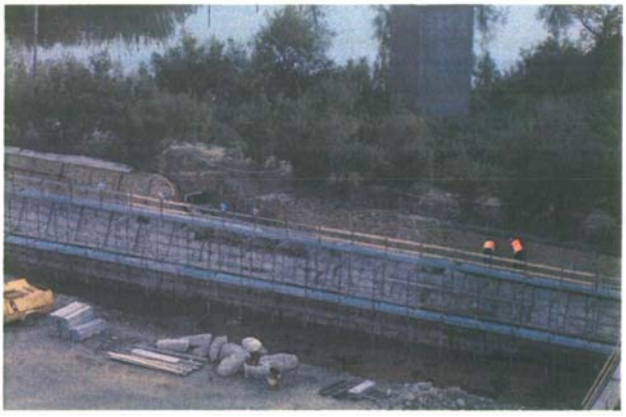

Conca di navigazione – opere di protezione della sponda del territorio lato Forte S. Pietro: l'intervento di restauro del muro del forte S. Pietro



Conca di navigazione – opere di protezione della sponda del territorio lato Forte S. Pietro: la scogliera provvisoria dell'area di intervento in corrispondenza del forte S. Pietro



Bocca di Malamocco - Opere di barriera: opere per la prefabbricazione dei cassoni di alloggiamento delle barriere

Obiettivo specifico: realizzazione del sito ove troverà ubicazione l'impianto per la prefabbricazione dei cassoni di alloggiamento delle paratoie delle barriere di Malamocco e Lido S. Nicolò

Intervento in corso

Infrastrutture di prefabbricazione dei cassoni di alloggiamento delle paratoie per le barriere di Malamocco e di S. Nicolo: a sinistra l'attacco alla testata ovest della diga, della scogliera lato sud di conterminazione del rilevato a seguire il doppio palancolato lato mare e lato conca. Sullo sfondo a destra la scogliera nord del rilevato in fase di realizzazione



Refluimento del materiale dragato nell'avanconca, a formazione del rilevato delle infrastrutture di prefabbricazione dei cassoni di alloggiamento delle paratoie



Refluimento del materiale dragato nell'avanconca, a formazione del rilevato delle infrastrutture di prefabbricazione dei cassoni di alloggiamento delle paratoie

Bocca di Chioggia

CONFIGURAZIONE OPERE ALLA BOCCA DI PORTO DI CHIOGGIA

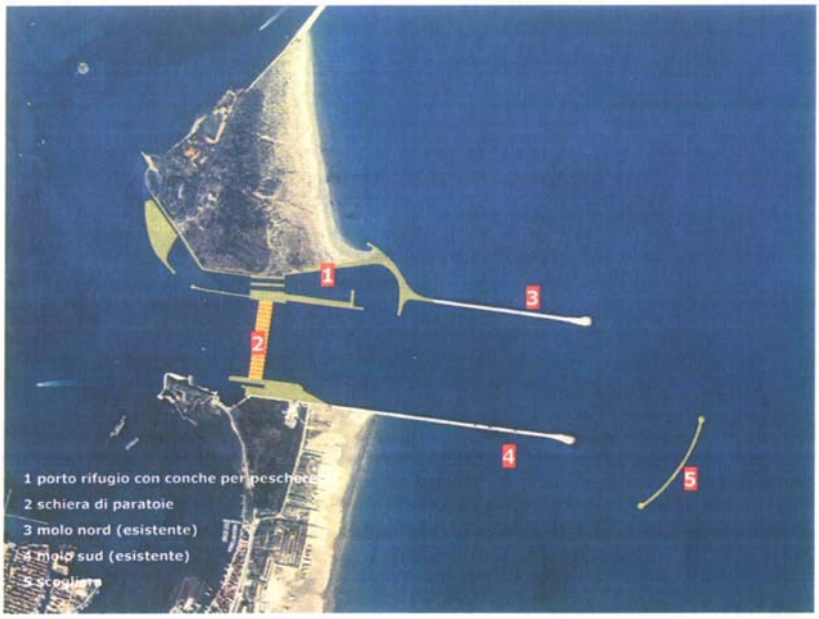

LAVORI ULTIMATI IN CORSO E DI PROSSIMO AVVIO
PLANIMETRIA GENERALE BOCCA DI CHIOGGIA

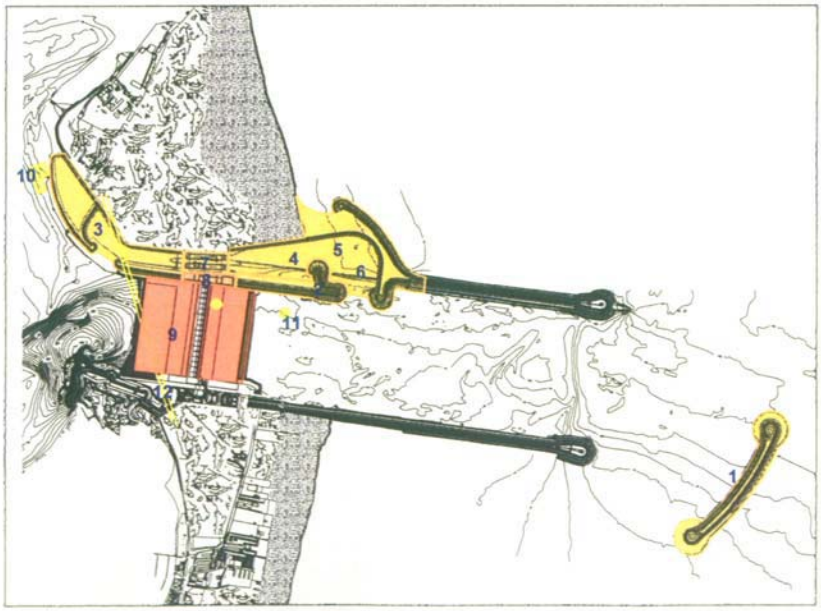

Attività finanziate:

Diga foranea, porto rifugio e conche di navigazione

1. Diga foranea di fronte alla bocca di porto di Chioggia (Ultimato)
2. Porto rifugio - scogliera sud del porto rifugio 1^ fase
3. Porto rifugio - bacino lato laguna
4. Porto rifugio lato mare/tura 1^ fase - opere in scogliera, palancolati, riempimenti e demolizioni
5. Porto rifugio lato mare/tura 1^ fase - palancolato, scavo bacino
6. Porto rifugio lato mare/tura 1^ fase - opere di finitura, svuotamento bacino
7. Conche per pescherecci - opere civili

Opere di spalla

8. Spalla nord - creazione del piano di lavoro e costruzione dei terrapieni d'ala

Opere di barriera

9. Barriera - protezione del fondale realizzazione della parte centrale della protezione dei fondali

Attività funzionali alla realizzazione delle opere

10. Aree di produzione - cantiere piarda di movimentazione stoccaggio materiale
11. Campo prova pali di fondazione
12. Cavidotti di attraversamento per linee elettriche - trivellazione orizzontale teleguidata (Ultimato)



Bocca di Chioggia - Diga Foranea, porto rifugio e conche di navigazione

Obiettivi specifici: realizzazione di una diga per creare effetti dissipativi delle correnti nei canali di bocca. Il porto rifugio è stato previsto per consentire il ricovero e il transito, attraverso le due conche di navigazione affiancate, dei pescherecci, delle imbarcazioni da diporto e dei mezzi di soccorso durante la temporanea chiusura della bocca di porto

Interventi ultimati e in corso

Diga foranea: Vista della diga (ultimato)



Porto rifugio e conche per pescherecci: da sinistra, il bacino lato laguna, le conche di navigazione, il bacino lato mare con la scogliera sud e la scogliera di protezione



Porto rifugio - scogliera sud: vista della scogliera sud del porto rifugio lato mare. In secondo piano il bacino lato mare del porto rifugio



Porto rifugio – bacino lato laguna: terrapieno che delimita a nord il bacino lato laguna del porto rifugio. E' stata realizzata la scogliera, è in corso di realizzazione il riempimento



Porto rifugio – bacino lato laguna: formazione della scogliera lato canale a ridosso del palancolato precedentemente infisso, costituente la parete interna del bacino lato laguna del porto rifugio



Porto rifugio – lato mare/tura 1^ fase: la scogliera di protezione del bacino lato mare completata, sulla sinistra il palancolato di chiusura del bacino in fase di realizzazione, in secondo piano la scogliera sud del porto rifugio lato mare, quasi completata, sullo sfondo le conche per pescherecci e il bacino lato laguna del porto rifugio



Conche per pescherecci - opere civili: in primo piano a sinistra getto degli impalcati in corrispondenza della testata lato mare, in corrispondenza delle banchine delle conche di navigazione. All'interno della testata lato laguna si scorge la struttura di puntellazione provvisoria. In secondo piano i terrapieni d'ala della spalla. Sulla destra il molo sud del bacino lato laguna del porto rifugio



Bocca di Chioggia - Spalla nord della barriera: la spalla nord della barriera dovrà raccordarsi con le strutture di nuova costruzione, lungo il canale di bocca lato Cà Roman, relative al porto rifugio, nel tratto in cui verranno realizzate le due conche di navigazione parallele

Interventi in corso

Spalla nord 1^ stralcio: i terrapieni d'ala della spalla nord in via di realizzazione in adiacenza alle conche di navigazione. Sullo sfondo il porto rifugio lato laguna



Spalla nord 1^ stralcio: attività di dragaggio in corrispondenza del recesso della spalla nord. Sulla destra il riempimento del terrapieno d'ala lato mare. In secondo piano le conche di navigazione con gli impalcati in fase di realizzazione

Centro per la Simulazione della Navigazione



A lato: localizzazione del Centro sito al Lido di Venezia in località Alberoni.

L'installazione del centro segue l'esperienza fatta in Danimarca, dove erano stati realizzati dei cicli di simulazione ai quali avevano partecipato la Corporazione Piloti di Venezia, la Corporazione Piloti di Chioggia, l'autorità Portuale di Venezia, la Capitaneria di Porto di Venezia, la Capitaneria di Porto di Chioggia, il Magistrato alle Acque di Venezia, il progettista Technital e il Consorzio Venezia Nuova. Il Magistrato alle Acque di Venezia, visti i buoni risultati raggiunti in quella sede e in risposta alle esigenze delle Corporazioni Piloti di Venezia e Chioggia e del grande interesse dimostrato dalle relative Capitanerie di Porto e dell'Autorità Portuale, ha deciso di dar corso alle attività di installazione di un simulatore della navigazione direttamente a Venezia allo scopo di verificare l'accessibilità alle bocche di porto nelle fasi di costruzione e di successiva gestione delle opere mobili



A fianco e in basso, "Operator's room". Si tratta della sala attrezzata per la gestione complessiva delle prove e del relativo software di simulazione. Nelle immagini si può vedere la consolle di controllo da cui è possibile, tra l'altro, seguire le manovre eseguite sul ponte di comando





Simulazioni di navigazione. In alto, ingresso di una nave portacontenitori (245 m di lunghezza e 32 m di larghezza) nella conca di navigazione alla bocca di Malamocco in corso di realizzazione nell'ambito del sistema di difesa dalle acque alte. In basso, transito di una nave da crociera in corrispondenza della stazione marittima di Venezia, lungo il canale della Giudecca

PAGINA BIANCA

DIFESA LOCALE DALLE ACQUE MEDIO - ALTE



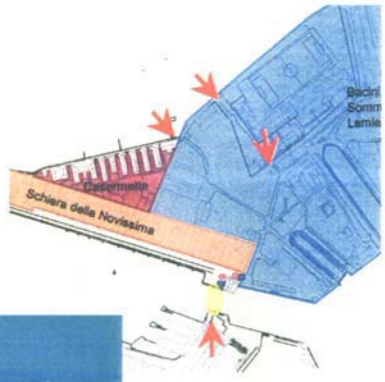




Venezia
Chioggia
Interventi ultimati

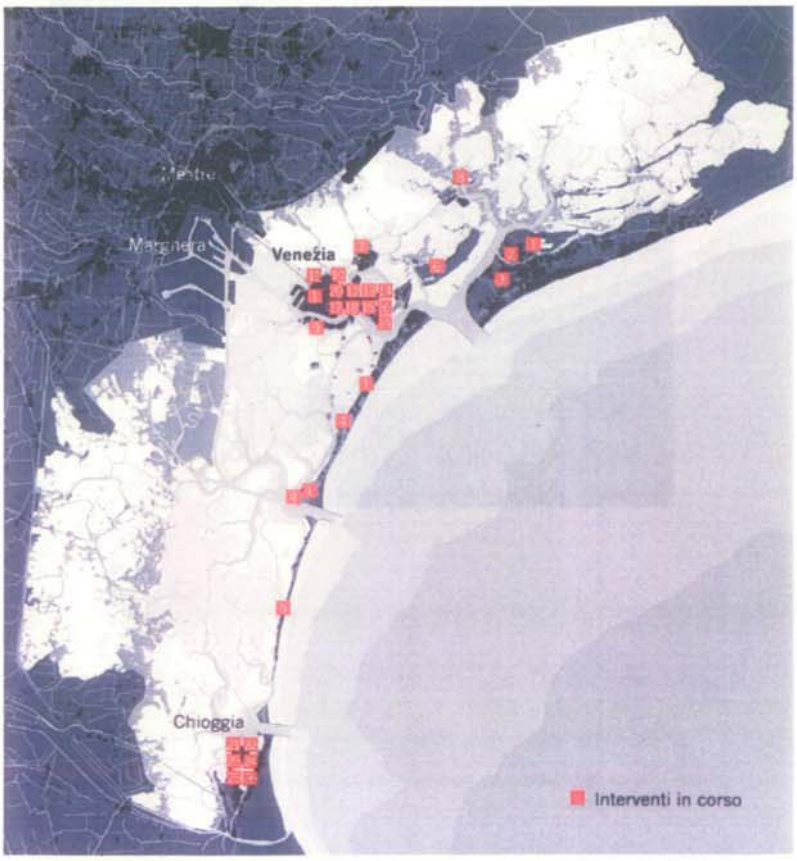
Venezia
Chioggia
Interventi in corso

Attività finanziate:

Attività ultimate

1. Indagini propedeutiche a progetti di recupero e difesa degli insediamenti 1^, 2^, 3^, 4^ , 5^ e 6^ fase
2. Ricostruzione di marginamenti e difesa dell'insediamento urbano di Treporti - primi quattro stralci e 1^ e 2^ fase del 5° stralcio (marginamento via Vivaldi e sistemazione delle chiaviche) (Cavallino)
3. Ricostruzione rive del canale dei Bari (Cavallino)
4. Ricostruzione riva in corrispondenza di via Navarrino (Lido)
5. Difesa dell'abitato di Malamocco (Lido)
6. Ristrutturazione riva in località Alberoni (Lido)
7. Difesa dell'abitato di Alberoni, lato sud-est (Lido) in Accordo di programma con il Comune di Venezia
8. Marginamento a Lido – via Coletti, e lato sud (Lido)
9. Difesa dell'insediamento urbano di S. Pietro in Volta 1° e 2° stralcio (Pellestrina)
10. Difesa dell'abitato di Pellestrina – quattro stralci funzionali (Pellestrina)
11. Sistemazione area banchinamento Cà Roman (Pellestrina)
12. Gestione e manutenzione degli impianti di sollevamento e dei presidi posti a difesa dell'abitato di Pellestrina (Pellestrina)
13. Completamento in direzione nord delle opere di difesa dell'abitato di Pellestrina, lato laguna (Pellestrina)
14. Difesa insediamento urbano a S. Erasmo 1° stralcio (laguna nord)
15. Difesa dell'abitato di Murano 1° stralcio (laguna nord)
16. Ristrutturazione rive a Mazzorbo (laguna nord)
17. Ricostruzione argine a Lio Piccolo (laguna nord)
18. Ricostruzione argini di con terminazione lungo i canali Bondantino (laguna centrale)
19. Ristrutturazione riva a S. Alvise (Venezia)
20. Ristrutturazione riva cantiere ex Opere marittime a Cannaregio (Venezia)
21. Ricostruzione delle rive alle Zattere e alla Giudecca 1°, 2°, 3°, 4°, 5° e 6° stralcio (Venezia)
22. Ricostruzione delle rive dei Giardini Napoleonici – in Accordo di programma con il Comune di Venezia (Venezia)
23. Ristrutturazione riva a S. Elena – Giardini (Venezia)
24. Ristrutturazione riva a S. Elena – Morosini (Venezia)
25. Messa in sicurezza del molo e delle lanterne dell'isola di S. Giorgio – interventi urgenti (Venezia)
26. Intervento di messa in sicurezza del molo di San Giorgio Maggiore 2^ fase (Venezia)
27. Indagini storico architettoniche sull'Arsenale Militare (Venezia) e indagini propedeutiche alla progettazione degli interventi (Venezia)
28. Consolidamento banchine dell'Arsenale – interventi urgenti (Venezia)
29. Intervento di messa in sicurezza del "Reparto delle Galeazze" e "Fonderie" presso l'Arsenale (Venezia
30. Arsenale di Venezia - Messa in sicurezza e restauro Capannoni S. Cristoforo (Venezia)
31. Arsenale di Venezia - Messa in sicurezza Capannoni Novissima (capannone 110 e 111) (Venezia)
32. Difesa del percorso dei Tolentini (Venezia) – in Accordo di programma con il Comune di Venezia
33. Interventi per il ripristino delle rive delle Fondamente Nuove – messa in sicurezza del Ponte Donà (Venezia)

34. Sistemazione rive e difesa dell'insediamento urbano di Sottomarina (Chioggia) in Accordo di programma con il Comune di Chioggia, primi quattro stralci

35. Difesa dei quartieri Tombola e Borgo S. Giovanni (Chioggia) in Accordo di programma con il Comune di Chioggia, 1° stralcio

36. Difesa dell'"insula" di Chioggia dalle acque alte in Accordo di programma con il Comune di Chioggia: ponte lungo

37. Sistemazione zona Lusenzo interno (Chioggia)

38. Difesa dell'isola dell'Unione e Buon Castello (Chioggia) in Accordo di programma con il Comune di Chioggia

39. Difesa dei quartieri S. Giovanni e Tombola (Chioggia) 2° stralcio in Accordo di programma con il Comune di Chioggia

40. Difesa dei quartieri San Domenico (Chioggia) 1° stralcio in Accordo di programma con il Comune di Chioggia

41. Difesa dell'"insula" di Chioggia dalle acque alte, sistemazione del ponte Vigo in Accordo di programma con il Comune di Chioggia

42. Protezione del Forte di S. Andrea (bocca di porto di Lido)

43. Intervento di adeguamento e messa in sicurezza delle stazioni mareografiche nella laguna di Venezia

Attività in corso

1. Indagini propedeutiche a progetti di recupero a difesa degli insediamenti 7^ fase

2. Interventi a difesa dell'abitato di Treporti (Cavallino) ed aree annesse dalle acque alte 5° stralcio: ulteriori interventi di protezione di sponda (3^ fase)

3. Marginamento canale Pordelio - Treporti 1^ stralcio Ponte girevole (Cavallino)

4. Interventi di difesa degli abitati di Malamocco e Alberoni (Lido) nell'ambito dell'Accordo di programma con il Comune di Venezia

5. Interventi di difesa insediamenti urbani lungo l'isola di Pellestrina, lato laguna - tratto tra Portosecco e il cantiere de Poli (Pellestrina)

6. Difesa dell'abitato di S. Erasmo 2° e 3° stralcio (laguna nord)

7. Difesa Insula Murano - Canale S. Mattia (laguna nord)

8. Difesa dell'abitato di Torcello (laguna nord)

9. Rive sud Giudecca e Sacca Fisola nord (Venezia)

10. Ripristino Fondamente Nuove 1° e 2° stralcio (Venezia)

11. Ripristino del marginamento antistante l'ex macello a S. Giobbe (Venezia)

12. Ricostruzione della difesa spondale dell'area edificata a nord dell'Arsenale di Venezia - Rive Casermette (Venezia)

13. Arsenale di Venezia - Messa in sicurezza delle Tese della Novissima (capannoni da 96 a 100, da 107 a 109, 112 e 113) (Venezia)

14. Arsenale di Venezia - Risanamento e consolidamento delle rive della Darsena Vecchia e Vasca delle Galeazze (Venezia)

15. Intervento di recupero e adeguamento funzionale dei marginamenti dell'area a nord dell'Arsenale di Venezia (Venezia)

16. Intervento di recupero del marginamento dell'area nord dell'Arsenale di Venezia lungo il canale delle Fondamente Nuove tra la Celestia e le Casermette (Venezia)

17. Difesa Insula di San Marco 1° stralcio (Venezia)

18. Difesa bacino San Marco tra il Ponte delle Paglia e il Ponte del Vin (Venezia)

19. Marginamento lungo il fronte est dell'Isola di S. Elena (Venezia)

20. Difesa dell'Insula di Rialto (Venezia) - progettazione

21. Difesa dei quartieri San Domenico (Chioggia) 2° stralcio in Accordo di programma con il Comune di Chioggia

22. Difesa dell'"insula" di Chioggia dalle acque alte interventi sulle rive del canale Lombardo e del bacino Vigo in Accordo di programma con il Comune di Chioggia

23. Difesa dell'"insula" di Chioggia dalle acque alte, interventi sulle rive del canale Perottolo in Accordo di programma con il Comune di Chioggia

24. Difesa dell'"insula" di Chioggia dalle acque alte, sistemazione Corso del Popolo e canal Vena 1° stralcio

25. Difesa dell'"insula" di Chioggia dalle acque alte, sistemazione dei ponti sul canal Vena 1° stralcio in Accordo di programma con il Comune di Chioggia

26. Interventi di difesa dell'insediamento urbano di Sottomarina dalle acque alte 5° stralcio, riva San Felice (Chioggia)

Attività da avviare

1. Prosecuzione sistemazione marginamento canale Pordelio - Treporti 2^ stralcio

2. Completamento dell'intervento nella zona Malamocco - Alberoni a Lido

3. Prosecuzione degli interventi nella zona di Lido

4. Prosecuzione della sistemazione di rive e marginamenti del centro storico di Venezia

5. Difesa Insula di San Marco- sistemazione funzionale del Campanile

6. Sistemazione sponde, ed edifici prospicienti, all'Arsenale di Venezia

7. Prosecuzione della difesa del centro storico di Chioggia

Venezia - Fondamente Nuove

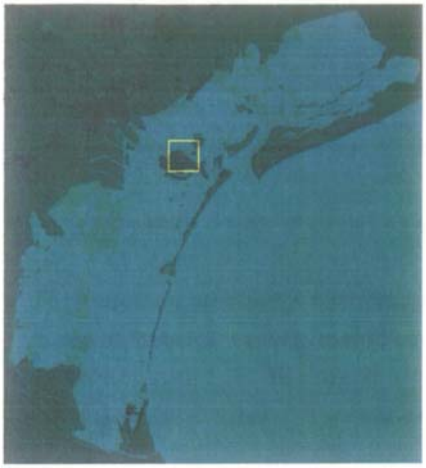

Obiettivi specifici: contrastare il dissesto delle rive, ridurre la frequenza degli allagamenti e proteggere dal moto ondoso

Interventi principali: restauro, consolidamento e rialzo delle rive, adeguamento altimetrico delle soglie di unità immobiliari al piano terra rispetto alla nuova quota della pavimentazione esterna. Risanamento igienico ambientale del sistema fognario e riordino dei sottoservizi

Interventi in corso

A lato: localizzazione dell'intervento



Vista aerea dell'area d'intervento



Rimozione del palancolato provvisionale dopo l'ultimazione dei lavori di marginamento nell'area d'intervento di primo stralcio



Area d'intervento a lavori ultimati nei pressi di Ponte Donà dopo il rialzo del marginamento e della pavimentazione



Centinatura di Ponte Donà prima degli interventi progettuali



Ripristino dei paramenti murari delle spalle di Ponte Donà



Scale esistenti sul marginamento prima degli interventi progettuali



Ripristino delle scale esistenti sul marginamento



Esecuzione di cordolo in cemento armato sulla sommità della palancola antiscalzamento



Demolizioni nell'area d'intervento di S. Alvise



Rifacimento del parapetto in muratura sul marginamento e rifacimento della pavimentazione del campiello S. Alvise

Difesa degli abitati di Malamocco e Alberoni

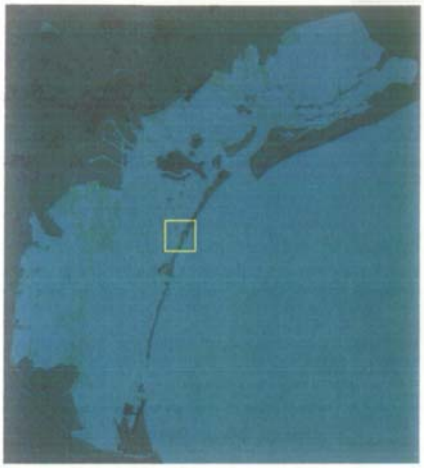

Obiettivi specifici: contrastare il dissesto delle rive, ridurre la frequenza degli allagamenti e proteggere dal moto ondoso

Interventi principali: interventi di marginamento e riqualificazione ambientale: consolidamento e valorizzazione ambientale di sponde e rive, vivificazione e bonifica dei canali, predisposizione del sistema fognario. Riqualificazione urbana: riqualificazione delle piazze e sistemazione delle pavimentazioni, predisposizione di percorsi e passerelle pedonali, adeguamento illuminazione pubblica e sottoservizi, realizzazione parcheggio. Gli interventi vengono realizzati in Accordo di Programma con il Comune di Venezia

Interventi in corso

A lato: localizzazione dell'intervento

In basso: opere di marginamento e recupero ambientale, localizzazione e tipologie degli interventi. La zona indicata con la "C" è quella destinata allo spazio di cantiere







Opere di riqualificazione urbana. Localizzazione e tipologie degli interventi. La zona indicata con la lettera "C" è quella destinata allo spazio di cantiere

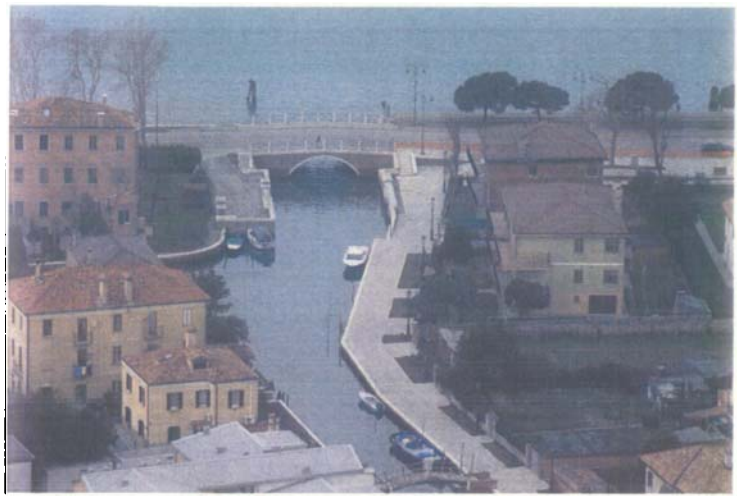

Vista aerea del rio Squero dopo i lavori di sistemazione delle rive



Vista aerea della zona tra rio Strocca e rio Squero durante i lavori di ristrutturazione delle rive e di riapertura dello spazio acqueo



Una fase dei lavori



Un tratto di riva sul rio Strocca prima dei lavori

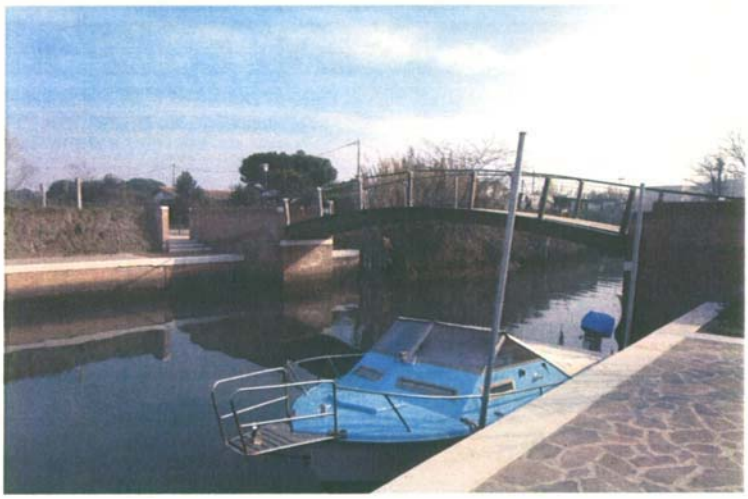

Un tratto di riva a lavori ultimati



Un tratto di riva a lavori ultimati

PAGINA BIANCA

RISTRUTTURAZIONE DEI MOLI FORANEI

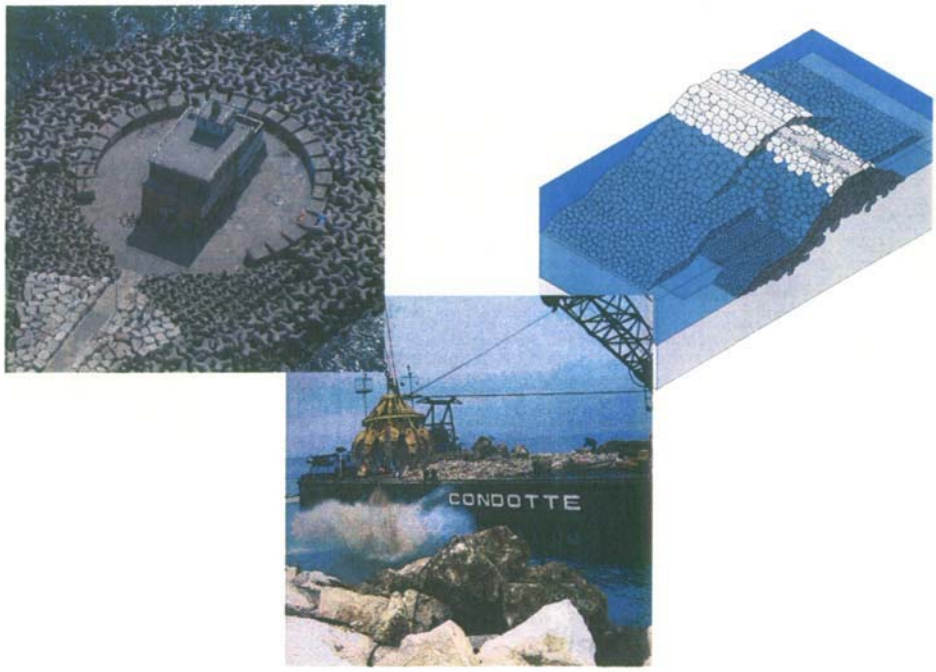

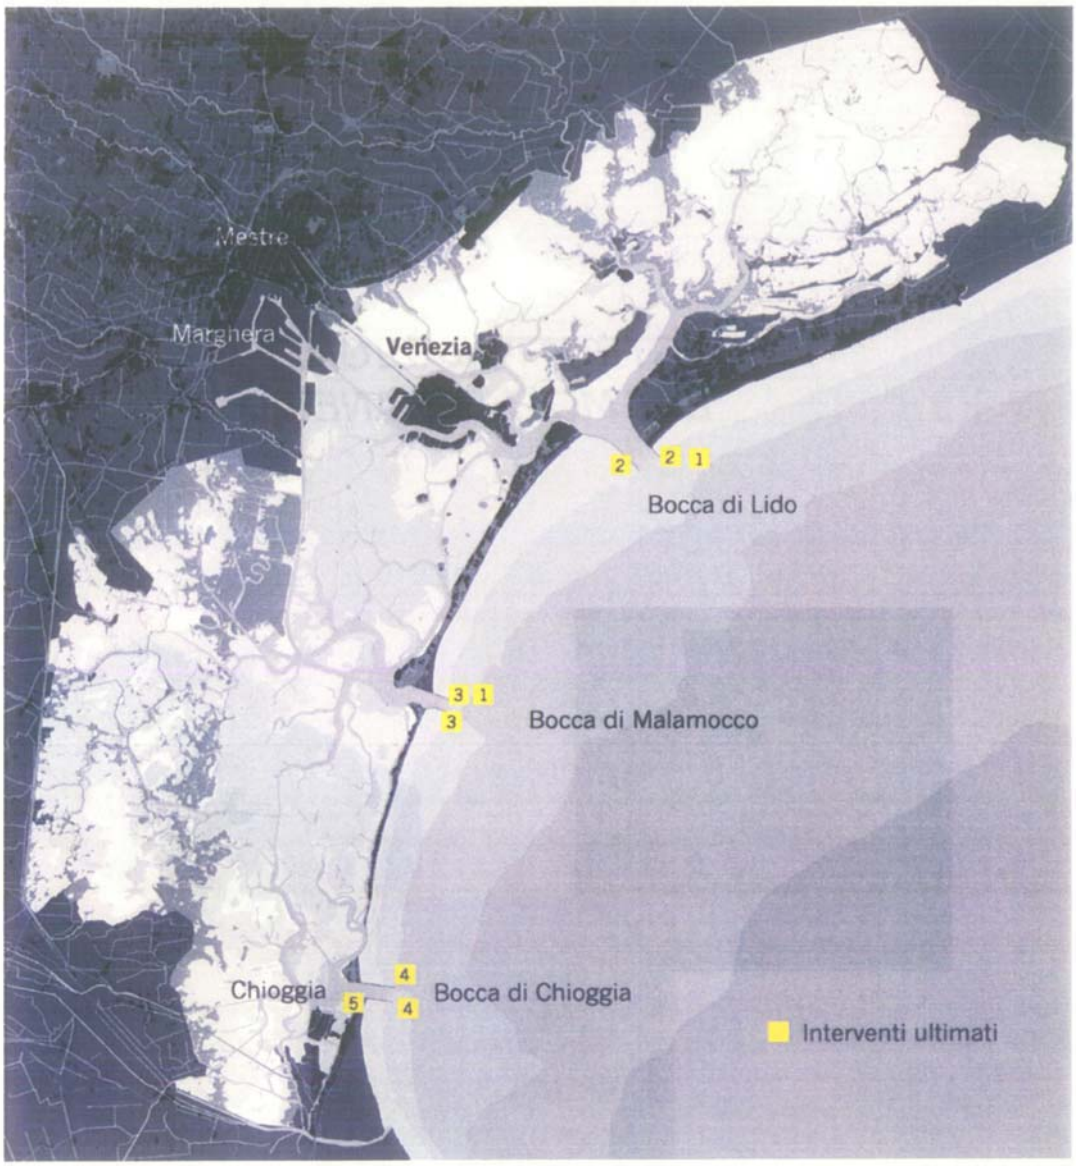

RISTRUTTURAZIONE DEI MOLI FORANEI
ATTIVITA' ULTIMATE
(nessuna attività è attualmente in corso)

Attività finanziate:

Attività ultimate

1. Messa in sicurezza e adeguamento dei fari sui moli foranei a nord di Malamocco e di Lido
2. Ristrutturazione dei moli nord e sud di Lido
3. Ristrutturazione del molo nord e sud di Malamocco
4. Ristrutturazione del molo nord e sud di Chioggia
5. Sistemazione della radice del molo sud di Chioggia

Malamocco – ristrutturazione del molo nord

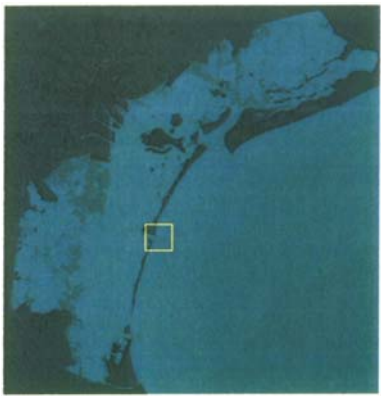

Obiettivi specifici: contrastare il dissesto e il degrado della struttura; aumentare la resistenza rispetto alle mareggiate

Interventi principali: rinforzo delle scogliere e protezione del fondale alla base del molo per impedire l'erosione (2 km)

Intervento ultimato





Molo di Malamocco. *A sinistra*: Un tratto del molo nord al termine degli interventi di rinforzo della scogliera. *A destra*: Lavori per l'adeguamento del faro, al termine degli interventi di ristrutturazione del molo

PAGINA BIANCA

DIFESA DALLE MAREGGIATE

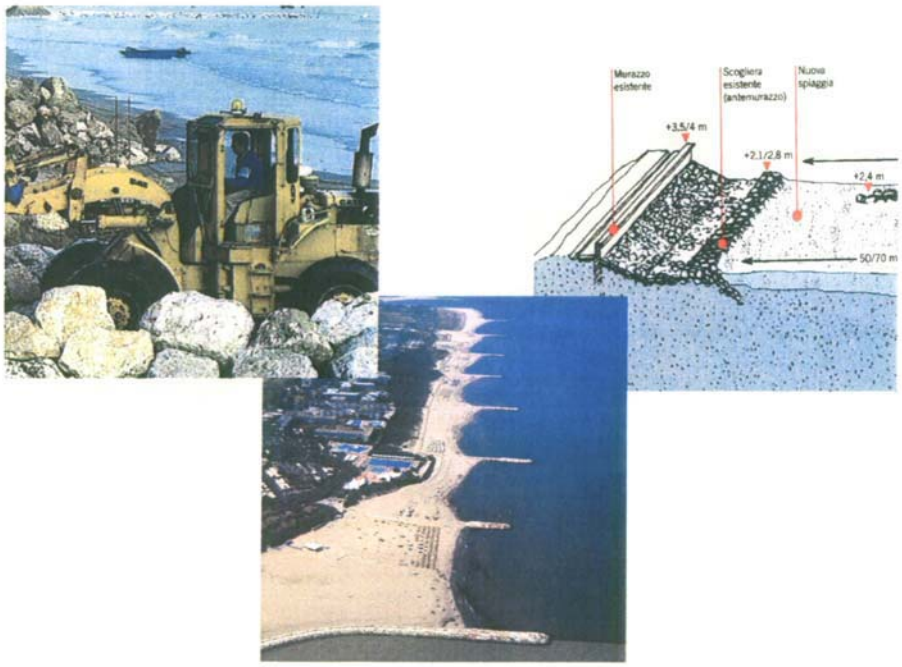

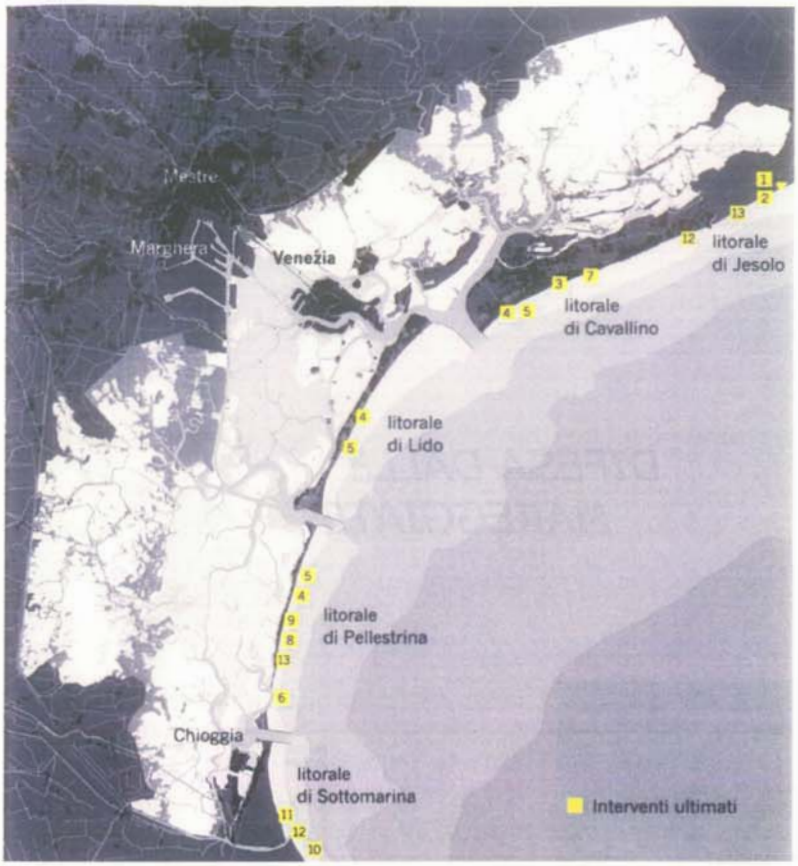
Mestre
Marghera
Venezia
litorale
di Jesolo
litorale
di Cavallino
litorale
di Lido
litorale
di Pellestrina
Chioggia
litorale
di Sottomarina
Interventi ultimati

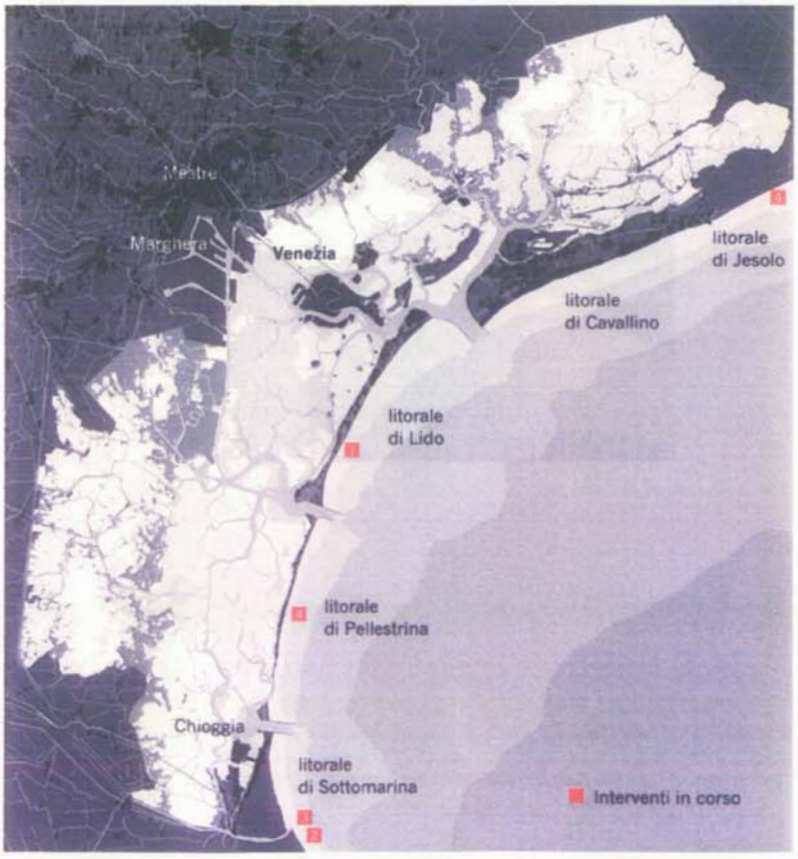
Mestre
Marghera
Venezia
litorale
di Jesolo
litorale
di Cavallino
litorale
di Lido
litorale
di Pellestrina
Chioggia
litorale
di Sottomarina
Interventi in corso

Attività finanziate:

Attività ultimate

1. Rinforzo del litorale di Jesolo 1° e 2° stralcio - in Accordo di programma con il Comune di Jesolo
2. Sistemazione zona Cortellazzo e Foce Piave - 1° e 2° stralcio
3. Interventi sperimentali di difesa del litorale di Cavallino (località Cà Pasquali)
4. Indagini propedeutiche alla realizzazione degli interventi
5. Monitoraggio del litorale da Cavallino a Pellestrina - prime fasi
6. Restauro murazzo Cà Roman sul litorale di Pellestrina
7. Rinforzo e rinaturalizzazione del litorale di Cavallino
8. Rinforzo della scogliera tra S. Pietro in Volta e Pellestrina e del murazzo di Caroman (litorale di Pellestrina)
9. Rinforzo e ripascimento del litorale di Pellestrina
10. Rinforzo del litorale di Isola Verde/Chioggia
11. Rinforzo del litorale di Sottomarina (Chioggia)
12. Interventi stagionali alla foce del Brenta e alla foce dell'Adige - in Accordo di programma con la Regione del Veneto, Comune di Chioggia e Comune di Rosolina - 1^ fase
13. Manutenzione dei litorali mediante ripristino del ripascimento in sabbia

Attività in corso

1. Difesa litorale Lido 1° e 2° stralcio
2. Completamento rinforzo litorale di Isola Verde
3. Interventi stagionali alla foce del Brenta e alla foce dell'Adige - in Accordo di programma con la Regione del Veneto, Comune di Chioggia e Comune di Rosolina - 2^ fase
4. Manutenzione dei litorali mediante ripristino del ripascimento in sabbia

Attività da avviare

1. Completamento rinforzo litorale di Jesolo e Cortellazzo

Attività da finanziare:

1. Prosecuzione della manutenzione dei litorali mediante ripristino del ripascimento
2. Completamento rinforzo litorale di Jesolo (zone Cortellazzo, Eraclea) e di Lido
3. Monitoraggi di controllo degli interventi realizzati

Litorale di Jesolo



Obiettivi specifici: proteggere i territori e gli abitati litoranei; contrastare l'erosione della costa; smorzare l'energia delle onde; ripristinare ambienti naturali degradati

Interventi principali: ampliamento della spiaggia (10 km); adeguamento dei pontili lungo la riva (34 pontili ristrutturati, 16 di nuova costruzione) e realizzazione di 4 scogliere di roccia ("pennelli")

Intervento ultimato

A lato: localizzazione dell'intervento

In basso: un tratto del litorale prima e dopo i lavori

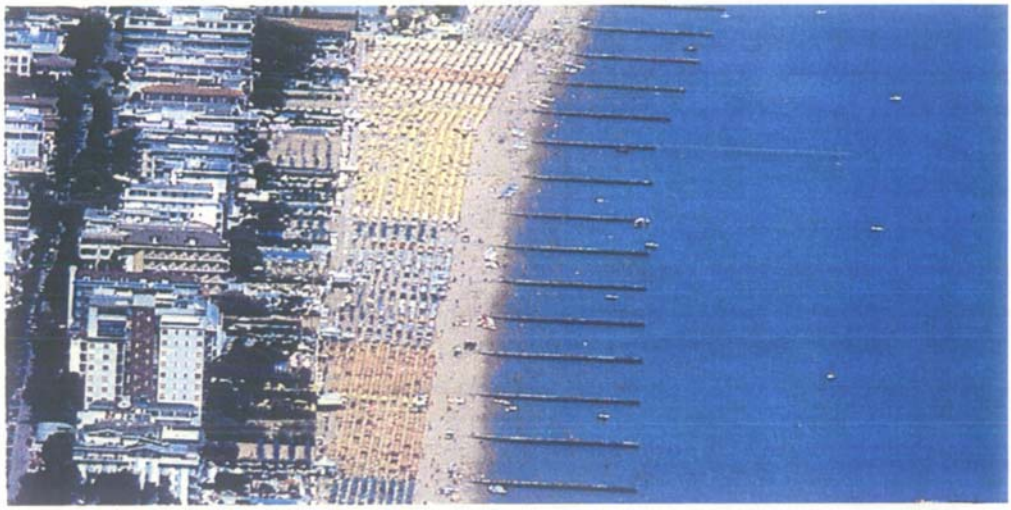



Litorale di Cavallino

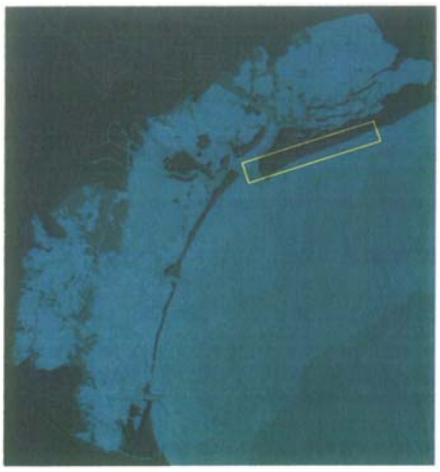

Obiettivi specifici: proteggere i territori e gli abitati litoranei; contrastare l'erosione della costa; smorzare l'energia delle onde; ripristinare ambienti naturali degradati

Interventi principali: ampliamento della spiaggia (11 km) protetta da 32 "pennelli"

Intervento ultimato

A lato: localizzazione dell'intervento

In basso: la parte sud del litorale prima e dopo l'intervento





Litorale di Pellestrina

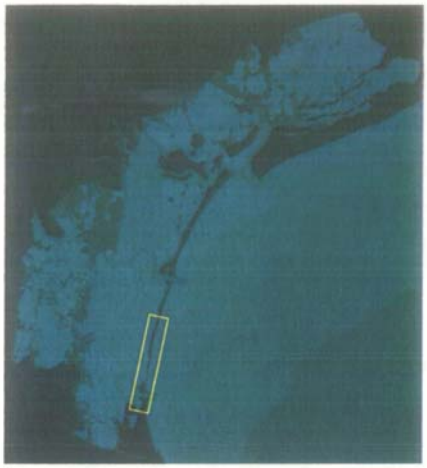

Obiettivi specifici: proteggere i territori e gli abitati litoranei; contrastare l'erosione della costa; smorzare l'energia delle onde; rinforzare le antiche difese a mare "murazzi"

Interventi principali: formazione di una nuova spiaggia (9 km) contenuta entro "celle" delimitate da 18 "pennelli" trasversali alla riva e da una scogliera sommersa longitudinale (9 km)

Intervento ultimato

A lato: localizzazione dell'intervento

In basso: un tratto del litorale prima e dopo i lavori





Litorale di Isola Verde

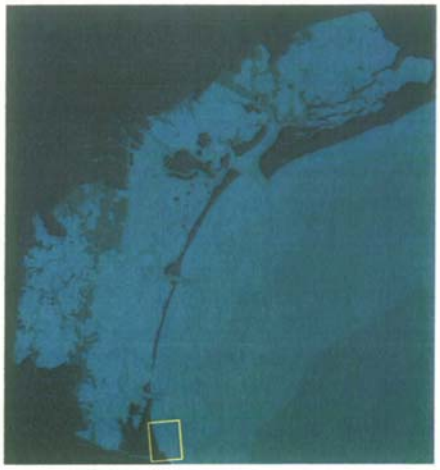

Obiettivi specifici: proteggere i territori e gli abitati litoranei; contrastare l'erosione della costa; smorzare l'energia delle onde

Interventi principali: rinascimento della spiaggia (2,5 km) e costruzione di 8 "pennelli" di roccia a difesa del nuovo arenile

Intervento ultimato

A lato: localizzazione dell'intervento

In basso: un tratto del litorale prima e dopo i lavori





PAGINA BIANCA

RECUPERO MORFOLOGICO

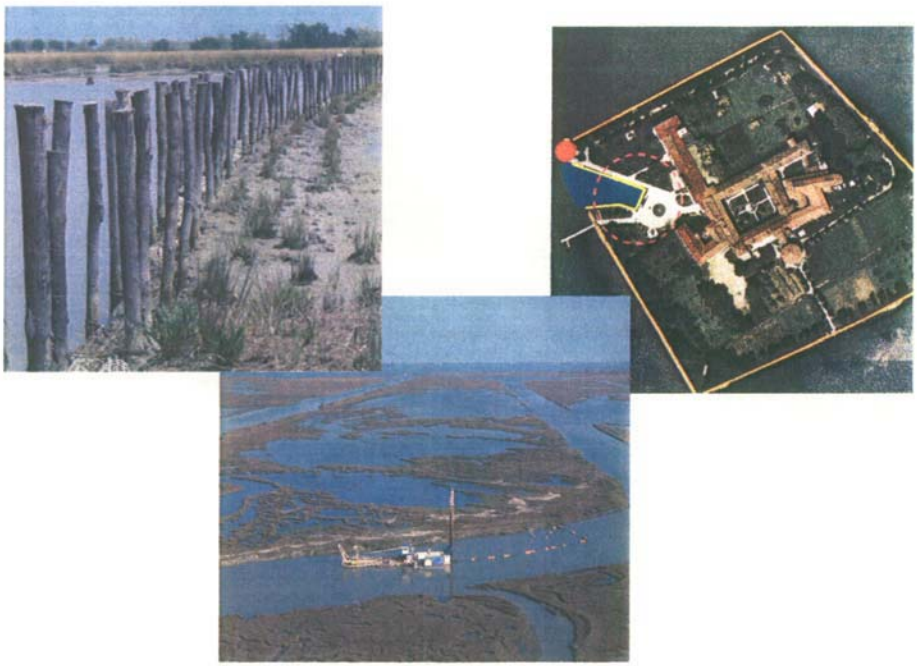

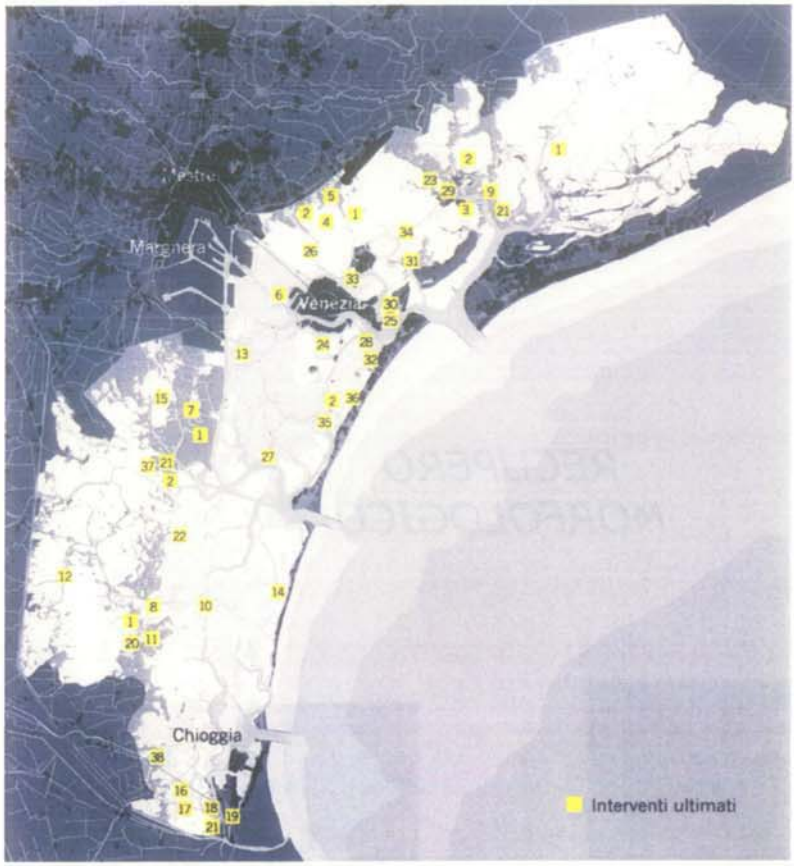
Marghera
Venezia
Chioggia
Interventi ultimati

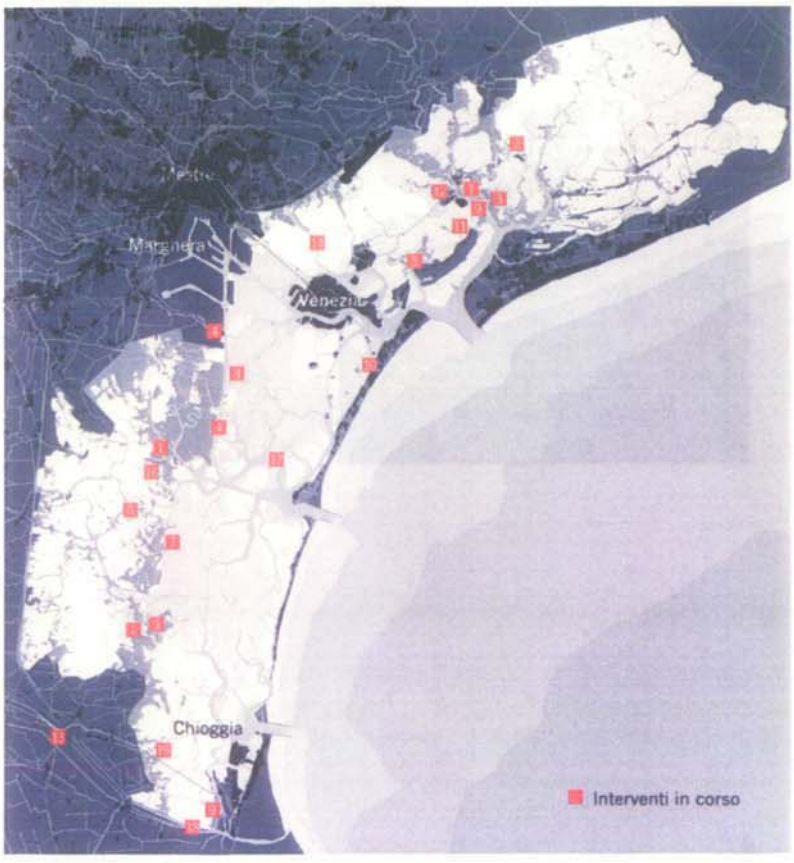
Marghera
Venezia
Chioggia
Interventi in corso

Attività finanziate:

Attività ultimate

1. Indagini propedeutiche alla realizzazione degli interventi
2. Interventi sperimentali
3. Recupero morfologico zona Burano, Mazzorbo, S. Francesco del Deserto (laguna nord)
4. Recupero morfologico zona Tessera, Campalto, Osellino (laguna nord)
5. Interventi integrativi sul canale di Tessera (laguna nord)
6. Isola del Tronchetto - escavo per la vivificazione area sud-ovest in Accordo di programma con il Comune di Venezia (laguna centrale)
7. Ripristino dei canali nelle casse di colmata B e D/E e ricostruzione di barene a sud della cassa di colmata D/E (laguna centrale)
8. Cordoni sabbiosi a difesa di barene in erosione 1° stralcio
9. Intervento di protezione barene 1° e 2° ciclo (laguna nord)
10. Dragaggio del canale Alfacciante (laguna centrale)
11. Dragaggio di canali in valle Millecampi (laguna sud) e ricostruzione di barene
12. Dragaggio canale Scirocchetto e canale Buello (laguna centrale)
13. Dragaggio canali lagunari di Tessera, Fusina, e Contorta S. Angelo e ricostruzione di barene (laguna nord e centrale)
14. Dragaggio del canale S. Antonio dalla bocca di Malamocco a Caroman (laguna centrale)
15. Ripristino fondali canali area lago Teneri 1^ stralcio (canali Volpego e Fiumesino)
16. Dragaggio dei varchi sotto il ponte translagunare tra Chioggia e la terraferma (laguna sud)
17. Dragaggio canali Sottomarina, Madonna, Alghero, Laghini 1- Alghero, Trezze, Otregan, Scarpion, S. Domenico e Borgo S. Giovanni (Chioggia)
18. Dragaggio canali nel bacino del Lusenzo e ricostruzione di barene lungo il canale Lombardo esterno sud e nord (Chioggia)
19. Sistemazione dei fondali del canale Fossetta (Chioggia)
20. Recupero ambientale Valle Millecampi
21. Naturalizzazione e riqualificazione ambientale delle strutture morfologiche artificiali a velma e barena
22. Realizzazione di sovralzi di sabbia a protezione delle barene in erosione (laguna nord e sud)
23. Recupero ambientale e morfologico delle barene - rilievi e monitoraggi; recupero barene con tecniche di ingegneria naturalistica (progetto Life Natura)
24. Interventi di ripristino morfologico e risagomatura del canale marittimo di S. Spirito e dei canali limitrofi Rezzo e Fasiol (laguna centrale)
25. Completamento dell'isola della Certosa
26. Recupero morfologico dell'isola di Campalto (laguna nord)
27. Recupero morfologico dell'isola Fisolo (laguna centrale)
28. Recupero morfologico dell'isola di S. Servolo (laguna centrale)
29. Recupero morfologico dell'isola dei Laghi (laguna nord)

30. Recupero morfologico dell'isola della Certosa (laguna nord)

31. Recupero morfologico dell'isola del Lazzaretto Nuovo (laguna nord)

32. Recupero morfologico dell'isola di San Lazzaro degli Armeni (laguna centrale)

33. Recupero morfologico dell'isola di San Michele (laguna centrale)

34. Intervento di ripristino morfologico e restauro statico murature perimetrali dell'isola di S. Giacomo in Paludo (laguna nord)

35. Recupero morfologico dell'isola di Poveglia (laguna centrale)

36. Ripristino morfologico canale litoraneo Lido 1^ stralcio (laguna centrale)

37. Opere di confinamento della barena Novisso (laguna centrale)

38. Manutenzione canale Novissimo (laguna sud)

Attività in corso

1. Monitoraggi sugli esiti dei lavori morfologici realizzati

2. Vivificazione e recupero morfologico lagunare della zona dell'isola di S. Cristina (laguna nord)

3. Manutenzione straordinaria e completamento barene di Burano

4. Intervento di recupero morfologico aree casse di colmata D/E Fossetta Barambani (laguna centrale)

5. Isola Lazzaretto Nuovo completamento impianto fitobiodepurazione e gestione (laguna centrale)

6. Ripristino fondali canali area lago Teneri 2^ stralcio (barena Casone Zappa A e B)

7. Cordoni sabbiosi a difesa di barene in erosione 2° stralcio (1^ fase)

8. Strutture morfologiche per la protezione dei bassofondali adiacenti il canale S.Leonardo - Marghera

9. Naturalizzazione barene 1^ fase

10. Recupero morfologico dell'isola di Lazzaretto Vecchio (laguna centrale)

11. Recupero morfologico dell'isola San Francesco del Deserto (laguna centrale)

12. Recupero morfologico nell'ambito delle isole di Mazzorbetto e S. Caterina Val Verde

13. Ricalibratura e rinforzo del canal Morto tratto tra l'idrovora Cà Bianca e l'innesto del Canale Barbegara

14. Manutenzione per lo scavo, riprofilatura e ripristino briccole di segnalamento sul canale di Campalto

15. Recupero morfologico dell'area lungo il canale Novissimo - barena Otregan

16. Ripristino morfologico dell'area lungo il canale Cornio

17. Intervento pilota sperimentale per uso di sedimenti idonei a sviluppo biocenosi vegetali

18. Ricalibratura dell'argine sinistro Brenta 1° e 2° stralcio

Attività da avviare

1. Prosecuzione degli interventi sperimentali per l'adeguamento del progetto morfologico

2. Interventi morfologici strettamente connessi alle opere alle bocche di porto

3. Prosecuzione degli interventi morfologici di ricalibratura dei canali lagunari, di sollevamento dei bassi fondali e di ricostruzione di velme e barene

4. Prosecuzione degli interventi per il recupero morfologico e ambientale, per la protezione delle barene e dei bassifondi, per il riavvio dei dinamismi naturali e per la naturalizzazione delle barene e delle strutture morfologiche artificiali
5. Recupero morfologico e ambientale delle isole: Mazzorbetto 2^ fase

Attività da finanziare:

1. Prosecuzione degli interventi morfologici di ricalibratura dei canali lagunari, di sollevamento dei bassi fondali e di ricostruzione di velme e barene
2. Prosecuzione degli interventi per il recupero morfologico e ambientale, per la protezione delle barene e dei bassifondi, per il riavvio dei dinamismi naturali e per la naturalizzazione delle barene e delle strutture morfologiche artificiali
3. Interventi per il recupero morfologico e ambientale nell'ambito del Programma di Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile del Territorio (Prusst)
4. Completamento interventi di ricalibratura degli argini lungo la conterminazione lagunare
5. Prosecuzione del recupero morfologico e ambientale delle isole: Madonna del Monte, Isola Campana, S. Angelo delle Polveri, San Michele, San Pieretto, Vignole

Metodi di intervento per rinforzo/ricostruzione delle barene



Protezione barene mediante buzzoni



Protezione barene mediante ripascimento



Protezione barene mediante fascinate



Evoluzione nel tempo di una barena ricostruita

Ripristino delle barene in laguna sud



Vista aerea delle barene ricostruite lungo il canale lombardo esterno a Chioggia





Laguna sud, barena Otregan. Vista aerea dell'area di intervento durante i lavori di ripristino della barena

Recupero morfologico delle isole minori



Isola degli Armeni: in alto, un tratto di sponda prima degli interventi dove sono evidenti i danni e i dissesti prodotti dall'azione delle maree e del moto ondoso. In basso, lo stesso tratto di riva a lavori ultimati

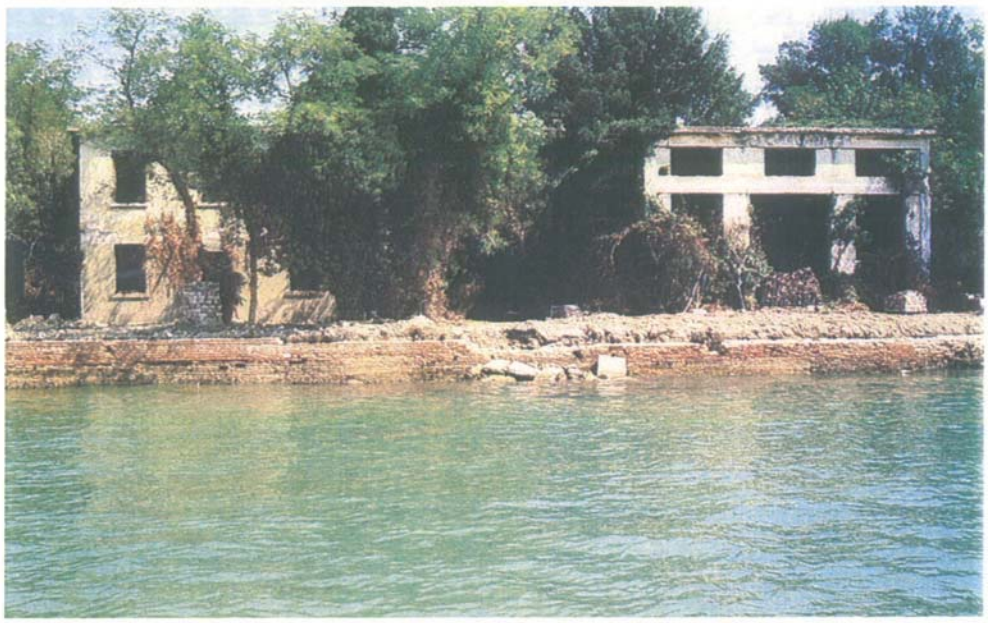

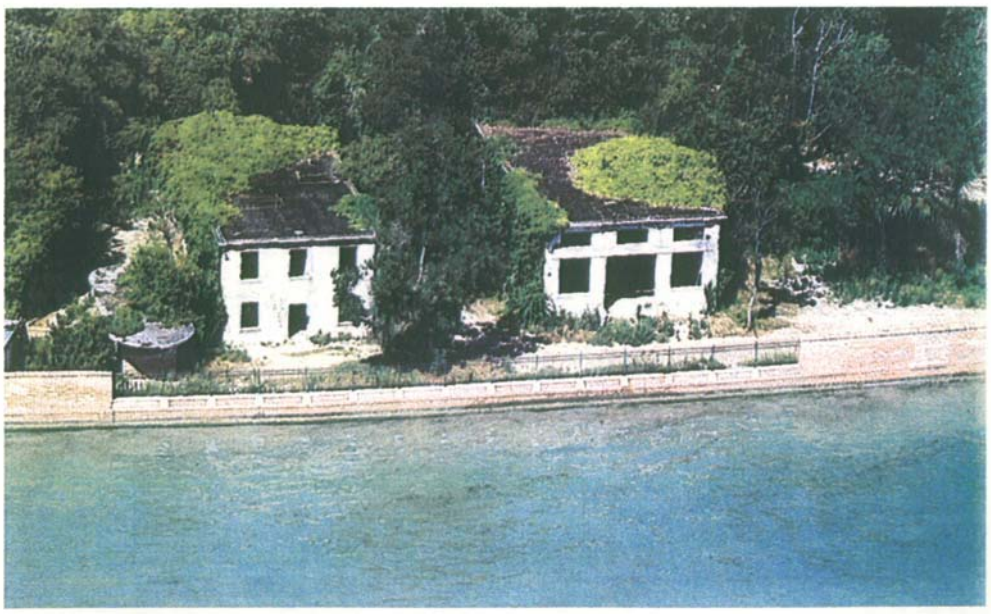

Isola della Certosa: in alto, un tratto di sponda prima degli interventi dove sono evidenti i dissesti prodotti dall'azione delle maree e del moto ondoso. In basso, lo stesso tratto di riva a lavori ultimati





Isola di Poveglia: due immagini dell'isola prima e dopo i lavori

Isola del Lazzaretto Vecchio



Obiettivi specifici: recupero statico e architettonico dei fabbricati e delle murature perimetrali dell'isola

Interventi principali:. consolidamento delle fondazioni, restauro e ripristino delle strutture murarie e delle coperture degli edifici situati nella parte est dell'isola. Rinforzo e recupero delle murature lungo il bordo della parte ovest dell'isola. Predisposizione del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e delle acque "nere"

Intervento in corso

A lato: localizzazione dell'intervento

In basso: vista aerea dell'isola

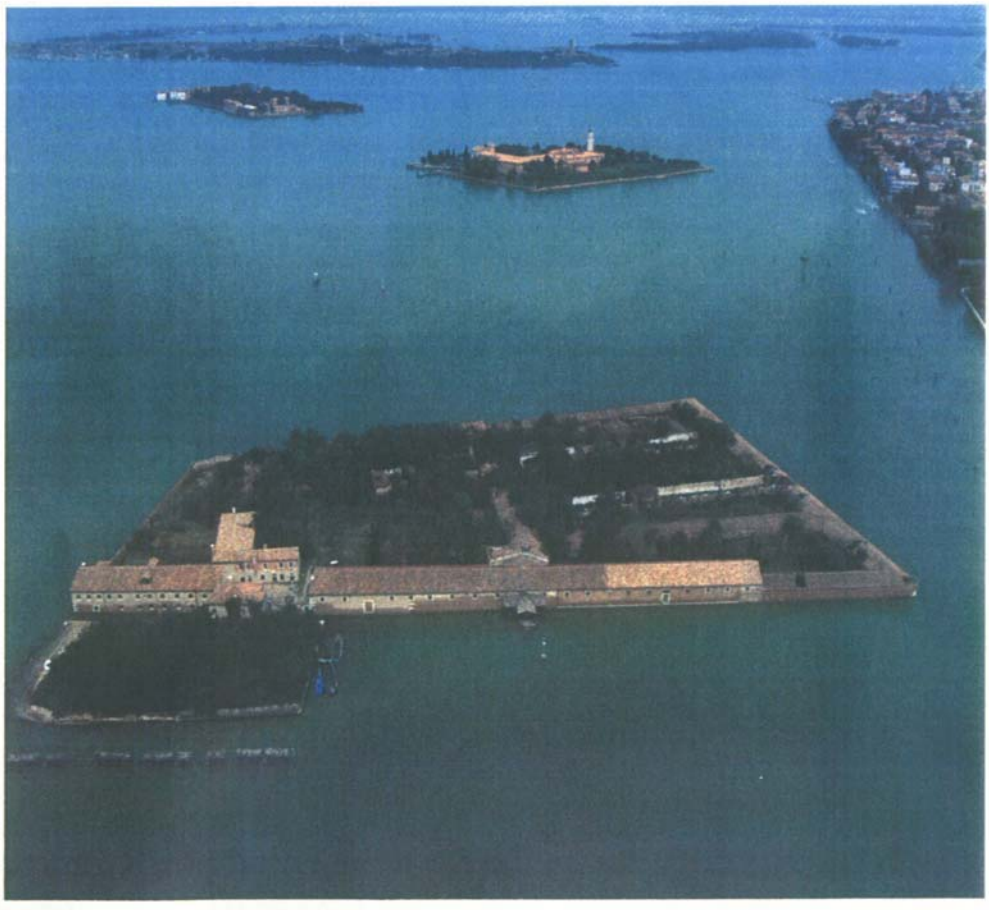



Fasi di lavoro per l'impianto di depurazione collegato al nuovo sistema fognari



Fase di sistemazione degli antichi fabbricati dell'isola

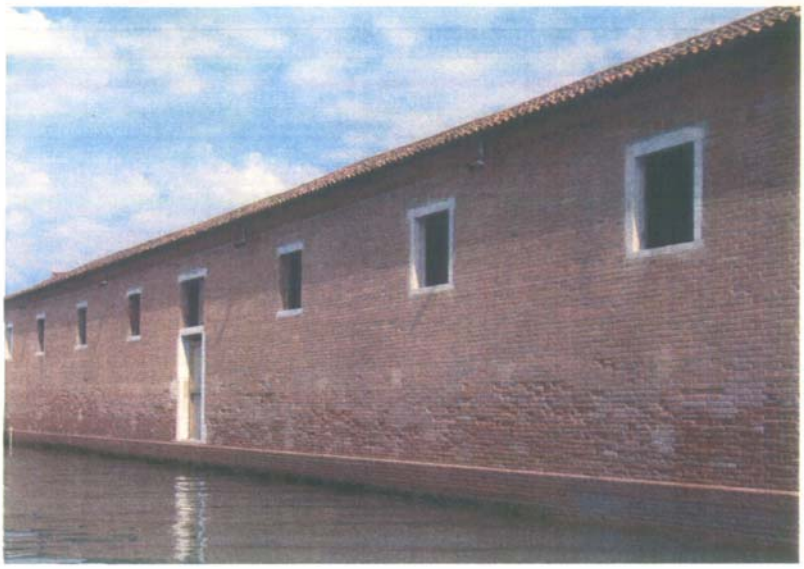



Sopra e *in basso*: sistemazione degli antichi fabbricati dell'Isola

PAGINA BIANCA

ARRESTO DEL DEGRADO DELL'ECOSISTEMA LAGUNARE



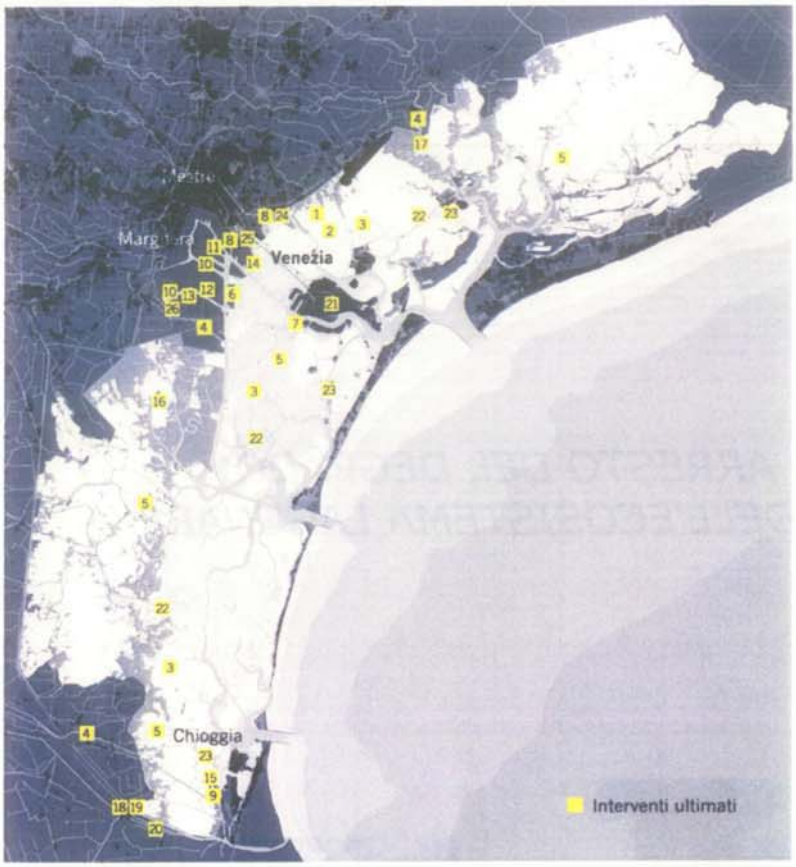
Venezia
Chioggia
Interventi ultimati


Venezia
Chioggia
Interventi in corso

Attività finanziate:

Attività ultimate

1. Verifica sperimentale di tecniche di arresto e di inversione del degrado della Laguna 1° e 2° fase ("Mosambiente")
2. Interventi sui fondali e rimozione algale nella zona di Tessera - Campalto
3. Attività di approfondimento del quadro conoscitivo di riferimento per gli interventi ambientali (progetto 2023)
4. Determinazione degli apporti inquinanti dal bacino scolante (progetto Drain)
5. Indagine della qualità dei sedimenti e mappatura dell'inquinamento dei fondali Lagunari
6. Messa in sicurezza e risanamento ambientale della macroisola delle Tresse (Laguna centrale)
7. Messa in sicurezza e risanamento ambientale della macroisola dell'ex inceneritore (Venezia)
8. Indagini per la caratterizzazione dei siti inquinati (Passo Campalto, Pili, Canale Industriale Nord, Brentella)
9. Messa in sicurezza della discarica di Val da Rio 1° stralcio (Chioggia)
10. Indagini integrative a supporto della progettazione degli interventi sulle sponde dei canali di Porto Marghera 1^ fase e 2^ fase
11. Asportazione selettiva di sedimenti inquinati dal Canale Industriale Nord di Porto Marghera - 1° stralcio (1^ e 2^ fase) (Laguna centrale)
12. Sistemazione della sponda nord del Canale Industriale Sud di Porto Marghera - in Accordo di Programma con Autorità Portuale 1°, 2° e 3° stralcio
13. Sistemazione della sponda del Canale Industriale sud 4° stralcio 1° e 2° lotto (area nuova Sirma e area 43 ettari)
14. Messa in sicurezza dell'area demaniale denominata Terzo Argine a Porto Marghera
15. Interventi di risanamento della discarica di borgo S. Giovanni in zona Val da Rio a Chioggia - completamento (Laguna sud)
16. Risanamento del fondale nel Lago dei Teneri (Laguna centrale)
17. Vivificazione della Palude di Cona (Laguna nord)
18. Indagini propedeutiche agli interventi di controllo degli apporti inquinanti provenienti dal bacino scolante: Botte delle Trezze (Laguna sud)
19. Realizzazione di opere di regolazione delle acque scolanti in Laguna attraverso la Botte delle Trezze (Laguna sud)
20. Intervento sperimentale di fitobiodepurazione nel tratto abbandonato del Canale Novissimo, realizzazione e monitoraggio (Laguna sud)
21. Monitoraggio della qualità dell'acqua dei canali del centro storico di Venezia - Sistema Waters 1^ fase e integrazione
22. Monitoraggio ambientale della Laguna di Venezia 1° stralcio, 2° stralcio e 3° stralcio 1^ fase
23. Interventi per l'arresto del degrado connessi alla proliferazione delle macroalghe in Laguna di Venezia - Campagne 1989/1999, 2000/2002, 2003/2004
24. Messa in sicurezza della macroisola di Passo Campalto 1^ fase (Laguna nord)
25. Ristrutturazione rive a S. Giuliano e piano di caratterizzazione dell'area
26. Caratterizzazione di una parte dell'area 43 ettari a Porto Marghera

Attività in corso

1. Monitoraggio ambientale della Laguna di Venezia 3°stralcio 2^fase e 4° stralcio
2. Monitoraggio Post Operam Passo Campalto (laguna centrale)
3. Indagini e Monitoraggi nelle aree lagunari tra Venezia e Porto Marghera 1^ fase (MAPVE1)
4. Indagini su sedimenti e acque dei canali a Porto Marghera e delle aree lagunari antistanti il SIN (ISAP)
5. Indagini a supporto delle progettazioni degli interventi a Porto Marghera nelle Macroisole Nord e Malcontenta (IPM3)
6. Asportazione selettiva di sedimenti inquinati dal Canale Industriale Nord a Porto Marghera 2° stralcio
7. Sistemazione della sponda nord del Canale Industriale Sud di Porto Marghera 3° stralcio
8. Sistemazione della sponda sud del Canale Industriale Ovest a Porto Marghera
9. Sistemazione della sponda est Canale Industriale Ovest a Porto Marghera
10. Sistemazione ambientale del Canale Brentella 1° e 2° stralcio
11. Sistemazione del Canale Vittorio Emanuele III sponda nord e darsene Agip e Petroven 1 e 2° stralcio
12. Sistemazione della sponda ovest dell'Isola dei Serbatoi Petroliferi
13. Sistemazione della sponda nord e sud dell'Isola dei Serbatoi Petroliferi 1° e 2° stralcio
14. Messa in sicurezza della Botte delle Trezze sottopassante il fiume Bacchiglione 1^ e 2^ fase in Laguna sud
15. Messa in sicurezza della Botte a Sifone sottopassante il fiume Brenta in località Conche di Codevigo
16. Monitoraggio fitobiodepurazione del canale Novissimo (laguna sud)
17. Sistemazione nodi idraulici e ricalibratura canale Piovego di Villabozza 1° stralcio
18. Sistemazione del Canale Lusore Bretelle sponda nord e sud
19. Sistemazione della sponda del Canale Industriale sud 4° stralcio sponda sud e darsena terminale 2° lotto fase C (sponda 43Ha)
20. Sistemazione della sponda del Canale Industriale sud 4° stralcio sponda sud e darsena terminale fase A(sponda ovest della darsena)
21. Sistemazione della sponda del Canale Industriale sud 4° stralcio sponda sud e darsena terminale 6° lotto fase A e B (sponda ex Abibes)
22. Sistemazione della sponda del Canale Industriale sud 4° stralcio sponda sud e darsena terminale 3° lotto Fase A di messa in sicurezza (tratto Pagnan - Colacem)
23. Sistemazione della sponda del Canale Industriale sud 4° stralcio sponda sud e darsena terminale lotto 7BFase A di messa in sicurezza (sponda sud tratto Fassa)
24. Sistemazione della sponda del Canale Industriale sud 4° stralcio sponda sud e darsena terminale 4° lotto Fase A di messa in sicurezza (sponda sud - tratto Syndial, Polimeri Europa)
25. Intervento di messa in sicurezza dell'area demaniale i Pili a Porto Marghera 1° stralcio di emergenza
26. Sistemazione darsena della Rana sponda nord e sud e Canale Industriale Ovest sponda sud
27. Sistemazione sponda ovest del canale industriale Ovest tratto sud 1° lotto tratto Transped ex S. Marco
28. Messa in sicurezza dell'area denominata Terzo Argine completamento 1^ stralcio
29. Messa in sicurezza di emergenza del canale S. Giuliano 2^ stralcio 1° lotto
30. Messa in sicurezza discarica Cà Rossa 1^ stralcio
31. Messa in sicurezza discarica di Campalto Tiro al Piattello

32. Installazione di un campo prova per la verifica di tiranti strutturali

33. Interventi di sistemazione della sponda ovest del Canale S. Leonardo – Marghera nel tratto tra il Canale Industriale Sud e Fusina

34. Interventi di sistemazione della sponda ovest del Canale S. Leonardo – Marghera nel tratto tra il Canale Industriale Ovest e Sud

Attività da avviare

1. Completamento delle caratterizzazioni dell'area 43 ettari, dell'area Lusore Brentelle, dei fondali del Brentella, dell'area dei Pili, dell'area "Terzo Argine", della Rana
2. Prosecuzione sistemazione sponde dei canali industriali: Canale S. Leonardo – Marghera sponda Ovest; Canale Industriale Sud sponda sud altri tratti; Canale Industriale Ovest sponda est e sponda ovest; Darsena della Rana e completamento Canale Industriale Ovest sponda sud; Canale Industriale Nord sponda nord; Opere PIF; Canal Salso e Canal Cieco; Sistemazione Isola delle Statue, Retromarginamenti delle Macroisole

Attività da finanziare:

1. Prosecuzione di monitoraggi ambientali e gestione sperimentale degli interventi già realizzati
2. Completamento interventi di messa in sicurezza delle discariche abbandonate situate all'interno della conterminazione Lagunare
3. Completamento asportazione selettiva di sedimenti inquinati dal Canale Industriale Nord a Porto Marghera
4. Asportazione selettiva dei sedimenti della Darsena della Rana e del canale Industriale Brentella a Porto Marghera
5. Prosecuzione interventi di sistemazione sponde delle macroisole a Porto Marghera
6. Realizzazione di un sistema di gestione delle terre inquinate risultanti da scavi, dragaggi e bonifiche eseguiti a Marghera e in Laguna
7. Prosecuzione degli interventi per l'arresto del degrado connesso alla proliferazione delle macroalghe in Laguna di Venezia
8. Bonifica anche mediante sopralzo di alcune aree di basso fondale inquinate poste tra Venezia e Porto Marghera
9. Sperimentazione di interventi di indirizzo dei processi autodepurativi dei bassifondali
10. Estensione degli interventi di indirizzo dei processi autodepurativi dei bassifondali
11. Prosecuzione messa in sicurezza della Botte delle Trezze sottopassante il fiume Bacchiglione e la Botte a sifone sottopassante il fiume Brenta
12. Prosecuzione ed estensione interventi di sistemazione nodi idraulici

Interventi di sistemazione delle sponde dei canali portuali dell'area di interesse nazionale di Venezia – Porto Marghera. Opere ultimate, in corso e di prossimo avvio.

	Macroisola	Intervento del Magistrato alle Acque	Tratto	Lunghezza in metri	Stato avanzamento al 31.12.2006
1	Tresse	Contermhiaatione Isola delle Tresse lato canali	H2	1.730	LAVORI ULTIMATI
2	Tresse	Contermhiaatione Isola delle Tresse lato laguna	I1+I2+I3	2.080	LAVORI ULTIMATI
3	Passo Campalto	Messa in sicurezza del sito "Passo Campalto"	S+N1+O2	2.640	LAVORI ULTIMATI
5	S. Giuliano	Penisola di S. Giuliano 1° stralcio sponda est	O1+T	1.650	LAVORI ULTIMATI
4	Nuovo Petrolchimico	Canale Industriale Sud sponda nord 1°, 2° e 3° stralcio	E1	3.045	LAVORI ULTIMATI
6	Fusina	Canale Industriale Sud 4° stralcio - sponda sud e darsena terminale, 1° lotto - Nuova Sirma Fase A	E2/1	290	LAVORI ULTIMATI
7	Fusina	Canale Industriale Sud 4° stralcio - sponda sud e darsena terminale, 2° lotto - Area 43 ha - Fase A (sponda sud)	E2/3a	660	LAVORI ULTIMATI
8	Raffinerie	Sponda lagunare III° argine - 1° stralcio	L1	1.100	LAVORI ULTIMATI
9	Raffinerie	Sponda lagunare III° argine - 1° stralcio - completamento	L1	-	LAVORI IN CORSO
10	Raffinerie	Sponda lagunare area "Pili" - 1° stralcio di emergenza	L2	1.200	LAVORI IN CORSO
11	Raffinerie	Canale S. Giuliano, sponda sud - 2° stralcio - 1^ fase di messa in sicurezza	P2	1.940	LAVORI IN CORSO
12	Nuovo Petrolchimico	Canale Industriale Ovest sponda sud - 1° lotto	D4/1	1.570	LAVORI IN CORSO
13	Portuale	Canale Industriale Ovest sponda est - 1° stralcio	D2/1	820	LAVORI IN CORSO
14	Raffinerie/ 1^ Zona Industriale	Canale Industriale Brentella - 1^ fase sistemazione sponde, 1° e 2° lotto	G1/1+G1/2+G2/1+G2 /2+ G2/3	2.920	LAVORI IN CORSO
15	1^ Zona Industriale	Canale Industriale Nord sistemazione sponda nord, 1° lotto	A2/1	350	LAVORI IN CORSO
16	Raffinerie	Canale Vittorio Emanuele III sistemazione sponda nord, 1° stralcio	F1/1	180	LAVORI IN CORSO
17	Raffinerie	Canale Vittorio Emanuele III sponda nord - completamento - 1° stralcio	F1/2	380	LAVORI IN CORSO
18	Raffinerie	Canale Vittorio Emanuele III sponda nord - darsena Agip e Petroven - 2° stralcio	F2 + F3	1.100	LAVORI IN CORSO
19	Vecchio e Nuovo Petrolchimico	Canale Lusore Brentelle, sponda nord e sponda sud	Z1/1+Z1/2	1.910	LAVORI IN CORSO
20	Vecchio e Nuovo Petrolchimico	Darsena della Rana, sponda nord e sponda sud	D5/1+D5/2a	1.200	LAVORI IN CORSO
21	Vecchio Petrolchimico	Canale Industriale Ovest, sponda ovest - tratto sud - 1° lotto Tratto Transped ex S. Marco)	D3/1a	250	LAVORI IN CORSO
22	Serbatoi	Isola dei serbatoi petroliferi (sponda ovest)	H1	890	LAVORI IN CORSO
23	Serbatoi	Isola dei serbatoi petroliferi, sponda nord - 1° stralcio e 2° stralcio	F4	1.110	LAVORI IN CORSO
24	Serbatoi	Isola dei serbatoi petroliferi, sponda sud - 1° stralcio e 2° stralcio	K	1.000	LAVORI IN CORSO
25	Nuovo Petrolchimico	Canale S. Leonardo-Marghera (sponda ovest, tra i canali Industriali Ovest e Sud) - 1° stralcio	H3/1+H3/2+H3/3 +H3/4	1.480	LAVORI IN CORSO
26	Fusina	Canale S. Leonardo-Marghera (sponda ovest, tra il Canale Industriale Sud e Fusina) - 1° stralcio	H4/1	410	LAVORI IN CORSO
27	Fusina	Canale Industriale Sud 4° stralcio - sponda sud e darsena terminale, 2° lotto - Area 43 ha - Fase C (sponda sud)	E2/3a	-	LAVORI IN CORSO
28	Fusina	Canale Industriale Sud 4° stralcio - sponda sud e darsena terminale, 3° lotto - Fase A di messa in sicurezza (sponda sud della darsena - tratto Pagnan - Colacem)	E2/3b	320	LAVORI IN CORSO
29	Fusina	Canale Industriale Sud 4° stralcio - sponda sud e darsena terminale, lotto 7B - Fase A di messa in sicurezza (sponda sud - tratto Fassa)	E2/6	300	LAVORI IN CORSO
30	Fusina	Canale Industriale Sud 4° stralcio - sponda sud e darsena terminale, lotto 4 - Fase A di messa in sicurezza (sponda sud - tratto Syndial, Polimeri Europa)	E2/7	230	LAVORI IN CORSO
31	Malcontenta	Canale Industriale Sud 4° stralcio - sponda sud e darsena terminale, 5° lotto (sponda ovest darsena) - Fase A di messa in sicurezza	E2/2	420	LAVORI IN CORSO
32	Fusina	Canale Industriale Sud 4° stralcio - sponda sud e darsena terminale, lotto 6 (tratto Abibes) - Fase A di messa in sicurezza	E2/4a	285	LAVORI IN CORSO
33	Portuale	Canale Industriale Ovest sponda est - 2° stralcio	D2/2	1.210	LAVORI DI PROSSIMO AVVIO
34	Fusina	Canale Industriale Sud 4° stralcio - sponda sud e darsena terminale, lotto 6 (tratto Abibes) - Completamento	E2/4a	285	LAVORI DI PROSSIMO AVVIO
	TOTALE			34.670	

Sponde lungo i canali industriali di Porto Marghera oggetto di intervento

I colori servono a distinguere i tratti di marginamento oggetto di intervento

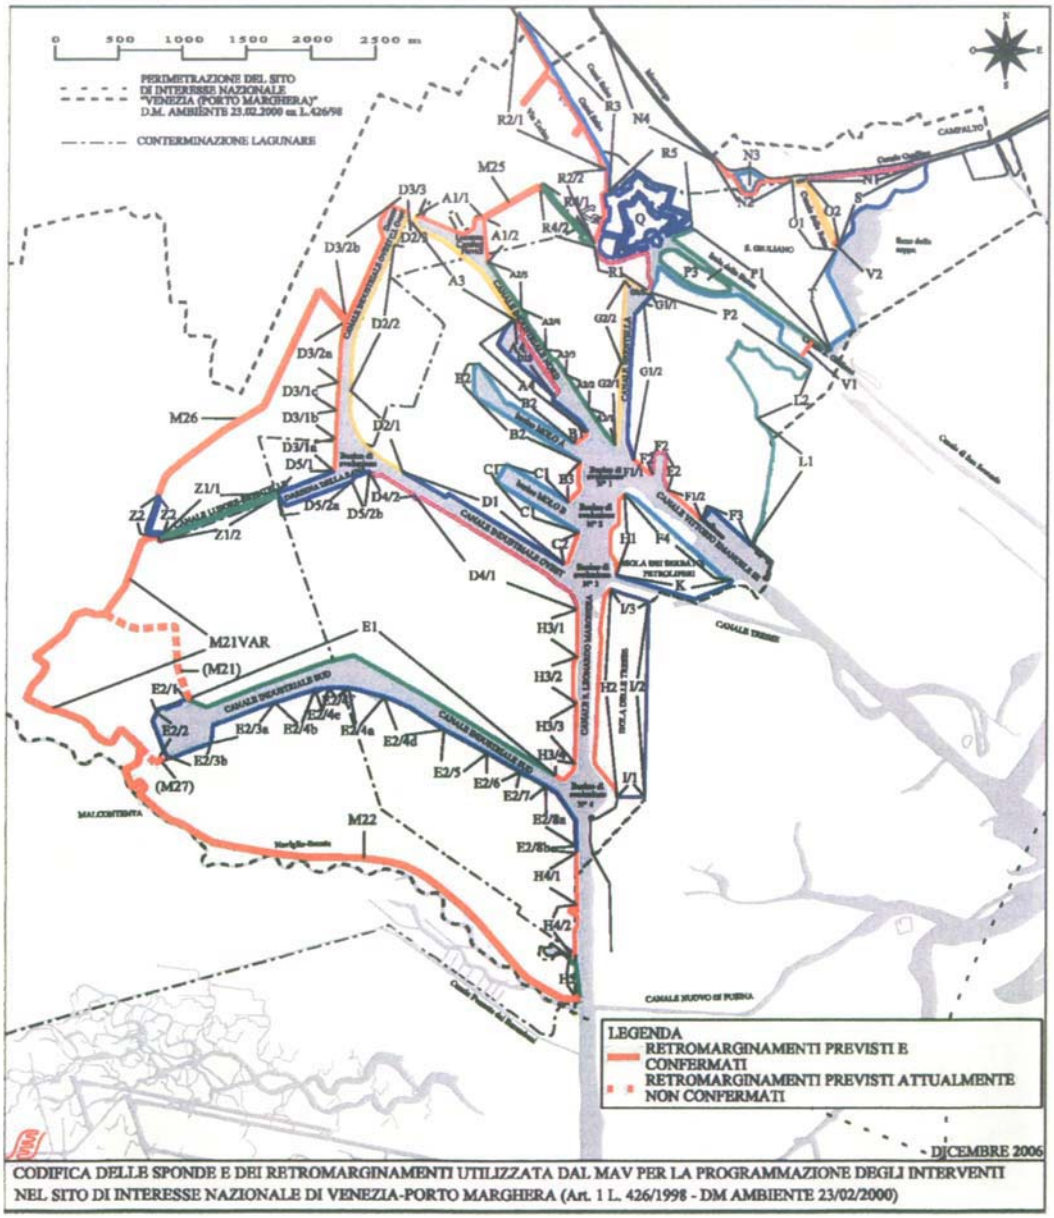

Canale Industriale Brentella 1° stralcio

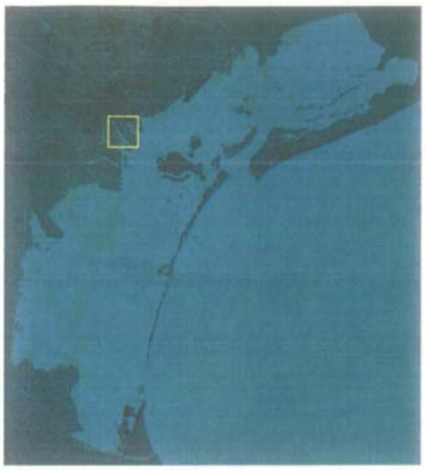

Obiettivi specifici: bloccare la diffusione in laguna degli inquinanti contenuti nel suolo, contrastando l'erosione delle sponde

Interventi principali: lavori di marginamento mediante palancolato metallico strutturale a tenuta idraulica (per contrastare l'erosione delle sponde e bloccare il rilascio di inquinanti dai terreni verso il canale); predisposizione del sistema di collettamento per le acque meteoriche e per quelle di falda che percolerebbero filtrando dal terreno verso il canale

Intervento in corso

A lato: localizzazione dell'intervento



Vista aerea del canale Brentella durante i lavori



Un tratto di marginamento completato



Marginamento con tiranti in fase di ultimazione e tura provvisionale



Estrazione della palancola di tura provvisionale



Fase di estrazione della palancola di tura provvisionale



Fase di realizzazione dei tiranti



Fase di realizzazione dei tiranti sul cordolo di marginamento

Bonifica con misure di sicurezza nell'area demaniale dei "Pili" a Porto Marghera

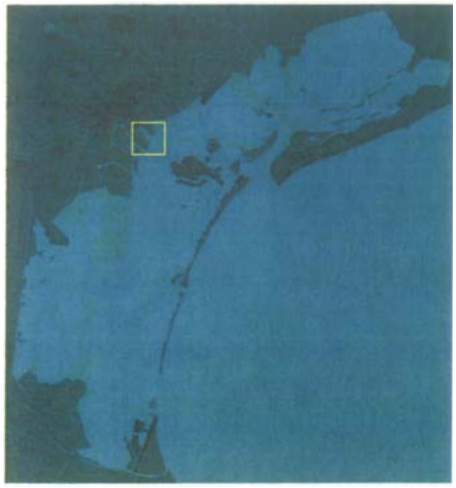

Obiettivi specifici: ridurre il più possibile ogni via di contatto della discarica con le acque lagunari

Interventi principali: realizzazione di un marginamento definitivo costituito da un argine (antistante il deposito di rifiuti) predisposto sul fondale bonificato mediante asportazione dei materiali dalla fascia a ridosso delle sponde (l'argine comprende un palancolato metallico strutturale e un diaframma plastico con funzione di barriera impermeabile per il contenimento degli inquinanti); refluimento dei sedimenti dragati in "riserva temporanea" all'interno di contenitori in geotessuto ("bacini di accumulo"; predisposizione del sistema di drenaggio e di un impianto di trattamento delle acque di sgrondo

Intervento in corso

A lato: localizzazione dell'intervento



Vista aerea dell'area di cantiere





In alto vista aerea del bacino di accumulo n. 1

In basso vista aerea del bacino di equalizzazione per la disidratazione del materiale dragato



Impermeabilizzazione del bacino di accumulo n. 1 con telo HDPE e geotessuto



Ultimazione della realizzazione del bacino di accumulo n. 2. Nella foto piccola viabilità posta sull'argine del bacino di accumulo



Viabilità sull'argine del bacino n. 2



Rete di drenaggio dei geotubi nel bacino di accumulo n. 2



Rete di raccolta delle acque di drenaggio dei bacini di accumulo



Rete idraulica antitorbidità all'interno della quale verranno dragati i materiali dalla fascia a ridosso delle sponde

Canale S. Giuliano sponda sud 2° stralcio



Obiettivi specifici: impedire il trasferimento dell'inquinamento proveniente dagli imbonimenti, dalle falde e dai suoli inquinati verso i canali in comunicazione con l'ambiente lagunare

Interventi principali: realizzazione di un nuovo marginamento con struttura portante costituita da palancolato metallico a tenuta idraulica, predisposizione del sistema di drenaggio e raccolta delle acque di falda

Intervento in corso

A lato: localizzazione dell'intervento



Tratto di riva interessata dai lavori

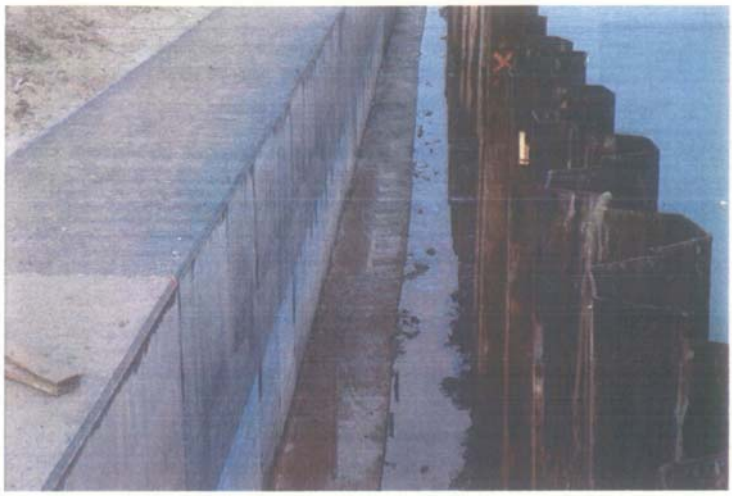

Tura provvisionale e marginamento completato



Armatura in ferro del cordolo sommitale



Predisposizione per la realizzazione dei tiranti



Tura provvisionale, palancolato strutturale e predisposizione tiranti



Palancolato strutturale e cordolo sommitale completato



Pista di transito e palancolato strutturale

PAGINA BIANCA

ALLONTANAMENTO DEL TRAFFICO PETROLIFERO DALLA LAGUNA

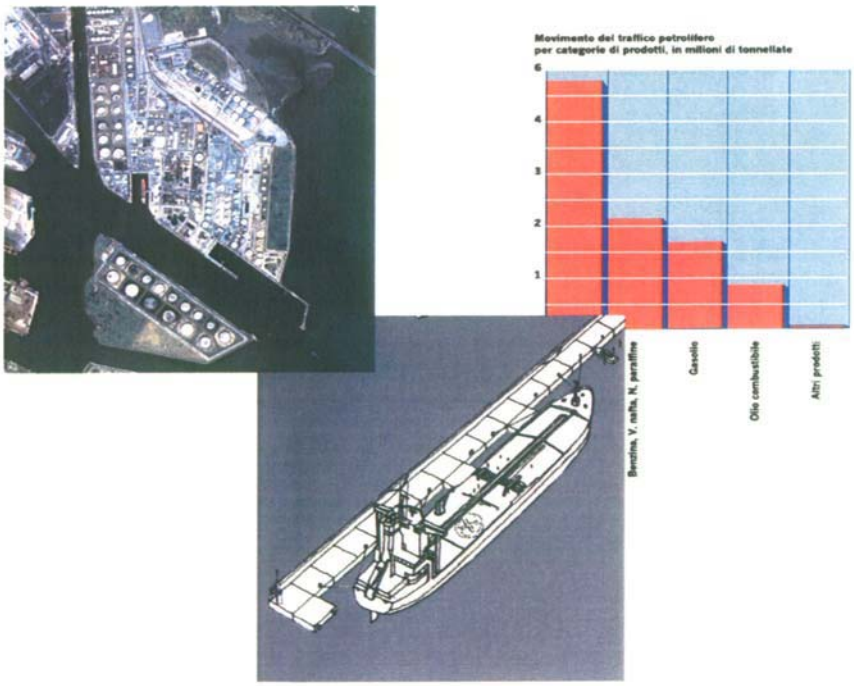

Attività finanziate:

Attività ultimate

1. Studi propedeutici al progetto operativo
2. Progetto operativo per la sostituzione del traffico petrolifero in laguna
3. Progetto preliminare fattibilità di un approdo off shore in alto Adriatico
4. Esame dei provvedimenti per il contenimento di spandimenti accidentali in laguna
5. Analisi costi - benefici e V.I.A. della realizzazione di un approdo off shore in Alto Adriatico

Attività da avviare

1. Intervento sperimentale per il contenimento di spandimenti accidentali lungo il canale Malamocco - Marghera
2. Progetto definitivo di un primo intervento pilota per il contenimento di spandimenti accidentali

Attività da finanziare:

1. Panne di contenimento lungo il Canale dei Petroli (presidi per protezione della laguna da sversamenti accidentali da natanti)
2. Attività preliminari alla progettazione esecutiva e alla realizzazione di un approdo off shore in Alto Adriatico

AUSILII LUMINOSI ALLA NAVIGAZIONE







Attività finanziate:

Attività ultimate

1. Analisi della convenienza della realizzazione del traffico portuale di notte e con nebbia
2. Realizzazione sistema di illuminazione e radar lungo il Canale Malamocco - Marghera

Attività da finanziare:

1. Intervento di adeguamento dell'impianto

Ausilii alla navigazione lungo il canale Malamocco / Marghera



Obiettivi specifici: ridurre i rischi derivanti dal trasporto in laguna di prodotti petroliferi e chimici; facilitare la navigazione di notte e con la nebbia

Interventi principali: installazione di segnali luminosi, riflettori radar e "fog detectors" lungo il canale tra la bocca di Malamocco e la zona industriale (15 km)

Intervento ultimato

A lato: localizzazione dell'intervento

In basso: un tratto del canale Malamocco/Marghera con il nuovo sistema di illuminazione



Realizzazione di un approdo off – shore in Alto Adriatico

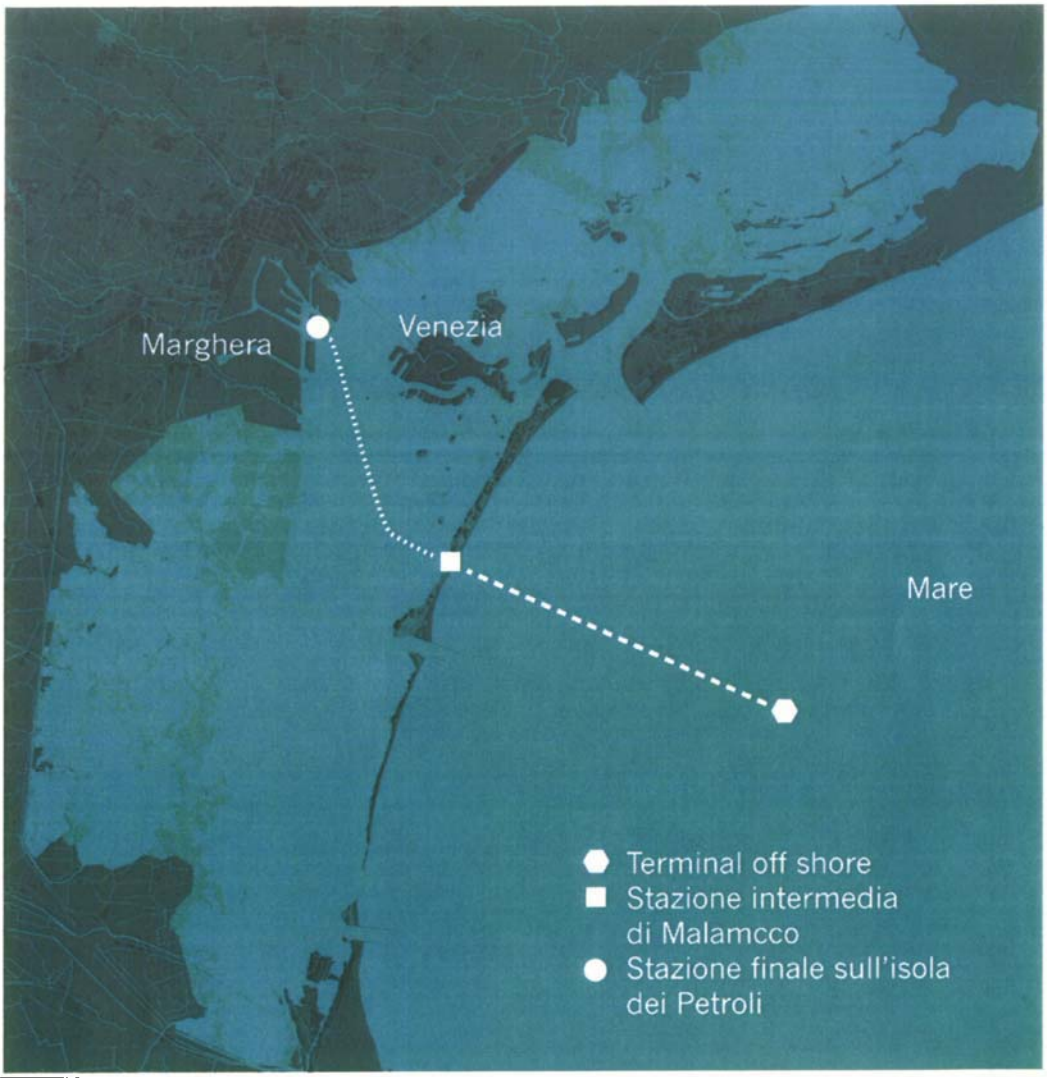

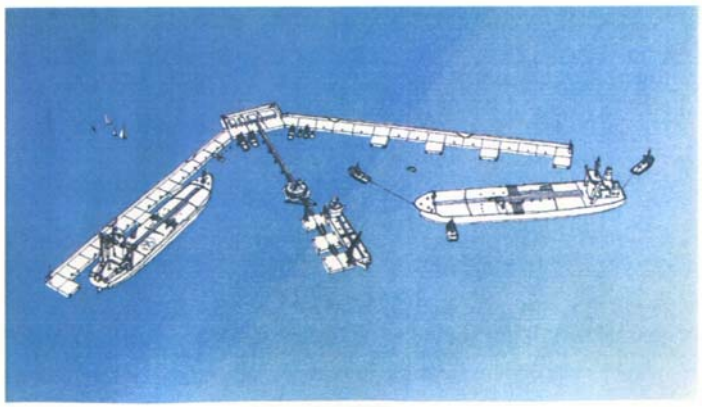

In alto: localizzazione dell'intervento

A lato: vista dell'approdo off – shore

APERTURA DELLE VALLI DA PESCA



Attività finanziate:

Attività ultimate

1. Studi propedeutici alla progettazione dell'intervento sperimentale
2. Progetto preliminare e di massima
3. Intervento sperimentale di apertura di Valle Figheri e monitoraggio

Valle Figheri – intervento sperimentale



Obiettivi specifici: migliorare la qualità delle acque in aree periferiche della laguna in cui circolazione e ricambi idrici avvengono con difficoltà; monitorare gli effetti di questo tipo di opere attraverso un intervento pilota in una valle scelta come campione

Interventi principali: realizzazione di un argine di terre (2 km) per dividere la valle in due parti, di cui una "riaperta"; realizzazione di un manufatto per regolare il flusso della marea tra valle aperta e laguna e di due manufatti tra valle aperta e valle chiusa

Intervento ultimato

A lato: localizzazione dell'intervento

In basso: il manufatto di regolazione tra valle aperta e laguna



PAGINA BIANCA

SERVIZIO INFORMATIVO



Attività finanziate:

Attività ultimate

n. 96 perizie

Attività in corso

n. 18 perizie

Attività da avviare

n. 7 perizie

Attività da finanziare:

Almeno n. 60 stralci delle varie sezioni di lavoro per garantire continuità alle attività dal 2007 fino al 2015

Attività del Servizio Informativo

Banche dati territoriali e sistemi di consultazione

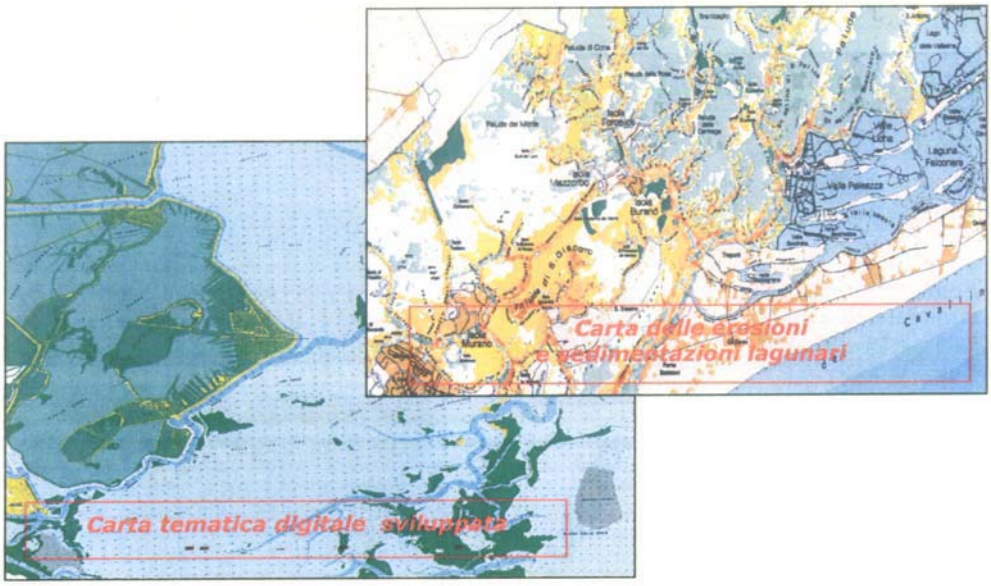

:

Acquisizione e gestione attrezzature informatiche e di rete

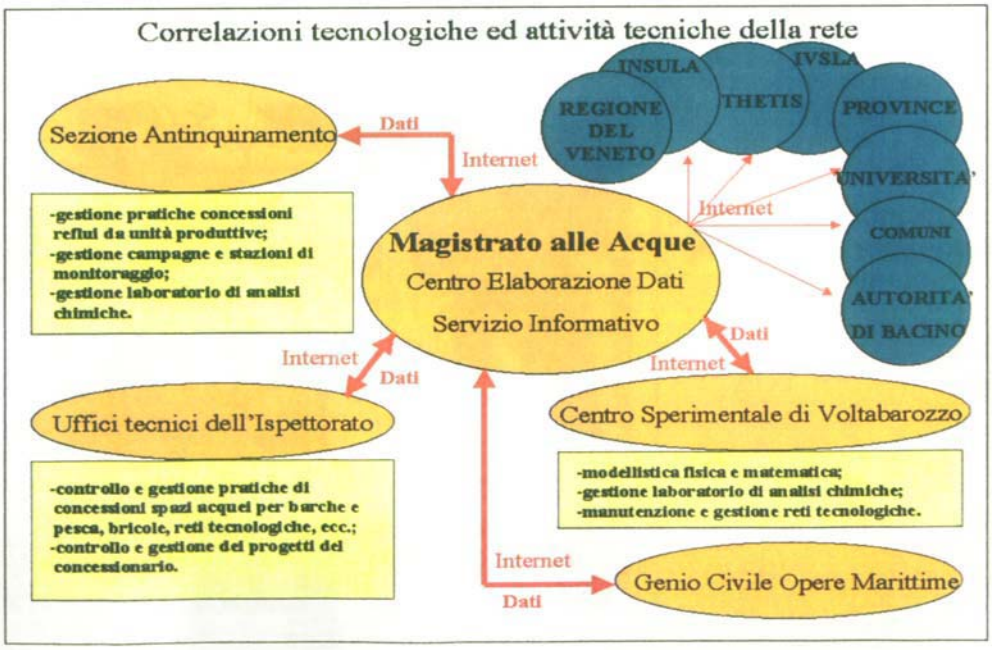

Rilievi della morfologia terrestre e lagunare









Monitoraggi ambientali in tempo reale ed indagini stagionali

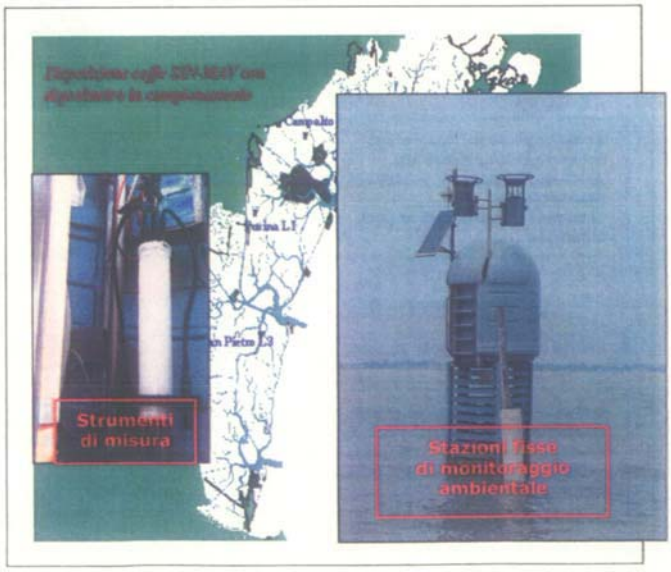

Laboratorio di analisi chimiche di Venezia e Voltabarozzo



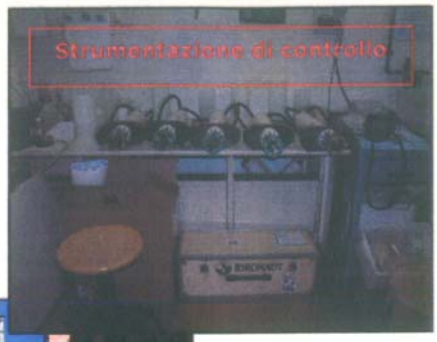









Gestione dell'informazione tecnica e della diffusione dei dati



Telerilevamento satellitare ed aereo

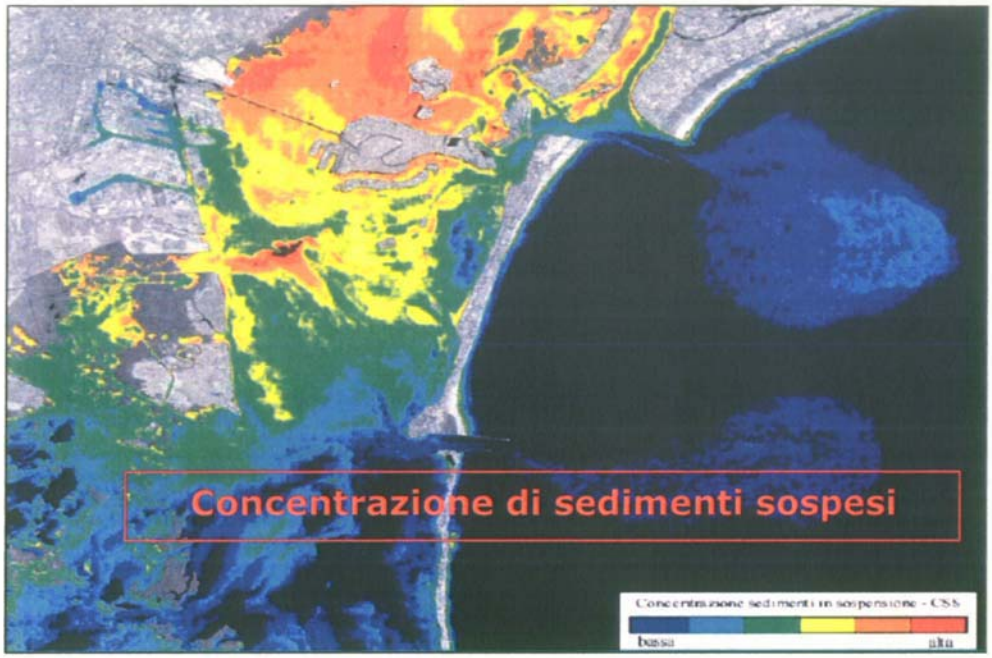



PAGINA BIANCA

Documento C ***Regione del Veneto***

Stato di attuazione degli interventi finanziati con fondi della legge speciale per Venezia – Aggiornamento al 31 dicembre 2006

PAGINA BIANCA

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

26 APR. 2007 | Protocollo N° 235464/5700 | Allegati N°

Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia.

Al Presidente
del Magistrato alle Acque
Palazzo X Savi
30125 Venezia

Con riferimento a quanto richiesto con nota n. 262/GAB in data 04 aprile 2007, concernente l'oggetto, si inviano la relazione illustrativa ed i quadri analitici, suddivisi per Leggi e per Soggetti Attuatori ed aggiornati al 31 dicembre 2006, sullo stato di attuazione delle attività svolte dalla Regione Veneto a fronte dei finanziamenti ottenuti con la legislazione speciale per Venezia.

L'occasione è gradita per inviare distinti saluti.

Il Segretario Regionale
all'Ambiente e Territorio
Ing. Roberto Casarin

PAGINA BIANCA

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

SEGRETERIA REGIONALE ALL'AMBIENTE E TERRITORIO

DIREZIONE REGIONALE PROGETTO VENEZIA

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

ANNO 2005

RELAZIONE AL PARLAMENTO

PAGINA BIANCA

LEGGE SPECIALE PER VENEZIA
STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Quadro normativo e di programmazione

I fondi messi a disposizione dalla Legge speciale per Venezia dal 1984 ad oggi hanno consentito di avviare concretamente una radicale azione di disinquinamento e risanamento della laguna.

Tenuto conto delle competenze attribuite alla Regione Veneto dalla vigente legislazione, la quasi totalità dei fondi stanziati dalla stessa Regione è stata destinata ad opere mirate al disinquinamento delle acque.

Inizialmente, fino al 1991, i finanziamenti furono destinati alla realizzazione di fognature e impianti di depurazione delle acque negli otto comuni della gronda lagunare, secondo quanto stabilito dalle Leggi n. 171/73 e n. 798/84. Successivamente, dal 1991 in poi, con l'entrata in vigore della Legge n. 360/91, i finanziamenti furono estesi anche ad opere finalizzate al risanamento ambientale in senso lato, cioè volte a limitare l'effetto dell'inquinamento diffuso proveniente dall'agricoltura e dalla zootecnia, alla razionalizzazione del sistema idraulico della bonifica, al risanamento dei suoli contaminati, agli impianti di compostaggio ed al trattamento dei rifiuti solidi urbani prodotti nel bacino scolante.

Una parte dei fondi stanziati della Legge Speciale sono stati infine destinati ad opere acquedottistiche e ospedaliere, secondo quanto previsto dalla Legge n. 798/84.

Nell'ambito di applicazione della Legge Speciale per Venezia, la Regione, con apposite Leggi regionali, ha introdotto norme tese a regolamentare le relative attività di competenza.

La Legge regionale n. 49/74 ha normato le attività fino al 1990, quando, con l'entrata in vigore della Legge regionale n. 17/90, è stato radicalmente modificato l'assetto normativo. La Legge regionale n. 17/90 è stata successivamente modificata con la Legge regionale n. 8/92 e con la Legge regionale n. 35/93.

La Legge regionale n. 17/90 stabilisce che il disinquinamento della laguna di Venezia deve essere definito da uno strumento programmatorio di carattere generale chiamato "Piano Direttore".

Il Piano Direttore 2000

La Regione si è dotata di un Piano Direttore per il disinquinamento della Laguna sin dal 1979. Detto piano è servito per coordinare i primi interventi di disinquinamento.

Nel 1991, in ottemperanza alla citata Legge regionale n. 17/90, è stato predisposto e approvato dal Consiglio Regionale il "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia".

Detto Piano affronta le problematiche dell'inquinamento lagunare nella loro complessità e tiene conto delle varie fonti che lo possono originare. Fornisce quindi gli indirizzi da seguire per individuare le azioni più efficaci e le opere più idonee a conseguire i risultati attesi.

Successivamente, nel 1994, la Giunta Regionale, nell'intento di individuare azioni specifiche per limitare il carico di sostanze nutrienti immesso in laguna e controllare quindi il fenomeno dell'eutrofizzazione, ha predisposto ed adottato un documento denominato "Piano pluriennale degli interventi in attuazione del Piano per il disinquinamento della laguna di Venezia", al fine di meglio individuare gli interventi da finanziare con i fondi messi a disposizione dalla Legge n. 139/92.

In data 1 marzo 2000, infine, il Consiglio Regionale ha approvato un aggiornamento al Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia, in ottemperanza all'incarico affidato alla Regione dal Ministro dell'Ambiente con l'ordinanza n. 4498 dell'1.10.1996. Tale aggiornamento è denominato "Piano Direttore 2000".

Il *"Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento del bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia"* prevede:

a) per gli interventi finalizzati all'abbattimento dell'inquinamento civile e urbano diffuso, di operare principalmente attraverso il miglioramento e il completamento delle strutture di raccolta e depurazione degli scarichi fognari civili e delle acque di pioggia;
b) per gli interventi finalizzati alla razionalizzazione dei prelievi dai corsi d'acqua del bacino scolante o da pozzi della relativa zona di ricarica diretta, di garantire una maggiore portata e favorire, in sinergia con gli interventi di naturalizzazione, i processi di autodepurazione naturale dei corsi d'acqua stessi. Questi obiettivi rientrano nella prospettiva del mantenimento del minimo deflusso vitale in tutta la rete idrografica del bacino scolante.
c) per gli interventi finalizzati al settore agricolo e zootecnico, di ridurre l'apporto di macronutrienti (azoto e fosforo) nella Laguna di Venezia, attraverso il miglioramento della qualità delle acque superficiali che scolano nel sistema idrografico che sfocia in Laguna, alimentato sia dalle acque di ruscellamento e percolazione dai terreni coltivati, sia dalla ricarica dell'acquifero indifferenziato che si trova nella parte nord-occidentale del bacino, intervenendo anche con azioni di prevenzione e di riuso in agricoltura dei letami e dei liquami zootecnici;
d) per gli interventi finalizzati al settore territorio, di operare principalmente attraverso l'aumento della capacità di autodepurazione dei corsi d'acqua del Bacino Scolante per ridurre l'inquinamento residuo riversato nella Laguna;
e) per la verifica ed il monitoraggio delle azioni del Piano, di destinare cospicue quote delle risorse finanziarie ad approfondimenti e sperimentazioni per una corretta valutazione sia dei carichi inquinanti residui sia del raggiungimento degli obiettivi generali di risanamento e di riequilibrio del sistema lagunare.

La strategia degli interventi

La strategia di disinquinamento adottata dalla Regione del Veneto nel "Piano Direttore 2000" prevede di intervenire sull'inquinamento generato nel Bacino Scolante in tre momenti diversi.

1° PREVENZIONE
Il primo passo è quello d'intervenire su tutte le possibili fonti inquinanti con azioni di prevenzione, che mirano ad abbattere all'origine l'inquinamento.

2° RIDUZIONE
Sull'inquinamento che sfugge alle azioni di prevenzione si interviene, dove possibile, attraverso azioni di riduzione. Si tratta principalmente della depurazione delle acque di scarico civili e industriali prima di immetterle nei corsi d'acqua del Bacino Scolante.

3° AUTODEPURAZIONE e/o DIVERSIONE
L'inquinamento residuo, che raggiunge i corsi d'acqua, può subire un ulteriore abbattimento grazie alla loro naturale capacità di autodepurazione, che può agire per l'intero percorso sino allo sbocco nella Laguna.
Il "Piano Direttore 2000" prevede di intervenire sui corsi d'acqua per aumentare la capacità di autodepurazione.
Un'ultima possibilità di intervento è data dalla diversione, cioè dall'allontanamento, parziale e temporaneo, dalla Laguna delle acque dolci inquinate.

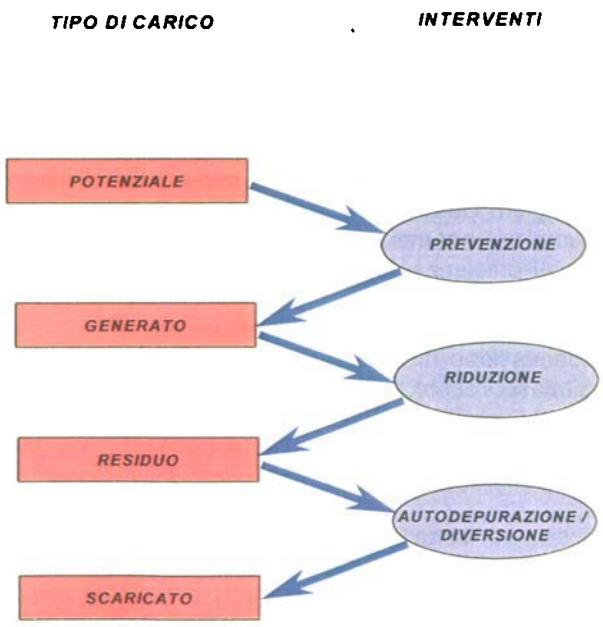

I settori di intervento sono:

Settore Fognatura e Depurazione

Gli interventi nella rete fognaria mirano alla riduzione degli scarichi diretti in Laguna, attraverso il completamento dei sistemi fognari, con la separazione della fognatura delle acque nere dalle acque di prima pioggia, la eliminazione delle acque parassite e la costruzione di vasche di prima pioggia sull'intero territorio del bacino scolante.
Gli interventi puntano, da una parte, allo sviluppo della rete di raccolta minore (sviluppo dei "pettini"), laddove già esistono le principali linee di collettamento, e dall'altra alla realizzazione di nuove linee principali dove esistano zone convenientemente servibili e non ancora raggiunte da pubblica fognatura. L'obiettivo è quello di estendere gli allacciamenti di fognatura all'84% degli abitanti residenti all'interno del bacino scolante (percentuale fissata sulla base di un'analisi costi-benefici, a seguito di una capillare ricognizione del reale stato di consistenza delle reti di fognatura, dello stato degli allacciamenti e del tipo di urbanizzazione esistente).

Gli interventi sugli impianti di depurazione si possono essenzialmente suddividere in tre categorie:

- interventi di affinamento dei processi di depurazione e di adeguamento della qualità degli scarichi ai limiti legislativi;
- interventi di incremento della potenzialità dell'impianto in termini di abitanti equivalenti;
- collettamento di impianti minori ad impianti più grandi, per una migliore economia di gestione e per la diversione dello scarico in corpi ricettori sfocianti all'esterno dalla Laguna.

Settore Acquedotti

Questa tipologia di interventi è finalizzata alla razionalizzazione dei prelievi dai corsi d'acqua del bacino scolante o da pozzi della relativa zona di ricarica diretta, al fine di garantire sia una maggiore portata dei corsi d'acqua e il conseguente incremento dei processi di autodepurazione naturale, sia la riduzione dei consumi idropotabili finalizzata ad un miglioramento dell'efficienza degli impianti di depurazione. Le principali azioni sono mirate:

- alla realizzazione di nuove linee di distribuzione;
- alla interconnessione di sistemi di produzione ad uso idropotabile del Veneto centrale e del basso Veneto, al fine di ridurre gli attingimenti di punta e riequilibrare, nel lungo periodo, i prelievi nel loro complesso. In questo modo verranno rifornite con acqua di buona qualità le aree oggi sfavorite del basso Veneto;
- alla trasformazione del sistema acquedottistico veneto da tipo reticolare, ad anello chiuso;
- alla gestione, su base pluriennale, delle risorse idriche, anche mediante monitoraggio e riuso di acque depurate all'interno dei cicli industriali e a scopo irriguo.

All'interno della programmazione regionale rientra il Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto, previsto dall'art. 14 della L.R. 5/1998, che individua gli schemi di massima delle principali strutture acquedottistiche del Veneto, nonché le fonti da salvaguardare per risorse idriche ad uso potabile. La Legge Speciale per Venezia interviene finanziando specificamente lo Schema del Veneto Centrale che alimenterà con acque di buona qualità i territori della provincia di Rovigo, della Bassa Padovana e delle aree limitrofe della provincia di Venezia.

Settore Territorio

Questo settore rappresenta, in termini di finanziamenti ripartiti, il secondo grande settore di intervento a favore del disinquinamento della Laguna, dopo quello di fognatura e depurazione. Gli interventi finanziati hanno come obiettivo primario l'aumento della capacità autodepurativa dei corsi d'acqua del Bacino Scolante, in modo da contribuire alla riduzione dell'inquinamento veicolato dalla rete idrografica scolante in Laguna. Vale, infatti, il principio secondo il quale quanto più a lungo l'acqua inquinata risiede in un sistema naturale biologicamente attivo, tanto più i processi naturali di assimilazione dei nutrienti e di abbattimento dei microinquinanti possono agire e favorire la depurazione di quell'acqua.

Settore Agricoltura e Zootecnia

Le azioni nel settore agricolo e zootecnico rispondono all'esigenza di ridurre l'apporto di macronutrienti (azoto e fosforo) nella Laguna di Venezia, attraverso il miglioramento della qualità delle acque superficiali che scolano nel sistema idrografico sfociante in Laguna.

Tipici del settore sono i carichi diffusi, cioè quelli presenti nelle acque di pioggia, o di irrigazione, drenate dal terreno, che scolano dalle superfici coltivate verso i corsi d'acqua, portando con sé parte delle sostanze nutrienti fornite alle colture con i fertilizzanti chimici, con le deiezioni animali (liquami), con la letamazione e a seguito della dispersione di sostanze microinquinanti contenute nei fitofarmaci.

I carichi di sostanze nutrienti provenienti dal settore agricolo e zootecnico dipendono soprattutto da alcune componenti, come la tipologia delle colture, i metodi di irrigazione, il tipo di fertilizzazione, le pratiche agricole adottate, il rapporto tra carico di bestiame e dimensione dei fondi e le modalità di spargimento dei liquami zootecnici sui terreni. Le attività di questo settore si articolano in cinque sottosettori:

- Incentivi all'agricoltura compatibile nell'area del Bacino Scolante;
- Realizzazione di fasce tampone e messa a riposo colturale con finalità ambientali nel Bacino Scolante;
- Gestione delle pratiche irrigue: razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica nel Bacino Scolante;
- Gestione dei reflui zootecnici e interventi strutturali in zootecnia a tutela dell'ambiente nel Bacino Scolante;
- Gestione delle pratiche agricole: incentivazione all'innovazione ambientale eco compatibile in agricoltura nel Bacino Scolante.

Settore Bonifica siti inquinati.

Le azioni finanziano interventi, nel territorio del Bacino Scolante, volti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti nel suolo a causa di siti inquinati, ex-discariche, depositi abusivi etc. La destinazione dei fondi si specifica in due distinti settori territoriali: il primo è specifico per l'area industriale inquinata di Porto Marghera, il secondo sono le aree inquinate nel territorio del Bacino Scolante.

Settore Monitoraggio e Sperimentazione.

Il sistema di monitoraggio costituisce lo strumento di verifica del raggiungimento degli obiettivi generali di risanamento e di riequilibrio del sistema Bacino Scolante - Laguna – Mare. E' quindi essenziale che la rete di monitoraggio fornisca dati, sia qualitativi sia quantitativi, sulle acque superficiali in modo tale da permettere una corretta valutazione dei carichi di inquinanti. La Regione Veneto è da sempre attenta alle evoluzioni tecnologiche nel settore del disinquinamento e nelle sue azioni continua a finanziare studi, approfondimenti e sperimentazioni nell'ambito della riduzione dell'apporto di nutrienti e sedimenti in Laguna.

Queste attività si esplicano essenzialmente tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV), e sono particolarmente concentrate nelle attività di monitoraggio e controllo delle matrici ambientali nei seguenti settori:

- monitoraggio quali-quantitativo dei corpi idrici del bacino scolante;
- monitoraggio qualità dell'aria e gestione del rischio industriale;
- monitoraggio e previsione meteorologica;
- realizzazione della carta dei suoli;
- studi e servizi nel settore agro-zootecnico ed agro-meteorologico;
- sviluppo del sistema informativo ambientale.

Ospedali

I finanziamenti assegnati a questo settore riguardano interventi di risanamento igienico sanitario presso l'ospedale Santi Giovanni e Paolo di Venezia, secondo quanto stabilito dalla legislazione speciale per Venezia.

INTERVENTI SPECIALI

1) Progetto Integrato Fusina e Progetto Integrato Campalto.

Il territorio della terraferma veneziana non è individuabile come una sola unità idrografica di caratteristiche univoche, ma va piuttosto considerato come un insieme di singoli bacini con uno specifico regime idraulico, allo stato attuale, indipendente l'uno dall'altro. Motivo principale di tale disomogeneità è la giacitura dei terreni, tale da imporre un regime di scolo meccanico continuo a buona parte del territorio in oggetto.

In generale la terraferma veneziana è suddivisibile in due distinti ambiti, quello di Fusina e quello di Campalto, a seconda dei recapiti (impianti di depurazione) cui sono convogliati i reflui di ciascun bacino.

1.A) Progetto Integrato Fusina

In tale contesto territoriale si inserisce il Progetto Integrato Fusina (PIF), realizzato dalla Regione Veneto in regime di Project Financing. L'importo dell'intervento ammonta a circa 200 milioni di euro, IVA esclusa. Di questi 92,8 milioni di euro sono messi a disposizione dalla Regione Veneto; la quota rimanente è a carico di capitali privati.

Il Progetto nasce dall'idea di coordinare gli interventi per la depurazione spinta dei reflui e di rigenerazione delle acque usate mediante la trasformazione dell'attuale impianto di depurazione in un centro di trattamento polifunzionale per gli scarichi civili, le acque di pioggia di Mestre, Marghera e del Mirese, il post-trattamento degli scarichi industriali di Porto Marghera, la depurazione delle acque di falda e per la produzione di acque per il riuso industriale.

Il progetto si pone come raccordo tra le pianificazioni regionali (costituite dal "Piano Direttore 2000", dal "Master Plan" per la bonifica dei siti inquinati di Porto Marghera, dal Modello strutturale degli acquedotti – Schema del Veneto Centrale) e le attività del Magistrato alle Acque di Venezia (MAV) consistenti nel ripristino morfologico della laguna e nell'estromissione del traffico petrolifero.

In particolare, il PIF prevede il riutilizzo, nell'area industriale di Porto Marghera, di quota parte dei reflui depurati. Ciò libererà risorse idriche di buona qualità del fiume Sile per un utilizzo più pregiato, a scopo potabile, da destinare in particolar modo alle aree più sfavorite del territorio regionale, quali quelle meridionali.

La creazione di un'area umida in Cassa di Colmata "A" permetterà, inoltre, l'utilizzo di tale volume per la collocazione dei fanghi lagunari scavati dal Magistrato alle Acque di Venezia nell'ambito degli interventi previsti dal Master Plan.

Contestualmente il materiale di buona qualità presente in Cassa A potrà essere utilizzato per gli interventi di ripristino morfologico attuati dal Magistrato alle Acque di Venezia, mentre per lo scarico finale a mare potranno essere utilizzate le condotte previste nel progetto per l'estromissione del traffico petrolifero dalla Laguna di Venezia, predisposto sempre dal MAV, qualora l'intervento stesso venga realizzato.

Per quanto attiene l'iter amministrativo, si allega di seguito una tabella esplicativa:

1 marzo 2000	Con il Provvedimento del Consiglio Regionale 01.03.2000, n. 24 viene approvato il "PIANO PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ED IL RISANAMENTO DELLE ACQUE DEL BACINO IDROGRAFICO IMMEDIATAMENTE SVERSANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA – PIANO DIRETTORE 2000 –, che contiene le strategie e le linee-guida operative individuate dalla Regione per il disinquinamento della Laguna di Venezia e del suo bacino idrografico scolante.

	Uno degli interventi principali individuati dal Piano Direttore 2000 è il "PROGETTO INTEGRATO FUSINA – P.I.F. –", secondo il quale l'impianto integrato di depurazione di Fusina costituisce il *"filtro artificiale"* nei riguardi della Laguna dello scarico puntuale più rilevante del bacino scolante nella Laguna di Venezia. Il PIF è conforme alle direttive del P.A.L.A.V. – approvato con il P.C.R. n. 70/1995 e con la D.C.R. n. 70/1999.
4 agosto 2000	Con la D.G.R. n. 2636/2000 viene aggiudicata la gara d'appalto per la redazione del progetto preliminare, già indetta con la D.G.R. 03.11.1999, n. 3881.
28 dicembre 2000	Presentazione del Progetto preliminare da parte dell'aggiudicatario alla Direzione Regionale Tutela Ambiente
16 febbraio 2001	Con D.G.R. n. 365/2001 viene adottato il progetto preliminare e viene avviata la proceduta di VIA.
2 aprile 2001	Domanda di VIA inoltrata dalla Direzione regionale Tutela Ambiente
1° luglio 2002	Conclusa l'istruttoria tecnica la Commissione V.I.A. esprime parere favorevole di compatibilità ambientale, con prescrizioni - Parere 01.07.2002, n. 30 –.
26 novembre 2002	Espressione dei Pareri positivi con prescrizioni delle Commissioni consiliari regionali "Settima" e "Per Venezia".
14 febbraio 2003	Con D.G.R. n. 386/2003 la Giunta Regionale esprime giudizio favorevole di compatibilità ambientale – Parere VIA 01.07.2002, n. 30 – e viene conseguentemente adottato il progetto preliminare. Viene dato avvio alla progettazione definitiva, revocando le disposizioni relative alla progettazione esecutiva delle opere urgenti individuate nella precedente D.G.R. n. 365/2001.
31 dicembre 2003	La costituenda A.T.I. composta da Veneto Acque S.p.a (Capogruppo mandataria), Vesta s.p.a. e Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani presenta una proposta di *project financing* denominata "PROGETTO INTEGRATO FUSINA – progetto preliminare".
6 febbraio 2004	Con D.G.R. 06.02.2004, n. 282, viene approvato l'Avviso di selezione per l'avvio delle procedure di ricerca del soggetto promotore, ponendo a base di gara il progetto preliminare approvato con D.G.R. n. 386/2003. Con la medesima Deliberazione viene nominato il Responsabile Unico del Procedimento – RUP –.
22 aprile 2004	La Conferenza dei Servizi per gli Interventi a Porto Marghera, con la Deliberazione 22.04.2000, n. 1, approva il MASTERPLAN PER LA BONIFICA DEI SITI INQUINATI DI PORTO MARGHERA che definisce il *Progetto Integrato Fusina quale impianto strategico di area al quale affidare il trattamento delle acque di drenaggio provenienti dai retromarginamenti, nonché delle acque di processo industriale e delle acque pluviali.*
3 giugno 2004	Termine per la presentazione di eventuali ulteriori proposte. Non perviene alcuna proposta concorrente.
18 giugno 2004	Con la D.G.R. 18.06.2004, n. 1906, viene nominata un'apposita Commissione per l'esame della documentazione presentata e per

	formulare le proposte per le successive determinazioni dell'Amministrazione regionale.
26 novembre 2004	La D.G.R. 26.11.2004, n. 3801, approva il Piano di caratterizzazione della Cassa di Colmata A – ex D.M. n. 471/1999 –.
29 dicembre 2004	La D.G.R. 29.12.2004, n. 4532 stabilisce l'acquisizione al patrimonio regionale della Cassa di Colmata A e delle aree all'interno dell'impianto di FUSINA destinate alla realizzazione del PIF.
29 dicembre 2004	Con la D.G.R. 29.12.2004, n. 4531, viene approvato l'Accordo di programma tra Regione e Magistrato alle Acque – "*Accordo di programma regolante le modalità di attuazione di alcuni interventi di salvaguardia ambientale della laguna da attuarsi a Porto Marghera e in aree lagunari vicine*" –.
7 febbraio 2005	Con Decreto n. 18 della Direzione Regionale Tutela Ambiente viene affidato l'incarico di caratterizzazione della Casa di Colmata A. Contestualmente si affidano gli incarichi per i rilievi topografici ed i frazionamenti della Cassa di Colmata A e dell'area VESTA di Fusina.
14 febbraio 2005	Il Promotore integra in via definitiva la proposta del 31.12.2003, prot. n. 21658, con nota 14.02.2005, n. 045/05.
17 marzo 2005	Con nota 17.03.2005, prot. n. 199334/40.08, il N.U.V.V. - ex art. 45, L.R. n. 27/2003 – trasmette al R.U.P. il Parere espresso nelle sedute dell11 e 15.03.2005, con esito positivo sulla convenienza del *project financing PIF* per la Pubblica Amministrazione e di sostenibilità economico-finanziaria.
18 marzo 2005	Con la D.G.R. 18.03.2005, n. 1134, sulla scorta dell'art. 37-ter della Legge Quadro sui LL.PP., n. 109/1994 e ss.mm.ii., vengono individuate le condizioni di pubblico interesse in relazione alla Proposta, e viene dato mandato al RUP di dar corso a tutte le attività necessarie per l'espletamento della gara di concessione dei lavori pubblici.
29 marzo 2005	Con il Decreto del Dirigente Servizio VIA, viene fatto proprio il Parere VIA espresso nella seduta 14.03.2005, che esclude dalla procedura VIA i lavori nella Cassa di Colmata A, e prende atto della Valutazione d'incidenza Ambientale di tali lavori in Cassa Colmata A.
21 aprile 2005	Il R.U.P. trasmette all'Unione Europea il Bando di gara "*Affidamento tramite contratto di concessione di cui agli artt. 19 e 37-quater della L. n. 109/1994 e ss.mm.ii. della progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina*". Segue la pubblicazione sulla GUCE, GURI, BURV e su quattro quotidiani il 05.05.2005.
23 giugno 2005	Il RUP provvede a dare regolare Avviso di Avvio del procedimento in base all'art. 7 della L. n. 241/1990, con pubblicazione agli Albi Pretori dei Comuni di Venezia e Mira e su due quotidiani locali.
11 maggio 2005	Con il Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Tutela dell'Ambiente 11.05.2005, n. 79, viene nominata la Commissione per le operazioni di preselezione della gara di cui al Bando 21.04.2005.
30 maggio 2005	Termine stabilito dal Bando 21.04.2005 per la presentazione delle

	domande di partecipazione alla licitazione privata.
31 maggio 2005	La Commissione per le operazioni di preselezione della gara, rilevato che la gara è andata deserta, redige l'apposito Verbale.
1° giugno 2005	Il RUP, in esito alla Licitazione Privata, attiva una procedura negoziale con il Promotore.
28 giugno 2005	La Giunta Regionale approva lo schema di "Contratto per l'affidamento e la disciplina della concessione di costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina – ex art. 37-bis Legge n. 109/94" ed affida all'ATI Veneto Acque S.p.a. (Capogruppo mandataria), VESTA S.p.a. e Impresa Costruzioni Ing. E. mantovani S.p.a., la progettazione definitica ed esecutiva, la costruzione e la successiva gestione del Progetto Integrato Fusina.
6 luglio 2005	Firma del Contratto tra Regione e l'ATI. In pari data, la A.T.I. si trasforma in Società Consortile per Azioni, denominata S.I.F.A. (Sistema Integrato Fusina Ambiente);
04 ottobre 2005	In esito alla richiesta della S.I.F.A. di modifica della compagine sociale originaria, con la D.G.R. 04.10.2005, n. 2868 la Giunta Regionale accoglie la richiesta sulla scorta dell'art. 7 del Contratto Regione-S.I.F.A. scpa;
30 novembre 2005	Consegna alla Regione – Servizio Legge Speciale per Venezia – del Progetto Definitivo da parte della di S.I.FA. per l'approvazione da parte della Commissione VIA – art. 19-bis L.R. 10/1999.
12 dicembre 2005	VESTA Spa invia in Regione il Progetto Integrato Fusina-Progetto definitivo trattamenti primari.
7 marzo 2006	D.G.R. 07.03.2006, n. 618. Approvazione modificazione della compagine sociale e delle quote di partecipazione alla SIFA scpa.
06 aprile 2006	La C.T.R.A. esprime Parere favorevole – ex art. 11, L.R. n. 33/1985 – al Progetto Integrato Fusina-Progetto definitivo, presentato dalla S.I.F.A. s.c.p.a. (Parere 06.04.2006, n. 3359), e sul Progetto Integrato Fusina-Progettodefinitivo Trattamenti primari, presentato da VE.S.T.A. S.p.a. (Parere 06.04.06, n. 3360).
30 maggio 2006	La Commissione per la Salvaguardia di Venezia, con voto n. 106/709 A, seduta n. 09/06 del 30.05.06, si esprime favorevolmente all'intervento denominato "Progetto Integrato Fusina-Project Financing, Progetto definitivo", proponenti: Regione Veneto e S.I.F.A. S.c.p.a., limitatamente agli interventi previsti nel Comune di Venezia.
30 maggio 2006	La Commissione per la Salvaguardia di Venezia, con voto n. 107/709 B, seduta n. 09/06 del 30.05.2006, si esprime favorevolmente all'intervento denominato "Progetto Integrato Fusina-Impianto di depurazione di Fusina-Trattamenti primari", proponenti: Comune di Venezia e VE.S.T.A. S.p.A., limitatamente agli interventi ricadenti nel Comune di Venezia.
11 luglio 2006	D.G.R. 11.07.2006, n. 2162, approvazione del „Progetto Integrato Fusina-Project Financing-Progetto definitivo" elaborato dalla SIFA scpa; approvazione del "Progetto Integrato Fusina-Impianto di depurazione

	di Fusina-Trattamenti primari", elaborato da VESTA Spa. Per entrambi i progetti viene dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, "limitatamente" ai lavori inclusi nel territorio del Comune di Venezia. Parere CTRA 06.04.2006, n. 3359 – Project Financing di SIFA scpa-. Parere CTRA 06.04.2006, n. 3360 – Progetto Integrato Fusina-Impianto di depurazione di Fusina-Trattamenti primari, di VESTA SpA.
03 agosto 2006	La Commissione per la Salvaguardia di Venezia, con il voto n. 109/979 del 30.08.06, seduta n. 14/2006, si esprime favorevolmente, con prescrizioni, all'intervento denominato "Progetto Integrato Fusina-Project Financing, Progetto definitivo, Prima fase, realizzazione fitodepurazione in Cassa A", proponenti: Regione Veneto e S.I.F.A. S.c.p.a.
07 agosto 2006	Con la D.G.R. 07.08.06, n. 2531 viene dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori previsti dal "Progetto Integrato Fusina – Project Financing – Progetto definitivo, Prima Fase, Fitodepurazione in Cassa A".
16 novembre 2006	Con nota 13.11.2006, prot. n. 85/06 – giunta al protocollo regionale il 16.11.2006, prot. n. 660543, strut. 57.08 –, la SIFA ha trasmesso alla Regione il progetto esecutivo, 1° Stralcio, impianto MBR, approvato dalla SIFA a seguito di asseverazione del medesimo progetto da parte dello Studio Fidelio S.p.A.

1.B) Progetto Integrato Campalto

L'ambito di Campalto è collocato nella parte nord orientale della terraferma veneziana; in esso si possono individuare due tipologie fognarie di bacini:

- bacini di tipo misto, ovvero caratterizzati da rete fognaria unitaria, generalmente facenti parte dell'area mestrina, fortemente urbanizzata;
- bacini di tipo separato, caratterizzati dalla presenza di una fitta rete di canali di bonifica, cui è affidato il compito di raccogliere e smaltire gli afflussi meteorici.

Della prima categoria fanno parte i bacini centrali di Via Torino, Mestre Centro, San Giuliano, Carpendo, Bissuola e Favaro; la seconda accomuna invece i bacini marginali degli abitati di Campalto, Villaggio Laguna e Tessera.

Nell'ambito di Campalto confluiscono inoltre le acque reflue derivanti dall'immissione da Mogliano Veneto.

In questo contesto territoriale si inserisce il Progetto Integrato Campalto che si pone il duplice obiettivo di ridurre il carico di inquinanti originati dal bacino di Campalto e sversati in Laguna di Venezia e di porre in condizioni di efficienza idraulica la rete di recapito dei deflussi meteorici incidenti nel bacino stesso.

I soggetti attuatori del progetto sono la società VESTA S.p.A. ed il Consorzio di Bonifica Dese-Sile, ciascuno per le rispettive parti di competenza.

Il Progetto Integrato Campalto (PIC) rientra nell'ambito di un'opera composta di tre parti:

1) collettore acque basse da Via Torino a Campalto (PIC1), per il quale di recente è stata approvata la procedura di VIA;
2) impianto di depurazione di Campalto, che sarà potenziato da 130.000 a 160.000 abitanti equivalenti. Detto progetto è stato approvato ed è in corso di realizzazione (PIC2);
3) opere di finissaggio dei reflui tramite fitodepurazione al fine di raggiungere concentrazioni degli inquinanti in linea con i valori stabiliti dal D.M. 30 luglio 1999 (PIC3), per le quali il Comune di Venezia sta redigendo il progetto.

2) Modello Strutturale degli Acquedotti – Schema del Veneto Centrale

Nell'ambito degli interventi di programmazione merita particolare interesse anche il Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto, previsto dall'art. 14 della L.R. 5/1998, al fine di coordinare le azioni delle otto Autorità d'ambito istituite, e approvato dalla Giunta Regionale del Veneto nel 2000, che consiste nell'individuazione degli schemi di massima delle principali strutture acquedottistiche del Veneto, nonché delle fonti da salvaguardare per risorse idriche ad uso potabile:

I principali obiettivi sono:

- fornitura di acqua di buona qualità alle aree oggi sfavorite del basso Veneto;
- ottimizzazione della gestione del servizio idrico integrato;
- salvaguardia delle risorse idropotabili;
- riduzione dei costi dell'acqua potabile grazie all'abbattimento degli sprechi di acqua e all'ottimizzazione delle risorse finanziarie di esercizio.



Le principali azioni sono:

- realizzazione di nuove linee di distribuzione;
- interconnessione di sistemi di produzione ad uso idropotabile del Veneto centrale e del basso Veneto;
- trasformazione del sistema acquedottistico veneto da tipo reticolare, ad anello chiuso;
- gestione su base pluriennale delle risorse idriche, anche mediante monitoraggio.

Lo Schema del Veneto Centrale, in corso di esecuzione da parte del concessionario Veneto Acque S.p.A., è strettamente connesso al Progetto Integrato Fusina. Tra gli obiettivi del Progetto Integrato Fusina, infatti, c'è anche il riuso delle acque depurate per scopi non potabili all'interno dell'area di Porto Marghera. In questo modo si potranno liberare risorse idriche di buona qualità del fiume Sile per un utilizzo più pregiato, a scopo potabile, che saranno destinate in particolar modo alle aree più sfavorite del territorio regionale, quali sono quelle del Basso Veneto.

Sarà, quindi, possibile garantire servizi acquedottistici migliori (caratterizzati da maggiori portate, elasticità e ridondanza della rete) nell'area compresa fra la bassa padovana ed il Polesine e una adeguata gestione del ciclo integrato delle acque con considerevoli vantaggi per la tutela ed il risparmio delle risorse ambientali.

La realizzazione dello Schema del Veneto Centrale è finanziata con i fondi della Legge Speciale per Venezia, che finora ha complessivamente destinato € 91.968.268,89.

3) Centro di biotrattamento di Camposampiero.

Il Centro di biotrattamento di Camposampiero, un'opera di competenza di Energia Territorio Risorse Ambientali, E.T.R.A., S.p.A., rappresenta un importante progetto nel settore Fognatura e Depurazione.

L'impianto prevede il trattamento integrato di quattro tipi di rifiuti: reflui urbani, liquami zootecnici, frazione organica della raccolta differenziata di rifiuti urbani e scarti vegetali. Dal loro trattamento vengono prodotti energia termica, acqua irrigua e per usi civili non potabili (irrigazione, servizi igienici,....), liquido fertilizzante e compost di qualità.

Il concetto ispiratore di questo impianto è l'integrazione della depurazione tradizionale con l'attività di recupero di materiali utili dai rifiuti organici, con il conseguente ottenimento di molteplici benefici tra i quali il migliore equilibrio economico della gestione dell'impianto (grazie ai ritorni derivanti dalla collocazione sul mercato dei materiali prodotti e dalla produzione di energia), la possibilità di sostituzione di parte dei concimi chimici azotati con l'ammendante agricolo prodotto dall'impianto, con conseguente minore inquinamento, e la possibilità di riutilizzo dell'acqua depurata in agricoltura ed in acquedotto duale a servizio di un'area artigianale contigua per usi industriali e per gli usi civili non potabili, meno esigenti dal punto di vista qualitativo.

Tale opera consiste in una serie di impianti strettamente interconnessi (depurazione biologica, codigestione anaerobica, cogenerazione, compostaggio aerobico) attraverso i quali è possibile la realizzazione di un unico centro che consente di valorizzare congiuntamente materiali di matrice diversa quali:

- le frazioni umide e verde dei rifiuti solidi rese disponibili dalla raccolta differenziata nei comuni del consorzio bacino Padova 1;
- i fanghi derivanti dalla depurazione biologica.

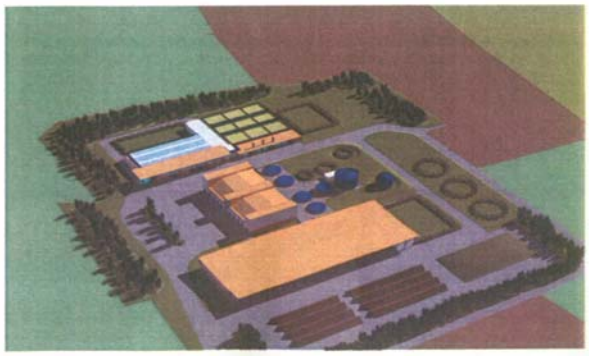

Il progetto del centro di Biotrattamento di Camposampiero è stato approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 561 del 02.03.1999 ed è stato inaugurato il 24 marzo 2005.

Ad oggi cono stati realizzati i seguenti comparti:

1) Impianto di depurazione: si basa sul processo biologico a fanghi attivi ed è stato progettato per trattare i reflui

fognari di 35.000 AE.

2) Impianto di trattamento rifiuti: prevede la codigestione a umido della FORSU, dei reflui zootecnici e dei fanghi di depurazione.

Le opere successive di completamento prevedono i raddoppio del codigestore anaerobico e della capacità di trattamento dei liquami civili e dei liquami zootecnici.

4) Oasi di Cà di Mezzo.

Un altro progetto di rilevante importanza riguarda l'area di fitodepurazione di Cà di Mezzo di competenza del Consorzio di Bonifica Adige Bacchiglione.
Tale area, situata nel Comune di Codevigo (PD) tra il fiume Bacchiglione e il Canal Morto, occupa una superficie di circa 30 ettari. L'area è un ecosistema palustre ed è stato completamente ricostruito su terreni a precedente uso agricolo e ritenuti scarsamente produttivi a seguito di una ridotta capacità di drenaggio.



Il progetto di ricostruzione di quest'area è stato impostato con una logica multi obiettivo; se da un lato la finalità principale è stata quella di migliorare la qualità dell'acqua, riducendo il carico dei nutrienti (azoto e fosforo) scaricati in laguna di Venezia, dall'altro si è posta l'attenzione anche al conseguimento di altri obiettivi quali la laminazione di picchi di piena con conseguente aumento della sicurezza idraulica del territorio, la ricarica di falda, la disponibilità di acqua da utilizzare nel periodo irriguo e l'aumento del valore naturalistico dell'area e della sua valenza sociale (usi paesaggistici, ricreativi, didattici).

STATO DELLA SPESA

.I fondi messi a disposizione dalla Legge Speciale per Venezia sommano complessivamente a 1.762,5 Milioni di EURO di cui :

- impegnati con progetti approvati, per circa 1.262,95 Milioni di EURO pari a circa il 71,65% delle somme finanziate;
- erogati (spesi) per circa a 865,43 Milioni di EURO corrispondenti a circa il 49,10% delle somme finanziate.

La suddivisione dei finanziamenti per i settori di intervento è riportata nella tabella che segue:

SETTORI	Fondi Finanziati	Fondi Impegnati	Fondi Erogati
Fognatura e depurazione	1.127,16 MLN €	866,67 MLN €	623,30 MLN €
Territorio	262,55 MLN €	135,17 MLN €	71,51 MLN €
Agricoltura e zootecnia	150,24 MLN €	97,79 MLN €	58,78 MLN €
Bonifica siti inquinati	52,92 MLN €	27,86 MLN €	13,80 MLN €
Acquedotti	107,23 MLN €	82,28 MLN €	55,30 MLN €
Monitoraggio e Sperimentazione	42,09 MLN €	35,26 MLN €	25,48 MLN €
Ospedali	20,30 MLN €	17,92 MLN €	17,26 MLN €
TOTALE	**1.762,5 MLN €**	**1.262,95 MLN €**	**865,43 MLN €**

Il totale degli interventi a cui è stato concesso il finanziamento alla data del 31.12.2006 è pari a 961. Nella tabella che segue tale numero di interventi viene suddiviso a seconda del settore di appartenenza.

SETTORI	Numero Interventi
Fognatura e depurazione	693
Territorio Acquedotti	21
Territorio	141
Agricoltura e zootecnia	25 (1)
Bonifica siti inquinati	44
Monitoraggio e Sperimentazione	32
Ospedali	5
TOTALE	**961**

A tale proposito si sottolinea che il Consiglio Regionale ha già individuato interventi urgenti da finanziare per complessivi 1784,32 milioni di euro con un'eccedenza di 21,8 milioni di euro rispetto alla somma a tutt'oggi finanziata.

(1) Sotto questa voce sono compresi i finanziamenti attribuiti ai 5 settori che costituiscono il comparto Agricoltura e Zootecnia:

1. Incentivi all'agricoltura compatibile nell'area del Bacino Scolante
2. Realizzazione di fasce tampone e messa a riposo colturale con finalità ambientali nel Bacino Scolante
3. Gestione delle pratiche irrigue: razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica nel Bacino Scolante
4. Gestione dei reflui zootecnici e interventi strutturali in zootecnia a tutela dell'ambiente nel Bacino Scolante
5. Gestione delle pratiche agricole: incentivazione all'innovazione ambientale ecocompatibile in agricoltura nel Bacino Scolante

Con successivi provvedimenti vengono finanziati i singoli interventi alle Aziende Agricole e ai Consorzi di Bonifica.

Si riporta, nel seguito e suddivisa per Legge, la situazione degli interventi finanziati con i fondi della Legge Speciale per Venezia, aggiornata al 31 dicembre 2006.

Legge 798/84 - esercizi 1984-85-86 (€ 41.316.551,93, pari a 58 miliardi di lire)

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 41.316.551,93	€ 40.185.926,28	97,3%	€ 32.111.293,99	77,7%

I fondi di questa Legge sono stati destinati al finanziamento di 33 interventi relativi principalmente ad opere del settore Fognatura e Depurazione. I finanziamenti ammontano a € 41.316.551,93 e alla data del 31.12.2006 risultano impegnati per il 97,3% ed erogati per il 77,7%.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	27	20
Acquedotti	3	1
Territorio	2	2
Agricoltura e Zootecnia		
Bonifica siti inquinati		
Monitoraggio e sperimentazione		
Ospedali	1	
TOTALE	**33**	**23**

La maggior parte delle opere risultano ultimate e collaudate.
Sono in fase di collaudo i lavori per la realizzazione del progetto relativo all'"*Estensione della rete fognaria ed implementazione degli allacciamenti in fognatura nera comunale*" presentato dal Comune di Mogliano Veneto che ammontano a € 2.582.284,50 e sono finanziati da questa Legge limitatamente ad € 516.456,90. E' importante sottolineare che, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1075 del 2004, è stato approvato il cambio del soggetto attuatore, divenuto l'azienda Servizi Pubblici Integrati Mogliano, S.P.I.M. S.p.A.

Anche i lavori per il *"Progetto definitivo della nuova centrale di sollevamento sull'isola del Tronchetto dell'acquedotto di Venezia centro storico ed estuario sud"* sono tuttora in corso. I ritardi sono dovuti alla revisione del progetto originario le cui modifiche sono state approvate con il decreto della Direzione Regionale Geologia e Ciclo dell'Acqua n. 147 del 29 marzo 2001.

Per quanto riguarda la fognatura dell'isola di Pellestrina, con decreto del Dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia n. 39 del 23 marzo 2006 è stato finanziato per € 4.168.069,57 il progetto di *"Risanamento igienico di S. Pietro in Volta a Pellestrina. Costruzione del collettore fognario principale sulla strada della laguna e collegamento alla rete di trasferimento sulla strada dei murazzi"*.

Infine, per quanto riguarda i fondi del progetto relativi alla costruzione della *"Vasca di prima pioggia e laminazione in località Gazzera Mestre (VE)"*, con deliberazione della Giunta Regionale n. 3521 del 12 novembre 2004, sono stati revocati per la quota non ancora erogata (pari a € 444.697,73) ed accantonati a favore della Diocesi Patriarcato di Venezia per finanziare interventi di risanamento igienico - sanitario relativi ai *Lavori di restauro della Sede Patriarcale, del Seminario Patri arcale e della Basilica della Salute"*.

Legge 910/86 - esercizio 87-88 (€ 51.645.690,16, pari a 100 miliardi di lire)

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 51.645.690,16	€ 47.507.603,17	*92,0%*	€ 46.043.326,36	*89,2%*

I fondi di questa Legge sono stati destinati al finanziamento di 42 interventi relativi principalmente ad opere del settore Fognatura e Depurazione.

I finanziamenti ammontano a € 51.645.690,16 e alla data del 31.12.2006 risultano impegnati per il 92% ed erogati per l' 89,2%.

	Int..	Collaudi
Fognatura e Depurazione	39	29
Acquedotti	1	
Territorio		
Agricoltura e Zootecnia		
Bonifica siti inquinati		
Monitoraggio e sperimentazione	1	1
Ospedali	1	1
TOTALE	**42**	**31**

Dei lavori finanziati con i fondi della Legge 910/86 esercizi 1987-88, la maggior parte sono stati progettati ed eseguiti direttamente dalla Regione Veneto con il supporto tecnico del Consorzio Venezia Disinquinamento. Tali lavori risultano ad oggi conclusi e già collaudati.

Le economie di spesa degli interventi finanziati con questa Legge i cui lavori ultimati e collaudati hanno determinato una spesa inferiore rispetto a quanto impegnato, saranno utilizzate per finanziare altre opere. Tra queste rientrano i *"Lavori di realizzazione della fognatura comunale di via Rovigo in comune di Musile di Piave"*, per un importo complessivo pari a € 45.900,53. La quota finanziata con le economie di questa Legge è pari a € 26.788,59. La quota rimanente, pari a € 19.111,94, è finanziata con le economie della Legge 67/88 – Esercizio 1990. Il progetto è stato approvato e l'impegno di spesa è stato assunto con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Tutela Ambiente n. 214 del 17 novembre 2004.

Inoltre, nel corso del 2006, con decreto del Dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia n. 5 del 19 gennaio 2006 è stata approvata la contabilità finale dell'intervento di competenza del Comune di Venezia relativo ai *"Lavori di costruzione del collettore di via Paleocapa e via Canal - Marghera (VE")*.

Legge 910/86 esercizio 1989 (€ 38.734.267,43, pari a 75 miliardi di lire)

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 38.734.267,43	€ 37.708.856,19	*97,4%*	€ 27.608.007,14	*71,3%*

I fondi di questa Legge sono stati destinati al finanziamento di 17 interventi relativi principalmente ad opere del settore Fognatura e Depurazione. I finanziamenti ammontano a € 38.734.267,43 e alla data del 31.12.2006 risultano impegnati per il 97,4 ed erogati per il 71,3%.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	13	6
Acquedotti	1	
Territorio	2	1
Agricoltura e Zootecnia		
Bonifica siti inquinati		
Monitoraggio e sperimentazione		
Ospedali	1	1
TOTALE	17	8

Si tratta di 13 progetti rientranti nel settore Fognatura e Depurazione, 1 del settore Acquedotti, 2 del settore Territorio ed 1 relativo ad interventi presso l'Ospedale di SS. Giovanni e Paolo di Venezia. Gli interventi collaudati sono sei, mentre quelli per i quali i lavori sono conclusi e il collaudo è in corso sono otto.

In relazione all'intervento relativo al *"Dipartimento d'urgenza dell'Ospedale di SS. Giovanni e Paolo di Venezia – 2° stralcio"*, la quota di cofinanziamento a carico della Regione del Veneto ammonta a € 2.582.284,50. I lavori risultano collaudati.

Per quanto riguarda i *"Lavori di estensione della rete fognaria ed implementazione degli allacciamenti in fognatura nera"* nel comune di Mogliano Veneto, la presente Legge finanzia le opere per € 1.549.370,70. Lo stesso progetto riceve finanziamenti anche dalla Legge 798/84 ES. 1984 – 1985 –1986 e dalla Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase, per un importo complessivo pari a € 2.582.284,50. Attualmente i lavori sono in fase di collaudo.

Per quanto riguarda l'intervento relativo alla *"Nuova centrale di sollevamento sull'isola del Tronchetto dell'acquedotto di Venezia centro storico ed estuario sud"* la situazione riamane invariata rispetto al 2005: la società VE.S.T.A. S.p.A., incaricata della realizzazione dell'opera ha realizzato un nuovo progetto che è stato approvato con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Geologia e Ciclo dell'Acqua n. 147 del 29 marzo 2001.

Infine, gli interventi relativi al settore Territorio sono due. In particolare per quanto concerne gli *"Interventi di difesa dell'isola di S. Erasmo dalle acque alte"*, il Magistrato alle Acque di Venezia ha presentato il progetto definitivo, per il quale è stato assunto l'impegno di spesa, con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Tutela Ambiente n. 99 del 30 ottobre 2000.

Legge 67/88 esercizio 1988 (€ 18.334.219,92, pari a 35,5 miliardi di lire)

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 18.334.219,92	€ 11.851.990,41	*64,6 %*	€ 5.478.912,28	*29,9 %*

I fondi di questa Legge sono stati destinati al finanziamento di 7 interventi e ammontano a € 18.334.219,92 e alla data del 31.12.2006 risultano impegnati per il 64,6 % ed erogati per il 29,9 %.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	3	1
Acquedotti	4	1
Territorio		
Agricoltura e Zootecnia		
Bonifica siti inquinati		
Monitoraggio e sperimentazione		
Ospedali		
TOTALE	7	2

Del totale degli interventi, 4 sono concentrati nel settore degli Acquedotti e 3 nel Settore della Fognatura e Depurazione.

Per quanto riguarda gli interventi nel settore Acquedotti, l'unico i cui lavori sono tuttora in corso riguarda le opere connesse alla *"Realizzazione della condotta Cavarzere – Chioggia"* nell'ambito del Sistema degli acquedotti del Basso Veneto.

I tre interventi del settore Fognatura e Depurazione sono inerenti ad opere effettuate presso gli impianti di depurazione di Fusina e Campalto.

In merito all'impianto di depurazione di Fusina, si rimanda all'approfondimento nella sezione introduttiva dedicata alle opere speciali. E' però opportuno precisare che i finanziamenti di questa Legge sono assegnati al Comune di Venezia per opere presso l'attuale depuratore di Fusina, che si differenzia dal Progetto Integrato Fusina in capo alla Regione Veneto.

Per quanto riguarda l'intervento relativo ad *"Opere accessorie all'impianto di Campalto"* di competenza del Comune di Venezia, i lavori sono stati collaudati ed il decreto del Dirigente della Direzione Regionale Tutela dell'Ambiente n. 203 del 22.10.2004 ne approva la contabilità finale.

Legge 67/88 esercizio 1990 (€ 53.969.745,95, pari a 104,5 miliardi di lire)

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 53.969.745,96	€ 51.858.671,85	*96,1%*	€ 36.215.404,36	*67,1%*

I fondi di questa Legge sono stati destinati al finanziamento di 30 interventi, di cui 27 rientranti nel settore Fognatura e Depurazione, 1 appartenente al settore Territorio e 2 al Monitoraggio e Sperimentazione. I finanziamenti ammontano a € 53.969.745,96 ed alla data del 31.12.2006 risultano impegnati per il 96,1 % ed erogati per il 67,1%.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	27	14
Acquedotti		
Territorio	1	
Agricoltura e Zootecnia		
Bonifica siti inquinati		
Monitoraggio e sperimentazione	2	
Ospedali		
TOTALE	**30**	**14**

Di questi interventi, 14 risultano collaudati e 11 ultimati o in avanzata fase di esecuzione. Si descrive ora la situazione degli altri 2 interventi che invece non sono ancora avviati.

1) *"Interventi di risanamento igienico sanitario relativi al restauro della Sede Patriarcale, del Seminario Patriarcale e della Basilica della Salute"*: l'intervento è stato finanziato parzialmente con i fondi della Legge 798/84, come evidenziato in precedenza, e parte con i fondi di questa Legge (L. 67/88 Es. 1990) originariamente destinati al Comune di Chioggia/ASP e riassegnati con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3521 del 12 novembre 2004.

2) *"Vasca di accumulo acque meteoriche di Carpenedo - Bissuola (VE)"*: per quest'opera la Giunta Regionale ha recepito e fatto proprio, con Deliberazione n. 719 del 19/03/2004, il giudizio di compatibilità ambientale espresso dalla Commissione Valutazione di Impatto Ambientale. Questo intervento fa parte del Progetto Integrato Campalto.

Il Progetto Integrato Campalto (PIC) risulta sostanzialmente composto di tre parti:

1) collettore acque basse da Via Torino a Campalto (PIC1), per il quale di recente è stata approvata la procedura di VIA;
2) impianto di depurazione di Campalto che sarà potenziato da 130.000 a 160.000 abitanti equivalenti. Detto progetto è stato approvato ed è in corso di realizzazione (PIC2);
3) opere di finissaggio dei reflui tramite fitodepurazione al fine di raggiungere concentrazioni degli inquinanti in linea con i valori stabiliti dal D.M. 30 luglio 1999 (PIC3).

Nell'ambito del Progetto Integrato Campalto rientrano inoltre le opere relative al *"Risanamento e rinaturalizzazione del 2° tronco del canale Acque Basse"* e con DGR 3772/2005 viene individuata la società Vesta S.p.A. come soggetto attuatore. L'opera si inserisce nell'ambito di una radicale riprogettazione di tutta la fase terminale delle fognature afferenti all'impianto di Campalto e finalizzata al controllo dell'inquinamento

diffuso urbano che il Comune di Venezia, in accordo con il Consorzio di Bonifica Dese Sile, sta effettuando.

Nel corso del 2006 sono state collaudate due opere di competenza del Comune di Venezia; in particolare:

- Il decreto del Dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia n. 21 del 07.03.2006 ha approvato gli atti di contabilità finale relativi al progetto di *"Ampliamento della fognatura del Cavallino (VE) - II stralcio"*.
- Il decreto del Dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia n. 88 del 05.06.2006 ha approvato gli atti di contabilità finale relativi alla *"Razionalizzazione della rete fognaria di Marghera (VE) - via Asseggiano a Chirignago"*.

Legge 67/88 esercizio 1991 (€ 15.803.581,16, pari a 30,6 miliardi di lire)

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 15.803.581,16	€ 15.803.581,11	*100%*	€ 15.357.106,61	*97,2%*

I fondi di questa Legge sono stati destinati al finanziamento di 8 interventi, di cui 7 rientranti nel settore Fognatura e Depurazione e 1 appartenente al settore Monitoraggio e Sperimentazione. I finanziamenti ammontano a € 15.803.581,16 ed alla data del 31.12.2006 risultano totalmente impegnati ed erogati per il 97,2%.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	7	2
Acquedotti		
Territorio		
Agricoltura e Zootecnia		
Bonifica siti inquinati		
Monitoraggio e sperimentazione	1	
Ospedali		
TOTALE	**8**	**2**

Gli interventi rientranti nel settore Fognatura e Depurazione risultano ultimati e/o collaudati.
L'intervento relativo all'*"Impianto di trattamento R.S.U. di Venezia"* risulta terminato. Questo progetto è stato cofinanziato con i fondi della Legge Speciale per Venezia e con i fondi F.I.O.

Rimane un intervento in questo settore i cui lavori sono tuttora in corso: si tratta dell'*"Impianto di biotrattamento di Camposampiero"*. Questo progetto riceve ulteriori finanziamenti anche da altre Leggi (Legge 139/92 - I^ fase per € 4.338.237,95, Legge 539/95 - 3^ fase per € 11.878.508,68 e Legge 515/96 - 4^ fase per € 5.375.864,61, per un totale complessivo di € 24.174.895,74), e per la conclusione dei lavori è stato fissato, con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Tutela Ambiente n. 173 del 2003, il nuovo termine di fine lavori al 19/11/2008. Per un ulteriore approfondimento si rimanda alla parte introduttiva relativa alle opere speciali.

L'unico intervento rientrante nel settore Monitoraggio e Sperimentazione è il *"Sistema informativo regionale – progetto SINA"* che è stato approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2558 del 27 luglio 1999. L'intervento è finanziato con fondi a valere su questa Legge e sulla Legge 139/92 Es. 1993. I lavori, condotti dall'A.R.P.A.V. sono ultimati.

Legge 67/88 esercizio 1992 1^ tranche (€ 15.338.769,90 pari a 29,7 miliardi di lire)

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 15.338.769,90	€ 11.819.744,67	*77,1%*	€ 9.806.345,11	*63,9%*

I fondi di questa Legge sono stati destinati al finanziamento di 13 interventi, di cui 12 rientranti nel settore Fognatura e Depurazione e 1 appartenente al settore Territorio. I finanziamenti ammontano a € 15.338.769,90 ed alla data del 31.12.2006 risultano impegnati per il 77,1% ed erogati per il 63,9%.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	12	4
Acquedotti		
Territorio	1	1
Agricoltura e Zootecnia		
Bonifica siti inquinati		
Monitoraggio e sperimentazione		
Ospedali		
TOTALE	**13**	**5**

Degli interventi di fognatura e Depurazione 5 risultano con lavori in corso e riguardano la realizzazione di vasche di raccolta di prima pioggia e il completamento delle fognature nei comuni di Strà, Campagna Lupia, Fiesso D'Artico, Mirano e Spinea.
Per tali interventi, di competenza dell'Azienda Consorzio del Mirese S.p.A., l'impegno di spesa è stato assunto nel corso del 2004 e del 2005.

I lavori per il "R*ifacimento del collegamento fra il nodo di Ca' Emiliani e l'impianto di modulazione della Rana*" in comune di Venezia sono invece collaudati; con decreto del Dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia n. 98 del 23.06.2006 è stata approvata la contabilità finale relativa all'intervento.

L'unico progetto appartenente al settore Territorio riguarda il *"2° stralcio dell' impianto idrovoro a servizio del Canale Scolmatore del fiume Marzenego"*. I lavori, eseguiti da parte del Consorzio di Bonifica Dese Sile, risultano collaudati e il Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Tutela Ambiente n. 27 del 31 marzo 1999 ne approva la contabilità finale.

Legge 67/88 esercizio 1992 2^ tranche (€ 30.987.413,94 pari a 60 miliardi di lire)

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 30.987.413,94	€ 24.782.680,22	*80,0%*	€ 15.159.182,31	*48,9%*

I fondi di questa Legge sono stati destinati al finanziamento di 10 interventi, di cui 7 rientranti nel settore Fognatura e Depurazione e 3 appartenenti al settore Territorio. I finanziamenti ammontano a € 30.987.413,94 ed alla data del 31.12.2006 risultano impegnati per l'80% ed erogati per il 48,9%.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	7	2
Acquedotti		
Territorio	3	2
Agricoltura e Zootecnia		
Bonifica siti inquinati		
Monitoraggio e sperimentazione		
Ospedali		
TOTALE	**10**	**4**

Dei 7 interventi rientranti nel settore Fognatura e Depurazione, 2 sono collaudati mentre 5 risultano con lavori in corso. In particolare, 2 di questi sono gestiti dal Centro Veneto Servizi S.p.A.. Il primo riguarda *"Interventi di fognatura nei comuni di Candiana, Conselve, Monselice, Pozzonovo, Solesino, Tribano"* per il quale il Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Tutela Ambiente n. 183 del 2005 stabilisce come termine per la fine dei lavori il 18/10/2007. La stessa valutazione vale per gli *"Interventi di fognatura per impianti di depurazione minori"* per i quali il Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Tutela Ambiente n. 182 del 2005 stabilisce come termine fine lavori il 12/12/2007. Si rileva, inoltre, che gli *"Interventi di fognatura per impianti di depurazione minori"* hanno ottenuto il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Ambiente n. 3178 del 04 dicembre 2003, in merito alla proroga per l'adeguamento degli scarichi ai sensi del Decreto Ministeriale del 30 luglio 1999.

Vi sono inoltre 3 interventi del settore Fognatura e Depurazione che fanno parte del Progetto Integrato Fusina, per le cui caratteristiche si rimanda a quanto descritto in premessa.

Degli interventi appartenenti al settore Territorio, si segnala che i lavori per il "P*otenziamento dell'impianto idrovoro di Malcontenta*", realizzati dal Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta, risultano collaudati e con decreto del Dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia n. 97 del 23.06.2006 sono stati approvati gli atti di contabilità finale. I lavori di *"Sistemazione del Fiume Marzenego - Ramo Beccherie"*, realizzati dal Consorzio di Bonifica Dese Sile, sono stati collaudati e con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Tutela Ambiente n. 132 del 25 novembre 2002 sono stati approvati gli atti di contabilità finale.

Legge 360/91 (€ 8.263.310,39, pari a 16 miliardi di lire)

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 8.263.310,39	€ 5.398.763,42	*65,3%*	€ 3.803.309,92	*46,0%*

I fondi di questa Legge sono stati destinati al finanziamento di 7 interventi, di cui 1 rientrante nel settore Fognatura e Depurazione, 1 appartenente al settore Territorio, 3 relativi all'Agricoltura e Zootecnia e 2 relativi alla Bonifica dei Siti Inquinati. I finanziamenti ammontano a € 8.263.310,39 e alla data del 31.12.2006 risultano impegnati per il 65,3% ed erogati per il 46,0%.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	1	
Acquedotti		
Territorio	1	
Agricoltura e Zootecnia	3	1
Bonifica siti inquinati	2	
Monitoraggio e sperimentazione		
Ospedali		
TOTALE	7	1

L'unico intervento del settore Fognatura e Depurazione, i cui lavori risultano ultimati, è *"L'impianto di trattamento R.S.U. di Venezia"*. Questo progetto, come già sottolineato in precedenza, è stato cofinanziato con i fondi della Legge Speciale per Venezia e con i fondi F.I.O.

L'intervento rientrante nel settore Territorio, *"Ricalibrazione e sostegno nei sottobacini del Marzenego"*, di competenza del Consorzio di Bonifica Dese Sile, è stato escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e il Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Tutela Ambiente n. 133 del 13 luglio 2004 ha fatto proprio il parere della competente commissione.

Per quanto attiene il progetto relativo al recupero ambientale e valorizzazione dell'area di S. Giuliano in Venezia e la creazione del cosiddetto *"Bosco di Mestre"*, i lavori risultano ultimati relativamente al 1° stralcio. il Comune di Venezia ha predisposto il progetto per quanto attiene al 2° stralcio.

I due interventi rientranti nel settore Bonifica Siti Inquinati, riguardano il *"Recupero ambientale e valorizzazione dell'area di S. Giuliano (VE) - Bonifica discarica di S. Giuliano (VE) - I lotto "B1"* e la *"bonifica in viale S. Marco"*, entrambi in comune di Venezia.

Legge 139/92 - esercizio 1993 – I^ fase (€ 180.759.914,68, pari a 350 miliardi di lire)

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 180.759.914,68	€ 178.483.372,67	*98,7%*	€ 152.252.543,22	*84,2%*

I fondi di questa Legge sono stati destinati al finanziamento di 67 interventi, di cui 62 rientranti nel settore Fognatura e Depurazione, 3 appartenenti al settore Territorio e 2 relativi al Monitoraggio e Sperimentazione. I finanziamenti ammontano ad € 180.759.914,68 ed alla data del 31.12.2006 risultano impegnati per il 98,7% ed erogati per l' 84,2%.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	62	41
Acquedotti		
Territorio	3	3
Agricoltura e Zootecnia		
Bonifica siti inquinati		
Monitoraggio e sperimentazione	2	
Ospedali		
TOTALE	67	44

Dei 62 interventi del settore Fognatura e Depurazione, 41 risultano essere collaudati e 7 sono ormai conclusi.
Tra gli interventi tuttora in fase di progettazione, rientrano gli *"Interventi di risanamento igienico sanitario relativi al restauro della Sede Patriarcale, del Seminario Patriarcale e della Basilica della Salute"* della Diocesi Patriarcato di Venezia. Per questo intervento è utile ribadire quanto espresso in precedenza: tale opera è finanziata parzialmente con la riallocazione di fondi delle Leggi n. 798/84, n. 67/88 – Esercizio 1990 e di questa Legge, che revoca fondi originariamente destinati al Comune di Venezia. Tali revoche e riassegnazioni dei fondi sono state effettuate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3521 del 12 novembre 2004.

Tra i lavori tuttora in corso rientrano quelli relativi al *"Completamento dell'impianto di depurazione di Campalto"*: originariamente il soggetto attuatore di tale progetto era il Comune di Venezia, ma la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 3772 del 2005, ha individuato nella società Vesta il nuovo interlocutore per il proseguimento dei lavori.

Inoltre, il *"Progetto definitivo relativo agli interventi diffusi di ristrutturazione della fognatura nera e bianca del Lido di Venezia. Bacino 16 e 20 - 9° lotto"* redatto dal Comune di Venezia, è stato approvato con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Tutela Ambiente n. 115 del 23/06/2004.

Una nota particolare va riservata ai lavori per la realizzazione del Centro di Biotrattamenti di Camposampiero ad opera di E.T.R.A. S.p.A. Questo intervento beneficia di finanziamenti dalle Leggi n. 67/88 (per € 2.582.284,50), 139/92 - I^ fase (per € 4.338.237,95), 539/95 - 3^ fase (per € 11.878.508,68) e 515/96 - 4^ fase (per € 5.375.864,61) per un totale complessivo di € 24.174.895,74.
I lavori di realizzazione di tale opera hanno subito un rallentamento dovuto ad un ricorso presentato avanti al Tribunale Amministrativo Regionale in relazione alla graduatoria finale di aggiudicazione dell'opera, presentato dalla seconda ditta classificata. La sentenza favorevole per la stazione appaltante, porta la data del 23 maggio 2002 ed è

stata depositata il 15 gennaio 2003. A tutt'oggi i lavori sono in fase di esecuzione e la nuova conclusione dei lavori è stata fissata, con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Tutela Ambiente n. 173 del 2003, per il 19/11/2008.

I tre interventi rientranti nel settore Territorio sono stati tutti collaudati e riguardano le *"Sistemazioni idraulico-ambientali area Brenta-Bacchiglione (foce lagunare di Lova)"*, di competenza del Consorzio di Bonifica Bacchiglione Brenta e *"L'intervento di diversione idraulica dalla laguna - incremento invasi - monitoraggio e telecontrollo"* e l' *"Area pilota di fitodepurazione per integrazione di reti fognarie e rete di bonifica"* del Consorzio di Bonifica Adige Bacchiglione.

Infine vi sono due interventi relativi al settore Monitoraggio e Sperimentazione. Il primo riguarda l' *"Estensione della rete agrometeorologica"* di A.R.P.A.V. per il quale i lavori risultano ultimati. Il secondo è inerente ad *"Interventi per il monitoraggio dei corsi d'acqua"*, sempre dell' A.R.P.A.V., e rientra nel progetto SINA. L'intervento è finanziato con fondi a valere su questa Legge e sulla Legge 67/88 Es. 1991 e i lavori sono stati ultimati.

Legge 139/92 - II^ fase (€ 165.266.208,31, pari a 320 miliardi di lire)

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 165.266.208,31	€ 111.156.058,62	*67,3%*	€ 87.256.521,10	*52,8%*

I fondi di questa Legge sono stati destinati al finanziamento di 52 interventi, di cui 18 rientranti nel settore Fognatura e Depurazione, 23 appartenenti al settore Territorio, 6 relativi al settore Agricoltura e Zootecnia e 5 relativi al Monitoraggio e Sperimentazione. I finanziamenti ammontano a € 165.266.208,31 e alla data del 31.12.2006 risultano impegnati per il 67,3% ed erogati per il 52,8%.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	18	7
Acquedotti		
Territorio	23	9
Agricoltura e Zootecnia	6	
Bonifica siti inquinati		
Monitoraggio e sperimentazione	5	
Ospedali		
TOTALE	52	16

Dei 18 interventi del settore Fognatura e Depurazione, per 6 la progettazione è tuttora in corso: di questi, 5 riguardano opere di competenza del Comune di Venezia, di cui 4 relative ad opere rientranti nell'ambito del Progetto Integrato Campalto.
L'unico finanziamento alla Regione Veneto riguarda il Progetto Integrato Fusina ed ammonta a € 12.181.000,00; per approfondimenti si rimanda a quanto descritto nella parte introduttiva alla presente relazione.

Una nota particolare merita il finanziamento riservato al *Progetto Integrato RII* di Venezia, pari a € 16.526.620,77. Tale quota è stata completamente erogata.

Tra gli interventi rientranti nel settore Territorio, la cui progettazione è in corso, ve ne sono da annoverare 2 di competenza del Consorzio di Bonifica Dese Sile, che riguardano la *"Costruzione del I tronco del collettore Acque Basse"* e il *"Risanamento e rinaturalizzazione del secondo tronco del canale Acque Basse"*: per questi due interventi la Commissione Regionale VIA ha esaminato il progetto in data 1.12.2003 e il giudizio di compatibilità ambientale è stato recepito con Deliberazione della Giunta Regionale n. 719 del 19.03.2004. Inoltre la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3772 del 2005 ha individuato come soggetto attuatore dell'intervento la Società Ve.S.T.A. S.p.A.

Tra gli interventi i cui lavori sono in corso, si ricordano gli *"Interventi strutturali: diversione delle acque di piena del Fiumicello (idrovora Cambroso)"* che si stanno per concludere, e i lavori per gli *"Interventi strutturali in rete di bonifica - Sistema di telecontrollo"* che risultano in avanzata fase di esecuzione: entrambi i progetti fanno capo al Consorzio di bonifica Bacchiglione Brenta.

Sempre tra gli interventi ricadenti nel settore Territorio e i cui lavori sono in avanzata fase di attuazione, si ricordano, tra gli altri, gli *"Interventi di ristrutturazione della rete di bonifica dell'area centrale del medio corso dei fiumi Dese e Zero nei comuni di Scorzè, Zero Branco, Trebaseleghe, Piombino Dese e Mogliano Veneto e tributaria corsi d'acqua*

consortili Pioveva di Cappella, Scolo Dosolino, Rio S.Ambrogio e Piovega di Levada" di competenza del Consorzio di Bonifica Dese Sile e i lavori per la realizzazione del *"Sistema di monitoraggio e controllo della rete idrica scolante nella Laguna di Venezia. Interventi strutturali in reti di bonifica. Estensione del sistema di telecontrollo nel Bacino scolante Impianto per n. 24 stazioni."*

Per quanto riguarda le opere di *"Riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Draganziolo nell'area denominata "Oasi" in comune di Noale per la riduzione dei nutrienti versati nella laguna di Venezia"* ad opera del Comune di Noale, con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Tutela Ambiente n. 28 del 15 maggio 2000, è stato deliberato il non assoggettamento a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, con prescrizioni. In particolare per la sua realizzazione si rileva l'importante collaborazione maturata tra l'amministrazione comunale e il Consorzio di Bonifica Dese Sile, in fase sia di progettazione sia di conduzione dei lavori.

Nel corso del 2006, sempre nell'ambito del Territorio, sono state collaudate una serie di opere; tra queste si ricordano:

- Il progetto *"Potenziamento impianto idrovoro di Dogaletto in comune di Mira"* di competenza del Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta è stato collaudato, e con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia n. 84 del 5 giugno 2006, sono stati approvati gli atti di contabilità finale.
- Il progetto relativo alla *"Riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Draganziolo nell'area denominata "Oasi" in comune di Noale per la riduzione dei nutrienti versati nella laguna di Venezia. Progetto definitivo di 1° stralcio"*, di competenza del Comune di Noale, è stato collaudato, e con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia n. 111 del 17 luglio 2006 sono stati approvati gli atti di contabilità finale.

Nel settore Agricoltura e Zootecnia, con DGR n. 2876 del 28 luglio 1998, la Giunta Regionale ha avviato tutte le attività connesse all'erogazione di contributi a soggetti privati operanti nell'agricoltura e nella zootecnia per la realizzazione di interventi volti a ridurre il rilascio di sostanze eutrofizzanti nei corsi d'acqua sfocianti nella laguna di Venezia; l'istruttoria per l'erogazione dei finanziamenti si è conclusa già da tempo; per alcuni interventi i lavori sono in corso di esecuzione, per altri sono già terminati e collaudati.

Verificato che nel settore zootecnico molti progetti non risultavano ancora realizzati, il Consiglio Regionale, con DCR n. 103/2002, ha provveduto a riallocare € 15.493.706,97, pari a 30 miliardi di lire, originariamente destinati per la gestione delle pratiche agricole nel Bacino Scolante, produzione di energia rinnovabile da culture a minor rilascio di nutrienti. Detti fondi sono stati definitivamente assegnati, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2834 del 10 settembre 2004, a Veneto Agricoltura, per € 3.300.000,00, e con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 24 del 4 maggio 2004, per € 12.181.000,00, a numerosi altri interventi.

Gli interventi del settore Monitoraggio e Sperimentazione sono tutti in corso di realizzazione, mentre per quanto riguarda il *"Potenziamento del servizio agrometeorologico della Regione Veneto"* i lavori risultano ultimati.

Maggiori e più favorevoli mutui dalla Legge 139/92– II^ fase (€ 40.349.825,52, pari a circa 78,13 miliardi di lire)

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 40.349.825,52	€ 31.833.865,52	*78,9%*	€ 12.331.249,40	*30,6%*

Il Consiglio Regionale, con Deliberazione n. 103 del 18 dicembre 2002, ha provveduto a ripartire la somma complessiva di € 40.349.825,52 in ragione delle più favorevoli condizioni rinegoziate dagli uffici regionali per l'assunzione del mutuo per il finanziamento degli interventi di cui alle Leggi n. 139/1992 – II^ fase e n. 515/1996 – IV^ fase

In questa sezione si analizza lo stato della spesa della quota riferita ai maggiori e più favorevoli mutui dalla Legge 139/92 – II^ fase (per la destinazione della quota di finanziamento riferita ai maggiori e più favorevoli mutui dalla Legge 515/96 – IV^ fase si rimanda alla sezione dedicata).

I fondi così ottenuti sono stati destinati al finanziamento di 34 interventi, in prevalenza nel settore fognatura e depurazione. Alla data del 31.12.2006 i finanziamenti risultano impegnati per il 78,9% ed erogati per il 30,6%.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	28	
Acquedotti		
Territorio	4	1
Agricoltura e Zootecnia		
Bonifica siti inquinati	2	
Monitoraggio e sperimentazione		
Ospedali		
TOTALE	**34**	**1**

Nel settore Fognatura e Depurazione sono previsti 28 interventi, in gran parte di adeguamento degli impianti di depurazione ai limiti previsti dal Decreto Ministeriale 30 luglio 1999 e per la realizzazione di condotte fognarie.

Nel settore Territorio, l'unica opera collaudata riguarda *"Interventi di completamento ed adeguamento per la riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Zero per il controllo e la riduzione dei nutrienti sversati nella Laguna di Venezia"*, di competenza del Consorzio di Bonifica Dese Sile.

Per quanto riguarda il settore della Bonifica Siti Inquinati, i fondi sono stati assegnati per il finanziamento di due interventi: il primo è di competenza dell'Autorità Portuale di Venezia e riguarda un "*Impianto pilota per il lavaggio di sedimenti nel Porto di Venezia*" e con D.G.R. n. 1826 del 13.06.2006 si è provveduto a finanziare tale intervento. Il secondo, invece, è stato assegnato alla Azienda Speciale del Porto di Chioggia per la "*Bonifica aree interessate alla realizzazione delle banchine "A", "E", "B" - terminal di Val da Rio*"; di questo, con D.G.R. n. 1825 del 13.06.2006, è stato approvato il disciplinare tecnico ed è stato impegnato parte del finanziamento.

Legge 539/95 - esercizio 1996 – II^ fase (€ 15.493.706,97, pari a 30 miliardi di lire)

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 15.493.706,97	€ 15.493.706,97	*100%*	€ 14.889.859,95	*96,1%*

I fondi di questa Legge sono stati destinati al finanziamento di 16 interventi, tutti rientranti nel settore Fognatura e Depurazione. I finanziamenti ammontano a € 15.493.706,97 ed alla data del 31.12.2006 risultano totalmente impegnati ed erogati per il 96,1%.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	**16**	**14**
Acquedotti		
Territorio		
Agricoltura e Zootecnia		
Bonifica siti inquinati		
Monitoraggio e sperimentazione		
Ospedali		
TOTALE	**16**	**14**

Di questi 16 interventi, 14 risultano collaudati mentre altri 2 presentano i lavori ultimati: tra questi ultimi, rientrano le opere relative allo *"Scavo dei Rii del Centro storico di Venezia"*.

Questo particolare intervento consiste nell'esecuzione di opere e di servizi di manutenzione urbana del Centro Storico e di parte delle isole di Venezia con particolare riferimento al suolo, al sottosuolo e al sistema dei rii e dei ponti.

Il progetto prevede la manutenzione complessiva di tutte le infrastrutture di urbanizzazione comprensiva del recupero funzionale dei muri di sponda, il restauro e/o ricostruzione dei ponti, la manutenzione della pavimentazione, la difesa dalle maree medio-alte attraverso rialzi della pavimentazione.

Per quanto riguarda la quota a carico della Regione Veneto relativa al risanamento igienico-sanitario, il progetto prevede lo scavo dei rii ed il radicale rispristino ed adeguamento del sistema di collettamento e smaltimento fognario.

Nel corso del 2006 il progetto relativo al *"Utilizzo delle economie di spesa per un nuovo tratto di condotta fognaria in via S. Giovanni Bosco - Piove di Sacco"* eseguito dall'Azienda Piovese Gestione Acque A.P.G.A. s.r.l. è stato ultimato e collaudato: il decreto del Dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia n. 50 del 05.04.2006 ne approva gli atti di contabilità finale.

Legge 539/95 - esercizio 1997 – III^ fase (€ 30.987.413,95, pari a 60 miliardi di lire)

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 30.987.413,95	€ 30.987.413,95	*100%*	€ 30.754.737,99	*99,2%*

I fondi di questa Legge sono stati destinati al finanziamento di 20 interventi, di cui 19 rientranti nel settore Fognatura e Depurazione e 1 appartenente al settore Ospedali. I finanziamenti ammontano a € 30.987.413,95 ed alla data del 31.12.2006 risultano totalmente impegnati ed erogati per il 99,2%.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	19	15
Acquedotti		
Territorio		
Agricoltura e Zootecnia		
Bonifica siti inquinati		
Monitoraggio e sperimentazione		
Ospedali	1	
TOTALE	**20**	**15**

Per gli interventi del settore Fognatura e Depurazione la maggior parte dei lavori risultano ultimati.
Tra questi, si ricorda quello relativo allo *"Scavo dei Rii nel centro storico di Venezia"* e quello relativo al *"Completamento dell'impianto R.S.U. di Venezia"* ad opera dell'Ente di Bacino R.S.U. di Venezia 2.
Infine per quanto riguarda l'intervento relativo al *"Dipartimento d'urgenza dell'Ospedale di SS. Giovanni e Paolo di Venezia – 2° stralcio"*, i lavori risultano ultimati.

Si sottolinea che, sempre nell'ambito del settore Fognatura e Depurazione, nel corso del 2006 sono state concluse una serie di opere.
Tra queste si ricordano:
Il progetto relativo ai *"Lavori di miglioramento ed ammodernamento dell'impianto di depurazione di Val da Rio - lotto funzionale A"*, di competenza dell'Azienda Servizi Pubblici S.p.A. di Chioggia è stato collaudato e con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia n. 110 del 17 luglio 2006 sono stati approvati gli atti di contabilità finale.
Il progetto relativo ai *"Progetto esecutivo dei lavori di miglioramento ed ammodernamento della linea "Picchi" del depuratore di Val da Rio"*, sempre di competenza dell'Azienda Servizi Pubblici S.p.A. di Chioggia è stato collaudato e con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia n. 53 del 5 aprile 2006 sono stati approvati gli atti di contabilità finale.

In relazione al progetto relativo all'ampliamento dell'impianto di biotrattamento del Comune di Camposampiero, ad opera di E.T.R.A. S.p.A., si rimanda a quanto già riportato nella sezione dedicata alla Legge 139/1992 – esercizio 1993 – I^ fase.

Legge 515/96 - esercizio 1997 - III^ fase (€ 103.291.379,33, pari a 200 miliardi di lire)

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 103.291.379,33	€ 97.877.847,28	*94,8%*	€ 75.941.274,38	*73,5%*

I fondi di questa Legge sono stati destinati al finanziamento di 70 interventi, di cui 63 rientranti nel settore Fognatura e Depurazione, 2 relativi al settore Territorio, 4 alla Bonifica dei Siti inquinati e 1 appartenente al settore Monitoraggio e Sperimentazione. I finanziamenti ammontano a € 103.291.379,33 ed alla data del 31.12.2006 risultano impegnati per il 94,8% ed erogati per il 73,5%.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	63	43
Acquedotti		
Territorio	2	2
Agricoltura e Zootecnia		
Bonifica siti inquinati	4	
Monitoraggio e sperimentazione	1	
Ospedali		
TOTALE	**70**	**45**

Degli interventi relativi al settore Fognatura e Depurazione, 46 risultano ultimati e/o collaudati. Tra quelli ultimati rientra anche lo *"Scavo dei Rii nel centro storico di Venezia"*.
Tra le opere con lavori in corso si ricorda il progetto di *"Progetto della fognatura del comune di San Biagio di Callalta - Stralcio A"* dell'Azienda Servizi Pubblici Sile Piave S.p.A.
Per tutti gli interventi del 28° Lotto fognature ricadenti nei comuni dell'A.C.M. S.p.A. i lavori risultano, invece, tutti ultimati e/o collaudati.

Tra gli interventi ancora in fase di progettazione rientrano i lavori di *"Restauro della Sede Patriarcale, del Seminario Patriarcale e della Basilica della Salute"* ad opera della Diocesi Patriarcato di Venezia che, come più volte ricordato in precedenza, sono finanziati parzialmente con la riallocazione di fondi delle Leggi n. 798/84, n. 67/88 – Esercizio 1990, n. 139/92 – Esercizio 1993 e di questa Legge, che revoca fondi originariamente destinati al Comune di Venezia. Tali revoche e riassegnazioni dei fondi sono state effettuate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3521 del 12 novembre 2004.

Nel corso del 2006 sono stati ultimati e collaudati i lavori relativi ad una serie di progetti; tra questi:
- Il progetto di *"Integrazione tecnologica dell'impianto di depurazione in Comune di Castelfranco Veneto, località Salvatronda"* di competenza del Comune di Castelfranco Veneto: il Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia n. 142 del 09.10.2006 ha approvato gli atti di contabilità finale.
- Il progetto di *"Ampliamento della rete fognaria nel Comune di Battaglia Terme"* eseguito da E.T.R.A. S.p.A.: il Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia n. 87 del 05.06.2006 ha approvato gli atti di contabilità finale.
- Il progetto di *"Ampliamento della rete fognaria in Comune di Arquà Petrarca"* eseguito dal Comune di Arquà Petrarca: il Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia n. 55 del 20.04.2006 ha approvato gli atti di contabilità finale.

Per quanto riguarda gli interventi del settore Territorio, il progetto di *"Riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Draganziolo nell'area denominata "Oasi" in Comune di Noale per la riduzione dei nutrienti versati nella Laguna di Venezia"* del Comune di Noale (si veda quanto già riportato per la Legge 139/1992 –II^ fase) risulta concluso: il decreto del Dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia n. 11 del 17.07.2006 approva gli atti di contabilità finale. Per quanto riguarda i lavori di *"Miglioramento della efficienza dello scarico delle reti fognarie 1° stralcio - Risanamento e riordino idraulici delle Isole Treportine in comune di Cavallino Treporti"*, del Consorzio di Bonifica Basso Piave, risultano collaudati: il Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Tutela dell'Ambiente n. 191 del 25.10.2005 approva gli atti di contabilità finale.

Infine, per quanto riguarda i lavori di *"Potenziamento della rete di telerilevamento agrometeorologica"* di A.R.P.A.V., i lavori risultano ultimati.

Maggiori e più favorevoli mutui dalle Leggi 539/95 e 515/96 – III^ fase (€ 21.342.612,00, pari a 41,32 miliardi di lire)

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 21.342.612,00	€ 0,00	*0%*	€ 0,00	*0%*

L'ammontare di tali fondi deriva, per € 3.954.248,00 dai maggiori e più favorevoli mutui della Legge 539/95 e per € 17.388.364,00 dai maggiori e più favorevoli mutui della Legge 515/96. Questo finanziamento è stato assegnato ad un unico intervento. Si tratta del Progetto Integrato Fusina. L'utilizzo di questi fondi viene previsto dall'ultimo riparto di spesa, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 24 del 4 maggio 2004.

Legge 515/96 – esercizio 1998 – IV^ fase (€ 60.425.456,52, pari a 117 miliardi di lire)

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 60.425.456,52	€ 56.505.003,98	*93,5%*	€ 48.589.092,20	*80,4%*

I fondi di questa Legge sono stati destinati al finanziamento di 74 interventi, dei quali 73 relativi il settore Fognatura e Depurazione ed 1 relativo al settore Territorio. I finanziamenti ammontano complessivamente ad € 60.425.456,52 ed alla data del 31.12.2006 risultano impegnati per il 93,5% ed erogati per l'80,4%.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	73	44
Acquedotti		
Territorio	1	
Agricoltura e Zootecnia		
Bonifica siti inquinati		
Monitoraggio e sperimentazione		
Ospedali		
TOTALE	**74**	**44**

I 73 interventi del settore Fognatura e Depurazione riguardano opere di fognatura ed ampliamento impianti di depurazione.
Di questi progetti, 47 risultano già collaudati o in fase di collaudo mentre di altri 15 lavori sono in avanzata fase di realizzazione.
La gestione delle opere in fase di esecuzione è affidata principalmente a tre aziende di servizi idrici Integrati: Energia Territorio Risorse Ambientali E.T.R.A. S.p.A., l'Azienda Servizi Pubblici Sile Piave S.p.A. e i Servizi Pubblici Integrati Mogliano, S.P.I.M. S.p.A.

In relazione al progetto relativo all'ampliamento del Centro di biotrattamento del Comune di Camposampiero, ad opera di E.T.R.A. S.p.A., si rimanda a quanto già riportato per la Legge 139/1992 – esercizio 1993 – I^ fase.

Per quanto riguarda il settore Territorio, si tratta di un intervento realizzato dal Magistrato alle Acque di Venezia per "*Il ripristino dei pennelli alle foci di Adige e Brenta*". I lavori risultano, al 31.12.2006, in avanzata fase di realizzazione.

Maggiori e più favorevoli mutui dalla Legge 515/96 – IV^ fase (€ 797.925,91 pari a 1,54 miliardi di lire)

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 797.925,91	€ 774.752,16	97,1%	€ 742.954,85	93,1%

I fondi sono stati destinati alla realizzazione di un'opera rientrante settore Territorio e a due opere relative al settore Monitoraggio. I finanziamenti ammontano complessivamente ad € 797.925,91 ed alla data del 31.12.2006 risultano impegnati per il 97,1% ed erogati per il 93,1%.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione		
Acquedotti		
Territorio	1	1
Agricoltura e Zootecnia		
Bonifica siti inquinati		
Monitoraggio e sperimentazione	2	
Ospedali		
TOTALE	3	1

Il progetto relativo al settore Territorio, di competenza del Consorzio di Bonifica Dese Sile riguarda *"Il completamento e l'adeguamento degli interventi per la riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Zero per il controllo e la riduzione dei nutrienti sversati nella Laguna di Venezia"*. I lavori sono stati collaudati e gli atti sono stati approvati con il Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Tutela Ambiente n. 105 del 8 giugno 2004. Tale intervento fa parte del riparto di spesa approvato dal Consiglio regionale con Deliberazione n. 103 del 18 dicembre 2002.

Legge 345/97 - esercizio 1998 – V^ fase (€ 142.025.647,25, pari a circa 275 miliardi di lire)

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 142.025.647,25	€ 99.627.022,39	*70,1%*	€ 66.148.431,61	*46,6%*

I fondi di questa Legge sono stati destinati al finanziamento di 36 interventi, distribuiti su quasi tutti i settori di intervento, ad esclusione del settore degli Ospedali. Gli interventi riguardano opere di fognatura, impianti di depurazione, di riqualificazione di corsi d'acqua e di bonifica di siti inquinati, opere acquedottistiche ed interventi nel settore agricolo e zootecnico. Infine un progetto è relativo allo "*scavo Rii nel centro storico di Venezia*".

L'importo dei finanziamenti ammonta ad € 142.025.647,25. Alla data del 31.12.2006 i finanziamenti risultano impegnati per il 70,1% ed erogati per il 46,6%.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	10	1
Acquedotti	4	
Territorio	14	1
Agricoltura e Zootecnia	1	
Bonifica siti inquinati	5	1
Monitoraggio e sperimentazione	2	
Ospedali		
TOTALE	**36**	**3**

I progetti di tali interventi risultano quasi tutti approvati ed i lavori sono in corso di realizzazione. Alcuni di questi sono stati sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale.
Per quanto attiene al settore fognatura e depurazione, l'intervento relativo alla "*Fognatura nei comuni di Piove di sacco, Legnaro, Brugine, Polverara, Correzzola, S. Angelo, Pontelongo, Arzergrande*" ad opera dell'Azienda Centro Veneto Servizi è stato collaudato: il Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Tutela Ambiente n. 186 del 23 ottobre 2005 approva la contabilità finale dell'opera.

Per quanto attiene le opere acquedottistiche, il finanziamento a favore dell' "*Acquedotto sostitutivo dei pozzi del Cavallino*", affidato al Consorzio di Bonifica Basso Piave, è stato definitivamente revocato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3521 del 12 novembre 2004, per carenze progettuali. La quota revocata ammonta a € 12.857.632,91 ed è stata così ripartita: la quota più consistente, pari a € 10.857.632,91, è stata assegnata alla Diocesi Patriarcato di Venezia per i "*Lavori di adeguamento igienico sanitario relativi al progetto di restauro della Sede Patriarcale, del Seminario Patriarcale e della Basilica della Salute*", mentre la parte rimanente, pari a € 2.000.000,00, è stata assegnata alla Comunità Ebraica di Venezia sempre per i "*Lavori di adeguamento igienico sanitario relativi al progetto di restauro dell'edificio adibito all'assistenza agli anziani della Comunità Ebraica di Venezia*" che ad oggi risulta in avanzata fase di realizzazione.

I finanziamenti rientranti nel settore Acquedotti riguardano "*L'interconnessione dei sistemi acquedottistici Venezia Chioggia*" nell'ambito di attuazione dello schema del Veneto centrale del Modello Strutturale degli Acquedotti.

Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3968 del 9 novembre 1999 è stato approvato l'Accordo di Programma tra la Regione del Veneto ed il Magistrato alle Acque di

Venezia per la realizzazione degli interventi Torre di Burri e Botte di Conche. Ai sensi del suddetto accordo detti lavori vengono cofinanziati per € 6.197.482,79, pari a 12 miliardi ciascuno, dalla Regione Veneto e dal Magistrato alle Acque di Venezia, che provvede inoltre al coordinamento dell'intervento. Si sottolinea che con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia n. 15 del 20.02.2006 tale progetto è stato finanziato.

Per quanto riguarda il settore Agricoltura e Zootecnia, l'unico intervento finanziato riguarda gli *"Incentivi, modifiche colturali e piani di spargimento e gestione idraulica dei deflussi delle superfici agricole"*, per il quale i lavori sono in corso.

Tra gli interventi di Bonifica di Siti Inquinati nel Bacino Scolante nella Laguna di Venezia, rientra la *"Bonifica delle "Corti femminili" a Mestre"* per opera del Comune di Venezia che è stata collaudata e la *"Bonifica area inquinata localizzata in via Teramo, località Olmo di Borbiago in comune di Mira (VE)"*. Per questo ultimo intervento è stata erogata una quota per la progettazione, che è tuttora in corso.

Gli interventi del settore Monitoraggio e Sperimentazione di competenza dell'A.R.P.A.V. e che riguardano il *"Potenziamento del servizio di analisi ed informazione in campo agro-zootecnico del centro Agroambientale di Castelfranco Veneto"* e il *"Sistema di monitoraggio e controllo della rete idrica scolante nella Laguna di Venezia - estensione del sistema di telecontrollo nel Bacino Scolante"*, sono in avanzata fase di realizzazione.

Legge 448/98 – esercizio 1999-2000-2001 – VI^ fase (€ 235.504.345,32, pari a 456 miliardi di lire)

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 235.504.345,32	€ 167.969.058,63	*71,3%*	€ 109.564.059,55	*46,5%*

Il Consiglio Regionale, con Deliberazione n. 23 del 1 marzo 2000, ha approvato il riparto dei fondi attribuiti dalla Legge n. 448/1999, individuando un cospicuo numero di interventi ed i relativi soggetti attuatori. I finanziamenti ammontano a € 235.504.345,32 e alla data del 31.12.2006 risultano impegnati per il 71,3% ed erogati per il 46,5%.

Si tratta di 118 interventi di cui 80 relativi al settore Fognatura e Depurazione (tra i quali uno relativo allo *scavo Rii nel centro storico di Venezia*), e 12 inerenti al settore Territorio. Gli altri si distribuiscono equamente tra tutti i rimanenti settori, ad esclusione degli Ospedali.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	80	20
Acquedotti	6	
Territorio	12	1
Agricoltura e Zootecnia	5	
Bonifica siti inquinati	8	1
Monitoraggio e sperimentazione	7	
Ospedali		
TOTALE	118	22

Per quanto attiene al settore fognatura e depurazione la maggior parte degli interventi è in corso di realizzazione, 21 interventi sono stati ultimati mentre 20 sono stati collaudati: di questi, nel corso del 2006, sono stati predisposti i decreti di determinazione del contributo definitivo di 14 interventi.

Per quanto attiene al settore Territorio, nel corso del 2005 il progetto "*Sostegni e incremento tempi di ritenzione delle acque del sottobacino Vela: risezionamento corsi d' acqua, manufatti di controllo, nuovi collegamenti e recupero capacità d' invaso nei comuni di S. Biagio di C., Monastier, Roncade*" il cui soggetto attuatore è il Consorzio di Bonifica Destra Piave, è stato collaudato ed il Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Tutela dell'Ambiente n. 157 del 20 settembre 2005 ne approva la contabilità finale.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2122 del 2004 e' stato approvato un Accordo di Programma tra la Regione del Veneto, Comune di Mira ed il Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta per la realizzazione del Parco Lagunare di Mira che consentirà:

a) l'aumento della capacità fitodepurativa del sistema idraulico di scolo, in particolare dello scolo Giare, con interventi di rinaturalizzazione dell'alveo, la creazione di golene sommerse, adeguata piantumazione delle rive e la creazione di alcuni specchi d'acqua avendo come riferimento l'assetto morfologico storico dell'ambito;

b) la creazione nell'estremo sud dell'area, a ridosso della Laguna di Venezia, di un ambito di interesse paesaggistico – naturalistico ed ecologico caratterizzato dalla presenza di un'area umida d'acqua dolce, fruibile anche per attività didattiche e ricreative, compatibilmente con le funzioni agricole presenti;

c) il complessivo miglioramento della qualità paesaggista e ambientale del sito;

In relazione al progetto relativo al centro di biotrattamento di Camposampiero, ad opera di E.T.R.A. S.p.A., si rimanda a quanto già riportato nella sezione dedicata alla Legge 139/1992 – esercizio 1993 – I^ fase.

Legge 488/99 – esercizio 2002-2003 – VII^ fase (€ 205.033.388,33, pari a 397 miliardi di lire)

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 205.033.388,33	€ 118.846.895,12	*58%*	€ 52.237.575,70	*25,5%*

Il Consiglio Regionale, con D.C.R. n. 70 del 27 dicembre 2001, ha approvato il riparto dei fondi (attribuiti dalla Legge n. 448/199 e riallocazione dei fondi assegnati con la Legge n. 345/1997), gli interventi ed i relativi soggetti attuatori, per un totale di € 212.780.242,45.

I fondi di questa Legge sono stati destinati al finanziamento di 116 interventi suddivisi tra i vari settori: in particolare nel settore Fognatura e Depurazione sono compresi 80 interventi, nel Territorio 20, Bonifica Siti Inquinati 11. I finanziamenti ammontano complessivamente ad € 205.033.388,33 e alla data del 31.12.2006 risultano impegnati per il 58% ed erogati per il 25,5%.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	**80**	**6**
Acquedotti	**1**	
Territorio	**20**	
Agricoltura e Zootecnia	**3**	
Bonifica siti inquinati	**11**	
Monitoraggio e sperimentazione	**1**	
Ospedali		
TOTALE	**116**	**6**

Per quanto riguarda l'intervento relativo al *"Progetto Integrato Fusina"* valgono le considerazioni gia riportate in precedenza.
I finanziamenti relativi alla Legge n. 488/1999 sono stati assegnati negli esercizi finanziari 2002-2003, pertanto vi sono ancora interventi in fase di progettazione. Tuttavia ad oggi, per quanto attiene al settore Fognatura e Depurazione il numero degli interventi in fase di realizzazione è costituito da circa 31 opere.

Gli interventi i cui lavori sono già stati ultimati, e dunque sono in fase di collaudo, sono 10. Nel corso del 2006 sono stati emessi i decreti di determinazione del contributo definitivo relativi ad alcuni interventi; tra questi si sottolinea il *"Progetto relativo ai lavori del 31° lotto delle fognature nel comune di S. Maria di Sala e Pianiga"* di competenza dell'Azienda Consorzio del Mirese: il decreto del Dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia n. 199 del 28.11.2006 approva gli atti di contabilità finale.

L'unico intervento del settore Acquedotti fa parte del Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (MO.S.A.V. – Schema del Veneto Centrale) e riguarda il primo stralcio della *"Sistemazione del nodo idrico di Padova e la chiusura dell'anello Venezia-Padova-Cavarzere-Chioggia"*. I lavori di quest'opera sono in corso.

Infine, per quanto riguarda il settore Monitoraggio e Sperimentazione, è stato finanziato un intervento, gestito da A.R.P.A.V., che è inerente al *"Sistema integrato per il monitoraggio ambientale e la gestione del rischio industriale e delle emergenze per l' area di Porto Marghera - SIMAGE II° Lotto"*. I lavori sono in fase di realizzazione.

Leggi n. 388/2000 e 448/2001 – esercizi 2002-2003-2004 – (VIII^ fase € 286.824.446,15)

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 286.824.446,15	€ 106.480.689,83	*37,1%*	€ 23.141.545,02	*8,1%*

Con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 24 del 4 maggio 2004 è stata definita la distribuzione dei fondi del nuovo riparto di spesa. I finanziamenti derivanti dai contratti di mutuo stipulati per le Leggi n. 388/2000 e n. 448/2001 ammontano complessivamente a € 286.824.446,15 (di cui € 97.701.446,15 dalla Legge n. 388/2000 e € 189.123.000,00 dalla Legge n. 448/2001). A tale proposito si sottolinea che il riparto approvato ha individuato interventi urgenti da finanziare con fondi nuovi per un importo complessivo di € 308.657.387,00 con un'eccedenza di € 21 mln rispetto al finanziato

Questo ultimo riparto gestisce inoltre anche fondi provenienti dalla riallocazione di finanziamenti originariamente destinati dalla Legge n. 139/92 – II fase, per una quota pari a € 12.181.000,00. Si aggiungono, inoltre, i fondi derivanti dai migliori e più favorevoli mutui dalle Leggi n. 539/95 e n. 515/96 – III fase, per un ammontare di € 21.342.612,00, di cui si è già detto nelle sezioni corrispondenti.

Alla data del 31.12.2006 i finanziamenti risultano impegnati per il 37,1% ed erogati per l' 8,1%.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	107	
Acquedotti	1	
Territorio	51	1
Agricoltura e Zootecnia	7	
Bonifica siti inquinati	12	
Monitoraggio e sperimentazione	8	
Ospedali	1	
TOTALE	**187**	**1**

Gli interventi avviati con questo ultimo riparto sono 187, gran parte rientranti nei settori Fognatura e Depurazione e Territorio.

Un'elevata percentuale dei progetti si trova ancora in fase di progettazione, vista la recente assegnazione dei finanziamenti anche se nel corso del 2006 è stato emesso il provvedimento di impegno per numerosi interventi.

In particolare si sottolinea che i finanziamenti assegnati ai Consorzi di Bonifica sono stati destinati soprattutto per la copertura delle maggiori spese, relative a progetti già finanziati, che gli stessi Consorzi devono sostenere a seguito dell'aumento delle indennità di esproprio.

Per quanto riguarda il settore Fognatura e Depurazione, si rileva che il *Progetto Integrato Fusina*, beneficia, in questo riparto, di un finanziamento complessivo pari a € 65.276.000,00.

Per il settore Bonifica Siti Inquinati nel Bacino Scolante sono stati assegnati € 11.000.000,00.

Con la deliberazione della Giunta Regionale n. 4529/04 sono stati individuati i soggetti attuatori che potranno disporre di fondi per la realizzazione di opere di bonifica di aree precedentemente occupate da discariche, inceneritori, attività industriali. Tra questi vi sono nuovi soggetti attuatori, tra cui la Provincia di Padova per la realizzazione dell'

"Intervento di bonifica in via sostitutiva dell'ex area Promofin in comune di Piombino Dese".

Si prevede inoltre di stanziare € 3.000.000,00 per la bonifica del Basso Corso del Fiume Marzenego – Osellino, alla presentazione da parte del Consorzio di Bonifica Dese Sile del relativo progetto.

A Veneto Acque S.p.A sono stati assegnati € 20.000.000,00 nell'ambito *"del Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto – Schema Veneto Centrale, segmento del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia"*. Tale progetto si trova in fase di realizzazione.

PAGINA BIANCA



giunta regionale

Segreteria Regionale all'Ambiente e Territorio
Direzione Progetto Venezia
Servizio Legge Speciale per Venezia



QUADRO DI SINTESI

SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

SUDDIVISO PER LEGGI DI FINANZIAMENTO E SOGGETTI ATTUATORI

Aggiornamento al 31 dicembre 2006

PAGINA BIANCA

SUDDIVISIONE PER LEGGE DI FINANZIAMENTO E PER SETTORI DI INTERVENTO AL 31.12.2006

	Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	29.954.500,15	28.823.874,50	24.160.777,60
2	Acquedotti	5.164.568,99	5.164.568,99	1.753.033,60
3	Ospedali	6.197.482,79	6.197.482,79	6.197.482,79
	TOTALE	41.316.551,93	40.185.926,28	32.111.293,99

	Legge 910/86 Es. 1987-1988	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	45.448.207,37	41.310.120,38	40.090.303,60
2	Acquedotti	1.032.913,80	1.032.913,80	788.453,77
3	Ospedali	5.164.568,99	5.164.568,99	5.164.568,99
	TOTALE	51.645.690,16	47.507.603,17	46.043.326,36

	Legge 910/86 Es. 1989	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	32.020.327,74	30.994.916,50	25.025.722,64
2	Acquedotti	4.131.655,19	4.131.655,19	0
3	Ospedali	2.582.284,50	2.582.284,50	2.582.284,50
	TOTALE	38.734.267,43	37.708.856,19	27.608.007,14

	Legge 67/88 Es. 1988	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	8.005.081,93	1.522.852,42	1.522.852,43
2	Acquedotti	10.329.137,98	10.329.137,98	3.956.059,85
3	Ospedali	0	0	0
	TOTALE	18.334.219,92	11.851.990,41	5.478.912,28

	Legge 67/88 Es. 1990	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	53.969.745,95	51.858.671,85	36.215.404,36
2	Acquedotti	0	0	0
3	Ospedali	0	0	0
	TOTALE			

	Legge 67/88 Es. 1991	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	15.803.581,16	15.803.581,11	15.357.106,61
2	Acquedotti	0	0	0
3	Ospedali	0	0	0
	TOTALE	15.803.581,16	15.803.581,11	15.357.106,61

	Legge 67/88 Es. 1992 - I^ tranche	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	15.338.769,90	11.819.744,67	9.806.345,11
2	Acquedotti	0	0	0
3	Ospedali	0	0	0
	TOTALE	15.338.769,90	11.819.744,67	9.806.345,11

	Legge 67/88 Es. 1992 - II^ tranche	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	30.987.413,94	24.782.680,22	15.159.182,31
2	Acquedotti	0	0	0
3	Ospedali	0	0	0
	TOTALE	30.987.413,94	24.782.680,22	15.159.182,31

	Legge 360/91	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	8.263.310,39	5.398.763,42	3.803.309,92
2	Acquedotti	0	0	0
3	Ospedali	0	0	0
	TOTALE	8.263.310,39	5.398.763,42	3.803.309,92

	Legge 139/92 Es. 1993	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	180.759.914,68	178.483.372,67	152.252.543,22
2	Acquedotti	0	0	0
3	Ospedali	0	0	0
	TOTALE	180.759.914,68	178.483.372,67	152.252.543,22

	Legge 139/92 II fase	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	165.266.208,31	111.156.058,62	87.256.521,10
2	Acquedotti	0	0	0
3	Ospedali	0	0	0
	TOTALE	165.266.208,31	111.156.058,62	87.256.521,10

	Legge 139/92 Magg. Mutui II^fase	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	40.349.825,52	31.833.865,52	12.331.249,40
2	Acquedotti	0	0	0
3	Ospedali	0	0	0
	TOTALE	40.349.825,52	31.833.865,52	12.331.249,40

	Legge 539/95 Es. 1996	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	15.493.706,97	15.493.706,97	14.889.859,95
2	Acquedotti	0	0	0
3	Ospedali	0	0	0
	TOTALE	15.493.706,97	15.493.706,97	14.889.859,95

	Legge 539/95 Es. 1997	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	27.630.444,11	27.630.444,10	27.437.327,96
2	Acquedotti	0	0	0
3	Ospedali	3.356.969,84	3.356.969,84	3.317.410,03
	TOTALE	30.987.413,95	30.987.413,95	30.754.737,99

	Legge 539-95 Magg. Mutui III fase	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	21.342.612,00	0,00	0,00
2	Acquedotti	0	0	0
3	Ospedali	0	0	0
	TOTALE	21.342.612,00	0,00	0,00

	Legge 515/96 Es. 1997	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	103.291.379,33	97.877.847,28	75.941.274,38
2	Acquedotti	0	0	0
3	Ospedali	0	0	0
	TOTALE	103.291.379,33	97.877.847,28	75.941.274,38

	Legge 515/96 Es. 1998	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	60.425.456,52	56.505.003,98	48.589.092,20
2	Acquedotti	0	0	0
3	Ospedali	0	0	0
	TOTALE	60.425.456,52	56.505.003,98	48.589.092,20

	Legge 515/96 Magg. Mutui IV^fase	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	797.925,91	774.752,16	742.954,85
2	Acquedotti	0	0	0
3	Ospedali	0	0	0
	TOTALE	797.925,91	774.752,16	742.954,85

	Legge 345/97 Es. 1998	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	119.351.045,51	76.952.420,64	46.313.829,86
2	Acquedotti	22.674.601,75	22.674.601,75	19.834.601,75
3	Ospedali	0	0	0
	TOTALE	142.025.647,26	99.627.022,39	66.148.431,61

	Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	201.934.646,87	145.354.443,95	89.695.371,00
2	Acquedotti	33.569.698,45	22.614.614,68	19.868.688,55
3	Ospedali	0	0	0
	TOTALE	235.504.345,32	167.969.058,63	109.564.059,55

	Legge 488/99 Es. 2002, 2003	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	194.704.250,35	108.517.757,14	49.138.834,30
2	Acquedotti	10.329.137,98	10.329.137,98	3.098.741,40
3	Ospedali	0	0	0
	TOTALE	205.033.388,33	118.846.895,12	52.237.575,70

	Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002/03/04	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	263.824.446,15	99.865.748,97	17.141.545,02
2	Acquedotti	20.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
3	Ospedali	3.000.000,00	614.940,86	0
	TOTALE	286.824.446,15	106.480.689,83	23.141.545,02

SINTESI

	TOTALE LEGGI FINANZIAMENTO	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	1.634.962.800,76	1.162.760.627,08	792.871.407,82
2	Acquedotti	107.231.714,14	82.276.630,38	55.299.578,92
3	Ospedali	20.301.306,12	17.916.246,98	17.261.746,31
	TOTALE	1.762.495.821,02	1.262.953.504,44	865.432.733,05

ELENCO DEI FINANZIAMENTI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA, ORDINATO PER SOGGETTO ATTUATORE

nr.	ENTE	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Azienda Consorzio del Mirese (A.C.M.)	102.630.686,01	96.219.716,82	77.951.283,41
2	Azienda Piovese Gestione Acque (A.P.G.A.)	46.442.369,96	39.302.002,70	26.294.703,05
3	Azienda Servizi Idrici della Castellana	10.433.025,89	10.433.025,89	8.393.868,18
4	Azienda Servizi Pubblici Sile Piave s.p.a	23.019.854,39	22.023.695,78	11.560.629,71
5	Energia Territorio Risorse Ambientali (E.T.R.A.)	164.741.942,84	145.535.140,60	105.472.088,01
6	Centro Veneto Servizi	48.929.293,36	48.929.293,36	22.647.988,28
7	Azienda Brenta Servizi	2.685.720,00	0,00	0,00
8	Azienda S.P.I.M.	3.403.084,50	3.403.084,50	2.324.056,05
9	A.S.P. di Chioggia	70.964.551,95	56.694.031,72	48.578.206,52
10	Consorzio Schievenin Alto Trevigiano	7.360.000,00	0,00	0,00
11	VESTA - Venezia Servizi Territoriali Ambientali	26.539.690,65	15.952.324,22	1.508.223,80
12	Comune di Arquà Petrarca	2.065.827,60	2.065.827,60	2.053.264,57
13	Comune di Campodarsego	5.082.284,50	2.582.284,50	159.380,45
14	Comune di Castelfranco Veneto	6.610.648,31	6.314.045,61	2.950.773,37
15	Comune di Cavallino	11.470.939,69	8.153.939,69	6.042.545,72
16	Comune di Cavarzere	7.488.625,04	7.488.091,86	7.125.198,56
17	Comune di Codevigo	3.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70
18	Comune di Cornuda	943.675,00	943.675,00	796.822,25
19	Comune di Este	2.102.237,80	2.102.237,80	1.553.655,93
20	Comune di Fossò	914.684,42	914.684,42	683.256,00
21	Comune di Galzignano	965.774,40	965.774,40	893.715,01
22	Comune di Jesolo / A.S.I.	5.986.029,80	5.983.446,81	5.905.536,84
23	Comune di Marcon	1.859.244,84	1.859.244,84	1.798.166,92
24	Comune di Meolo	1.032.913,80	1.032.913,80	981.268,11
25	Comune di Mira	4.168.489,67	113.620,50	113.620,50
26	Comune di Mogliano Veneto	6.352.419,86	6.352.419,86	5.871.302,30
27	Comune di Monastier	1.549.370,70	1.549.370,70	1.401.642,79
28	Comune di Monselice	8.749.272,61	8.749.272,61	6.324.061,28
29	Comune di Morgano	3.550.387,08	3.550.387,09	3.155.070,11

aggiornamento al 31/12/2006

nr.	ENTE	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
30	Comune di Musile di Piave	2.815.655,85	2.815.655,85	2.811.065,80
31	Comune di Noale	3.408.615,60	2.200.106,40	2.135.465,91
32	Comune di Padova	2.065.827,60	2.065.827,60	2.065.827,60
33	Comune di Piove di Sacco	3.615.198,29	3.615.198,29	3.615.193,13
34	Comune di Preganziol	1.807.599,15	1.807.599,15	1.587.431,09
35	Comune di Quarto d'Altino	5.422.797,44	5.422.797,44	5.100.289,25
36	Comune di Salzano	2.400.000,00	2.400.000,00	160.056,69
37	Comune di Spinea	500.000,00	0,00	0,00
38	Comune di Tezze sul Brenta	1.250.000,00	575.000,00	75.000,00
39	Comune di Venezia /VE.S.T.A.	384.982.881,91	302.420.309,34	203.264.003,08
40	Comune di Zero Branco	2.275.827,60	2.275.827,60	2.099.866,58
41	Consorzio di bonifica Adige – Bacchiglione	60.948.350,98	36.265.638,64	23.887.558,69
42	Consorzio di bonifica Basso Piave	4.323.102,82	1.344.931,82	1.344.881,11
43	Consorzio di bonifica Brenta – Bacchiglione	38.454.963,95	16.596.746,31	5.194.114,02
44	Consorzio di bonifica Brentella di Pederobba	9.843.748,75	7.663.748,75	613.796,31
45	Consorzio di bonifica Dese – Sile	74.250.513,00	35.060.968,92	23.201.280,89
46	Consorzio di bonifica Destra Piave	6.148.112,09	2.117.473,29	2.117.473,29
47	Consorzio di bonifica Sinistra – medio Brenta	32.700.196,14	17.239.912,15	6.097.580,73
48	Regione – Bonifiche siti Inquinati	23.182.229,88	10.324.053,88	9.759.378,80
49	Regione – Acquedotti / Delta Po	10.974.709,11	19.625,36	19.625,36
50	Regione – Disinquinamento / C.V.D.	141.007.818,78	53.990.471,91	42.399.717,02
51	Regione – Foreste/Agricoltura/Zootecnia	145.023.411,72	95.887.979,50	57.270.748,59
52	Veneto Acque S.p.A.	79.121.154,18	65.121.154,18	41.915.864,69
53	Veneto Agricoltura	5.200.000,00	1.900.000,00	200.000,00
54	ARPAV	25.584.352,93	25.506.175,57	20.774.544,55
55	Autorità portuale di Venezia	516.450,00	516.450,00	0,00
56	Azienda Speciale Porto di Chioggia	2.500.000,00	615.040,00	0,00
57	Ente di bacino R.S.U. VE 2	24.810.938,04	22.310.938,04	22.310.938,04
58	Magistrato alle Acque di Venezia	18.738.581,52	15.774.740,04	6.053.184,32
59	Provincia di Padova	400.000,00	0,00	0,00

nr.	ENTE	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
60	Provincia di Venezia	2.000.000,00	0,00	0,00
61	S.A.V.E. - Servizi Aeroportuali di Venezia	6.610.000,00	0,00	0,00
62	U.S.S.L. n.12 – Venezia/Disinquinamento	2.840.512,94	2.840.512,95	2.024.054,16
62a	U.S.S.L. n.12 – Venezia/Ospedali	20.301.306,12	17.916.246,98	17.261.746,32
63	A.S.L. n. 15 Alta Padovana	1.039.000,00	0,00	0,00
64	U.S.S.L. n.17 - Este-Monselice	1.523.142,25	1.291.142,25	1.285.164,00
65	Abbazia di San Giorgio Maggiore	286.582,76	286.582,76	278.532,97
66	Comunità Ebraica di Venezia	2.000.000,00	2.000.000,00	1.800.000,00
67	Diocesi Patriarcato di Venezia	25.765.143,00	1.214.400,00	478.500,00
68	Parrocchia Ognissanti	800.000,00	800.000,00	200.771,61
69	Associazione Teatro Stabile del Veneto "Goldoni"	455.000,00	0,00	0,00
70	Enti Vari (Fondo rotazione progetti)	2.009.681,29	1.987.326,15	1.939.380,08
	TOTALI	1.762.495.821,04	1.262.953.504,04	865.432.733,06

IMPORTI DEI FINANZIAMENTI ATTRIBUITI AI SOGGETTI ATTUATORI, ORDINATI PER ENTE

nr.	ENTE	Leggi di finanziamento	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Note
1	Azienda Consorzio del Mirese (A.C.M.)	Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986	2.582.284,50	2.582.284,50	2.562.101,11	
		Legge 910/86 Es. 1989	9.296.224,18	9.296.224,18	9.141.287,11	
		Legge 67/88 Es. 1990	516.456,90	516.456,90	446.735,22	
		Legge 67/88 Es. 1992 - I^ tranche	4.131.655,19	2.936.686,00	941.242,92	
		Legge 139/92 Es. 1993	30.987.413,95	30.987.413,95	30.975.991,34	
		Legge 539/95 Es. 1996	2.530.638,81	2.530.638,81	2.530.638,80	
		Legge 515/96 Es. 1997	10.329.137,98	10.329.137,98	10.204.842,36	
		Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase	5.939.254,34	5.939.254,34	5.869.873,50	
		Legge 345/97 Es. 1998 - V fase	1.795.000,00	1.795.000,00	80.045,49	
		Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase	7.746.853,49	7.746.853,49	7.101.295,06	
		Legge 488/99 Es. 2002, 2003	13.582.016,94	9.019.766,68	7.458.924,62	
		Legge 139/92 Magg. Mutui II^fase	2.500.000,00	2.500.000,00	387.750,29	
		Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004	10.693.749,74	10.040.000,00	250.555,58	
		Totali	102.630.686,01	96.219.716,82	77.951.283,41	
		Totali	**102.630.686,01**	**96.219.716,82**	**77.951.283,41**	
2	Azienda Piovese Gestione Acque (A.P.G.A.)	Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986	1.291.142,25	1.291.142,25	1.285.338,08	
		Legge 67/88 Es. 1992 - I^ tranche	1.652.662,08	1.652.662,08	1.652.662,08	
		Legge 139/92 Es. 1993	3.098.741,40	3.098.741,40	3.098.740,68	
		Legge 139/92 II fase	2.582.284,44	2.582.284,44	2.582.284,44	
		Legge 539/95 Es. 1996	4.441.529,33	4.441.529,33	4.425.033,85	
		Legge 515/96 Es. 1997	7.746.853,49	7.746.853,49	7.746.853,49	
		Legge 345/97 Es. 1998 - V fase	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	
		Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase	6.610.648,31	6.610.281,05	3.954.419,74	
		Legge 488/99 Es. 2002, 2003	10.329.137,98	10.329.137,98	0,00	
		Legge 139/92 Magg. Mutui II^fase	1.540.000,00	0,00	0,00	
		Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004	5.600.000,00	0,00	0,00	
		Totali	46.442.369,96	39.302.002,70	26.294.703,05	
		Totali	**46.442.369,96**	**39.302.002,70**	**26.294.703,05**	
3	Azienda Servizi Idrici della Castellana	Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase	1.032.913,80	1.032.913,80	966.608,02	
		Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	
		Legge 488/99 Es. 2002, 2003	3.098.741,39	3.098.741,39	3.077.402,97	
		Legge 139/92 Magg. Mutui II^fase	3.500.000,00	3.500.000,00	2.800.486,49	
		Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004	1.252.000,00	1.252.000,00	0,00	
		Totali	10.433.025,89	10.433.025,89	8.393.868,18	
		Totali	**10.433.025,89**	**10.433.025,89**	**8.393.868,18**	

nr.	ENTE	Leggi di finanziamento	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Note
4	Azienda Servizi Pubblici Sile - Piave S.p.A.	Legge 515/96 Es. 1997	1.549.370,70	1.549.370,70	115.508,77	
		Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase	7.488.625,04	7.488.625,04	5.212.539,25	
		Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 – VI fase	4.441.529,34	4.441.529,34	3.943.090,06	
		Legge 488/99 Es. 2002, 2003	4.441.529,31	3.949.370,70	1.178.041,38	
		Legge 139/92 Magg. Mutui II^fase	2.800.000,00	2.296.000,00	1.111.450,25	
		Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004	2.298.800,00	2.298.800,00	0,00	
		Totali	23.019.854,39	22.023.695,78	11.560.629,71	
		Totali	23.019.854,39	22.023.695,78	11.560.629,71	
5	Azienda Servizi Territoriali Ambientali (SE.T.A.)	Legge 139/92 Magg. Mutui II^fase	8.840.000,00	5.265.000,00	0,00	
		Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004	19.283.600,00	7.191.086,20	252.190,06	
		Totali	28.123.600,00	12.456.086,20	252.190,06	
		Totali	28.123.600,00	12.456.086,20	252.190,06	
5a	Azienda Consorzio del Tergola	Legge 67/88 Es. 1991	3.615.198,29	3.615.198,29	3.615.198,29	
		Legge 139/92 Es. 1993	29.438.043,25	29.438.043,25	29.437.215,74	
		Legge 539/95 Es. 1996	2.065.827,60	2.065.827,60	2.065.827,59	
		Legge 539/95 Es. 1997	17.714.471,64	17.714.471,64	17.714.471,64	
		Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase	20.038.527,00	19.556.618,68	15.194.583,51	
		Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase	10.380.783,66	9.864.326,77	8.089.654,69	
		Legge 488/99 Es. 2002, 2003	11.362.051,78	10.615.058,76	2.959.155,63	
		Totali	94.614.903,23	92.869.544,99	79.076.107,09	
		Totali	94.614.903,23	92.869.544,99	79.076.107,09	
5b	Azienda Consorzio Alta Servizi	Legge 67/88 Es. 1992 - II^ tranche	3.873.426,74	3.873.426,74	3.873.404,07	
		Legge 139/92 II fase	4.286.592,26	4.286.592,26	4.286.592,27	
		Legge 539/95 Es. 1997	1.652.662,08	1.652.662,08	1.652.662,08	
		Legge 515/96 Es. 1997	2.840.512,95	2.840.512,95	2.801.668,82	
		Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase	5.835.962,96	5.835.962,96	5.835.962,96	
		Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase	7.746.853,49	7.746.853,49	5.744.298,99	
		Legge 488/99 Es. 2002, 2003	10.329.137,98	10.329.137,98	0,00	
		Totali	36.565.148,46	36.565.148,46	24.194.589,19	
		Totali	36.565.148,46	36.565.148,46	24.194.589,19	
5c	Azienda Consorzio Acquedotto Euganeo Berico	Legge 539/95 Es. 1997	428.659,23	428.659,23	428.659,23	
		Legge 515/96 Es. 1997	568.102,59	568.102,59	550.970,88	
		Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase	1.032.913,80	1.032.913,80	929.622,42	
		Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase	1.342.787,94	529.367,00	0,00	

nr.	ENTE	Leggi di finanziamento	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Note
		Legge 488/99 Es. 2002, 2003	2.065.827,60	1.085.318,35	39.949,14	
		Totali	5.438.291,15	3.644.360,96	1.949.201,67	
		Totali	**5.438.291,15**	**3.644.360,96**	**1.949.201,67**	
6	**Azienda speciale consorziale Centro Veneto Servizi**	Legge 67/88 Es. 1992 - II^ tranche	5.164.568,99	5.164.568,99	4.161.493,74	
		Legge 515/96 Es. 1997	5.939.254,34	5.939.254,34	5.939.254,34	
		Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase	6.662.294,00	6.662.294,00	6.004.069,45	
		Legge 345/97 Es. 1998 - V fase	8.779.767,28	8.779.767,28	5.783.239,89	
		Legge 448/98 Es. 1999,2000, 2001	1.254.732,05	1.254.732,05	0,00	
		Legge 488/99 Es. 2002, 2003	2.582.284,50	2.582.284,50	395.103,55	
		Legge 139/92 Magg. Mutui II^fase	7.857.086,20	7.857.086,20	43.295,72	
		Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004	10.689.306,00	10.689.306,00	321.531,59	
		Totali	48.929.293,36	48.929.293,36	22.647.988,28	
		Totali	**48.929.293,36**	**48.929.293,36**	**22.647.988,28**	
7	**Azienda Brenta Servizi**	Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004	2.685.720,00	0,00	0,00	
		Totali	2.685.720,00	0,00	0,00	
		Totali	**2.685.720,00**	**0,00**	**0,00**	
8	**Azienda S.P.I.M.**	Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986	516.456,90	516.456,90	516.456,90	
		Legge 910/86 Es. 1989	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	
		Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase	516.456,90	516.456,90	258.228,45	
		Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004	820.800,00	820.800,00	0,00	
		Totali	3.403.084,50	3.403.084,50	2.324.056,05	
		Totali	**3.403.084,50**	**3.403.084,50**	**2.324.056,05**	
9	**Azienda Schievenin Alto Trevigiano**	Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004	7.360.000,00	0,00	0,00	
		Totali	7.360.000,00	0,00	0,00	
		Totali	**7.360.000,00**	**0,00**	**0,00**	
10	**A.S.P. di Chioggia - Fognature , Depurazione e Acquedotti**	Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986	4.957.986,23	4.957.986,23	4.808.039,83	
		Legge 910/86 Es. 1987-1988	1.032.913,80	1.032.913,80	788.453,77	
		Legge 910/86 Es. 1989	5.164.568,99	5.164.568,99	5.164.568,99	
		Legge 67/88 Es. 1988	1.394.433,63	1.394.433,63	1.275.648,54	
		Legge 67/88 Es. 1990	7.493.789,61	7.493.789,61	7.247.877,57	
		Legge 67/88 Es. 1991	516.456,90	516.456,90	514.127,07	
		Legge 139/92 Es. 1993	5.164.568,99	5.164.568,99	1.687.685,72	
		Legge 539/95 Es. 1996	4.906.340,54	4.906.340,54	4.318.989,01	
		Legge 539/95 Es. 1997	1.446.079,32	1.446.079,32	1.385.755,21	

nr.	ENTE	Leggi di finanziamento	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Note
		Legge 515/96 Es. 1997	10.329.137,99	10.201.137,99	8.726.337,01	
		Legge 345/97 Es. 1998 - V fase	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	
		Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase	12.394.965,58	9.812.681,08	9.450.000,00	
		Legge 488/99 Es. 2002, 2003	8.263.310,39	2.703.074,65	1.310.723,81	
		Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004	6.000.000,00	0,00	0,00	
		Totali	70.964.551,95	56.694.031,72	48.578.206,52	
		Totali	**70.964.551,95**	**56.694.031,72**	**48.578.206,52**	
11	**Comune di Arquà Petrarca**	Legge 139/92 Es. 1993	516.456,90	516.456,90	513.763,48	
		Legge 515/96 Es. 1997	1.549.370,70	1.549.370,70	1.539.501,09	
		Totali	2.065.827,60	2.065.827,60	2.053.264,57	
		Totali	**2.065.827,60**	**2.065.827,60**	**2.053.264,57**	
12	**Comune di Campodarsego**	Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase	2.582.284,50	2.582.284,50	159.380,45	
		Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004	2.500.000,00	0,00	0,00	
		Totali	5.082.284,50	2.582.284,50	159.380,45	
		Totali	**5.082.284,50**	**2.582.284,50**	**159.380,45**	
13	**Comune di Castelfranco Veneto**	Legge 515/96 Es. 1997	1.446.079,32	1.446.079,32	1.178.114,61	
		Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase	258.228,45	0,00	0,00	
		Legge 488/99 Es. 2002, 2003	4.906.340,55	4.867.966,29	1.772.658,76	
		Totali	6.610.648,31	6.314.045,61	2.950.773,37	
		Totali	**6.610.648,31**	**6.314.045,61**	**2.950.773,37**	
14	**Comune di Cavallino**	Legge 515/96 Es. 1997	4.648.112,09	4.648.112,09	4.648.112,09	
		Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase	1.032.913,80	1.032.913,80	464.811,21	
		Legge 488/99 Es. 2002, 2003	1.549.913,80	1.032.913,80	929.622,42	
		Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004	4.240.000,00	1.440.000,00	0,00	
		Totali	11.470.939,69	8.153.939,69	6.042.545,72	
		Totali	**11.470.939,69**	**8.153.939,69**	**6.042.545,72**	
15	**Comune di Cavarzere**	Legge 67/88 Es. 1992 - I^ tranche	1.291.142,25	1.291.142,25	1.289.946,52	
		Legge 515/96 Es. 1997	1.549.370,70	1.549.370,70	1.347.068,14	
		Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase	1.549.370,70	1.549.370,70	1.532.180,55	
		Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase	2.065.827,60	2.065.827,60	2.059.253,98	
		Legge 488/99 Es. 2002, 2003	1.032.913,80	1.032.380,62	896.749,37	
		Totali	7.488.625,04	7.488.091,86	7.125.198,56	
		Totali	**7.488.625,04**	**7.488.091,86**	**7.125.198,56**	

nr.	ENTE	Leggi di finanziamento	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Note
16	Comune di Codevigo	Legge 67/88 Es. 1990	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	
		Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004	2.000.000,00	0,00	0,00	
		Totali	3.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	
		Totali	3.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	
17	Comune di Cornuda	Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004	943.675,00	943.675,00	796.822,25	
		Totali	943.675,00	943.675,00	796.822,25	
		Totali	943.675,00	943.675,00	796.822,25	
18	Comune di Este	Legge 515/96 Es. 1997	1.291.142,25	1.291.142,25	1.162.028,02	
		Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase	811.095,55	811.095,55	391.627,91	
		Totali	2.102.237,80	2.102.237,80	1.553.655,93	
		Totali	2.102.237,80	2.102.237,80	1.553.655,93	
19	Comune di Fossò	Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase	634.684,42	634.684,42	634.684,42	
		Legge 488/99 Es. 2002, 2003	280.000,00	280.000,00	48.571,58	
		Totali	914.684,42	914.684,42	683.256,00	
		Totali	914.684,42	914.684,42	683.256,00	
20	Comune di Galzignano	Legge 539/95 Es. 1997	346.026,12	346.026,12	274.003,05	
		Legge 515/96 Es. 1997	619.748,28	619.748,28	619.711,96	
		Totali	965.774,40	965.774,40	893.715,01	
		Totali	965.774,40	965.774,40	893.715,01	
21	Comune di Jesolo / A.S.I.	Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986	1.291.142,25	1.291.142,25	1.282.148,91	
		Legge 910/86 Es. 1987-1988	563.232,36	563.232,36	562.617,11	
		Legge 67/88 Es. 1990	4.131.655,19	4.129.072,20	4.060.770,82	
		Totali	5.986.029,80	5.983.446,81	5.905.536,84	
		Totali	5.986.029,80	5.983.446,81	5.905.536,84	
22	Comune di Marcon	Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986	309.874,14	309.874,14	309.565,20	
		Legge 539/95 Es. 1997	1.549.370,70	1.549.370,70	1.488.601,72	
		Totali	1.859.244,84	1.859.244,84	1.798.166,92	
		Totali	1.859.244,84	1.859.244,84	1.798.166,92	
23	Comune di Meolo	Legge 67/88 Es. 1991	516.456,90	516.456,90	464.811,21	
		Legge 515/96 Es. 1997	516.456,90	516.456,90	516.456,90	

nr.	ENTE	Leggi di finanziamento	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Note
		Totali	1.032.913,80	1.032.913,80	981.268,11	
		Totali	1.032.913,80	1.032.913,80	981.268,11	
24	Comune di Mira	Legge 345/97 Es. 1998 - V fase	1.136.205,18	113.620,50	113.620,50	
		Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase	2.582.284,50	0,00	0,00	
		Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004	450.000,00	0,00	0,00	
		Totali	4.168.489,67	113.620,50	113.620,50	
		Totali	4.168.489,67	113.620,50	113.620,50	
25	Comune di Mogliano Veneto	Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986	671.393,97	671.393,97	610.414,64	
		Legge 139/92 Es. 1993	3.098.741,39	3.098.741,39	2.755.972,37	
		Legge 515/96 Es. 1997	2.582.284,50	2.582.284,50	2.504.915,29	
		Totali	6.352.419,86	6.352.419,86	5.871.302,30	
		Totali	6.352.419,86	6.352.419,86	5.871.302,30	
26	Comune di Monastier	Legge 515/96 Es. 1997	1.549.370,70	1.549.370,70	1.401.642,79	
		Totali	1.549.370,70	1.549.370,70	1.401.642,79	
		Totali	1.549.370,70	1.549.370,70	1.401.642,79	
27	Comune di Monselice	Legge 139/92 Es. 1993	2.582.284,50	2.582.284,50	2.582.284,50	
		Legge 515/96 Es. 1997	2.582.284,50	2.582.284,50	2.575.114,19	
		Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase	774.685,35	774.685,35	753.823,33	
		Legge 488/99 Es. 2002, 2003	2.810.018,27	2.810.018,27	412.839,26	
		Totali	8.749.272,61	8.749.272,61	6.324.061,28	
		Totali	8.749.272,61	8.749.272,61	6.324.061,28	
28	Comune di Morgano	Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.142,25	
		Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase	1.032.913,80	1.032.913,80	912.603,73	
		Legge 488/99 Es. 2002, 2003	826.331,04	826.331,04	639.248,81	
		Legge 139/92 Magg. Mutui II^fase	400.000,00	400.000,00	312.075,32	
		Totali	3.550.387,08	3.550.387,09	3.155.070,11	
		Totali	3.550.387,08	3.550.387,09	3.155.070,11	
29	Comune di Musile di Piave	Legge 910/86 Es. 1987-1988	543.245,49	543.245,49	543.245,49	
		Legge 67/88 Es. 1990	2.065.827,60	2.065.827,60	2.061.237,55	
		Legge 515/96 Es. 1997	206.582,76	206.582,76	206.582,76	
		Totali	2.815.655,85	2.815.655,85	2.811.065,80	
		Totali	2.815.655,85	2.815.655,85	2.811.065,80	

nr.	ENTE	Leggi di finanziamento	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Note
30	Comune di Noale	Legge 515/96 Es. 1997	1.291.142,25	1.291.142,25	1.289.814,72	
		Legge 139/92 II fase	774.685,35	774.685,35	774.685,35	
		Legge 488/99 Es. 2002, 2003	1.342.788,00	134.278,80	70.965,84	
		Totali	3.408.615,60	2.200.106,40	2.135.465,91	
		Totali	3.408.615,60	2.200.106,40	2.135.465,91	
31	Comune di Padova	Legge 515/96 Es. 1997	2.065.827,60	2.065.827,60	2.065.827,60	
		Totali	2.065.827,60	2.065.827,60	2.065.827,60	
		Totali	2.065.827,60	2.065.827,60	2.065.827,60	
32	Comune di Piove di Sacco	Legge 139/92 Es. 1993	3.615.198,29	3.615.198,29	3.615.193,13	
		Totali	3.615.198,29	3.615.198,29	3.615.193,13	
		Totali	3.615.198,29	3.615.198,29	3.615.193,13	
33	Comune di Preganziol	Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase	774.685,35	774.685,35	761.531,09	
		Legge 488/99 Es. 2002, 2003	1.032.913,80	1.032.913,80	825.900,00	
		Totali	1.807.599,15	1.807.599,15	1.587.431,09	
		Totali	1.807.599,15	1.807.599,15	1.587.431,09	
34	Comune di Quarto d'Altino	Legge 910/86 Es. 1987-1988	774.685,35	774.685,35	774.685,35	
		Legge 67/88 Es. 1990	2.582.284,50	2.582.284,50	2.259.776,30	
		Legge 139/92 Es. 1993	2.065.827,60	2.065.827,60	2.065.827,60	
		Totali	5.422.797,44	5.422.797,44	5.100.289,25	
		Totali	5.422.797,44	5.422.797,44	5.100.289,25	
35	Comune di Salzano	Legge 488/99 Es. 2002, 2003	2.400.000,00	2.400.000,00	160.056,69	
		Totali	2.400.000,00	2.400.000,00	160.056,69	
		Totali	2.400.000,00	2.400.000,00	160.056,69	
	Comune di Spinea	Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004	500.000,00	0,00	0,00	
		Totali	500.000,00	0,00	0,00	
		Totali	500.000,00	0,00	0,00	
36	Comune di Tezze sul Brenta	Legge 488/99 Es. 2002, 2003	1.250.000,00	575.000,00	75.000,00	
		Totali	1.250.000,00	575.000,00	75.000,00	
		Totali	1.250.000,00	575.000,00	75.000,00	
37	Comune di Venezia	Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986	16.495.088,56	15.809.160,64	11.392.279,30	
		Legge 910/86 Es. 1987-1988	11.775.217,54	7.710.024,34	7.027.738,37	

nr.	ENTE	Leggi di finanziamento	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Note
		Legge 910/86 Es. 1989	10.060.313,76	9.743.725,68	5.960.328,45	
		Legge 67/88 Es. 1988	8.005.081,94	1.522.852,43	1.522.852,43	
		Legge 67/88 Es. 1990	22.885.825,46	21.336.454,77	14.020.702,48	
		Legge 67/88 Es. 1991	4.183.300,88	4.183.300,88	3.790.801,90	
		Legge 67/88 Es. 1992 - I^ tranche	5.164.568,99	2.840.512,95	2.823.752,20	
		Legge 360/91	2.065.827,60	1.014.808,25	0,00	
		Legge 139/92 Es. 1993	73.130.296,91	72.609.708,36	50.214.687,12	
		Legge 139/92 II fase	41.161.614,86	24.996.513,92	16.608.802,49	
		Legge 539/95 Es. 1996	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	
		Legge 539/95 Es. 1997	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	
		Legge 515/96 Es. 1997	29.336.757,66	29.336.757,66	11.878.508,68	
		Legge 345/97 Es. 1998 - V fase	27.599.290,39	27.598.793,83	21.042.911,87	
		Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase	50.871.004,57	36.893.022,60	24.835.582,02	
		Legge 488/99 Es. 2002, 2003	37.701.353,63	23.687.333,90	20.658.275,96	
		Legge 139/92 - Magg.Mutui II FASE	4.038.597,75	4.038.597,75	4.038.597,75	
		Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004	37.410.000,00	16.000.000,00	4.349.440,67	
		Totali	384.982.881,91	302.420.309,34	203.264.003,08	
		Totali	**384.982.881,91**	**302.420.309,34**	**203.264.003,08**	
38	Comune di Zero Branco	Legge 139/92 II fase	258.228,45	258.228,45	258.204,50	
		Legge 515/96 Es. 1997	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	
		Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase	258.228,45	258.228,45	258.228,45	
		Legge 139/92 Magg. Mutui II^fase	210.000,00	210.000,00	34.062,93	
		Totali	2.275.827,60	2.275.827,60	2.099.866,58	
		Totali	**2.275.827,60**	**2.275.827,60**	**2.099.866,58**	
39	Consorzio di bonifica Adige - Bacchiglione	Legge 139/92 Es. 1993	12.911.422,47	12.911.422,47	12.911.422,47	
		Legge 139/92 II fase	8.366.601,77	8.366.601,77	8.240.312,74	
		Legge 345/97 Es. 1998 - V fase	11.362.051,78	3.976.718,12	510.864,70	
		Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase	12.911.422,48	5.164.568,99	0,00	
		Legge 488/99 Es. 2002, 2003	7.746.853,48	4.880.517,69	2.224.958,78	
		Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004	7.649.999,00	965.809,60	0,00	
		Totali	60.948.350,98	36.265.638,64	23.887.558,69	
		Totali	**60.948.350,98**	**36.265.638,64**	**23.887.558,69**	
40	Consorzio di bonifica Basso Piave	Legge 515/96 Es. 1997	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.091,54	
		Legge 345/97 Es. 1998 - V fase	53.789,57	53.789,57	53.789,57	
		Legge 488/99 Es. 2002, 2003	0,00	0,00	0,00	
		Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004	2.978.171,00	0,00	0,00	

nr.	ENTE	Leggi di finanziamento	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Note
		Totali	4.323.102,82	1.344.931,82	1.344.881,11	
		Totali	**4.323.102,82**	**1.344.931,82**	**1.344.881,11**	
41	**Consorzio di bonifica Brenta - Bacchiglione**	Legge 139/92 Es. 1993	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	
		Legge 139/92 II fase	2.169.118,98	2.169.118,98	1.686.246,94	
		Legge 345/97 Es. 1998 - V fase	7.746.853,50	7.746.853,50	619.819,26	
		Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase	8.779.767,28	3.382.792,35	951.334,45	
		Legge 488/99 Es. 2002, 2003	7.746.853,49	1.368.610,79	387.342,68	
		Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004	11.463.000,00	380.000,00	0,00	
		Totali	39.454.963,95	16.596.746,31	5.194.114,02	
		Totali	**39.454.963,95**	**16.596.746,31**	**5.194.114,02**	
42	**Consorzio di bonifica Brentella di Pederobba**	Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase	823.748,75	823.748,75	613.796,31	
		Legge 139/92 Magg. Mutui II^fase	780.000,00	0,00	0,00	
		Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004	8.240.000,00	6.840.000,00	0,00	
		Totali	9.843.748,75	7.663.748,75	613.796,31	
		Totali	**9.843.748,75**	**7.663.748,75**	**613.796,31**	
43	**Consorzio di bonifica Dese Sile**	Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986	2.427.347,43	2.427.347,43	2.427.347,43	
		Legge 67/88 Es. 1990	6.455.711,24	6.455.711,24	275.991,49	
		Legge 67/88 Es. 1992 - I^ tranche	3.098.741,39	3.098.741,39	3.098.741,39	
		Legge 67/88 Es. 1992 - II^ tranche	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.142,25	
		Legge 360/91	1.291.142,25	0,00	0,00	
		Legge 139/92 II fase	23.279.294,72	17.133.457,62	15.697.708,38	
		Legge 345/97 Es. 1998 - V fase	1.291.142,25	0,00	0,00	
		Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase	10.329.137,99	2.714.568,99	0,00	
		Legge 488/99 Es. 2002, 2003	7.746.853,49	0,00	0,00	
		Legge 139/92 Magg. Mutui II^fase	403.848,02	403.848,02	403.848,02	
		Legge 515/96 Magg. Mutui IV^fase	36.151,98	36.151,98	6.501,93	
		Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004	16.600.000,00	1.500.000,00	0,00	
		Totali	74.250.513,00	35.060.968,92	23.201.280,89	
		Totali	**74.250.513,00**	**35.060.968,92**	**23.201.280,89**	
44	**Consorzio di bonifica Destra Piave**	Legge 345/97 Es. 1998 - V fase	516.456,90	516.456,90	516.456,90	
		Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	
		Legge 488/99 Es. 2002, 2003	2.582.284,50	51.645,69	51.645,69	
		Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004	1.500.000,00	0,00	0,00	
		Totali	6.148.112,09	2.117.473,29	2.117.473,29	
		Totali	**6.148.112,09**	**2.117.473,29**	**2.117.473,29**	

nr.	ENTE	Leggi di finanziamento	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Note
45	Consorzio di bonifica Sinistra - Medio Brenta	Legge 910/86 Es.1989	206.582,76	206.582,76	206.582,76	
		Legge 67/88 Es. 1992 - II^ tranche	2.065.827,60	1.291.142,25	1.291.142,25	
		Legge 139/92 II fase	12.240.028,51	10.690.657,81	3.161.569,13	
		Legge 345/97 Es. 1998 - V fase	1.820.198,29	0,00	0,00	
		Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase	4.131.655,19	4.131.655,19	1.026.841,03	
		Legge 488/99 Es. 2002, 2003	6.197.482,79	309.874,14	103.291,38	
		Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004	6.038.421,00	610.000,00	308.154,18	
		Totali	32.700.196,14	17.239.912,15	6.097.580,73	
		Totali	**32.700.196,14**	**17.239.912,15**	**6.097.580,73**	
46	Regione - Bonifiche Siti Inquinati	Legge 515/96 Es. 1997	2.582.284,00	2.562.606,53	2.057.923,49	
		Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase	3.400.000,00	0,00	0,00	
		Legge 345/97 Es. 1998 - V fase	6.228.636,50	6.125.345,12	6.125.345,12	
		Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase	9.502.602,23	1.502.602,23	1.502.595,31	
		Legge 488/99 Es. 2002, 2003	516.456,90	89.000,00	38.500,00	
		Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004	952.250,26	44.500,00	35.014,88	
		Totali	23.182.229,88	10.324.053,88	9.759.378,80	
		Totali	**23.182.229,88**	**10.324.053,88**	**9.759.378,80**	
47	Regione - Acquedotti	Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase	10.974.709,11	19.625,36	19.625,36	
		Totali	10.974.709,11	19.625,36	19.625,36	
		Totali	**10.974.709,11**	**19.625,36**	**19.625,36**	
48	Regione - Disinquinamento	Legge 910/86 Es. 1987-1988	31.791.826,62	31.718.932,84	31.182.017,29	
		Legge 910/86 Es. 1989	3.160.982,85	3.112.191,61	3.003.584,63	
		Legge 67/88 Es. 1990	3.381.688,87	3.333.860,79	3.260.028,44	
		Legge 67/88 Es. 1992 - II^ tranche	15.492.448,37	10.062.400,00	3.612.000,00	
		Legge 139/92 II fase	12.181.000,00	0,00	0,00	
		Legge 539/95 Magg. Mutui III^ fase	21.342.612,00	0,00	0,00	
		Legge 515/96 Magg. Mutui IV^fase	761.773,93	738.600,18	736.452,92	
		Legge 345/97 Es. 1998 - V fase	18.075.991,47	0,00	0,00	
		Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase	3.706.340,54	1.024.486,48	605.633,74	
		Legge 488/99 Es. 2002, 2003	15.493.706,97	0,00	0,00	
		Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004	15.619.447,15	4.000.000,00	0,00	
		Totali	141.007.818,78	53.990.471,91	42.399.717,02	
		Totali	**141.007.818,78**	**53.990.471,91**	**42.399.717,02**	
49	Regione - Foreste/Agricoltura/	Legge 360/91	1.549.370,70	1.026.985,32	446.340,07	

nr.	ENTE	Leggi di finanziamento	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Note
	Zootecnia	Legge 139/92 II fase	32.536.784,92	28.391.824,40	24.208.055,49	
		Legge 345/97 Es. 1998 - V fase	10.329.137,98	9.520.098,11	6.622.784,73	
		Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase	30.987.413,95	26.632.857,00	18.843.380,36	
		Legge 488/99 Es. 2002, 2003	17.791.940,17	6.896.442,50	2.442.687,66	
		Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004	51.828.764,00	23.419.772,17	4.707.500,28	
		Totali	145.023.411,72	95.887.979,50	57.270.748,59	
		Totali	**145.023.411,72**	**95.887.979,50**	**57.270.748,59**	
50	Veneto Acque S.p.A.	Legge 67/88 Es. 1988	8.934.704,35	8.934.704,35	2.680.411,31	
		Legge 345/97 Es. 1998 - V fase	17.880.812,18	17.880.812,18	17.880.812,18	
		Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase	18.876.499,66	18.876.499,66	11.325.899,80	
		Legge 488/99 Es. 2002, 2003	10.329.137,98	10.329.137,98	3.098.741,40	
		Legge 67/88 Es. 1992 II tranche	3.100.000,00	3.100.000,00	930.000,00	
		Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004	20.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
		Totali	79.121.154,18	65.121.154,18	41.915.864,69	
		Totali	**79.121.154,18**	**65.121.154,18**	**41.915.864,69**	
51	Veneto Agricoltura	Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004	1.900.000,00	1.900.000,00	200.000,00	
		Legge 139/92 II fase	3.300.000,00	0,00	0,00	
		Totali	5.200.000,00	1.900.000,00	200.000,00	
		Totali	**5.200.000,00**	**1.900.000,00**	**200.000,00**	
52	ARPAV	Legge 67/88 Es. 1991	258.228,50	258.228,45	258.228,45	
		Legge 139/92 Es. 1993	1.549.370,70	1.549.370,70	1.548.164,22	
		Legge 139/92 II fase	11.529.900,95	11.506.093,63	9.752.059,37	
		Legge 515/96 Es. 1997	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	
		Legge 345/97 Es. 1998 - V fase	2.065.827,60	2.065.827,60	1.549.370,70	
		Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase	3.098.740,70	3.044.370,70	2.109.122,67	
		Legge 488/99 Es. 2002, 2003	1.549.370,70	1.549.370,70	774.685,35	
		Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004	4.500.000,00	4.500.000,00	3.750.000,00	
		Totali	25.584.352,93	25.506.175,57	20.774.544,55	
		Totali	**25.584.352,93**	**25.506.175,57**	**20.774.544,55**	
53	Autorità portuale di Venezia	Legge 139/92 Magg. Mutui II^fase	516.450,00	516.450,00	0,00	
		Totali	516.450,00	516.450,00	0,00	
		Totali	**516.450,00**	**516.450,00**	**0,00**	
54	Azienda Speciale Porto Chioggia	Legge 139/92 Magg. Mutui II^fase	2.500.000,00	615.040,00	0,00	
		Totali	2.500.000,00	615.040,00	0,00	

nr.	ENTE	Leggi di finanziamento	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Note
		Totali	**2.500.000,00**	**615.040,00**	**0,00**	
55	**Ente di bacino R.S.U. VE 2**	Legge 67/88 Es. 1991	6.713.939,69	6.713.939,69	6.713.939,69	
		Legge 360/91	3.356.969,84	3.356.969,84	3.356.969,84	
		Legge 139/92 Es. 1993	9.296.224,18	9.296.224,18	9.296.224,18	
		Legge 539/95 Es. 1997	2.943.804,32	2.943.804,32	2.943.804,32	
		Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004	2.500.000,00	0,00	0,00	
		Totali	24.810.938,04	22.310.938,04	22.310.938,04	
		Totali	**24.810.938,04**	**22.310.938,04**	**22.310.938,04**	
56	**Magistrato alle Acque di Venezia**	Legge 910/86 Es. 1989	2.582.284,50	1.922.252,58	0,00	
		Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase	1.549.370,70	1.520.474,93	1.434.437,77	
		Legge 139/92 Magg. Mutui II^fase	3.767.443,55	3.767.443,55	3.065.882,63	
		Legge 345/97 Es. 1998 - V fase	6.197.482,78	5.164.568,98	0,00	
		Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004	4.642.000,00	3.400.000,00	1.552.863,92	
		Totali	18.738.581,52	15.774.740,04	6.053.184,32	
		Totali	**18.738.581,52**	**15.774.740,04**	**6.053.184,32**	
57	**Provincia di Venezia**	Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004	2.000.000,00	0,00	0,00	
		Totali	2.000.000,00	0,00	0,00	
		Totali	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	
58	**Provincia di Padova**	Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004	400.000,00	0,00	0,00	
			400.000,00	0,00	0,00	
			400.000,00	**0,00**	**0,00**	
59	**S.A.VE. Servizi Aeroportuali VE**	Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004	6.610.000,00	0,00	0,00	
		Totali	6.610.000,00	0,00	0,00	
		Totali	**6.610.000,00**	**0,00**	**0,00**	
60	**VE.S.T.A.**	Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986	4.131.655,19	4.131.655,19	720.119,80	
		Legge 67/88 Es. 1990	1.362.929,76	1.362.929,76	0,00	
		Legge 910/86 Es. 1989	4.131.655,19	4.131.655,19	0,00	
		Legge 139/92 II fase	10.587.366,43	0,00	0,00	
		Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase	3.486.084,07	3.486.084,07	788.104,00	
		Legge 345/97 Es. 1998 - V fase	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00	
		Totali	26.539.690,65	15.952.324,22	1.508.223,80	
		Totali	**26.539.690,65**	**15.952.324,22**	**1.508.223,80**	

nr.	ENTE	Leggi di finanziamento	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Note
61	U.S.S.L. n. 12 - Venezia (settore Ospedali)	Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986	6.197.482,79	6.197.482,79	6.197.482,79	
		Legge 910/86 Es. 1987-1988	5.164.568,99	5.164.568,99	5.164.568,99	
		Legge 910/86 Es. 1989	2.582.284,50	2.582.284,50	2.582.284,50	
		Legge 539/95 Es. 1997	3.356.969,84	3.356.969,84	3.317.410,04	
		Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004	3.000.000,00	614.940,86	0,00	
		Totali	20.301.306,12	17.916.246,98	17.261.746,32	
		Totali	**20.301.306,12**	**17.916.246,98**	**17.261.746,32**	
62	U.S.S.L. n. 12 - Venezia (settore Disinquinamento)	Legge 67/88 Es. 1990	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	
		Legge 515/96 Es. 1997	1.032.913,80	1.032.913,80	991.140,36	
		Legge 488/99 Es. 2002, 2003	774.685,35	774.685,35	0,00	
		Totali	2.840.512,94	2.840.512,95	2.024.054,16	
		Totali	**2.840.512,94**	**2.840.512,95**	**2.024.054,16**	
63	U.S.S.L. n. 17 - Este-Monselice	Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase	1.291.142,25	1.291.142,25	1.285.164,00	
		Legge 139/92 Magg. Mutui II^fase	232.000,00	0,00	0,00	
		Totali	1.523.142,25	1.291.142,25	1.285.164,00	
		Totali	**1.523.142,25**	**1.291.142,25**	**1.285.164,00**	
64	A.S.L. n. 15 - Alta Padovana	Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004	1.039.000,00	0,00	0,00	
		Totali	1.039.000,00	0,00	0,00	
		Totali	**1.039.000,00**	**0,00**	**0,00**	
65	Abbazia di S. Giorgio Maggiore	Legge 488/99 Es. 2002, 2003	206.582,76	206.582,76	206.532,97	
		Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004	80.000,00	80.000,00	72.000,00	
		Totali	286.582,76	286.582,76	278.532,97	
		Totali	**286.582,76**	**286.582,76**	**278.532,97**	
66	Comunità Ebraica di Venezia	Legge 345/97 Es. 1998 - V fase	2.000.000,00	2.000.000,00	1.800.000,00	
			2.000.000,00	2.000.000,00	1.800.000,00	
			2.000.000,00	**2.000.000,00**	**1.800.000,00**	
67	Diocesi Patriarcale di Venezia	Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986	444.697,73	0,00	0,00	
		Legge 67/88 Es. 1990	511.292,33	0,00	0,00	
		Legge 139/92 Es. 1993	1.755.953,46	0,00	0,00	
		Legge 139/92 Magg. Mutui II fase	464.400,00	464.400,00	133.800,00	
		Legge 515/96 Es. 1997	5.265.854,58	0,00	0,00	
		Legge 345/97 Es. 1998 - V fase	10.857.632,91	0,00	0,00	
		Legge 488/99 Es. 2002, 2003	5.164.568,99	0,00	0,00	

nr.	ENTE	Leggi di finanziamento	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Note
		Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004	1.300.743,00	750.000,00	344.700,00	
		Totali	25.765.143,00	1.214.400,00	478.500,00	
		Totali	25.765.143,00	1.214.400,00	478.500,00	
68	Parrocchia Ognissanti	Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004	800.000,00	800.000,00	200.771,61	
		Totali	800.000,00	800.000,00	200.771,61	
		Totali	800.000,00	800.000,00	200.771,61	
69	Associazione Teatro Goldoni	Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004	455.000,00	0,00	0,00	
		Totali	455.000,00	0,00	0,00	
		Totali	455.000,00	0,00	0,00	
70	Enti vari	Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase	1.764.568,99	1.754.920,54	1.754.920,54	
		Legge 139/92 II fase	12.706,69	0,00	0,00	
		Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase	232.405,61	232.405,61	184.459,54	
		Totali	2.009.681,29	1.987.326,15	1.939.380,08	
		Totali	2.009.681,29	1.987.326,15	1.939.380,08	
			1.762.495.821,01	1.262.953.504,44	865.432.733,06	
			1.762.495.821,01	1.262.953.504,44	865.432.733,06	

IMPORTI DEI FINANZIAMENTI ATTRIBUITI AI SOGGETTI ATTUATORI, ORDINATI PER LEGGI DI FINANZIAMENTO

Leggi di finanziamento	Ente	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Note
Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986	Azienda Consorzio del Mirese (A.C.M.)	2.582.284,50	2.582.284,50	2.562.101,11	
	Azienda Piovese Gestione Acque (A.P.G.A.)	1.291.142,25	1.291.142,25	1.285.338,08	
	Comune di Chioggia/ASP	4.957.986,23	4.957.986,23	4.808.039,83	
	Comune di Jesolo	1.291.142,25	1.291.142,25	1.282.148,91	
	Comune di Marcon	309.874,14	309.874,14	309.565,20	
	Comune di Mogliano Veneto	671.393,97	671.393,97	610.414,64	
	Comune di Venezia	16.495.088,56	15.809.160,64	11.392.279,30	
	Diocesi Patriarcale di Venezia	444.697,73	0,00	0,00	
	S.P.I.M.	516.456,90	516.456,90	516.456,90	
	VE.S.T.A.	4.131.655,19	4.131.655,19	720.119,80	
	Consorzio di bonifica Dese Sile	2.427.347,43	2.427.347,43	2.427.347,43	
	U.S.S.L. 12 Venezia / Settore Ospedali	6.197.482,79	6.197.482,79	6.197.482,79	
	TOTALE	41.316.551,93	40.185.926,28	32.111.293,99	
Legge 910/86 Es. 1987-1988	Comune di Chioggia / A.S.P.	1.032.913,80	1.032.913,80	788.453,77	
	Comune di Jesolo / A.S.I.	563.232,36	563.232,36	562.617,11	
	Comune di Musile di Piave	543.245,49	543.245,49	543.245,49	
	Comune di Quarto d'Altino	774.685,35	774.685,35	774.685,35	
	Comune di Venezia	11.775.217,54	7.710.024,34	7.027.738,37	
	Regione - Disinquinamento	31.791.826,62	31.718.932,84	31.182.017,29	
	U.S.S.L. 12 Venezia / Settore Ospedali	5.164.568,99	5.164.568,99	5.164.568,99	
	TOTALE	51.645.690,16	47.507.603,17	46.043.326,36	
Legge 910/86 Es. 1989	Azienda Consorzio del Mirese (A.C.M.)	9.296.224,18	9.296.224,18	9.141.287,11	
	S.P.I.M.	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	
	Comune di Chioggia	5.164.568,99	5.164.568,99	5.164.568,99	
	Comune di Venezia	10.060.313,76	9.743.725,68	5.960.328,45	
	Consorzio di bonifica Sinistra Medio Brenta	206.582,76	206.582,76	206.582,76	
	Magistrato alle Acque di Venezia	2.582.284,50	1.922.252,58	0,00	
	Regione - Disinquinamento	3.160.982,85	3.112.191,61	3.003.584,63	
	U.S.S.L. 12 Venezia / Settore Ospedali	2.582.284,50	2.582.284,50	2.582.284,50	
	VE.S.T.A.	4.131.655,19	4.131.655,19	0,00	
	TOTALE	38.734.267,43	37.708.856,19	27.608.007,14	
Legge 67/88 Es. 1988	Comune di Chioggia / A.S.P.	1.394.433,63	1.394.433,63	1.275.648,54	
	Comune di Venezia	8.005.081,94	1.522.852,43	1.522.852,43	
	Veneto Acque SpA	8.934.704,35	8.934.704,35	2.680.411,31	

Leggi di finanziamento	Ente	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Note
	TOTALE	18.334.219,92	11.851.990,41	5.478.912,28	
Legge 67/88 Es. 1990	Azienda Consorzio del Mirese (A.C.M.)	516.456,90	516.456,90	446.735,22	
	Comune di Chioggia	7.493.789,61	7.493.789,61	7.247.877,57	
	Comune di Codevigo	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	
	Comune di Jesolo / A.S.I.	4.131.655,19	4.129.072,20	4.060.770,82	
	Comune di Musile di Piave	2.065.827,60	2.065.827,60	2.061.237,55	
	Comune di Quarto d'Altino	2.582.284,50	2.582.284,50	2.259.776,30	
	Comune di Venezia	22.885.825,46	21.336.454,77	14.020.702,48	
	Consorzio di bonifica Dese Sile	6.455.711,24	6.455.711,24	275.991,49	
	Diocesi Patriarcale di Venezia	511.292,33	0,00	0,00	
	Regione - Disinquinamento	3.381.688,87	3.333.860,79	3.260.028,44	
	U.S.S.L. 12 Venezia / Settore Disinquinamento	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	
	VE.S.T.A.	1.362.929,76	1.362.929,76	0,00	
	TOTALE	53.969.745,95	51.858.671,85	36.215.404,36	
Legge 67/88 Es. 1991	A.R.P.A.V.	258.228,50	258.228,45	258.228,45	
	Azienda Consorzio del Tergola	3.615.198,29	3.615.198,29	3.615.198,29	
	Comune di Chioggia	516.456,90	516.456,90	514.127,07	
	Comune di Meolo	516.456,90	516.456,90	464.811,21	
	Comune di Venezia	4.183.300,88	4.183.300,88	3.790.801,90	
	Ente di bacino R.S.U. VE 2	6.713.939,69	6.713.939,69	6.713.939,69	
	TOTALE	15.803.581,16	15.803.581,11	15.357.106,61	
Legge 67/88 Es. 1992 - I^ tranche	Azienda Consorzio del Mirese (A.C.M.)	4.131.655,19	2.936.686,00	941.242,92	
	Azienda Piovese Gestione Acque (A.P.G.A.)	1.652.662,08	1.652.662,08	1.652.662,08	
	Comune di Cavarzere	1.291.142,25	1.291.142,25	1.289.946,52	
	Comune di Venezia	5.164.568,99	2.840.512,95	2.823.752,20	
	Consorzio di bonifica Dese Sile	3.098.741,39	3.098.741,39	3.098.741,39	
	TOTALE	15.338.769,90	11.819.744,67	9.806.345,11	
Legge 67/88 Es. 1992 - II^ tranche	Azienda Consorzio Alta Servizi	3.873.426,74	3.873.426,74	3.873.404,07	
	Azienda speciale consorziale Veneto Servizi	5.164.568,99	5.164.568,99	4.161.493,74	
	Consorzio di bonifica Dese Sile	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.142,25	
	Consorzio di bonifica Sinistra Medio Brenta	2.065.827,60	1.291.142,25	1.291.142,25	
	Delta Po S.p.A.	3.100.000,00	3.100.000,00	930.000,00	
	Regione - Disinquinamento	15.492.448,37	10.062.400,00	3.612.000,00	
	TOTALE	30.987.413,94	24.782.680,22	15.159.182,31	

Leggi di finanziamento	Ente	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Note
Legge 360/91	Comune di Venezia	2.065.827,60	1.014.808,25	0,00	
	Consorzio di bonifica Dese Sile	1.291.142,25	0,00	0,00	
	Ente di bacino R.S.U. VE 2	3.356.969,84	3.356.969,84	3.356.969,84	
	Regione - Foreste/Agricoltura/Zootecnia	1.549.370,70	1.026.985,32	446.340,07	
	TOTALE	8.263.310,39	5.398.763,42	3.803.309,92	
Legge 139/92 Es. 1993	A.R.P.A.V.	1.549.370,70	1.549.370,70	1.548.164,22	
	Azienda Consorzio del Mirese (A.C.M.)	30.987.413,95	30.987.413,95	30.975.991,34	
	Azienda Piovese Gestione Acque (A.P.G.A.)	3.098.741,40	3.098.741,40	3.098.740,68	
	Azienda Consorzio del Tergola	29.438.043,25	29.438.043,25	29.437.215,74	
	Comune di Arquà Petrarca	516.456,90	516.456,90	513.763,48	
	Comune di Chioggia	5.164.568,99	5.164.568,99	1.687.685,72	
	Comune di Mogliano Veneto	3.098.741,39	3.098.741,39	2.755.972,37	
	Comune di Monselice	2.582.284,50	2.582.284,50	2.582.284,50	
	Comune di Piove di Sacco	3.615.198,29	3.615.198,29	3.615.193,13	
	Comune di Quarto d'Altino	2.065.827,60	2.065.827,60	2.065.827,60	
	Comune di Venezia	73.130.298,91	72.609.708,36	50.214.687,12	
	Consorzio di bonifica Adige - Bacchiglione	12.911.422,47	12.911.422,47	12.911.422,47	
	Consorzio di bonifica Brenta - Bacchiglione	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	
	Diocesi Patriarcale di Venezia	1.755.953,46	0,00	0,00	
	Ente di bacino R.S.U. VE 2	9.296.224,18	9.296.224,18	9.296.224,18	
	TOTALE	180.759.914,68	178.483.372,67	152.252.543,22	
Legge 139/92 II fase	A.R.P.A.V.	11.529.900,95	11.506.093,63	9.752.059,37	
	Azienda Piovese Gestione Acque (A.P.G.A.)	2.582.284,44	2.582.284,44	2.582.284,44	
	Azienda Consorzio Alta Servizi	4.286.592,26	4.286.592,26	4.286.592,27	
	Comune di Noale	774.685,35	774.685,35	774.685,35	
	Comune di Venezia	41.161.614,86	24.996.513,92	16.608.802,49	
	Comune di Zero Branco	258.228,45	258.228,45	258.204,50	
	Consorzio di bonifica Adige - Bacchiglione	8.365.601,77	8.366.601,77	8.240.312,74	
	Consorzio di bonifica Brenta - Bacchiglione	2.169.118,98	2.169.118,98	1.686.246,94	
	Consorzio di bonifica Dese Sile	23.279.294,72	17.133.457,62	15.697.708,38	
	Consorzio di bonifica Sinistra Medio Brenta	12.240.028,51	10.690.657,81	3.161.569,13	
	Regione - Disinquinamento	12.181.000,00	0,00	0,00	
	Regione - Foreste/Agricoltura/Zootecnia	32.536.784,92	28.391.824,40	24.208.055,49	
	Veneto Agricoltura	3.300.000,00	0,00	0,00	
	VESTA	10.587.366,43	0,00	0,00	
	Enti vari	12.706,69	0,00	0,00	
	TOTALE	165.266.208,31	111.156.058,62	87.256.521,10	

Leggi di finanziamento	Ente	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Note
Legge 139/92 Magg. Mutui II^ fase	Azienda Consorzio del Mirese (A.C.M.)	2.500.000,00	2.500.000,00	387.750,29	
	Azienda Piovese Gestione Acque (A.P.G.A.)	1.540.000,00	0,00	0,00	
	Azienda Servizi Idrici della Castellana	3.500.000,00	3.500.000,00	2.800.486,49	
	Azienda Servizi Pubblici Sile - Piave S.p.A.	2.800.000,00	2.296.000,00	1.111.450,25	
	Azienda Servizi Territoriali Ambientali (SE.T.A.)	8.840.000,00	5.265.000,00	0,00	
	Azienda speciale consorziale Centro Veneto Servizi	7.857.086,20	7.857.086,20	43.295,72	
	Porto di Chioggia	2.500.000,00	615.040,00	0,00	
	Comune di Morgano	400.000,00	400.000,00	312.075,32	
	Comune di Venezia	4.038.597,75	4.038.597,75	4.038.597,75	
	Comune di Zero Branco	210.000,00	210.000,00	34.062,93	
	Consorzio di bonifica Brentella di Pederobba	780.000,00	0,00	0,00	
	Consorzio di bonifica Dese Sile	403.848,02	403.848,02	403.848,02	
	Autorità portuale di Venezia	516.450,00	516.450,00	0,00	
	Diocesi Patriarcale di Venezia	464.400,00	464.400,00	133.800,00	
	Magistrato alle Acque di Venezia	3.767.443,55	3.767.443,55	3.065.882,63	
	U.S.S.L. n. 17 - Este-Monselice	232.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE	40.349.825,52	31.833.865,52	12.331.249,40	
Legge 539/95 Es. 1996	Azienda Consorzio del Mirese (A.C.M.)	2.530.638,81	2.530.638,81	2.530.638,80	
	Azienda Piovese Gestione Acque (A.P.G.A.)	4.441.529,33	4.441.529,33	4.425.033,85	
	Azienda Consorzio del Tergola	2.065.827,60	2.065.827,60	2.065.827,59	
	Comune di Chioggia	4.906.340,54	4.906.340,54	4.318.989,01	
	Comune di Venezia	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	
	TOTALE	15.493.706,97	15.493.706,97	14.889.859,95	
Legge 539/95 Es. 1997	Azienda Consorzio del Tergola	17.714.471,64	17.714.471,64	17.714.471,64	
	Azienda Consorzio Alta Servizi	1.652.662,08	1.652.662,08	1.652.662,08	
	Azienda Consorzio Acquedotto Euganeo Berico	428.659,23	428.659,23	428.659,23	
	Comune di Chioggia	1.446.079,32	1.446.079,32	1.385.755,21	
	Comune di Galzignano	346.026,12	346.026,12	274.003,05	
	Comune di Marcon	1.549.370,70	1.549.370,70	1.488.601,72	
	Comune di Venezia	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	
	Ente di bacino R.S.U. VE 2	2.943.804,32	2.943.804,32	2.943.804,32	
	U.S.S.L. n. 12 - Venezia - Settore Ospedali	3.356.969,84	3.356.969,84	3.317.410,04	
	TOTALE	30.987.413,95	30.987.413,95	30.754.737,99	
Legge 539/95 Magg. Mutui III^ fase	Regione - Disinquinamento	21.342.612,00	0,00	0,00	
	TOTALE	21.342.612,00	0,00	0,00	

Leggi di finanziamento	Ente	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Note
Legge 515/96 Es. 1997 - III fase	A.R.P.A.V.	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	
	Azienda Consorzio del Mirese (A.C.M.)	10.329.137,98	10.329.137,98	10.204.842,36	
	Azienda Piovese Gestione Acque (A.P.G.A.)	7.746.853,49	7.746.853,49	7.746.853,49	
	Azienda Servizi Pubblici Sile - Piave S.p.A.	1.549.370,70	1.549.370,70	115.508,77	
	Azienda Consorzio Alta Servizi	2.840.512,95	2.840.512,95	2.801.668,82	
	Azienda Consorzio Acquedotto Euganeo Berico	568.102,59	568.102,59	550.970,88	
	Azienda speciale consorziale Veneto Servizi	5.939.254,34	5.939.254,34	5.939.254,34	
	Comune di Arquà Petrarca	1.549.370,70	1.549.370,70	1.539.501,09	
	Comune di Castelfranco Veneto	1.446.079,32	1.446.079,32	1.178.114,61	
	Comune di Cavallino	4.648.112,09	4.648.112,09	4.648.112,09	
	Comune di Cavarzere	1.549.370,70	1.549.370,70	1.347.068,14	
	Comune di Chioggia	10.329.137,99	10.201.137,99	8.726.337,01	
	Comune di Este	1.291.142,25	1.291.142,25	1.162.028,02	
	Comune di Galzignano	619.748,28	619.748,28	619.711,96	
	Comune di Meolo	516.456,90	516.456,90	516.456,90	
	Comune di Mogliano Veneto	2.582.284,50	2.582.284,50	2.504.915,29	
	Comune di Monastier	1.549.370,70	1.549.370,70	1.401.642,79	
	Comune di Monselice	2.582.284,50	2.582.284,50	2.575.114,19	
	Comune di Musile di Piave	206.582,76	206.582,76	206.582,76	
	Comune di Noale	1.291.142,25	1.291.142,25	1.289.814,72	
	Comune di Padova	2.065.827,60	2.065.827,60	2.065.827,60	
	Comune di Venezia	29.336.757,66	29.336.757,66	11.878.508,68	
	Comune di Zero Branco	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	
	Consorzio di bonifica Basso Piave	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.091,54	
	Diocesi Patriarcale di Venezia	5.265.854,58	0,00	0,00	
	Regione - Bonifiche Siti Inquinati	2.582.284,00	2.562.606,53	2.057.923,49	
	U.S.S.L. n. 12 - Venezia - Settore Disinquinamento	1.032.913,80	1.032.913,80	991.140,36	
	TOTALE	103.291.379,33	97.877.647,28	79.941.274,38	
Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase	Azienda Consorzio del Mirese (A.C.M.)	5.939.254,34	5.939.254,34	5.869.873,50	
	Azienda Servizi Idrici della Castellana	1.032.913,80	1.032.913,80	966.608,02	
	Azienda Servizi Pubblici Sile - Piave S.p.A.	7.488.625,04	7.488.625,04	5.212.539,25	
	Azienda Consorzio del Tergola	20.038.527,00	19.556.618,68	15.194.583,51	
	Azienda Consorzio Alta Servizi	5.835.962,96	5.835.962,96	5.835.962,96	
	Azienda Consorzio Acquedotto Euganeo Berico	1.032.913,80	1.032.913,80	929.622,42	
	Azienda speciale consorziale Veneto Servizi	6.662.294,00	6.662.294,00	6.004.069,45	
	Comune di Cavarzere	1.549.370,70	1.549.370,70	1.532.180,55	
	Comune di Morgano	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.142,25	

Leggi di finanziamento	Ente	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Note
	Comune di Preganziol	774.685,35	774.685,35	761.531,09	
	Comune di Zero Branco	258.228,45	258.228,45	258.228,45	
	S.P.I.M.	516.456,90	516.456,90	258.228,45	
	Magistrato alle Acque di Venezia	1.549.370,70	1.520.474,93	1.434.437,77	
	Regione - Bonifica siti inquinati	3.400.000,00	0,00	0,00	
	U.S.S.L. n. 17 - Este-Monselice	1.291.142,25	1.291.142,25	1.285.164,00	
	Enti vari	1.764.568,99	1.754.920,54	1.754.920,54	
	TOTALE	60.425.456,52	56.505.003,98	48.589.092,20	
Legge 515/96 Magg. Mutui - IV fase	Consorzio di bonifica Dese Sile	36.151,98	36.151,98	6.501,93	
	Regione - Disinquinamento	761.773,93	738.600,18	736.452,92	
	TOTALE	797.925,91	774.752,16	742.954,85	
Legge 345/97 Es. 1998 - V fase	A.R.P.A.V.	2.065.827,60	2.065.827,60	1.549.370,70	
	Azienda Consorzio del Mirese (A.C.M.)	1.795.000,00	1.795.000,00	80.045,49	
	Azienda Piovese Gestione Acque (A.P.G.A.)	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	
	Azienda speciale consorziale Veneto Servizi	8.779.767,28	8.779.767,28	5.783.239,89	
	A.S.P. di Chioggia	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	
	Comune di Mira	1.136.205,18	113.620,50	113.620,50	
	Comune di Venezia	27.599.290,39	27.598.793,83	21.042.911,87	
	Consorzio di bonifica Adige - Bacchiglione	11.362.051,78	3.976.718,12	510.864,70	
	Consorzio di bonifica Basso Piave	53.789,57	53.789,57	53.789,57	
	Consorzio di bonifica Brenta - Bacchiglione	7.746.853,50	7.746.853,50	619.819,26	
	Consorzio di bonifica Dese Sile	1.291.142,25	0,00	0,00	
	Consorzio di bonifica Destra Piave	516.456,90	516.456,90	516.456,90	
	Consorzio di bonifica Sinistra Medio Brenta	1.820.198,29	0,00	0,00	
	Comunità Ebraica di Venezia	2.000.000,00	2.000.000,00	1.800.000,00	
	Diocesi Patriarcale di Venezia	10.857.632,91	0,00	0,00	
	Magistrato alle Acque di Venezia	6.197.482,78	5.164.568,98	0,00	
	Veneto Acque S.p.A.	17.880.812,18	17.880.812,18	17.880.812,18	
	Regione - Bonifiche Siti Inquinati	6.228.636,50	6.125.345,12	6.125.345,12	
	Regione - Disinquinamento	18.075.991,47	0,00	0,00	
	Regione - Foreste/Agricoltura/Zootecnia	10.329.137,98	9.520.098,11	6.622.784,73	
	VE.S.T.A.	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00	
	TOTALE	142.025.647,25	99.627.022,39	66.148.431,61	
Legge 448/98 Es. 1999, 2000,2001 VI fase	A.R.P.A.V.	3.098.740,70	3.044.370,70	2.109.122,67	
	Azienda Consorzio del Mirese (A.C.M.)	7.746.853,49	7.746.853,49	7.101.295,06	
	Azienda Piovese Gestione Acque (A.P.G.A.)	6.610.648,31	6.610.281,05	3.954.419,74	

Leggi di finanziamento	Ente	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Note
	Azienda Servizi Idrici della Castellana	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	
	Azienda Servizi Pubblici Sile - Piave S.p.A.	4.441.529,34	4.441.529,34	3.943.090,06	
	Azienda Consorzio del Tergola	10.380.783,66	9.864.326,77	8.089.654,69	
	Azienda Consorzio Alta Servizi	7.746.853,49	7.746.853,49	5.744.298,99	
	Azienda Consorzio Acquedotto Euganeo Berico	1.342.787,94	529.367,00	0,00	
	Azienda speciale consorziale Veneto Servizi	1.254.732,05	1.254.732,05	0,00	
	Comune di Campodarsego	2.582.284,50	2.582.284,50	159.380,45	
	Comune di Castelfranco Veneto	258.228,45	0,00	0,00	
	Comune di Cavallino	1.032.913,80	1.032.913,80	464.811,21	
	Comune di Cavarzere	2.065.827,60	2.065.827,60	2.059.253,98	
	Comune di Chioggia	12.394.965,58	9.812.681,08	9.450.000,00	
	Comune di Este	811.095,55	811.095,55	391.627,91	
	Comune di Fossò	634.684,42	634.684,42	634.684,42	
	Comune di Mira	2.582.284,50	0,00	0,00	
	Comune di Monselice	774.685,35	774.685,35	753.823,33	
	Comune di Morgano	1.032.913,80	1.032.913,80	912.603,73	
	Comune di Venezia	50.871.004,57	36.893.022,60	24.835.582,02	
	Consorzio di bonifica Adige - Bacchiglione	12.911.422,48	5.164.568,99	0,00	
	Consorzio di bonifica Brenta - Bacchiglione	8.779.767,28	3.382.792,35	951.334,45	
	Consorzio di bonifica Brentella di Pederobba	823.748,75	823.748,75	613.796,31	
	Consorzio di bonifica Dese Sile	10.329.137,99	2.714.568,99	0,00	
	Consorzio di bonifica Destra Piave	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	
	Consorzio di bonifica Sinistra Medio Brenta	4.131.655,19	4.131.655,19	1.026.841,03	
	Veneto Acque S.p.A.	18.876.499,66	18.876.499,66	11.325.899,80	
	Regione - Bonifiche Siti Inquinati	9.502.602,23	1.502.602,23	1.502.595,31	
	Regione - Acquedotti	10.974.709,11	19.625,36	19.625,36	
	Regione - Disinquinamento	3.706.340,54	1.024.486,48	605.633,74	
	Regione - Foreste/Agricoltura/Zootecnia	30.987.413,95	26.632.857,00	18.843.380,36	
	VE.S.T.A.	3.486.084,07	3.486.084,07	768.104,00	
	Enti vari	232.405,61	232.405,61	184.459,54	
	TOTALE	235.504.345,32	167.969.058,63	109.564.059,55	
Legge 488/98 Es. 2002, 2003 - VII fase	Abbazia di S. Giorgio Maggiore	206.582,76	206.582,76	206.532,97	
	A.R.P.A.V.	1.549.370,70	1.549.370,70	774.685,35	
	Azienda Consorzio del Mirese (A.C.M.)	13.582.016,94	9.019.766,68	7.458.924,62	
	Azienda Piovese Gestione Acque (A.P.G.A.)	10.329.137,98	10.329.137,98	0,00	
	Azienda Servizi Idrici della Castellana	3.098.741,39	3.098.741,39	3.077.402,97	
	Azienda Servizi Pubblici Sile - Piave S.p.A.	4.441.529,31	3.949.370,70	1.178.041,38	
	Azienda Consorzio del Tergola	11.362.051,78	10.615.058,76	2.959.155,63	

Leggi di finanziamento	Ente	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Note
	Azienda Consorzio Alta Servizi	10.329.137,98	10.329.137,98	0,00	
	Azienda Consorzio Acquedotto Euganeo Berico	2.065.827,60	1.085.318,35	39.949,14	
	Azienda speciale consorziale Veneto Servizi	2.582.284,50	2.582.284,50	395.103,55	
	Comune di Castelfranco Veneto	4.906.340,55	4.867.966,29	1.772.658,76	
	Comune di Cavallino	1.549.913,80	1.032.913,80	929.622,42	
	Comune di Cavarzere	1.032.913,80	1.032.380,62	896.749,37	
	Comune di Chioggia	8.263.310,39	2.703.074,65	1.310.723,81	
	Comune di Fossò	280.000,00	280.000,00	48.571,58	
	Comune di Monselice	2.810.018,27	2.810.018,27	412.839,26	
	Comune di Morgano	826.331,04	826.331,04	639.248,81	
	Comune di Noale	1.342.788,00	134.278,80	70.965,84	
	Comune di Preganziol	1.032.913,80	1.032.913,80	825.900,00	
	Comune di Salzano	2.400.000,00	2.400.000,00	160.056,69	
	Comune di Tezze sul Brenta	1.250.000,00	575.000,00	75.000,00	
	Comune di Venezia	37.701.353,63	23.687.333,90	20.658.275,96	
	Consorzio di bonifica Adige - Bacchiglione	7.746.853,48	4.880.517,69	2.224.958,78	
	Consorzio di bonifica Basso Piave	0,00	0,00	0,00	
	Consorzio di bonifica Brenta - Bacchiglione	7.746.853,49	1.368.610,79	387.342,68	
	Consorzio di bonifica Dese Sile	7.746.853,49	0,00	0,00	
	Consorzio di bonifica Destra Piave	2.582.284,50	51.645,69	51.645,69	
	Consorzio di bonifica Sinistra Medio Brenta	6.197.482,79	309.874,14	103.291,38	
	Diocesi Patriarcale di Venezia	5.164.568,99	0,00	0,00	
	Veneto Acque S.p.A.	10.329.137,98	10.329.137,98	3.098.741,40	
	Regione - Bonifiche Siti Inquinati	516.456,90	89.000,00	38.500,00	
	Regione - Disinquinamento	15.493.706,97	0,00	0,00	
	Regione - Foreste/Agricoltura/Zootecnia	17.791.940,17	6.896.442,50	2.442.687,66	
	U.S.S.L. n. 12 - Venezia - Settore Disinquinamento	774.685,35	774.685,35	0,00	
	TOTALE	205.033.388,33	118.846.895,12	52.237.575,70	
Legge 388/00 e 488/01 Es. 2002, 2003, 2004	Abbazia di S. Giorgio Maggiore	80.000,00	80.000,00	72.000,00	
	A.R.P.A.V.	4.500.000,00	4.500.000,00	3.750.000,00	
	Azienda Consorzio del Mirese (A.C.M.)	10.693.749,74	10.040.000,00	250.555,58	
	Azienda Piovese Gestione Acque (A.P.G.A.)	5.600.000,00	0,00	0,00	
	Azienda Servizi Idrici della Castellana	1.252.000,00	1.252.000,00	0,00	
	Azienda Servizi Pubblici Sile - Piave S.p.A.	2.298.800,00	2.298.800,00	0,00	
	Azienda Servizi Territoriali Ambientali (SE.T.A.)	19.283.600,00	7.191.086,20	252.190,06	
	Azienda speciale Centro Veneto Servizi	10.689.306,00	10.689.306,00	321.531,59	
	Azienda Brenta Servizi	2.685.720,00	0,00	0,00	
	Azienda SPIM	820.800,00	820.800,00	0,00	
	Azienda Schievenin Alto Trevigiano	7.360.000,00	0,00	0,00	

Leggi di finanziamento	Ente	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Note
	Comune di Campodarsego	2.500.000,00	0,00	0,00	
	Comune di Cavallino	4.240.000,00	1.440.000,00	0,00	
	Comune di Chioggia	6.000.000,00	0,00	0,00	
	Comune di Codevigo	2.000.000,00	0,00	0,00	
	Comune di Comuda	943.675,00	943.675,00	796.822,25	
	Comune di Mira	450.000,00	0,00	0,00	
	Comune di Spinea	500.000,00	0,00	0,00	
	Comune di Venezia	37.410.000,00	16.000.000,00	4.349.440,67	
	Consorzio di bonifica Adige - Bacchiglione	7.849.999,00	965.809,60	0,00	
	Consorzio di bonifica Basso Piave	2.978.171,00	0,00	0,00	
	Consorzio di bonifica Brenta - Bacchiglione	11.463.000,00	380.000,00	0,00	
	Consorzio di bonifica Brentella di Pedemobba	8.240.000,00	6.840.000,00	0,00	
	Consorzio di bonifica Dese Sile	16.600.000,00	1.500.000,00	0,00	
	Consorzio di bonifica Destra Piave	1.500.000,00	0,00	0,00	
	Consorzio di bonifica Sinistra Medio Brenta	6.038.421,00	610.000,00	308.154,18	
	Ente di bacino RSU VE2	2.500.000,00	0,00	0,00	
	Veneto acque S.p.A.	20.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
	Magistrato alle Acque di Venezia	4.642.000,00	3.400.000,00	1.552.863,92	
	Diocesi Patriarcale di Venezia	1.300.743,00	750.000,00	344.700,00	
	Parrocchie di Ognissanti	800.000,00	800.000,00	200.771,61	
	Regione - Disinquinamento	15.619.447,15	4.000.000,00	0,00	
	Regione - Foreste/Agricoltura/Zootecnia	51.828.764,00	23.419.772,17	4.707.500,28	
	Regione - Bonifiche Siti Inquinati	952.250,28	44.500,00	35.014,88	
	Veneto Agricoltura	1.900.000,00	1.900.000,00	200.000,00	
	U.S.S.L. n. 12 - Venezia - Settore Ospedali	3.000.000,00	614.940,88	0,00	
	A.S.L. n. 15 - Alta Padovana	1.039.000,00	0,00	0,00	
	S.A.VE. Servizi Aeroportuali Venezia	6.610.000,00	0,00	0,00	
	Provincia di Padova	400.000,00	0,00	0,00	
	Provincia di Venezia	2.000.000,00	0,00	0,00	
	Associazione Teatro Stabile Veneto Goldoni	455.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	TOTALE	**1.762.495.821,01**	**1.262.953.504,44**	**885.432.733,08**	

PAGINA BIANCA

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Segreteria Regionale all'Ambiente e Territorio
Direzione Progetto Venezia
Servizio Legge Speciale per Venezia

RAPPORTO

SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

SUDDIVISO PER SOGGETTI ATTUATORI

Aggiornamento al 31 dicembre 2006

PAGINA BIANCA

INDICE

INDICE 3
RIEPILOGO DEI FINANZIAMENTI, DEGLI IMPEGNI E DELLE EROGAZIONI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA, AL 31 DICEMBRE 2006 7
GUIDA ALLA LETTURA DEL PRESENTE RAPPORTO 9

SEZIONE I: COMUNI 11
COMUNE DI ARQUA' PETRARCA 13
COMUNE DI CAMPODARSEGO 13
COMUNE DI CASTELFRANCO 13
COMUNE DI CAVALLINO 14
COMUNE DI CAVARZERE 15
COMUNE DI CODEVIGO 16
COMUNE DI CORNUDA 16
COMUNE DI ESTE 16
COMUNE DI FOSSO' 17
COMUNE DI GALZIGNANO TERME 17
COMUNE DI JESOLO / A.S.I. 18
COMUNE DI MARCON 19
COMUNE DI MEOLO 20
COMUNE DI MIRA 20
COMUNE DI MOGLIANO VENETO 21
COMUNE DI MONASTIER 21
COMUNE DI MONSELICE 21
COMUNE DI MORGANO 22
COMUNE DI MUSILE DI PIAVE 23
COMUNE DI NOALE 23
COMUNE DI PADOVA 24
COMUNE DI PIOVE DI SACCO 24
COMUNE DI PREGANZIOL 25
COMUNE DI QUARTO D'ALTINO 25
COMUNE DI SALZANO 25
COMUNE DI SPINEA 26
COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA 26
COMUNE DI VENEZIA / VE.S.T.A. 26
COMUNE DI ZERO BRANCO 35

SEZIONE II: AZIENDE SPECIALI CONSORTILI 37

AZIENDA CONSORZIO DEL MIRESE (A.C.M.) 39

AZIENDA PIOVESE GESTIONE ACQUE (A.P.G.A.) 47

AZIENDA BRENTA SERVIZI 50

AZIENDA SERVIZI IDRICI DELLA CASTELLANA 50

AZIENDA SERVIZI PUBBLICI A.S.P. DI CHIOGGIA 52

AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SILE PIAVE 55

ENERGIA TERRITORIO E RISORSE AMBIENTALI (E.T.R.A.) 57

AZIENDA CONSORZIO ACQUEDOTTO EUGANEO BERICO 57
AZIENDA CONSORZIO ALTA SERVIZI 58
AZIENDA CONSORZIO DEL TERGOLA 59
SE.T.A. – SERVIZI TERRITORIO AMBIENTE 67

AZIENDA SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO 69

SERVIZI PUBBLICI INTEGRATI MOGLIANO S.P.A. (SPIM S.P.A.) 69

AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE CENTRO VENETO SERVIZI 70

VE.S.T.A. 73

SEZIONE III: CONSORZI DI BONIFICA 75

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE BACCHIGLIONE 77

CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE BRENTA 79

CONSORZIO DI BONIFICA BASSO PIAVE 81

CONSORZIO DI BONIFICA DESE SILE 82

CONSORZIO DI BONIFICA DESTRA PIAVE 86

CONSORZIO DI BONIFICA PEDEMONTANO BRENTELLA DI PEDEROBBA 87

CONSORZIO DI BONIFICA SINISTRA MEDIO BRENTA 87

SEZIONE IV: REGIONE VENETO 91

REGIONE: ACQUEDOTTI 93

REGIONE: DISINQUINAMENTO / CONSORZIO VENEZIA DISINQUINAMENTO (C.V.D.) 93

REGIONE: BONIFICA SITI INQUINATI 97

REGIONE: FORESTE / AGRICOLTURA / ZOOTECNIA 98

SEZIONE V: AMMINISTRAZIONI E SOCIETA' PUBBLICHE 101

ARPAV 103

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA 104

AZIENDA SPECIALE PORTO DI CHIOGGIA 105

ENTE DI BACINO R.S.U. VENEZIA 2 105
MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA 106
PROVINCIA DI VENEZIA 107
PROVINCIA DI PADOVA 107
S.A.VE. – SERVIZI AEROPORTUALI VENEZIA 107
U.L.S.S. N° 12 - VENEZIA 108
A.S.L. N° 15 – ALTA PADOVANA 109
U.L.S.S. N° 17 – ESTE - MONSELICE 109
VENETO ACQUE S.P.A (EX DELTA PO S.P.A.) 109
VENETO AGRICOLTURA 110

SEZIONE VI: ENTI VARI 113

ABBAZIA DI SAN GIORGIO MAGGIORE (VENEZIA) 115
COMUNITA' EBRAICA DI VENEZIA 115
DIOCESI PATRIARCALE DI VENEZIA 115
ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DEL VENETO "GOLDONI" 116
PARROCCHIA DI OGNISSANTI 117
ENTI VARI 117

RIEPILOGO DEI FINANZIAMENTI, DEGLI IMPEGNI E DELLE EROGAZIONI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA, AL 31 Dicembre 2006

nr.	ENTE	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Azienda Consorzio del Mirese (A.C.M.)	102.630.666,01	96.219.716,82	77.951.283,41
2	Azienda Piovese Gestione Acque (A.P.G.A.)	48.442.369,96	39.302.002,70	26.294.703,05
3	Azienda Servizi Idrici della Castellana	10.433.025,69	10.433.025,69	8.393.866,18
4	Azienda Servizi Pubblici Sile Piave s.p.a	23.019.854,39	22.023.695,76	11.560.829,71
5	Energia Territorio Risorse Ambientali (E.T.R.A.)	164.741.942,84	145.535.140,60	108.472.066,01
6	Centro Veneto Servizi	48.929.293,36	48.929.293,36	22.847.868,28
7	Azienda Brenta Servizi	2.685.720,00	0,00	0,00
8	Azienda S.P.I.M.	3.403.084,50	3.403.084,50	2.324.056,05
9	A.S.P. di Chioggia	70.964.561,96	56.894.031,72	48.578.206,52
10	Consorzio Schievenin Alto Trevigiano	7.360.000,00	0,00	0,00
11	VESTA - Venezia Servizi Territoriali Ambientali	26.539.890,65	16.952.324,22	1.606.223,80
12	Comune di Arquà Petrarca	2.065.827,60	2.065.827,60	2.053.264,57
13	Comune di Campodarsego	5.082.284,50	2.582.284,50	159.380,45
14	Comune di Castelfranco Veneto	6.610.848,31	6.314.048,61	2.950.773,37
15	Comune di Cavallino	11.470.939,69	8.153.939,69	6.042.545,72
16	Comune di Cavarzere	7.488.825,04	7.488.091,86	7.125.198,56
17	Comune di Codevigo	3.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70
18	Comune di Comuda	943.678,00	943.678,00	796.822,28
19	Comune di Este	2.102.237,80	2.102.237,80	1.553.655,93
20	Comune di Fossò	914.684,42	914.684,42	683.256,00
21	Comune di Galzignano	965.774,40	965.774,40	893.715,01
22	Comune di Jesolo / A.S.I.	6.966.029,80	6.983.446,81	5.905.536,84
23	Comune di Marcon	1.859.244,84	1.859.244,84	1.798.166,92
24	Comune di Meolo	1.032.913,80	1.032.913,80	981.268,11
25	Comune di Mira	4.166.469,57	113.620,50	113.620,50
26	Comune di Mogliano Veneto	6.352.419,86	6.352.419,86	5.871.302,30
27	Comune di Monastier	1.549.370,70	1.549.370,70	1.401.842,79
28	Comune di Monselice	6.749.272,61	6.749.272,61	6.324.081,26
29	Comune di Morgano	3.550.387,09	3.550.387,09	3.165.070,11
30	Comune di Musile di Piave	2.815.655,85	2.815.655,85	2.811.085,80
31	Comune di Noale	3.408.615,80	2.200.108,40	2.135.465,91
32	Comune di Padova	2.065.827,60	2.065.827,60	2.065.827,60
33	Comune di Piove di Sacco	3.615.198,29	3.615.198,29	3.615.193,13
34	Comune di Pregarziol	1.807.599,15	1.807.599,15	1.567.431,09
35	Comune di Quarto d'Altino	5.422.797,44	5.422.797,44	5.100.289,25
36	Comune di Salzano	2.400.000,00	2.400.000,00	160.056,69
37	Comune di Spinea	500.000,00	0,00	0,00
38	Comune di Tezze sul Brenta	1.250.000,00	575.000,00	75.000,00
39	Comune di Venezia /VE.S.T.A.	384.982.881,91	302.420.309,34	203.284.003,08
40	Comune di Zero Branco	2.275.827,60	2.275.827,60	2.099.866,58
41	Consorzio di bonifica Adige – Bacchiglione	60.948.350,86	36.265.638,64	23.887.556,69

nr.	ENTE	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
42	Consorzio di bonifica Basso Piave	4.323.102,82	1.344.931,82	1.344.881,11
43	Consorzio di bonifica Brenta – Bacchiglione	39.454.983,95	16.596.746,31	5.194.114,02
44	Consorzio di bonifica Brentella di Pederobba	9.843.748,75	7.683.748,75	613.796,31
45	Consorzio di bonifica Dese – Sile	74.250.513,00	35.060.968,92	23.201.280,89
46	Consorzio di bonifica Destra Piave	6.148.112,09	2.117.473,29	2.117.473,29
47	Consorzio di bonifica Sinistra – medio Brenta	32.700.196,14	17.239.912,15	8.097.580,73
48	Regione – Bonifiche siti inquinati	23.162.229,88	10.324.053,88	9.759.378,80
49	Regione – Acquedotti / Delta Po	10.974.709,11	19.625,36	19.625,36
50	Regione – Disinquinamento / C.V.D.	141.007.818,78	53.990.471,91	42.399.717,02
51	Regione – Foreste/Agricoltura/Zootecnia	145.023.411,72	95.887.979,50	57.270.748,59
52	Veneto Acque S.p.A.	79.121.154,18	65.121.154,18	41.915.864,69
53	Veneto Agricoltura	5.200.000,00	1.900.000,00	200.000,00
54	ARPAV	25.584.352,93	25.508.175,57	20.774.544,55
55	Autorità portuale di Venezia	516.450,00	516.450,00	0,00
56	Azienda Speciale Porto di Chioggia	2.500.000,00	615.040,00	0,00
57	Ente di bacino R.S.U. VE 2	24.810.938,04	22.310.938,04	22.310.938,04
58	Magistrato alle Acque di Venezia	18.738.581,52	15.774.740,04	6.053.184,32
59	Provincia di Padova	400.000,00	0,00	0,00
60	Provincia di Venezia	2.000.000,00	0,00	0,00
61	S.A.V.E. - Servizi Aeroportuali di Venezia	6.610.000,00	0,00	0,00
62	U.S.S.L. n.12 – Venezia/Disinquinamento	2.840.512,94	2.840.512,95	2.024.054,16
62a	U.S.S.L. n.12 – Venezia/Ospedali	20.301.308,12	17.916.246,98	17.261.746,32
63	A.S.L. n. 15 Alta Padovana	1.039.000,00	0,00	0,00
64	U.S.S.L. n.17 - Este-Monselice	1.523.142,25	1.291.142,25	1.285.164,00
65	Abbazia di San Giorgio Maggiore	286.582,76	286.582,76	278.532,97
66	Comunità Ebraica di Venezia	2.000.000,00	2.000.000,00	1.800.000,00
67	Diocesi Patriarcato di Venezia	25.765.143,00	1.214.400,00	478.500,00
68	Parrocchia Ognissanti	800.000,00	800.000,00	200.771,61
69	Associazione Teatro Stabile del Veneto "Goldoni"	455.000,00	0,00	0,00
70	Enti Vari (Fondo rotazione progetti)	2.009.881,29	1.987.326,15	1.939.380,08
	TOTALI	1.762.485.821,01	1.262.953.504,44	655.432.733,06

GUIDA ALLA LETTURA DEL PRESENTE RAPPORTO

Gli schemi che sono riportati nel proseguo di questo report rappresentano la successione ordinata, Ente per Ente, di tutti i finanziamenti erogati dal Servizio Legge Speciale nella sua storia.

Lo scopo di questo lavoro è, oltre che quello di quantificare i singoli finanziamenti, di riepilogare lo stato dei lavori andando ad individuare le principali fasi di esecuzione:

- data di approvazione del finanziamento
- data di approvazione del progetto
- data di inizio lavori
- data di fine lavori
- data di collaudo

In molti casi un singolo finanziamento può essere stato diviso dall'Ente e dar vita a più progetti. In questo caso una singola riga di finanziamento si interrompe e si sviluppa in un numero di righe pari al numero di progetti sviluppati. Come si vede nell'esempio la riga madre (n. 12) mantiene i riferimenti dell'approvazione del finanziamento ma rimanda alle righe successive le informazioni inerenti i tempi di esecuzione del progetto e degli impegni ove siano separati.

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio e consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
12	Interventi strutturali: ricalibrazione e adeguamento sez. idraulica del fiume Dese (finanziamento iniziale: 8.263.310,39 euro)	5/B/2	DGR N. 6400 DEL 12/12/1995		8.263.310,39			Finanziamento suddiviso negli interventi 12A (€ 4.131.655,19) e 12B (€ 4.131.655,19)				
12A	Ristrutturazione rete di bonifica dell'area centrale e del medio corso del fiumi Dese e Zero e tributaria dei corsi d'acque consortili: Piovega di C., Desolino, Rio S.Martino, Piovega di S., Rio S.Ambrogio, Piovega di L. e Piovega dei Tre Comuni, Fossa Storta e Zermason (€ 4.131.655,19)		Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 12 (€ 4.131.655,19)					Progettazione definitiva in corso				
12B	Ristrutturazione rete di bonifica tributaria dei collettori Marignana, Deviatore Piovega di Peseggia, Badino Pisani, Peseggiana, Marocchesa e Terò in Comune di Venezia, Mogliano V.to e Scorzè (€ 4.131.655,19)		Realizzato con parte dei fondi del finanziamento 12 (€ 4.131.655,19)					Progettazione in corso				Progetto all'esame della Commissione V.I.A.

Ci sono anche casi in cui due o più finanziamenti danno vita ad un unico progetto. In questo caso le righe degli interventi originari (che sono stati evidenziati in grigio) contengono le informazioni sul finanziamento, mentre le notizie inerenti all'impegno e allo stato dei lavori sono riportate nella riga relativa all'intervento unificato.

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio e consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Impianto di Vigonza (PD)		DGR N. 4978 DEL 2/11/1993	OPGR N. 2267 DEL 6/11/1996	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	Finanziamento convogliato nell'intervento 4A				
4	Ampliamento dell'impianto di depurazione in Comune di Vigonza	1/A/2	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	OPGR N. 2267 DEL 6/11/1996	6.507.356,93	6.507.356,93	6.507.356,93	Finanziamento convogliato nell'intervento 4A				
4A	Esecuzione dei lavori di ampliamento impianto di depurazione di Vigonza (€ 7.540.270,73)		Riuniti i finanziamenti 1 (€ 1.032.913,80) + 4 (€ 6.507.356,93) = € 7.540.270,73					Lavori collaudati	24/09/1998	07/07/1999 26/07/1999	10/02/2000 15/02/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDOA n. 4 del 15/01/2001 per € 7.540.270,73

Inoltre, le note nelle tabelle guidano il lettore nella consultazione dei progetti realizzati con i fondi della Legge Speciale.

SEZIONE I: COMUNI

Nota: nelle tabelle che seguono vengono riportati i finanziamenti attribuiti direttamente ai Comuni

PAGINA BIANCA

COMUNE DI ARQUA' PETRARCA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Fognatura nel comune di Arquà Petrarca	6/A/2	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DPGR N. 6 DEL 3/1/1996	516.456,90	516.456,90	513.783,45	Lavori collaudati	05/02/1999 01/06/1999	23/07/2002	08/09/2003	Decreto di contabilità finale in sospeso, in attesa dell'invio da parte dell'ente della documentazione completa relativa al collaudo
2	Ampliamento della rete fognaria in Comune di Arquà Petrarca	A/1/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DGCA N. 540 9/12/1997	1.549.370,70	1.549.370,70	1.539.501,09	Lavori collaudati	16/06/1998 03/12/1998	25/01/2001	29/09/2003	Registrata, con DDPV 55 del 20/04/2006, economia di € 9.869,61
	TOTALI				2.065.827,60	2.065.827,60	2.053.284,57					

COMUNE DI CAMPODARSEGO

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Bonifica ambientale presso la discarica di Campodarsego (PD)	D/84	DGR N. 1834 23/6/2000	DGR N. 2621 10/10/2001	2.582.284,50	2.582.284,50	169.380,45	Lavori in corso				
2	Intervento di bonifica e riqualificazione ambientale della discarica per RSU in loc. S. Andrea	B/15	DGR N. 24 DEL 04/05/2004		2.500.000,00	0,00	0,00	Progettazione in corso				
	TOTALI				5.082.284,50	2.582.284,50	169.380,45					

COMUNE DI CASTELFRANCO

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Integrazione tecnologica dell'impianto di depurazione in Comune di Castelfranco Veneto, località Salvatronda	A/10/1	DGR N. 2613 DEL 22/07/1998	DDDA N. 25 19/03/1999	1.446.079,32	1.446.079,32	1.178.114,61	Lavori collaudati	23/05/2000	29/11/2001		Registrata, con DDPV N. 142 del 02/10/2006, economia di € 267.964,71
2	Interventi di fognature e depurazione	B1/52	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000		258.228,45			Finanziamento convogliato nell'intervento 3A				
3	Interventi di ampliamento dell' impianto di depurazione di Salvatronda	1/R/1	DGR N. 784 DEL 09/04/2002	DDDA N. 257 28/12/2004	1.187.850,87	1.187.850,87	1.002.376,16	Finanziamento convogliato nell'intervento 3A				
3A	Interventi di ampliamento dell' impianto di depurazione di Salvatronda (€ 1.446.079,32)		Riuniti i finanziamenti 2 (€ 258.228,45) + 3 (€ 1.187.850,87) = € 1.446.079,32					In fase di progettazione				

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione atto impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
4	Interventi di razionalizzazione processi depurativi ed estensione rete fognaria comunale (€ 2.375.701,74)	1/R/2	DGR N. 784 DEL 09/04/2002					Finanziamento diviso negli interventi 4A (€ 1.319.848,42), 4B (€ 346.985,06), 4C (€ 671.394,00) e 4D (€ 38.374,26)				
4A	Potenziamento del Depuratore di Salvatronda per l'allacciamento dei comuni di Asolo, Fonte e Paderno	1/R/2.3	DGR N. 784 DEL 09/04/2002	DDDA N. 170 11/10/2005	1.319.848,42	1.319.848,42	79.078,17	In fase di progettazione				
4B	Integrazione fasi di processo depuratori Borgo Padova e Salvatronda. Filtrazione e disinfezione dello scarico	1/R/2.2	DGR N. 784 DEL 09/04/2002	DDDA N. 257 28/12/2004	346.985,06	346.985,06	0,00	Progetto approvato				
4C	Interventi di razionalizzazione processi depurativi ed estensione rete fognaria comunale. Località S. Andrea O. M. (€ 671.394,00)	1/R/2.1	DGR N. 784 DEL 09/04/2002	DDDA N. 116 23/06/2004	671.394,00	671.394,00	291.076,39	Lavori in corso				
4D	Interventi di razionalizzazione processi depurativi ed estensione rete fognaria comunale	1/R/2.4	DGR N. 784 DEL 09/04/2002		38.374,26	0,00	0,00	In fase di progettazione				
5	Integrazione tecnologica dell' impianto di depurazione di Borgo Padova	1/R/3	DGR N. 784 DEL 09/04/2002					Finanziamento diviso negli interventi 5A (€ 1.216.657,36) e 5B (€ 128.130,58)				
5A	Integrazione tecnologica dell' impianto di depurazione di Borgo Padova	1/R/3.1	DGR N. 784 DEL 09/04/2002	DDDA N. 258 28/12/2004	1.216.657,36	1.216.657,36	400.126,04	Lavori in corso				
5B	Potenziamento del Depuratore di Salvatronda per l'allacciamento dei comuni di Asolo, Fonte e Paderno	1/R/3.2	DGR N. 784 DEL 09/04/2002	DDDA N. 170 11/10/2005	128.130,58	128.130,58	0,00	Progetto approvato				
	TOTALI				8.610.848,31	8.314.048,81	2.850.773,37					

COMUNE DI CAVALLINO

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione atto impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Lavori di ristrutturazione e completamento della rete fognaria del Cavallino (VE)	C/3/1.2	DGR N. 2613 DEL 22/7/1999	DDDA N. 38 23/4/2002	4.648.112,09	4.648.112,09	4.648.112,09	Lavori in corso				DDDA 58 del 06/04/2005 nuovi termini per fine lavori : 23/04/2007.
2	Lavori di ristrutturazione e completamento della rete fognaria del Cavallino (VE)	B1/B3	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 38 23/4/2002	1.032.913,80	1.032.913,80	464.811,21	Lavori in corso				DDDA 58 del 06/04/2005 nuovi termini per fine lavori : 23/04/2007.
3	Costruzione della rete di fognatura nera della zona di Via dell'artigliere in comune di Cavallino - Treporti (VE)	1/S/1	DGR N. 784 DEL 9/4/2002	DDDA N. 2 07/01/2004	1.032.913,80	1.032.913,80	929.622,42	Lavori in corso				
4	Bonifica ex discarica per RSU	4/A/1.1	DGR N. 784 DEL 9/4/2002		517.000,00			Progetto in fase di redazione				Vedi scheda riepilogativa degli interventi relativi alla bonifica dei siti inquinati nel bacino scolante
5	Completamento della fognatura separata (nera e bianca) zona di Ca Ballarin e Ca Valle	E/10.2	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 116 20/07/2006	1.440.000,00	1.440.000,00		Progettazione in corso				

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
6	Interventi vari di miglioramento dell'impianto di depurazione del Cavallino (trattamento fanghi e igiene ambientale)	E/11	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.200.000,00			Progettazione in corso				
7	Individuazione e riduzione di acque parassite nella fognatura	E/10.1	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.600.000,00			Progettazione in corso				
	TOTALI				11.470.939,69	8.163.939,69	6.042.545,72					

COMUNE DI CAVARZERE

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Fognatura comunale di Cavarzere	I/4.5	DGR N. 2773 DEL 21/8/1994	DDDA N. 62 DEL 8/9/1995	568.102,89	568.102,89	566.906,85	Lavori collaudati	Data non comunicate dall'ente			Registrata, con DDDA n. 19 del 26/02/2001, un'economia di € 1.195,73 reiscritta sui fondi impegnati con DGR n. 188/CR/1993
2	Ampliamento dell'impianto di depurazione - III lotto	I/4.5bis	DGR N. 2773 DEL 21/8/1994	DPGR 2293 9/11/1998	723.039,66	723.039,66	723.039,66	Lavori collaudati	Data non comunicate dall'ente			Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 93 del 23/09/2002
3	Ampliamento della rete fognaria in Comune di Cavarzere	B/16/1.A	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 64 12/11/1998	1.549.370,70	1.549.370,70	1.347.068,14	Lavori collaudati	Data non comunicate dall'ente			Registrata, con DDDA n. 204 del 22/10/2004, un'economia di € 4.303,48. Richiesta la restituzione alla R.V. di € 202.302,56
5	Interventi fognari a Villaggio Busonera, S. Giuseppe e Zona Industriale	B/16 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 81 9/10/2000	1.549.370,70	1.549.370,70	1.532.180,55	Lavori collaudati	Data non comunicate dall'ente			Registrata, con DDDA n. 228 del 03/12/2004, un'economia di € 17.190,15
6	Realizzazione di interventi fognari nelle località Rottanova, Cà Venier e Villaggio Busonera.	B1/61	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 126 4/10/2001	2.068.827,60	2.068.827,60	2.060.253,98	Lavori collaudati				Registrata, con DDPV n. 118 del 26/07/2006, un'economia di € 8.573,62
7	Estensione della rete fognaria e depurazione nel territorio comunale	I/L/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 97 26/05/2004	1.032.913,80	1.032.380,62	896.749,37	Lavori in corso				
	TOTALI				7.488.625,04	7.488.091,88	7.126.198,56					

COMUNE DI CODEVIGO

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Ampliamento della rete fognaria di Codevigo (PD)	1/2.13	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DPGR 2281 29/10/1992	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	Lavori collaudati	Date non comunicate dall'ente			Determinazione del contributo definitivo con DGCA n. 381 del 02/10/1997
2	Interventi di ripristino dei caratteri lagunari in alcune aree della gronda attraverso rinaturalizzazione di aree prossime alla conterminazione lagunare, finalizzate al ripristino delle funzioni ecologiche proprie delle zone umide	B/6	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		2.000.000,00			Progetto preliminare				Stipulato un accordo di programma tra il comune di Codevigo e il MAV per la realizzazione dell'intervento
	TOTALI				3.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70					

COMUNE DI CORNUDA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Adeguamento ai limiti di legge del depuratore comunale di Cornuda, località La Valle	E/12	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDDA N. 42 09/03/2005	943.676,00	943.676,00	796.822,25	Progetto approvato				
	TOTALI				943.676,00	943.676,00	796.822,25					

COMUNE DI ESTE

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Ampliamento della rete fognaria nella zona del canale Bisatto - XI stralcio "Meggiaro"	A/6/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 30 DEL 6/5/1998	1.291.142,25	1.291.142,25	1.182.028,02	Collaudo in corso Lavori ultimati	02/02/2000 09/06/2003	16/05/2001 -		
2	Lavori di rifacimento delle fognature e pavimentazione nelle via Sabina, Largo Tiepolo - XIV° stralcio fognature.	B1/64.B	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 67 DEL 4/5/2001	516.456,90	516.456,90	96.989,28	Lavori in corso				DDDA 59 del 6/04/05 nuovi termini fine lavori : 04/06/2006.
3	Ampliamento ed adeguamento tecnologico dell'impianto di depurazione di Este - III° lotto, 1° stralcio	B1/64.A	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 53 DEL 9/5/2001	294.638,55	294.638,55	294.638,55	Lavori in corso				Finanziamento originale € 1.549.370,70: cambio soggetto attuatore. Quota non ancora erogata trasferita al Centro Veneto Servizi
	TOTALI				2.102.237,80	2.102.237,80	1.563.656,93					

COMUNE DI FOSSO'

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio e consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Bonifica sito inquinato via Favalli, in comune di Fossò (VE)	D/84	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DGR N. 2621 10/10/2001	634.684,42	634.684,42	634.684,42	Lavori ultimati				
2	Bonifica area ex discarica per RSU, in via Favalli	4/A/1.6C	DGR N. 794 DEL 09/04/2002	DGR 2833 10/09/2004	280.000,00	280.000,00	48.571,58	Lavori in corso				
	TOTALI				914.684,42	914.684,42	683.256,00					

COMUNE DI GALZIGNANO TERME

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Collegamento della fognatura comunale all'impianto di depurazione di Battaglia Terme	C/30/1	DGR N. 553 DEL 25/02/1997	DDDA N. 62 11/06/1997	348.028,12	348.028,12	274.003,05	Lavori collaudati	14/05/1998	29/06/2002	19/09/2003	Registrata, con DDDA n. 119 del 23/06/2004, un'economia di € 72.023,06
2	Ampliamento della rete fognaria nel Comune di Galzignano	A/7/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DGCA N. 185 24/4/1998	619.746,28	619.746,28	619.711,96	Lavori collaudati	11/01/1999	09/03/2001	31/02/2002	Registrata, con DDDA n. 61 del 31/05/2002, un'economia pari a € 36,32
	TOTALI				968.774,40	968.774,40	893.715,01					

COMUNE DI JESOLO / A.S.I.

FINANZIAMENTI DIRETTI AL COMUNE

Finanziamenti gestiti dal Comune di Jesolo

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Completamento dell'impianto di depurazione di Jesolo (VE)	1/1.4			1.291.142,25	1.291.142,25	1.282.148,91	Lavori collaudati			16/01/1997	Registrata, con DDLP n. 312 del 02/12/1998, un'economia pari a € 8.993,34 da reiscrivere sul capitolo 50511 del bilancio regionale esercizio 1998
2	Rilievi ed ispezioni televisive della rete fognaria del Comune di Jesolo (VE). 2° Stralcio	1/1.4.1	DGR N. 744 DEL 1/7/1988	DGR N. 158 27/9/1996	46.551,70	46.551,70	46.551,70	Lavori collaudati	03/07/1996	03/11/1998	29/01/1997	Registrata, con DDDA n. 29 del 16/05/2000, un'economia di € 54.486,00 reimpiegata nell'intervento 12
3	Progetto esecutivo delle opere fognarie di collegamento della zona P.I.P. all'impianto di depurazione (VE)	1/1.4.2	DGR N. 744 DEL 1/7/1988	DDDA N. 182 2/10/1996	95.639,10	95.639,10	95.639,10	Lavori collaudati	07/01/1997	15/04/1997	24/07/1997	Registrata, con DDDAn. 98 del 21/10/1999, un'economia di € 84.462,84 reimpiegata nell'intervento 11
4	Interventi alle reti -parte 1^/ parte 2^.	1/1.4.3a	DGR N. 744 DEL 1/7/1988	DDDA N. 71 23/6/1997	242.406,28	242.406,28	242.406,28	Lavori collaudati				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 105 del 26/10/1999
6	Opere di completamento fognario	1/1.22		DPGR 2853 31/12/1990	59.686,88	59.686,88	59.686,88	Lavori ultimati				
5	Ampliamento della rete fognaria di via Baffie in Comune di Jesolo (VE)	1/2.10a	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DDDA N. 14 16/4/1993	2.614.145,76	2.614.145,76	2.614.145,76	Lavori collaudati	04/09/1995	01/05/1997	24/06/1998	L'erogazione comprende l'importo di € 226.367,16 (economia) reimpiegata nell'intervento 14, con DDDA n. 34 del 21/06/2000
7	Interventi alle reti -parte 1^ / parte 2^.	1/1.4.3b	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DDDA N. 71 23/6/1997	126.343,95	126.343,95	126.343,95	Lavori collaudati				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 105 del 26/10/1999
8	Progetto degli interventi presso l'impianto di depurazione comunale.	1/2.10b	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DDDA N. 13 12/5/1997	1.142.673,28	1.142.673,28	1.080.850,81	Lavori collaudati	17/09/1997	13/11/1999	07/03/2002	Registrata, con DDDA n. 6 del 05/02/2003, un'economia di € 61.822,47
9	Somme per ulteriori interventi per copertura supero di spesa progetto "ampliamento rete fognaria Via Baffie" (1/2.10a)		DGR N. 4599 DEL 5/8/1991		9.119,02	6.536,02	6.536,02					Dati non forniti dall'ente
10	Progetto esecutivo per il trattamento dei percolati di discarica presso l'impianto di depurazione comunale		DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DDDA N. 35 DEL 5/5/1999	6.527,10	6.527,10	6.527,10	Finanziamento riallocato nell'intervento 13A				
	TOTALI				5.634.236,34	5.631.852,35	5.560.836,53					

Finanziamenti gestiti dall'ASI

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio e consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
11	Progetto esecutivo per il trattamento dei percolati di discarica presso l'impianto di depurazione comunale di Jesolo (€ 64.482,00)	1/1.4.4a	DGR N. 744 DEL 1/7/1988	DDDA N. 27 12/3/2001	64.482,64	64.482,64	63.847,29	Finanziamento convogliato nell'intervento 13A				Finanziamento costituito dall'economia di € 64.482,64 dell'intervento 3 del comune di Jesolo
12	Progetto definitivo rete fognatura in via Rusti Comune di Jesolo (€ 64.488,00)	1/1.4.1 bis	DGR N. 744 DEL 1/7/1988	DDDA N. 25 25/3/2002	64.488,88	64.488,88	64.488,88	Finanziamento convogliato nell'intervento 14A				Finanziamento costituito dall'economia di € 64.488,88 dell'intervento 2 del comune di Jesolo
13	Progetto esecutivo per il trattamento dei percolati di discarica presso l'impianto di depurazione comunale di Jesolo	1/1.4.4b	DGR N. 4599 DEL 8/8/1991	DDDA N. 27 12/3/2001	6.478,90	6.478,90	0,00	Finanziamento convogliato nell'intervento 13A				
13A	Trattamento dei percolati da discarica (€ 77.488,83)		Riuniti i finanziamenti 10 (€ 6.527,10) + 13 (€ 6.478,90) + 11 (€ 64.482,64) = € 77.488,83					Lavori ultimati. Collaudo in corso	03/09/2001	30/04/2002	-	
14	Progetto definitivo rete fognatura in via Rusti Comune di Jesolo	1/2.10a bis	DGR N. 744 DEL 1/7/1988	DDDA N. 25 25/3/2002	226.367,16	226.367,16	226.367,16	Finanziamento convogliato nell'intervento 14A				
14A	Costruzione della rete fognaria in via Rusti - Comune di Jesolo (€ 280.853,02)		Riuniti i finanziamenti 12 (€ 64.488,88) + 14 (€ 226.367,16) = € 280.853,02					Lavori ultimati. Collaudo in corso	22/04/2002	03/10/2003	-	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 99 del 03/06/2005
	TOTALI				351.794,46	351.794,46	344.700,31					
	Totale Comune di Jesolo/A.S.I.				6.988.029,50	6.983.448,81	6.905.638,84					

COMUNE DI MARCON

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio e consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Costruzione della fognatura del Comune di Marcon - VIII lotto		DGR N. 950 DEL 31/10/1987	DDLP N. 951 31/10/1987	42.794,90	42.794,90	42.794,90	Lavori collaudati	22/03/1988	30/10/1990		Determinazione del contributo definitivo con Decreto del LL_PP n. 7 del 28/03/2000
2	Recupero della rete di fognatura nera in loc. Gaggio	1/4.7.2	DGR N. 48 DEL 25/06/1999	DDDA N. 48 25/6/1999	267.079,24	267.079,24	266.770,30	Lavori collaudati	25/06/2001	17/06/2002	14/01/2003 -	Registrata, con DDDA n. 103 del 23/06/2005, un'economia di € 308,94
3	Riabilitazione fognaria del Comune di Marcon	C/29/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DGCA N. 186 24/4/1998	1.549.370,70	1.549.370,70	1.488.601,72	Lavori collaudati	25/06/2001			Registrata, con DDDA n. 167 del 3/10/2005, un'economia di € 60.768,98
	TOTALI				1.859.244,84	1.859.244,84	1.798.166,92					

COMUNE DI MEOLO

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Adeguamento impianto di depurazione e rete fognaria in comune di Meolo.	3b	DGR N. 4975 DEL 2/11/1993	DDDA N. 7 20/1/1995	516.456,90	516.456,90	464.811,21	Finanziamento diviso negli interventi 1A, 1B e 1C				
1A	Adeguamento per adeguamento impianto di depurazione e della rete di fognatura di via Cà Tron, via Verdi e via Toscanini (progetto complessivo € 428.963,36)		Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 1					Lavori collaudati	12/06/1998	10/06/1999	25/09/2000	Documentazione relativa al collaudo, sollecitata più volte, non ancora inviata da parte dell'ente
1B	Ampliamento per adeguamento impianto di depurazione e della rete di fognatura (progetto complessivo € 74.913,49)		Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 1					Lavori collaudati	09/11/1995	15/10/1998	coll. provvis. 15-10-1998	Documentazione relativa al collaudo, sollecitata più volte, non ancora inviata da parte dell'ente
1C	Ampliamento per adeguamento impianto di depurazione e della rete di fognatura (progetto complessivo € 74.554,87)		Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 1					Lavori collaudati	09/11/1995	15/10/1998	coll. provvis. 15-10-1998	Documentazione relativa al collaudo, sollecitata più volte, non ancora inviata da parte dell'ente
2	Ampliamento della rete fognaria in Comune di Meolo (progetto complessivo € 638.335,67)	B/19/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 11 DEL 6/5/1998	516.456,90	516.456,90	516.456,90	Lavori collaudati	12/06/1998	10/06/1999	25/09/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 166 del 13/11/2003
	TOTALI				1.032.913,80	1.032.913,80	981.268,11					

COMUNE DI MIRA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Bonifica area inquinata localizzata in via Teramo, loc. Olmo di Borbiago in comune di Mira (VE)	B/17 V fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DDDA N.148 13/12/2002	1.136.295,18	113.620,50	113.620,50	Progettazione in corso				Vedi scheda riepilogativa degli interventi relativi alla bonifica dei siti inquinati nel bacino scolante. Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione
2	Parco lagunare di Mira	D/82	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000		2.682.284,50			Progettazione in corso				Intervento congiunto con il Consorzio Sinistra Medio Brenta e la Regione Veneto
3	Intervento di messa in sicurezza di emergenza della discarica della Soc. Veneta Mineraria in loc. Bastiette	B/15	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		200.000,00			Progettazione in corso				
4	Intervento di messa in sicurezza dell'area Baldan.	B/15	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		250.000,00			Progettazione in corso				
	TOTALI				4.168.489,67	113.620,50	113.620,50					

COMUNE DI MOGLIANO VENETO

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Fognatura del Comune di Mogliano Veneto (TV)			DGR 984 DEL 09/10/1986	413.165,52	413.165,52	378.748,50	Lavori collaudati			14/11/1996	Registrata, con DDLP n. 407 del 14/11/1996, un'economia pari a € 34.417,02 impegnata sul capitolo 60511 del bilancio regionale esercizio 1986
2	Fognature frazioni di Bonisiolo e Zerman in comune di Mogliano Veneto (TV)			DGR 875 DEL 12/09/1986	258.228,45	258.228,45	231.686,14	Lavori collaudati	13/07/1987	18/03/1988		Registrata, con DDLP n. 684 del 06/11/1991, un'economia pari a € 26.562,30
3	Opere di completamento della fognatura comunale e monitoraggio/telerilevamento impianti di sollevamento	B/G/1	DGR N. 4977 DEL 02/11/1993	DDDA N. 68 24/11/1994	3.098.741,39	3.098.741,39	2.756.972,37	Lavori ultimati				Dati e documentazione non ancora inviata da parte dell'ente
4	Ampliamento della rete fognaria in Comune di Mogliano Veneto	A/11/1	DGR N. 2613 DEL 22/07/1997	DDDA N. 84 09/12/1998	2.582.284,60	2.582.284,60	2.604.916,29	Lavori ultimati				Registrata, con DDDA n. 113 del 11/07/2005, un'economia pari a € 77.369,21
	TOTALI				6.352.419,88	6.352.419,88	5.971.302,30					

COMUNE DI MONASTIER

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Ampliamento della rete fognaria e dell'impianto di depurazione comunale in Comune di Monastier	B/12/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 29 DEL 5/8/1998	1.401.642,79	1.401.642,79	1.401.642,79	Lavori collaudati	01/07/1999	26/10/2001	22/07/2002	Importo originale del progetto pari a € 1.549.370,70. Registrata, con DDDA n. 36 del 14/04/2003, un'economia di € 147.727,91, reinvestita per finanziare l'int. 2
2	Ampliamento della rete fognaria in via Pralongo nel comune di Monastier - opere di completamento	B/12/1.1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 182 05/10/2004	147.727,91	147.727,91	0,00	Progetto approvato				Utilizzo economie di spesa maturate dal decreto contabilità finale n. 36 del 14/04/2003
	TOTALI				1.549.370,70	1.549.370,70	1.401.642,79					

COMUNE DI MONSELICE

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Fognatura di Monselice	B/A/1	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DPGR N. 103 24/1/1995	2.582.284,50	2.582.284,50	2.582.284,50	Lavori collaudati	20/11/1995	03/12/1998	31/10/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 41 del 28/04/2002

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione del rilapogio	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
2	Ampliamento della rete fognaria in Comune di Monastier	A/8/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 116 13/12/1999	2.582.284,50	2.582.284,50	2.575.114,19	Lavori collaudati	18/01/2000	26/09/2002		Registrata, con DDDA n. 19 del 06/02/2005, un'economia di € 7.170,31
3	Impianto di depurazione	B1/85	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 90 06/08/2003	774.685,35	774.685,35	763.823,33	Lavori collaudati				Registrata, con DDPV n. 119 del 28/07/2006, un'economia di € 20.882,02
4	Interventi di completamento ed adeguamento della rete fognaria della frazione Marendole e di via Mandic	1/U/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 28 28/5/2003	284.051,29	284.051,29	255.646,17	Lavori in corso				
5	Bonifica area ex inceneritore	4/A/1.4	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 197 14/10/2004	1.807.599,00	1.807.599,00	167.193,09	Lavori in corso				
6	Bonifica area ex inceneritore per RSU in località Schiavonesca	4/A/1.6A	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DGR 2833 10/09/2004	718.367,88	718.367,88	0,00	Progetto approvato				
	TOTALI				8.749.272,81	8.749.272,81	6.324.061,28					

COMUNE DI MORGANO

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione del rilapogio	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Ampliamento della fognature comunale di via Ongarie, via Zaricko, via Statue, via Aldo Moro in Comune di Morgano (Tv)	B/14 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 62 DEL 1/8/2000	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.142,25	Lavori collaudati	14/01/2003	22/07/2003		Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 146 del 13/09/2005
2	Lavori di ampliamento delle fognature comunali nelle vie S. Martino, Chiesa, Trentin, Papa Luciani in comune di Morgano (TV).	B1/85	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 13 22/2/2002	616.456,90	616.456,90	614.853,49	Lavori collaudati				Registrata, con DDPV 30 del 21/03/2006, economia di € 1.603,41
3	Bonifica ex discarica R.S.U. in loc. via Bosco	D/84	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DGR N. 2621 10/10/2001	616.456,90	616.456,90	397.950,24	Lavori in corso				
4	Interventi di fognatura e depurazione nel territorio comunale	1/N/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 63 18/03/2004	826.331,04	826.331,04	639.248,81	Lavori in corso				
5	Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999 dell' impianto di depurazione di Morgano	6/G/1	DGR N. 1140 DEL 18/4/2003	DDDA N. 222 22/11/2004	400.000,00	400.000,00	312.076,32	Lavori in corso				
	TOTALI				3.650.387,08	3.650.387,09	3.165.070,11					

COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Lavori di costruzione del I lotto impianto di depurazione di Musile di Piave (VE)	1/1.21	DGR N. 744 DEL 1/7/1988	DPGR N. 2817 28/12/1990	516.456,90	516.456,90	516.456,90	Finanziamento convogliato nell'intervento 6A				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 44 del 9/05/2002
2	Lavori di realizzazione della fognatura comunale di via Rovigo in comune di Musile di Piave - Riutilizzo economie	1/3.1bis ECO	DGR N. 744 DEL 1/7/1988	DDDA 214 17/11/2004	26.788,59	26.788,59	26.788,59	Lavori ultimati				
3	Rete fognaria comune di Musile di Piave	1/2.11a	DGR N. 4699 DEL 5/8/1991	DDDA N. 111 15/10/1992	1.630.268,76	1.630.268,76	1.630.268,76	Lavori collaudati	11/02/1999	20/06/2002	16/11/2002	Importo originale del finanziamento € 1.649.370,70. Registrata, con DDDA n. 22 del 26/03/2003, un'economia di € 19.111,94 (reinvestita nell' int. 4)
4	Lavori di realizzazione della fognatura comunale di via Rovigo in comune di Musile di Piave - Riutilizzo economie	1/2.11a ECO	DGR N. 4699 DEL 5/8/1991	DDDA 214 17/11/2004	19.111,94	19.111,94	14.821,89	Lavori in corso				
5	Lavori di costruzione del I lotto impianto di depurazione di Musile di Piave (VE)	1/2.11b	DGR N. 4699 DEL 5/8/1991	DDDA N. 32 26/3/1997	516.456,90	516.456,90	516.456,90	Finanziamento convogliato nell'intervento 6A				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 44 del 9/05/2002
6	Lavori di costruzione del I lotto impianto di depurazione di Musile di Piave (VE)	B/20/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 93 30/7/2001	206.582,76	206.582,76	206.582,76	Finanziamento convogliato nell'intervento 6A				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 44 del 9/05/2002
6A	Lavori di costruzione del I lotto impianto di depurazione di Musile di Piave (VE) (€ 1.239.496,56)		Riuniti i finanziamenti 1 (€ 516.456,90) + 3 (€ 516.456,90) + 4 (€ 206.582,76) = € 1.239.496,56					Lavori collaudati	18/02/2000	20/06/2001	28/01/2002	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 44 del 9/05/2002
	TOTALI				2.816.855,85	2.816.855,85	2.811.065,80					

COMUNE DI NOALE

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Draganziolo nell'area denominata "Casi" in Comune di Noale per la riduzione dei nutrienti versati nella Laguna di Venezia. Progetto definitivo di 1° stralcio.	B/21/1	DGR N. 2613 22/7/1997	DDDA N. 18 26/2/2001	1.291.142,25	1.291.142,25	1.289.814,72	Finanziamento convogliato nell'intervento 2B per l'importo di € 1.291.142,25				Registrata, con DDPV N. 111 del 17/07/2006, economia di € 1.327,53
2	Riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Draganziolo nell'area denominata "Casi" in comune di Noale per la riduzione dei nutrienti versati nella laguna di Venezia. Progetto definitivo di 1° stralcio (Finanziato inizialmente al Consorzio DESE-SILE)	5/B/3.3	DGR N. 6400 12/12/1995	DDDA N. 18 26/2/2001	774.685,35	774.685,35	774.685,35	Finanziamento convogliato nell'intervento 2B per l'importo di € 774.685,35				Determinazione del contributo definitivo con DDPV N. 111 del 17/07/2006

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
2B	Riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Draganziolo nell'area denominata "Oasi" in comune di Noale per la riduzione dei nutrienti versati nella laguna di Venezia. Progetto definitivo di 1° stralcio (€ 2.065.827,60)		Riuniti i finanziamenti 1 (€ 1.291.142,25) + 2 (€ 774.685,35) = € 2.065.827,60					Lavori in corso	01/07/2002 03/09/2003			Lavori in corso mediante due appalti
3	Bonifica ex discarica per RSU	4/A/1.2	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 167 DEL 2003	1.342.788,00	134.278,80	70.965,84	Lavori in corso				
	TOTALI				3.408.615,60	2.200.106,40	2.135.465,91					

COMUNE DI PADOVA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Ampliamento dell'impianto di depurazione di Ca' Nordio in Comune di Padova	A/9/1	DGR N. 2613 DEL 22/07/1997	DGCA N. 213 03/05/1999	2.065.827,60	2.065.827,60	2.065.827,60	Lavori collaudati	20/05/2002			Importo compless. dell'opera € 6.971.742,72 (fondi della Legge Speciale per Venezia per € 2.065.827,60) DGCA 356/05 determinazione contributo definitivo
	TOTALI				2.065.827,60	2.065.827,60	2.065.827,60					

COMUNE DI PIOVE DI SACCO

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Sistemazioni idraulico-ambientali di Piove di Sacco ("Vallo di circonvallazione")	5/C/1	DGR N. 4977 DEL 02/11/1993	DDDA N. 80 24/11/1995	1.609.967,86	1.609.967,86	1.609.962,70	Lavori collaudati	14/04/1997	05/11/1998	06/06/2001	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 19 del 26/3/2003
2	Ampliamento fognature di Piove di Sacco	5/C/2	DGR N. 4977 DEL 02/11/1993	DDDA N. 23 03/04/1996	2.005.230,43	2.005.230,43	2.005.230,43	Lavori collaudati	06/09/1995	28/03/1998	07/04/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 20 del 26/3/2003
	TOTALI				3.615.198,29	3.615.198,29	3.615.193,13					

COMUNE DI PREGANZIOL

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Costruzione delle fognature a servizio della frazione di Sambughè	B/15.1 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 46 27/7/2000	774.685,35	774.685,35	761.531,09	Lavori collaudati	19/07/2001	26/10/2002	04/02/2003	Registrata, con DDDA n. 53 del 29/03/2005, un'economia pari a € 13.154,26
2	Estensione della rete fognaria nelle frazioni di Sambughè e Boschetta	1/I/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 30 27/3/2003	1.032.913,80	1.032.913,80	826.900,00	Lavori in corso	26/11/2003			
	TOTALI				1.807.599,15	1.807.599,15	1.587.431,09					

COMUNE DI QUARTO D'ALTINO

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Costruzione della rete fognaria di Quarto d'Altino (VE)	1/3.2	DGR N. 259 25/1/1994	DDDA N. 26 11/4/1991	774.685,35	774.685,35	774.685,35	Lavori collaudati	20/04/1995	20/01/1997	20/11/1998	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 102 del 20/11/2000
2	Ampliamento della rete fognaria e dell'impianto di depurazione di Quarto d'Altino (VE)	1/2.12	DGR N. 4599 DEL 6/8/1991	DPGR 1047 28/4/1993	2.582.284,50	2.582.284,50	2.259.776,30	Lavori collaudati	25/10/1996	20/07/1998	20/09/1998	Registrata, con DDDA n. 93 del 18/05/2004, un'economia di € 322.508,20
3	Interventi alle fognature di Quarto d'Altino (II stralcio)	6/A/1	DGR N. 4977 2/11/1993	DDETA N. 6 20/1/1995	2.065.827,60	2.065.827,60	2.065.827,60	Lavori collaudati	16/12/1996	05/08/1999	21/02/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 103 del 20/11/2000
	TOTALI				5.422.797,44	5.422.797,44	5.100.289,25					

COMUNE DI SALZANO

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Bonifica ex discarica per RSU e Rifiuti speciali	4/A/1.5	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 188 07/10/2004	2.400.000,00	2.400.000,00	160.056,69	Lavori in corso				Vedi scheda riepilogativa degli interventi relativi alla bonifica dei siti inquinati nel bacino scolante
	TOTALI				2.400.000,00	2.400.000,00	160.056,69					

COMUNE DI SPINEA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio e consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Interventi di bonifica e messa in sicurezza di emergenza ex discarica per rifiuti inerti in via Luneo - comune di Spinea (V E)	B/16	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		500.000,00			Progettazione in corso				
	TOTALI				500.000,00	0,00	0,00					

COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio e consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Bonifica tratto di canale contaminato da scarichi industriali	4/A/1.6	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 64 28/05/2003	750.000,00	75.000,00	75.000,00	Progetto approvato				Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione (importo pari a € 75.000,00). Vedi scheda riepilogativa degli interventi relativi alla bonifica dei siti inquinati nel bacino scolante.
2	Bonifica tratto di canale contaminato da scarichi industriali (in particolare da Cr6)	4/A/1.8	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DGR N. 2833 10/09/2004	500.000,00	500.000,00	0,00	Progetto approvato				Vedi scheda riepilogativa degli interventi relativi alla bonifica dei siti inquinati nel bacino scolante.
	TOTALI				1.250.000,00	575.000,00	75.000,00					

COMUNE DI VENEZIA / VE.S.T.A.

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio e consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Realizzazione del 1° stralcio funzionale della rete fognaria dell'isola della Giudecca.	1/3.6		DDEA N. 54 17/10/1991	85.417,05	85.417,05	85.417,05	Lavori ultimati				L'intervento consiste nella redazione dello studio e del progetto
2	Costruzione fognature di via San Donà e Carpenedo - Mestre (VE)	798/84 ECO	DGR N. 1175 DEL 26/03/1986	DDDA N. 55 12/10/1994	593.925,43	593.925,43	453.576,54	Lavori collaudati				Registrata, con DDPV n. 20 del 07/03/2008, un'economia pari a € 140.348,89.
2A	Vasca di prima pioggia e laminazione in località Gazzera Mestre VE	1/5.1	DGR N. 4976 DEL 2/11/1993	DDDA N. 51 25/6/1999	71.759,17	71.759,17	71.759,17	Lavori ultimati				Finanziamento originale pari a € 516.456,90, di cui € 444.697,73 revocati e devoluti alla Diocesi Patriarcato di Venezia

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione ed impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
3	Costruzione della fognatura di TREPORTI		DGR N. 1175 DEL 29/03/1985	DDLP N. 1190 23/12/1987	1.394.433,83	1.394.433,83	1.370.999,31	Lavori collaudati	14/11/1988	28/02/1991	18/09/1994	Determinazione del contributo definitivo con DDLP n. 56 del 09/02/1996, per € 1.379.859,31. Con DDLP n. 83 del 14/04/1999 si finanzia l'aumento della revisione dei prezzi per € 37.357,55
4	Costruzione rete fognaria del Lido (VE) - V lotto			DDLP N. 1006 28/10/1987	1.696.861,82	1.696.861,82	1.687.990,21	Lavori collaudati	23/11/1987	24/02/1989	06/12/1993	Registrata, con DDLP n. 167 del 11/07/1994, un'economia pari a € 7.881,61.
5	Completamento acolmatore bacino S. Giuliano (VE)			DDLP N. 1003 28/10/1987	1.032.913,80	1.032.913,80	1.028.127,96	Lavori collaudati	23/11/1987	10/11/1988	13/12/1991	Registrata, con DDLP n. 208 del 22/08/1994, un'economia pari a € 3.785,84
6	Costruzione della fognatura del Terraglio (VE)		DGR N. 2992 DEL 28/08/1987	DDLP N. 1002 28/10/1987	619.748,28	619.748,28	606.827,75	Lavori collaudati	30/11/1987	24/08/1988	28/01/1998	Registrata, con DDLP n. 288 del 23/07/1997, un'economia pari a € 13.820,53
7	Completamento e ristrutturazione della fognatura di Carpenedo (VE) - II lotto		DGR N. 5891 DEL 29/09/1987	DDLP N. 1001 28/10/1987	1.823.647,86	1.491.806,77	1.491.806,77	Lavori collaudati	18/01/1988	31/05/1989	08/04/1991	Determinazione del contributo definitivo con DDLP n. 118 del 11/08/1994.
8	Completamento e ristrutturazione rete fognaria di Carpenedo (VE) - III lotto		DGR N. 5890 DEL 29/09/1987	DDLP N. 1000 28/10/1987	853.925,43	853.925,43	853.925,43	Lavori collaudati	13/01/1988	05/01/1989	04/05/1998	Determinazione del contributo definitivo con DDLP n. 32 del 23/02/1999. Con DDLP n. 75 del 31/03/1999 si concede un ulteriore finanziamento per € 4.201,73
9	Completamento e ristrutturazione rete fognaria di Carpenedo (VE) - I lotto		DGR N. 999 DEL 29/10/1987	DGR N. 999 28/10/1987	2.117.473,28	2.117.473,28	2.077.719,51	Lavori collaudati	12/01/1988	25/05/1989	18/03/1992	Registrata, con DDLP n. 322 del 10/11/1994, un'economia pari a € 39.753,78
10	Completamento delle fognature di Via Torino - Mestre VE		DGR N. 2994 DEL 29/09/1987	DDLP N. 1005 28/10/1987	882.183,68	882.183,68	823.357,07	Lavori collaudati	11/01/1988	15/12/1988	08/05/1997	Registrata, con DDLP n. 301 del 06/08/1997, un'economia pari a € 28.796,61
11	Progetto delle opere di collegamento delle fognature di Via Torino, Via Cappuccina, Via Gatti, Via Miranese, Via Pertini e la fognatura di Via Rizzardi, in Comune di Venezia	1A3.3.bis	DASI N. 124 DEL 11/10/1990	DDDA N. 25 19/2/1999	676.528,52	676.528,52	676.528,52	Finanziamento convogliato nell'intervento 3SA				Interventi gestiti dalla società INSULA
12	Completamento dei lavori di fognatura della zona di Mestre - Marghera (vasca di arrivo del collettore)			DDLP N. 949 21/10/1987	516.456,90	516.456,90	516.456,90	Lavori collaudati	12/10/1987	08/04/1988	22/10/1994	Determinazione del contributo definitivo con DDLP n. 95 del 11/05/1998. Con DDLP 256 del 16/10/1998 finanziato aumento revisione prezzi per € 10.940,58
13	Interventi di risanamento igienico ed edilizio di Pellestrina e S. Pietro in Volta	1A3.6.A		DDEA N. 84 17/10/1991	4.820.923,49	4.180.069,57	0,00	Progetto approvato				Interventi gestiti dalla società INSULA
14 V.	Lavori di costruzione del collettore di via Peloscapa e via Canal - Marghera (VE)	1A1.5	DGR N. 259 DEL 28/01/1994	DDDA N. 9 12/8/1998	1.032.913,80	1.017.420,09	1.012.738,79	Lavori collaudati	20/10/1187	22/06/1999	12/04/2000	La Regione ha utilizzato parte del finanziamento per € 15.493,70, destinando il rimanente pari a € 1.017.420,09 al Comune di Venezia. Registrata, con DDPV 5 del 18/01/2006, economia € 4.681,30

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione dell'impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
16	Lavori di costruzione della rete fognaria del Lido di Venezia - VII lotto	1/1.9		DDOA N. 14 11/10/1990	1.601.016,63	133.601,63	133.601,63	Progetto approvato				Modifica del progetto approvato utilizzando il finanziamento regionale oltre a fondi propri del Comune: in attesa della documentazione da parte del Comune
16	Costruzione della rete secondaria di fognatura di Pellestrina		DGR N. 4976 DEL 2/11/1993		2.582.284,50			Progettazione in corso				Impegno pari a € 2.582.284,50 dall'impegnato con decreto Direzione Bilancio nn. 6, 7 e 9 del 07/04/2004
17	Costruzione della rete di fognatura di S. Maria (VE)	1/3.7	DGR N. 4976 DEL 2/11/1993	DDOA N. 7 22/2/1993	2.065.827,60	2.065.827,60	2.028.110,08	Lavori collaudati	28/09/1997	08/03/2001	22/02/2002	Registrata, con DDOA 198 del 18/10/2004, economia € 4.681,20
18	Interventi per lo smaltimento delle acque meteoriche e nere a completamento della fognatura consortile Mestre - Marghera (VE)				3.615.198,29	3.615.198,29	2.976.311,14	Lavori ultimati				Dati attesi da parte del Comune di Venezia
19	Progetto delle opere di collegamento delle fognature di Pellestrina alla fognatura degli Alberoni. Importo € 6,6 Mld	1/4.2 bis	DAST N. 124 DEL 11/10/1990	DDOA N. 28 19/2/1993	877.976,73	877.976,73	877.976,73	Finanziamento convogliato nell'intervento 38A				Interventi gestiti dalla società INSULA
20	Costruzione vasca di modulazione di Favaro Veneto (VE)	1/3.8	DGR N. 4976 DEL 2/11/1993	DDOA N. 37 26/5/1994	1.807.599,18	1.807.599,18	1.697.613,90	Collaudo in corso	02/12/2002			Inizio dei lavori ritardato dal fallimento dell'impresa. Le opere sono finanziate, oltre che dal presente finanziamento, anche da € 568.102,59 (int. 84) e da € 413.165,52 (int. 64)
21	Costruzione della vasca di pioggia del nodo idraulico di Ca' Emiliani - Loc. Rana (VE)	1/3.3	DGR N. 745 DEL 1/7/1988	DDEA N. 69 11/12/1991	3.788.988,21	3.788.988,21	688.179,68	Lavori da appaltare				L'appalto sarà unificato all'int. n. 38. Dell'importo finanziato, una quota parte pari a € 206.582,76 è destinata al Consorzio Sinistra Medio Brenta.
22	Costruzione fognature di via San Donà a Carpenedo - Mestre (VE)	1/3.9	DGR N.4976 DEL 2/11/1993	DDOA N.66 12/10/1994	1.936.713,37	1.936.713,37	1.936.713,37	Finanziamento convogliato nell'intervento 22A				La erogazioni si riferiscono al finanziamento complessivo dell'int. 22A
22A	Costruzione fognature di via San Donà a Carpenedo - Mestre (VE)		Riunito i finanziamenti 7 (€ 683.926,43) + 22 (€ 1.936.713,37) = € 2.620.639,80					Lavori collaudati	06/05/1997	08/07/1999	26/11/2001	
23	Impianto di depurazione del Cavallino - adeguamento della fase biologica alla rimozione dell'azoto	1/3.6.E		DDEA N. 63 11/6/1997	657.606,82	657.606,82	657.606,82	Lavori collaudati	14/07/1997	22/10/1997	04/05/1998	Finanziamento originale pari a € 619.748,28. Registrata, con DDOA n. 17 del 02/03/1999, un' economia di € 62.241,48 destinata all'int. 24
24	Fognatura e depurazione del Lido e del Cavallino	1/3.6.E1	DGR N. 3324 DEL 29/7/1996	DDOA N. 32 26/4/1999	1.882.636,22	1.845.948,14	1.282.316,78	Lavori ultimati	01/06/2000			Quota parte del finanziamento, pari a € 378.046,45, convogliati nell'int. 28. Utilizzate le economie dell'int. 23 pari a € 62.241,46

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio e consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
25	Fognatura S.Erasmo							Fondi riallocati				Intervento affidato al MAV
26 V.	Ampliamento dell'impianto di depurazione di Fusina - IV linea (VE) - trattamento delle acque			Finanziamento suddiviso negli interventi 26A e 26B								
26A V.	Opere presso depuratore Fusina (ex fondi "ampliamento dell'impianto di depurazione di Fusina - IV linea (VE) - trattamento delle acque.")	1/2.1	DGR N. 4442 DEL 27/7/1990		6.482.229,51	0,00	0,00	Fondi riallocati				In attesa di chiarimenti sulla destinazione dei fondi da parte del Comune di Venezia
26B V.	Ampliamento impianto di depurazione di Fusina - IV linea . Trattamento delle acque.	1/2.1a	DGR N. 4442 DEL 27/7/1990		231.710,18	231.710,18	231.710,18	Progettazione conclusa				Finanziamento limitato alle sole spese di progettazione
27 V.	Completamento dell'impianto di trattamento di Campalto - Opere accessorie	1/2.2	DGR N. 4442 DEL 27/7/1990	DPGR N. 207 26/1/1994	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.142,25	Lavori collaudati	14/01/1997	20/06/2000	03/09/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 203 del 22/10/2004
28 V.	Ampliamento della fognatura del Cavallino (VE) - II stralcio	1/2.7	DGR N. 259 DEL 25/1/1994		3.098.741,39	3.098.741,39	3.098.741,39	Lavori collaudati	23/05/1996	10/04/1998	28/01/2002	L'importo dei lavori sale con perizia suppletiva di € 542.279,74, finanziato con parte dell'int. 24, pari a € 378.046,45 e con parte dell'int. 88 pari a € 163.727,74
29	Ampliamento delle fognature di Pellestrina (VE)	1/2.8	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991		1.549.370,70			Progettazione in corso				Impegno pari a € 1.549.370,70 disimpegnato con decreti Direzione Bilancio nn. 6, 7 e 9 del 07/04/2004
30	Ampliamento delle fognature del Lido di Venezia - VIII lotto	1/2.6	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	N. 23 DEL 15/4/1994	3.098.741,39	3.098.741,39	2.883.521,33	Lavori collaudati	11/11/1996	26/05/1999	31/03/2003	Registrata, con DDDA N. 221 del 28/11/2005, economia di € 218.220,06
31 V.	Vasca di accumulo acque meteoriche di Carpenedo - Bissuola (VE)	1/2.4b	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DPGR 2438 3/10/1994	6.455.711,24	6.455.711,24	722.403,68	Lavori in corso				L'erogazione è comprensiva delle spese di progettazione e dell'anticipo del 10%
32 V.	Costruzione della vasca di accumulo acque meteoriche di piazzale Giovannacci - Marghera (VE)	1/2.3a	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DDEA N. 24 DEL 7/4/1995	4.131.655,19	4.131.655,19	3.718.489,67	Collaudo in corso				Collaudate le opere civili. In appalto le opere elettromeccaniche
33 V.	Razionalizzazione della rete fognaria di Marghera (VE) - via Asseggiano a Chirignago	1/2.3b	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DPGR 1182 9/5/1994	3.615.198,29	3.615.198,29	3.597.548,42	Lavori collaudati	24/02/1997	14/12/1998	18/10/1999	Registrata, con DDDA N. 88 del 05/06/2006, economia di € 17.651,87
34 V.	Ampliamento IV linea depuratore Fusina.							Fondi riallocati				
34B V.	Opere presso depuratore Fusina (ex fondi "ampliamento IV linea depuratore Fusina").	1/2.5.B	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991		936.407,25	936.407,25	0,00	Progetto approvato				Finanziamento proveniente da fondi riallocati
35 V.	Estensione della rete fognaria di tipo separato nella zona di Trivignano - Zelarino - II lotto	1b	DGR N. 4975 DEL 2/11/1993	DDDA N. 12 12/2/1998	3.928.072,43	3.928.072,43	3.532.573,48	Lavori in via di ultimazione	12/12/1997			Mancano lavori di completamento. Integrazione di € 516.456,89 proveniente dall'int. 85. Ritardi dovuti al fallimento dell'impresa

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione dello impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
36	Progetto delle opere di collegamento delle fognature di Pellestrina alla fognatura degli Alberoni. Importo € 6,5 Mld	1/4.2 bis	DGR N. 4975 DEL 2/11/1993	DDDA N. 25 18/2/1998	258.228,45	258.228,45	258.228,45	Finanziamento convogliato nell'intervento 36A				Interventi gestiti dalla società INSULA
36A	Progetto delle opere di collegamento delle fognature di Pellestrina alla fognatura degli Alberoni. Importo € 6,5 Mld	1/4.2 bis	Riuniti i finanziamenti 11/(€ 675.568,64) + 19 (€ 877.976,73) + 36 (€ 258.228,45) + 68 (€ 1.646.239,04) = € 3.358.002,76					Lavori ultimati				
37 V.	Progetto di rifacimento del collegamento fra il nodo di Ca' Emiliani e l'impianto di modulazione della Rana	1/4.2	DGR N. 2773 DEL 21/8/1994	N. 157 DEL 16/8/1996	2.840.612,86	2.840.612,86	2.823.752,20	Lavori collaudati	27/05/1997	08/05/1999	14/10/2002	Registrata, con DDDA N. 58 del 23/06/2005, economia di € 16.760,75
38 V.	Impianto di sollevamento in località "Rana" e condotta di scarico.	1/4.2 bis	DGR N. 2773 DEL 21/8/1994		2.324.056,06			Progettazione in corso				Impegno pari a € 2.324.056,06 disimpegnato con decreti Direzione Bilancio nn. 6, 7 e 9 del 07/04/2004
39	Bonifica della discarica di rifiuti Ca' Emiliani (Marghera)	1/2.5	DGR N. 5211 DEL 18/11/1993					Fondi riallocati nell'intervento 39A				Vedi scheda riepilogativa degli interventi relativi alla bonifica dei siti inquinati nel bacino scolante.
39A	Bonifica in viale S. Marco in comune di Venezia	1/2.5	DGR N. 1140 DEL 18/4/2003	DDPV N. 183 08/11/2006	1.032.913,80	1.014.808,25	0,00	Progettazione in corso				Vedi scheda riepilogativa degli interventi relativi alla bonifica dei siti inquinati nel bacino scolante. In attesa dell'invio della documentazione da parte del Comune di Venezia
40	Recupero ambientale e valorizzazione dell'area di S. Giuliano (VE) - Bonifica discarica di S. Giuliano (VE) - I lotto "B1"	1/2.5	DGR N. 6243 DEL 30/10/1991		1.032.913,80			Progettazione in corso				Vedi scheda riepilogativa degli interventi relativi alla bonifica dei siti inquinati nel bacino scolante. Impegno pari a € 1.032.913,80 disimpegnato con decreti Direzione Bilancio nn. 6, 7 e 9 del 07/04/2004
41	Fognature di Pellestrina (VE)	5/3/1.1	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993		620.568,65	0,00	0,00	Progettazione in corso				Interventi gestiti dalla società INSULA
42 V.	Ristrutturazione dei collettori principali di fognatura di via Torino a Mestre	1/C/1	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 17 12/2/1996	4.761.403,47	4.761.403,47	4.283.343,67	Lavori collaudati	14/01/1997	06/08/1999	22/01/2001	Documentazione relativa al collaudo non ancora inviata da parte del Comune di Venezia
43 V.	Impianto di modulazione delle acque di pioggia del bacino di via Torino e del bacino di S. Giuliano	1/C/2	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 20 12/2/1996	2.986.460,01	2.986.460,01	1.333.826,60	Lavori in corso	31/01/1997			Sospensione lavori per mancata tenuta dei diaframmi. Impresa fallita. Nuovo progetto che comporta un incremento di spesa di € 1.548.371,00 finanziato con parte dei fondi del Fint. 84.
44 V.	Completamento della rete di fognatura separata della zona del Terraglio - bacino di Carpenedo - Mestre	1/C/3	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 16 12/2/1996	2.943.804,32	2.943.804,32	2.888.040,40	Lavori collaudati	15/05/1997	03/11/1999	07/01/2002	Registrata, con DDPV N. 3 del 19/01/2005, economia di € 67.763,92

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione atto impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
45 V.	Estensione della rete di fognatura separata nella zona di Marghera tra SS. Romea e autostrada VE-PD	1/C/4	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 13 12/2/1996	1.859.244,84	1.859.244,84	1.832.478,95	Lavori collaudati	10/03/1997	14/09/1999	04/11/2002	Registrata, con DDPV N. 4 del 19/01/2006, economia di € 26.765,89
46 V.	Ristrutturazione della rete fognatura afflgua al rio Cimetto - bacino Gazzera - Mestre	1/C/5	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 14 12/2/1996	2.014.181,91	2.014.181,91	1.925.147,00	Lavori collaudati	07/01/1998	19/11/1999	05/02/2001	Registrata, con DDPV N. 86 del 05/06/2006, economia di € 89.034,91
47 V.	Ristrutturazione della fognatura nella zona di Cipressina - Zelarino	1/C/6	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 22 12/2/1996	2.737.221,57	2.737.221,57	2.648.067,15	Lavori collaudati	23/03/1998	24/03/2000	09/02/2001	
48 V.	Ricostruzione della fognatura di via S. Donà - Bacino di Carpenedo	1/C/7	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 19 12/2/1996	3.718.489,57	3.718.489,57	3.419.977,74	Lavori collaudati	16/11/1998	29/09/1999	18/10/2000	
49 V.	Ricostruzione della fognatura della zona di via Silvio Trentin - Mestre	1/C/8	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 18 12/2/1996	3.368.969,84	3.368.969,84	1.528.061,85	Lavori in corso	10/07/1997			Risolto il contratto in danno all'impresa con lavori al 48%. Completamento appaltato ad altra ditta in data 06/05/2003
50 V.	Ristrutturazione ed estensione della rete di fognatura nella zona di Favaro Veneto	1/C/9	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 18 12/2/1996	2.169.118,98	2.169.118,98	2.140.491,59	Lavori collaudati	05/05/1997	23/10/1998	06/12/1999	Registrata, con DDDA N. 222 del 28/11/2005, economia di € 28.627,39
51 V.	Ristrutturazione ed estensione della rete di fognatura nella zona di Campalto e Tessera	1/C/10	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DGCA N. 168 10/4/1998	1.788.983,48	1.788.983,48	13.878,74	Lavori in corso				In attesa dell'approvazione della variante urbanistica
52 V.	Completamento dell'impianto di depurazione di Campalto	1/C/11	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DGCA N. 628 1/12/1997	7.230.398,59	7.230.398,59	349.459,20	Lavori in corso	16/01/2001			
53 V.	Risanamento fognario nella zona di Carpenedo (via Tevere)	1/C/12	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 11 12/2/1996	4.967.888,23	4.967.888,23	2.912.123,86	Lavori in corso	06/04/1998			Rescisso il contratto in danno all'impresa. Completamento lavori appaltato ad altra ditta
54 V.	Completamento della rete di fognatura di tipo separato di Malcontenta	1/C/13	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 133 DEL 6/8/1996	1.807.899,15	1.807.899,15	133.030,28	Lavori in corso				Consegna sospesa in attesa di risoluzione espropri
55 V.	Ricostruzione della rete fognaria nella zona del centro urbano di Mestre adigua al canale Osellino	1/C/14	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 21 12/2/1996	1.910.890,53	1.910.890,53	1.448.753,40	Lavori in corso	26/08/1997			Rescisso il contratto in danno all'impresa. Completamento lavori appaltato ad altra ditta il 12/12/2003
56 V.	Vasca di prima pioggia e laminazione in loc. "Gazzera" Mestre - Venezia	1/C/15	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 61 25/5/1999	0,00	0,00	0,00	Finanziamento revocato				Finanziamento originale pari a € 1.785.983,48 completamente revocato e devoluto alla Diocesi Partriarcato di Venezia
57	PROGETTO INTEGRATO RII	3	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993		18.078.991,47	18.078.991,47	18.078.991,47	Lavori in corso				
58	Progetto definitivo per il collegamento della fognatura di Palastrina alla fognatura degli Alberoni. Importo £ 6,5 Mld.	6/B/1	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 24 18/3/1999	1.845.239,04	1.845.239,04	1.209.842,06	Finanziamento intervento convogliato nell'intervento 36A				Interventi gestiti dalla società INSULA
59 V.	Interventi alla fognature del Lido - IX lotto.	6/B/2		DDDA N. 118 23/06/2004	4.648.112,09	4.648.112,09	0,00	Progetto approvato				Importo complessivo del progetto pari a € 8.894.700,00. Finanziato con parte dei fondi (€ 2.246.587,91) delfint. 86
60 V.	Progetto di ristrutturazione e ampliamento rete di fognatura del Cavallino - Zona Est - Ca' di Valle	6/B/3	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 23 12/2/1996	2.068.827,80	2.068.827,80	2.011.949,29	Lavori collaudati	15/01/1997	30/07/1999	04/10/2000	Registrata, con DDDA N. 223 del 28/11/2005, economia di € 53.878,31
61 V.	Progetto di ristrutturazione e ampliamento rete di fognatura del Cavallino - Zona Ovest - Ca' Savio	6/B/4	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 24 12/2/1996	2.068.827,80	2.068.827,80	2.068.827,80	Lavori collaudati	09/09/1999		06/06/2006	Determinazione contributo definitivo con DDPV N. 19 del 07/03/2008

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione del rilapogno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
62 V.	Progetto Fusina: completamento della rete fognaria e relativi allacciamenti nell'area Mestre-Gezzare e Mestre-Malcontenta	1/B/1	DGR N. 3324 DEL 29/7/1996	DDPV N. 70 24/05/2006	2.065.827,60	2.065.827,60	0,00	Progettazione in corso				Intervento facente parte del Progetto integrato
63 V.	Progetto Fusina: vasche volano presso gli impianti di sollevamento della rete industriale S1, S2, S3	1/B/4	DGR N. 3324 DEL 29/7/1996		2.065.827,60	0,00	0,00	Progetto definitivo				Integrazione del finanziamento, per € 1.549.370,69, con parte dei fondi dell'Int.85
64 V.	Progetto Campalto: ampliamento dell'impianto di depurazione di Campalto (V linea)	1/C/1	DGR N. 3324 DEL 29/7/1996	DDDA N. 110 14/12/2000	3.098.741,38	2.666.576,88	82.181,72	Lavori in corso	16/01/2002			La differenza tra importo finanziato ed impegnato, pari a € 413.165,51, convogliato nell'Int. 20
65	Progetto Campalto: adeguamento della rete principale di via Torino e interconnessione con la rete di Mestre	1/C/2	DGR N. 3324 DEL 29/7/1996		2.582.284,50	0,00	0,00	Progettazione in corso				Progetto Integrato Campalto
66	Progetto Campalto: costruzione tronco di interconnessione tra il collettore Acque Basse ed i bacini di via Torino e S. Giuliano	1/C/4	DGR N. 3324 DEL 29/7/1996		3.098.741,38	0,00	0,00	Progettazione in corso				Progetto Integrato Campalto
67	Progetto Campalto: regolazione dei flussi di piena e di trattamento acque di pioggia a S. Giuliano	1/C/5	DGR N. 3324 DEL 29/7/1996		4.131.655,18	0,00	0,00	Progettazione in corso				Progetto Integrato Campalto
68 V.	Opere fognarie: realizzazione di opere fognarie, relative a tratti secondari e terminali delle reti fognarie del Comune di Venezia	1/E/1	DGR N. 4533 DEL 16/10/1996	DDPV N. 70 24/05/2006	3.460.281,22	3.460.281,22	0,00	Progettazione in corso				Integra per € 116.688,34 l'int. 61, per € 183.715,84 l'int. 29 e per € 2.633.930,16 due interventi dell'appalto integrato.
69	PROGETTO INTEGRATO RII	3/A/1	DGR N. 2203 DEL 21/5/1996		18.526.820,77	18.526.820,77	18.526.820,77	Lavori ultimati				
70 V.	Progetto Campalto - affinamento con ittiodepurazione	5/B/6	DCR N. 45 DEL 15/7/1999		3.873.426,74	0,00	0,00	Progettazione in corso	16/01/2002			Finanziamento proveniente da fondi riallocati
71 V.	Interventi di miglioramento dell' impianto di depurazione di Campalto. Lavori di realizzazione dei trattamenti di chiarifloculazione, filtrazione e disinfezione U.V.	1/C/7	DCR N. 45 DEL 15/7/1999	DDDA N. 67 27/5/2002	258.228,45	258.228,45	0,00	Lavori in corso	16/01/2002			Finanziamento complessivo pari a € 6.713.939,68 distribuito tra gli Int. 71, 77A e 77B. Impegno inerente alle spese di progettazione
72	PROGETTO INTEGRATO RII	3/A/1	DGR N. 2203 DEL 21/5/1996		1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	Lavori in corso				
73	PROGETTO INTEGRATO RII	C/26/1	DGR N. 563 DEL 25/2/1997		1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	Lavori in corso				
74 V.	Ampliamento e ristrutturazione della rete fognaria in Comune di Venezia	C/23/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDPV N. 70 24/05/2006	7.521.518,25	7.521.518,25	0,00	Lavori in corso				
74A V.	Impianto di sollevamento località "Rana" e condotta di scarico.	C/23/1.1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 179 24/12/2001	428.669,23	428.669,23	0,00	Progetto approvato				

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
74B V.	Ristrutturazione della rete fognaria della zona del centro di Marghera (VE)	C/23/1.3	DGR N. 2613 DEL 22/7/1999	DDDA N. 78 27/6/2002	4.343.402,82	4.343.402,82	0,00	Progetto approvato				
75	PROGETTO INTEGRATO RII	C/26/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997		11.878.508,68	11.878.508,68	11.878.509,68	Lavori in corso				
74C V.	Ristrutturazione della rete fognaria scorrente della zona Nord e Centro di Marghera (VE)	C/23/1.4	DGR N. 2613 DEL 22/7/1999	DDPV N. 70 24/05/2006	2.068.827,60	2.068.827,60		Lavori in corso				Il DDDA n. 90 del 12/08/2002 che impegnava € 2.068.827,6 è annullato con il DDDA 77/03 in quanto l'intervento deve essere finanziato con i fondi CIPE
74D V.	Completamento della rete di fognatura di tipo misto del Bacino della Gazzera.	C/23/1.5	DGR N. 2613 DEL 22/7/1999	DDDA N. 114 20/08/2003	3.098.741,38	3.098.741,38	0,00	Progetto approvato				
76 V.	Bonifica "Cordi femminili" - Mestre	B/16 V fase	DGR N. 2962 DEL 14/8/2000		1.518.218,88	1.518.218,88	1.417.548,70	Lavori collaudati				Registrata, con DDDA n. 182 del 22/11/2001, un'economia di € 100.667,29
77A V.	Interventi di miglioramento dell' impianto di depurazione di Campalto. Lavori di realizzazione del trattamenti di chiarifloccolazione, filtrazione e disinfezione U. V.	A/2.1 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 87 27/6/2002	8.210.214,88	8.210.214,88	0,00	Progetto approvato				
77B V.	Progetto Campalto - completamento impianto di depurazione	A/2 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDPV 105 05/07/2006	1.239.000,00	1.239.000,00		Lavori in corso				
78	PROGETTO INTEGRATO RII	B/19 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 123 4/10/2001	19.626.362,17	19.626.362,17	19.626.362,17	Lavori in corso				
79	PROGETTO INTEGRATO RII	A/1	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 22 DEL 7/3/2002	24.789.931,16	24.789.931,16	24.789.931,16	Lavori in corso				
80 V.	Opere di potenziamento e risistemazione idraulica degli impianti di sollevamento 85 e 98 (FUSINA)	B1/85.1	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 120 29/12/2000	1.068.549,32	1.068.549,32	48.850,84	Lavori in corso	27/03/2003			
81 V.	Interventi di fognatura al Lido di Venezia	B1/88	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		826.331,04	0,00	0,00	Progettazione in corso				
	Interventi di fognatura: accordo di programma S. Erasmo	B1/89	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		1.807.899,16							Finanziamento suddiviso dall'ente in 6 interventi
	Interventi di fognatura: accordo di programma Malamocco e Alberoni	B1/90	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		5.531.025,83							
82 V.	Fognature afferenti all'impianto di Campalto	B1/87	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		4.829.649,34	0,00	0,00	Progettazione in corso				
	Bacino di Favaro. Ristrutturazione della rete di fognature e costruzione del collettore di rete primaria.	B1/87.2	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDPV N. 138 06/09/2006	1.849.370,70	1.849.370,70		Lavori in corso				
83 V.	Fognature afferenti all'impianto di Fusina	B1/86	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		1.133.476,86	0,00	0,00	Progettazione in corso				Finanziamento suddiviso dall'ente in 7 interventi (4 integrazioni di interventi precedenti e 2 nuovi interventi)

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione dello stanziamento	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Potenziamento e razionalizzazione delle fognature della terraferma: bacini di Fusina e Campalto	B1/58.2	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDPV N. 70 24/05/2006	5.131.661,99	5.131.661,99		Lavori in corso				
84	Bonifica area "ex - conterie" a Murano per stoccaggio rifiuti speciali e tossico - nocivi.	D/84	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DGR N. 2821 10/10/2001	3.098.741,38	3.098.741,38	0,00	Progetto approvato				
85	Interventi di riqualificazione della fognatura di V. viale Garibaldi e Piazza Carpaneto.	B1/57.1	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 108 18/10/2002	1.254.768,03	1.254.768,03	0,00	Progetto approvato				
86	Interventi di fognatura nel territorio comunale V. (importo complessivo € 17.043.077,67)	1/N/1	DGR N. 784 DEL 9/4/2002		14.014.019,73	0,00	0,00	Progettazione in corso				
86B	Riqualificazione integrata Viale Don Sturzo.Opere di fognatura dall'intersezione di V. via Vallon con via Lavaredo.	1/N/1.2	DGR N. 784 DEL 9/4/2002	DDPV N. 161 02/10/2006	782.469,94	782.469,94		Progetto approvato				
86A	Progetto definitivo relativo agli interventi diffusi di ristrutturazione e fognatura nera e V. bianca del Lido di Venezia. Bacino 16 e 20 - IX° lotto.	1/N/1.1	DGR N. 784 DEL 9/4/2002	DDOA N. 116 23/06/2004	2.246.588,00	2.246.588,00	0,00	Progetto approvato				
87	PROGETTO INTEGRATO RII	7/A/1	DGR N. 784 DEL 9/4/2002	DDDA N. 22 07/03/2002	20.658.276,98	20.658.276,98	20.658.276,98	Lavori in corso				
88	PROGETTO INTEGRATO RII		DGR N. 1140 DEL 18/4/2003		4.038.697,76	4.038.697,76	4.038.697,76	Lavori in corso				
89	Opere di disinquinamento ambito Campalto: diminuzione acque parassite	E/14.1	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.040.000,00			Progettazione in corso				
90	Opere di disinquinamento ambito Lido di Venezia: diminuzione acque parassite	E/14.2	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.600.000,00			Progettazione in corso				
91	Opere di disinquinamento ambito Fusina: diminuzione acque parassite	E/14.3	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		3.200.000,00			Progettazione in corso				
92	Opere di disinquinamento ambito Lido di Venezia: fognature nere e riqualificazione fognature bianca	E/14.4	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		2.320.000,00			Progettazione in corso				
93	Osservatorio naturalistico della Laguna	B/19	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDOA N. 243 28/12/2005	400.000,00	400.000,00	100.000,00	Lavori in corso				
94	Programma di iniziative sul tema dell'educazione ambientale e della promozione dell'agricoltura biologica nel territorio del bacino scolante in Laguna di Venezia	B/20	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDOA N. 243 28/12/2005	600.000,00	600.000,00	100.000,00	Lavori in corso				
95	PROGETTO INTEGRATO RII	A/5	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		28.000.000,00	15.000.000,00	4.149.440,67	Lavori in corso				
96	Redazione dei piani della caratterizzazione per i siti inquinati compresi nel territorio comunale.	B/15	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		250.000,00			Progettazione in corso				
	TOTALI				384.982.831,81	302.420.309,34	203.264.003,08					

COMUNE DI ZERO BRANCO

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Interventi di fognatura e depurazione in territorio comunale.	2/A/1	DGR 2924 DEL 03/08/1999	DDDA N. 21 DEL 7/3/2002	258.228,45	258.228,45	258.204,50	Finanziamento convogliato nell'intervento 4A per l'importo di € 258.228,45				
2	Ampliamento della rete fognaria e completamento del costruendo impianto di depurazione comunale	B/14/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 67 13/11/1998	1.849.370,70	1.849.370,70	1.849.370,70	Collaudo in corso	25/10/2000			Con DDDA n. 52/2004 stabilito integrazione finanziamento di € 210.000,00. Con DGR 1234/04 stabilito nuovo termine fine e lavori: 31/12/2005
3	Interventi di fognatura e di depurazione nel comune di Zero Branco.	B/16 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 64 DEL 1/6/2000	123.949,68	123.949,68	123.949,68	Finanziamento convogliato nell'intervento 4A per l'importo di € 123.949,68				
4	Interventi di fognature e depurazione	B/16 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 21 DEL 7/3/2002	134.278,79	134.278,79	134.278,79	Finanziamento convogliato nell'intervento 4A per l'importo di € 134.278,79				
4A	Interventi di fognature e depurazione (€ 516.456,90)		Riuniti i finanziamenti 1 (€ 258.228,45) + 3 (€ 123.949,68) + 4 (€ 134.278,79) = € 516.456,90					Lavori collaudati				Registrata, con DDDA n. 10 del 21/01/2005, un'economia pari a € 23,94
5	Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999 ed ampliamento dell' impianto di depurazione comunale	6/1/1	DGR N. 1140 DEL 18/4/2003	DDDA N. 52 16/03/2004	210.000,00	210.000,00	34.062,93	Lavori in corso				
	TOTALI				2.275.827,60	2.275.827,60	2.099.866,58					

PAGINA BIANCA

SEZIONE II: AZIENDE SPECIALI CONSORTILI

Nota: nelle tabelle che seguono vengono riportati i finanziamenti attribuiti direttamente alle Aziende Speciali Consortili.

PAGINA BIANCA

AZIENDA CONSORZIO DEL MIRESE (A.C.M.)

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione ed impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Costruzione della rete di fognatura consortile del Mirese - XIV lotto sub B (VE)			DPGR N.1523 16/12/1986	206.582,76	206.582,76	188.399,37	Lavori collaudati	23/03/1987	21/04/1987	16/01/1989	Registrata, con DDLP n. 422 del 11/12/2003, un'economia pari a € 20.183,39
2	Completamento funzionale di opere fognarie precedentemente realizzate nel Consorzio del Mirese		DPGR N. 621 DEL 20/07/1987	DR N. 1004 DEL 26/10/1987	2.375.701,74	2.375.701,74	2.375.701,74	Lavori collaudati	14/09/1987	16/07/1989	15/06/1989	Determinazione del contributo definitivo con DDLP n. 424 del 11/12/2003
3	Costruzione della rete fognaria di Campagna Lupia capoluogo (VE)	1/3.1bis	DGR N. 4976 DEL 2/11/1993	N. 1249 DEL 4/6/1993	1.549.370,70	1.549.370,70	1.394.433,63	Finanziamento convogliato nell'intervento 6A				Decreto di contabilità finale n. 92/2004, per € 1.394.433,63. Disimpegnati, con DGR 2517/2002 € 154.937,07.
4	Costruzione della rete fognaria di Mira - II fase	1/3.1A	DGR N. 4976 DEL 2/11/1993	DPGR N.1366 25/6/1993	7.488.625,04	7.488.625,04	7.488.625,04	Lavori collaudati	14/12/1994	27/10/2000	22/07/2003	
5	Costruzione della rete fognaria di Mira - III fase: Rilievi ed ispezioni televisive collettori fognari	1/3.1	DGR N. 4976 DEL 2/11/1993	N. 41 DEL 8/11/1993	258.228,45	258.228,45	258.228,45	Lavori collaudati	02/01/1996	20/08/1997	25/03/1998	Decreto di contabilità finale sospeso in attesa dell'integrazione della documentazione
6	Ampliamento della rete fognaria di Campagna Lupia (VE)	1/2.18	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DPGR N. 1249 4/6/1993	516.456,90	516.456,90	448.736,22	Finanziamento convogliato nell'intervento 6A				Registrata, con DDDA n. 92/2004, un'economia pari a € 69.721,68
6A	Ampliamento della rete fognaria di Campagna Lupia (VE) (€ 2.065.827,60)	Finanziato con i fondi del finanziamento 3 (€ 1.549.370,70) + 6 (€ 516.456,90) = € 2.065.827,60						Lavori collaudati	28/12/1994	16/03/1998	29/09/2003	Registrata, con DDDA n. 92/2004, un'economia pari a € 69.721,68
7	Realizzazione di vasca di raccolta delle acque di prima pioggia e completamento fognature (€ 4.131.656,19)	1/4.3	DGR N. 2773 DEL 21/6/1994		1.194.969,19	0,00	0,00	Finanziamento suddiviso in 7A (€ 462.854,00), 7B (€ 499.945,00) e 7C (460.000,00)				Finanziamento originale pari a € 4.131.656,19
7A	Realizzazione di vasche di raccolta delle acque di prima pioggia e completamento fognature del comune di Stra	1/4.3c	DGR N. 2773 DEL 21/6/1994	DDDA N. 144 23/07/2004	462.854,00	462.854,00	337.142,92	Lavori in corso				
7B	Realizzazione di vasche di raccolta delle acque di prima pioggia e completamento fognature del comune di Campagna Lupia	1/4.3a	DGR N. 2773 DEL 21/6/1994	DDDA N. 142 23/07/2004	499.945,00	499.945,00	291.836,05	Lavori in corso				
7C	Realizzazione di vasche di raccolta delle acque di prima pioggia e completamento fognature del comune di Fiesso d'Artico	1/4.3b	DGR N. 2773 DEL 21/6/1994	DDDA N. 143 23/07/2004	460.000,00	460.000,00	250.826,86	Lavori in corso				
7D	Realizzazione di vasche di raccolta delle acque di prima pioggia e completamento fognature del comune di Mirano	1/4.3d	DGR N. 2773 DEL 21/6/1994	DDDA N. 92 31/05/2005	684.835,00	684.835,00	27.844,19	Lavori in corso				
7E	Realizzazione di vasche di raccolta delle acque di prima pioggia e completamento fognature del comune di Spinea	1/4.3e	DGR N. 2773 DEL 21/6/1994	DDDA N. 93 31/05/2005	869.362,00	869.362,00	33.592,90	Lavori in corso				

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione atto impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
8	Completamento fognatura nera in Comune di Noale	1/B/1	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 38 25/8/1995	929.622,42	929.622,42	929.622,42	Lavori collaudati	28/08/1996	24/09/1998	01/08/2002	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 119 del 25/10/2002
9	Completamento fognatura nera in Comune di Salzano	1/B/2	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DGCA N. 18 3/3/1995	1.291.142,26	1.291.142,26	1.291.142,26	Lavori collaudati	06/11/1996	17/04/1997	18/10/1997	Determinazione del contributo definitivo con DGCA n. 99 del 02/03/1998
10	Interventi alla rete fognaria nel Comune di Martellago	1/B/3	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 57 16/10/1995	1.291.142,26	1.291.142,26	1.291.142,26	Lavori collaudati	11/04/1996	20/02/1998	21/12/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 8 del 15/02/2002
11	Interventi alla rete fognaria nel Comune di Scorzè	1/B/4	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 68 19/10/1995	1.291.142,26	1.291.142,26	1.291.142,26	Lavori collaudati	11/04/1996	28/11/1998	26/03/2001	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 79 del 15/07/2002
12	Vasca di pioggia di Noale	1/B/5	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 170 28/10/1996	361.519,83	361.519,83	361.519,83	Lavori collaudati	01/09/1998	25/03/1999	21/02/2001	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 7 del 15/02/2002
13	Interventi alla fognatura del Consorzio del Mirese (€ 1.228.167,42)	2/A/1	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993					Intervento suddiviso negli interventi 31 (€ 242.734,74), 32 (€ 142.025,88) e 33 (€ 844.407,03)				
14	Pulizia, ispezione televisiva e rilievo di condotte fognarie nei comuni di Dolo e Spinea	2/A/7	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 7 27/1/1997	320.203,28	320.203,28	320.203,28	Lavori collaudati	27/01/1998	25/07/1999	28/09/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 9 del 07/01/2004
15	Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Mirano	2/A/2	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 28 19/4/1995	3.358.969,84	3.358.969,84	3.358.969,84	Lavori collaudati	11/04/1996	22/12/2000	24/06/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 151 del 30/10/2003
16	Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di S. Maria di Sala	2/A/2	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 28 19/4/1995	1.291.142,26	1.291.142,26	1.291.142,26	Lavori collaudati	29/03/1996	31/07/1999	29/02/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 46 del 07/07/2000
17	Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Vigonovo	2/A/2	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 28 19/4/1995	1.291.142,26	1.291.142,26	1.291.142,26	Lavori collaudati	18/08/1998	01/08/1999	28/02/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 8 del 14/02/2001
18	Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Stra	2/A/3	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DGCA N. 18 3/3/1995	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	Lavori collaudati	18/07/1997	19/11/1998	28/02/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 87 del 30/10/2000
19	Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Fiesso d'Artico	2/A/3	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DGCA N. 18 3/3/1995	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	Lavori collaudati	27/11/1995	31/12/1997	07/10/1999	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 88 del 30/10/2000
20	Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Dolo	2/A/3	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 18 3/3/1995	2.324.056,85	2.324.056,85	2.314.921,22	Lavori collaudati	27/11/1995	06/02/2003	15/06/2003	Registrata, con DDDA n. 10 del 07/01/2004, un'economia pari a € 9.134,63
21	Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Pianiga	2/A/3	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DGCA N. 18 DEL 3/3/1995	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	Lavori collaudati	25/11/1995	27/09/1997	25/11/1998	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 44 del 07/07/2000
22	Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Campolongo Maggiore	2/A/3	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DGCA N. 18 3/3/1995	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	Lavori collaudati	27/11/1995	09/07/1997	03/08/1998	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 43 del 07/07/2000.
23	Interventi alle fognature nere del Comune di Spinea - II stralcio	2/A/4	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 4 19/1/1995	2.566.461,65	2.566.461,65	2.566.461,65	Lavori collaudati	25/08/1996	25/09/1999	25/02/2002	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 80 del 15/07/2002
24	Interventi alle fognature nere del Comune di Spinea - II stralcio	2/A/4	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 5 19/1/1995	3.382.792,69	3.382.792,69	3.382.792,69	Lavori collaudati	31/05/1995	09/01/1999	07/05/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 4 del 07/01/2004

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione dell'impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio e consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
25	Lavori di costruzione fognature nel Comune di Camponogara	2/A/5	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 88 24/10/1994	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.142,25	Lavori collaudati	25/02/1995	16/10/1996	02/03/1998	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 18 del 27/05/1998
26	Interventi alle fognature nel Comune di Fossò	2/A/5	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 81 7/10/1994	774.685,35	774.685,35	774.685,35	Lavori collaudati	23/02/1995	07/05/1997	04/05/1998	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 46 del 03/03/2004
27	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 27° lotto in comune di Mira A	2/A/1.1	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 148 31/12/1999	884.736,17	884.736,17	884.736,17	Lavori collaudati	20/12/2000			Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 101 del 10/06/2005
28	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 27° lotto in comune di Mira B	2/A/1.2	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 147 31/12/1999	671.393,97	671.393,97	671.393,97	Lavori collaudati	20/12/2000	10/11/2001		Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 37 del 08/03/2005
29	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 27° lotto in comune di Mira C	2/A/1.3	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 148 31/12/1999	839.697,48	839.697,48	839.697,48	Lavori collaudati	20/12/2000	31/07/2002		Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 138 del 16/07/2004
30	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 27° lotto in comune di Mirano	2/A/1.4	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 149 31/12/1999	774.685,35	774.685,35	774.395,85	Lavori collaudati	20/12/2000	28/10/2002		Registrata, con DDDA n. 46 del 3/3/2004, un'economia pari a € 389,49
31	Progetto esecutivo per l'eliminazione di perdite, rotture, infiltrazioni, sedimentazioni, incrostazioni, ecc. da effettuarsi sulla base di risultanze acquifere. 27° Lotto fognature.	2/A/1.5	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 16 28/2/2002	242.734,74	242.734,74	242.734,74	Lavori collaudati	12/07/2002	10/02/2003	22/10/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 45 del 02/03/2004
32	Progetto esecutivo per l' eliminazione di perdite, rotture, infiltrazioni, sedimentazioni, ecc. da effettuarsi sulla base di risultanze acquifere. 27° lotto fognature.	2/A/1.6	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 17 28/2/2002	142.028,66	142.028,66	142.028,66	Lavori collaudati	28/11/2002	08/04/2003		Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 184 del 20/09/2005
33	Progetto esecutivo per la costruzione di reti fognarie nere e per il completamento degli allacciamenti alle utenze. 27° lotto fognature	2/A/1.7	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 18 28/2/2002	844.407,03	844.407,03	842.869,74	Lavori collaudati	03/07/2002			Determinazione del contributo definitivo con DDPV n. 141 del 02/10/2006
34	Realizzazione di opere fognarie relative a tratti secondari e terminali del Consorzio del Mirese	1/E/3	DGR N. 4833 DEL 18/10/1996	DDDA N. 44 DEL 18/1999	2.630.638,81	2.630.638,81	2.630.638,80	Lavori collaudati	08/09/2000	07/04/2003		Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 162 31/08/2004.
35	Opere di fognatura nera - 28° lotto in comune di Fiesso D'Artico	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 73 13/6/2000	361.519,83	361.519,83	361.519,83	Lavori collaudati	13/03/2001	21/03/2002	25/03/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 98 del 18/08/2003
36	Progetto per la realizzazione di opere di fognatura nera - 28° lotto nel comune di Salzano	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 109 14/12/2000	258.228,45	258.228,45	258.228,45	Lavori collaudati	15/10/2001	30/05/2003		Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 239 del 20/12/2004
37	Progetto per la realizzazione di opere di fognatura nera - 28° lotto nel comune di Campagna Lupia.	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 107 14/12/2000	294.051,29	294.051,29	294.051,29	Lavori collaudati	16/07/2002			Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 156 del 20/09/2005
38	Impianto di fognatura del Comune di Martellago - settore A - 28° lotto	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 28 21/3/2001	413.165,82	413.165,82	413.165,82	Lavori collaudati	18/05/2002			Determinazione del contributo definitivo con DDPV n. 160 del 06/10/2006
39	Progetto per la realizzazione di opere di fognatura nera - 28° lotto in comune di Dolo.	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 74 13/6/2000	668.102,58	668.102,58	668.668,70	Lavori collaudati	13/04/2001			Registrata, con DDPV n. 18 del 07/03/2008, un'economia pari a € 1.438,89

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione dell'impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio e consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
40	Interventi di opere fognarie nei comuni di Martellago settore "B" e Salzano settore "B". Progettazione esecutiva del 25° lotto.	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 117 3/10/2001	619.748,28	619.748,28	619.748,28	Lavori collaudati	05/03/2002			Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 188 del 21/10/2005
41	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28°lotto in comune di Fosso	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 73 22/8/1999	413.166,62	413.166,62	383.660,72	Lavori collaudati	04/02/2000	04/04/2001		Registrata, con DDDA n. 113 del 16/06/2004, un'economia pari a € 19.304,81
42	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Camponogara	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 74 22/8/1999	464.811,21	464.811,21	464.692,98	Lavori collaudati	13/03/2000	27/04/2001	19/06/2002	Registrata, con DDDA n 141 del 12/12/2002, un'economia di € 118,23
43	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera - 28° lotto - in comune di Noale (Ve)	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 75 22/8/1999	568.102,69	568.102,69	568.102,69	Lavori collaudati	14/03/2000	22/03/2002	02/12/2002	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 67 del 27/05/2003
44	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Scorzè-Settore A	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1999	DDDA N. 144 31/12/1999	634.209,07	634.209,07	634.209,06	Lavori collaudati	22/05/2000	30/10/2002	12/07/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 7 del 07/01/2004
45	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Scorzè-Settore B	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1999	DDDA N. 145 31/12/1999	396.413,35	396.413,35	396.413,35	Lavori collaudati	11/02/2000	03/05/2001	22/11/2002	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 68 del 27/05/2003
46	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Planiga	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1999	DDDA N. 78 22/8/1999	516.456,90	516.456,90	497.090,05	Lavori collaudati	14/09/2000	21/05/2002	11/12/2003	Registrata, con DDDA n. 100 del 01/06/2004, un'economia di € 19.366,85
47	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Mirano. Settore A	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1999	DDDA N. 79 22/8/1999	534.616,92	534.616,92	516.457,90	Lavori collaudati	07/03/2000	30/07/2001	10/09/2002	Registrata, con DDDA n. 7 del 7/02/2003, un'economia di € 6.159,02
48	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Mirano. Settore B	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1999	DDDA N. 80 22/8/1999	508.296,88	508.296,88	481.632,69	Lavori collaudati	22/05/2000	04/07/2001	04/11/2003	Registrata, con DDDA n. 94 del 18/05/2004, un'economia di € 26.663,99
49	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Spinea	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1999	DDDA N. 81 22/8/1999	671.393,97	671.393,97	669.023,23	Lavori collaudati	05/09/2000	07/10/2002	01/09/2003	Registrata, con DDDA n. 8 del 07/01/2004, un'economia di € 2.370,74
50	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Mira. Settore A	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1999	DDDA N. 82 22/8/1999	284.051,29	284.051,29	274.136,39	Lavori collaudati	05/09/2000	23/11/2001		Registrata, con DDDA n. 161 del 31/05/2004, un'economia di € 9.914,90
51	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Mira. Settore B	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1999	DDDA N. 83 22/8/1999	748.682,50	748.682,50	748.682,48	Lavori collaudati	22/05/2000	22/02/2002		Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 231 del 06/12/2004
52	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di S. Maria di Sala	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1999	DDDA N. 131 23/12/1999	774.886,35	774.886,35	750.660,99	Lavori collaudati	20/10/2000	27/05/2002	20/10/2003	Registrata, con DDDA n. 91 del 18/05/2004, un'economia di € 24.124,37
53	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Stra	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1999	DDDA N. 132 23/12/1999	413.166,62	413.166,62	404.960,93	Lavori collaudati	14/09/2000	06/06/2002		Registrata, con DDDA n. 139 del 16/07/2004, un'economia di € 8.204,60
54	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Vigonovo	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1999	DDDA N. 133 23/12/1999	490.634,05	490.634,05	490.634,05	Lavori collaudati	20/12/2000	18/12/2002		Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 241 del 20/12/2004
55	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Campolongo Maggiore	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1999	DDDA N. 135 23/12/1999	516.456,90	516.456,90	508.828,66	Lavori collaudati	22/01/2001	20/06/2002		Registrata, con DDDA n. 112 del 16/06/2004, un'economia di € 7.631,24

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione atto impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio e consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
56	Lavori di costruzione del 29° lotto - Fognature in comune di Strà	A/11.2 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 33 DEL 2/4/2001	206.582,76	206.582,76	206.582,76	Lavori collaudati	08/03/2002	28/08/2003		Determinazione del contributo definitivo con DDPV n. 17 del 07/03/2006
57	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Santa Maria di Sala.	A/11.4 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 44 23/4/2001	413.165,52	413.165,52	413.165,52	Lavori collaudati	04/03/2002			Determinazione del contributo definitivo con DDPV n. 116 del 17/07/2006
58	Lavori per la costruzione del 29° lotto di fognatura. Intervento nel comune di Fossò	A/11.5 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 45 23/4/2001	103.291,38	103.291,38	103.291,38	Lavori collaudati	15/10/2001	13/12/2002		Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 38 del 08/03/2005
59	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Noale.	A/11.8 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 58 14/5/2001	516.456,90	516.456,90	516.456,90	Lavori collaudati	18/03/2003			Determinazione del contributo definitivo con DDPV n. 182 del 05/10/2006
60	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Scorzè	A/11.3 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 41 23/5/2001	868.102,89	868.102,89	868.102,89	Lavori collaudati	13/02/2002			Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 227 del 03/12/2004
61	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Campolongo Maggiore.	A/11.17 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 129 3/10/2001	309.874,14	309.874,14	278.886,73	Lavori in corso	07/10/2003			
62	Lavori di costruzione del 29° lotto - Fognature in comune di Vigonovo	A/11.1 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 32 DEL 2/4/2001	258.228,45	258.228,45	257.257,91	Lavori collaudati	06/03/2002	26/06/2003		Registrata, con DDPV n. 112 del 17/07/2006, un'economia di € 970,54
63	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Dolo.	A/11.12 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 106 DEL 7/8/2001	258.228,45	258.228,45	258.228,45	Lavori collaudati	03/07/2002			Determinazione del contributo definitivo con DDPV n. 181 del 05/10/2006
64	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Fiesso d' Artico.	A/11.7 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 57 14/5/2001	184.937,07	184.937,07	184.937,07	Lavori collaudati	10/06/2002			Determinazione del contributo definitivo con DDPV n. 92 del 18/06/2006
65	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Martellago	A/11.11 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 91 30/7/2001	361.519,83	361.519,83	326.367,05	Lavori in corso	09/10/2002			
66	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Mira.	A/11.13 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 107 DEL 7/8/2001	723.039,65	723.039,65	723.039,65	Lavori collaudati	28/08/2002			Determinazione del contributo definitivo con DDPV n. 113 del 17/07/2006
67	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Mirano.	A/11.18 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 119 3/10/2001	619.748,28	619.748,28	619.023,53	Lavori collaudati	23/10/2002			Registrata, con DDDA n. 185 del 21/10/2005, un'economia di € 724,75
68	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Salzano.	A/11.15 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 118 3/10/2001	413.165,52	413.165,52	413.165,52	Lavori collaudati	05/08/2002			Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 83 del 13/06/2005
69	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Spinea.	A/11.14 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 108 DEL 7/8/2001	184.937,07	184.937,07	184.937,07	Lavori collaudati	11/07/2002	22/07/2003		Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 240 del 20/12/2004
70	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Campagna Lupia	A/11.9 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 89 30/7/2001	184.937,07	184.937,07	184.937,07	Lavori collaudati	11/06/2002			Determinazione del contributo definitivo con DDPV n. 213 del 20/12/2006
71	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Piombino.	A/11.6 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 56 14/5/2001	258.228,45	258.228,45	257.582,29	Lavori collaudati	10/09/2002	26/07/2003		Registrata, con DDDA n. 84 del 13/05/2005, un'economia di € 645,16
72	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Camponogara	A/11.10 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 90 30/7/2001	484.811,21	484.811,21	484.811,21	Lavori collaudati	12/07/2002			Determinazione del contributo definitivo con DDPV n. 200 del 28/11/2006

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione atto impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
73	Progetto dimostrativo per l'integrazione di reti di fognatura bianca e reti di bonifica. Progetto definitivo / esecutivo, primo stralcio - PARTE A	B/13.1	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA 230 05/12/2006	415.000,00	415.000,00	80.045,49	Lavori in corso				
74	Progetto dimostrativo per l'integrazione di reti di fognatura bianca e reti di bonifica. Progetto definitivo / esecutivo, secondo stralcio - PARTE B	B/13.1	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DOPV 198 22/11/2006	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	Lavori in corso				
[redacted]												
75	Interventi di fognatura in comune di S.Maria di Sala	B/48	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 187 7/12/2002	413.166,62	413.166,62	413.166,62	Lavori collaudati	13/02/2003			Determinazione del contributo definitivo con DDPV n. 99 del 23/06/2006
76	Interventi di fognatura in comune di Vigonovo	B/52	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 103 DEL 7/9/2001	258.228,45	258.228,45	215.880,31	Lavori in corso	26/10/2002			
77	Interventi di fognatura in comune di Stra	B/51	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 168 7/12/2001	309.874,14	309.874,14	276.898,73	Lavori in corso	05/03/2003			
78	Interventi di fognatura in comune di Spinea	B/50	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 166 30/11/2001	258.228,45	258.228,45	258.228,45	Lavori collaudati	03/10/2002			Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 36 del 08/03/2006
79	Interventi di fognatura in comune di Scorzè	B/48	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 167 30/11/2001	516.456,90	516.456,90	484.811,21	Lavori in corso	13/02/2003			
80	Interventi di fognatura in comune di Salzano	B/47	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 165 30/11/2001	413.166,62	413.166,62	413.166,62	Lavori collaudati	13/02/2003			Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 165 del 20/09/2005
81	Progettazione esecutiva del 30° lotto. Interventi di fognatura in comune di Campolongo Maggiore	B/37	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 121 3/10/2001	381.519,83	381.519,83	277.053,09	Lavori in corso	13/02/2003			
82	Interventi di fognatura in comune di Noale	B/45	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 169 30/11/2001	671.393,97	671.393,97	604.254,67	Lavori in corso	18/02/2003			
83	Interventi di fognatura in comune di Martellago	B/42	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 166 30/11/2001	381.519,83	381.519,83	381.519,83	Lavori collaudati	13/02/2003			Determinazione del contributo definitivo con DDPV n. 159 del 05/10/2006
84	Progettazione esecutiva del 30° lotto. Interventi di fognatura in comune di Mirano.	B/44	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 129 4/10/2001	733.988,80	733.988,80	632.955,34	Lavori in corso	12/02/2003			
85	Progettazione esecutiva del 30° lotto. Interventi di fognatura in comune di Pianiga	B/46	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 127 4/10/2001	258.228,45	258.228,45	258.228,45	Lavori collaudati	13/02/2003			Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 158 del 20/09/2005
86	Interventi di fognatura in comune di Campagna Lupia	B/36	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 142 9/11/2001	258.228,45	258.228,45	258.228,45	Lavori collaudati	18/02/2003			Determinazione del contributo definitivo con DDPV n. 210 del 13/12/2006
87	Progettazione esecutiva del 30° lotto. Interventi di fognatura in comune di Mira	B/43	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 128 4/10/2001	1.032.913,80	1.032.913,80	928.822,41	Lavori in corso	28/01/2003			
88	Interventi di fognatura in comune di Camponogara	B/38	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 104 DEL 7/9/2001	1.032.913,80	1.032.913,80	929.622,42	Lavori in corso	18/02/2003			
89	Interventi di fognatura in comune di Dolo	B/39	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 160 30/11/2001	361.519,83	361.519,83	325.367,85	Lavori in corso	12/02/2003			
90	Progettazione esecutiva del 30° lotto. Interventi di fognatura in comune di Fiesso D'Artico	B/40	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 122 3/10/2001	258.228,45	258.228,45	232.405,60	Lavori in corso	13/02/2003			

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione atto impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio e consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Nota
91	Interventi di fognatura in comune di Fosso	B/41	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 105 DEL 7/9/2001	247.899,31	247.899,31	247.899,31	Lavori collaudati	01/10/2002			Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 187 del 21/10/2005
92A	Interventi di fognatura nel comune di Spinea - parte A (€ 182.000,00)	1/F1.2	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA 49/03	182.000,00	182.000,00	122.172,16	Lavori in corso				
92B	Interventi di fognatura nel comune di Spinea - parte B (€ 830.000,00)	1/F1.3	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA 49/03	830.000,00	830.000,00	747.000,00	Lavori in corso	07/10/2003			
92C	Interventi di fognatura nel comune di Spinea - parte C (€ 857.370,70)	1/F1.1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA 86/03	857.370,70	857.370,70	830.404,35	Lavori in corso	16/09/2003			L'importo complessivo del progetto è pari a € 836.387,00; il comune copre la quota di € 79.017,00
93A	Interventi di fognatura nel comune di Camponogara - parte A (€ 878.328,20)	1/F2.1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA 115 28/08/2003	878.328,20	878.328,20	706.177,69	Lavori in corso				
93B	Interventi di fognatura nel comune di Camponogara - parte B (€ 184.685,00)	1/F2.2	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA 85 27/08/2003	184.685,00	184.685,00	184.685,00	Lavori collaudati				Determinazione del contributo definitivo con DDPV n. 199 del 28/11/2006
94A	Interventi di fognatura nel comune di Fosso - parte A (€ 640.000,00)	1/F3.1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA 88 29/07/2003	640.000,00	640.000,00	630.219,24	Lavori in corso				
94B	Interventi di fognatura nel comune di Fosso - parte B (€ 392.913,00)	1/F3.2	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA 174 19/11/2003	392.913,00	392.913,00	337.147,97	Lavori in corso				
95	Interventi di fognatura nel comune di Noale	1/F4	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 89 29/07/2003	818.468,90	818.468,90	810.468,90	Lavori in corso				
96	Interventi per il completamento e la realizzazione di opere fognarie nei 17 comuni consorziati (€ 4.848.112,10)	1/F16	DGR N. 794 DEL 9/4/2003									
96B	Progetto esecutivo dei lavori del 31° lotto delle fognature nel comune di Spinea - parte C.	1/F16.1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 49 23/05/2003	79.017,91	79.017,91	47.423,67	Lavori in corso	16/09/2003			
96C	Progetto esecutivo dei lavori del 31° lotto delle fognature nel comune di Mirano	1/F16.2	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 47 23/05/2003	493.629,60	493.629,60	431.301,80	Lavori in corso				
96D	Progetto esecutivo dei lavori del 31° lotto delle fognature nel comune di Salzano	1/F16.3	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 48 23/05/2003	306.380,96	306.380,96	274.842,88	Lavori in corso				
96E	Progetto esecutivo dei lavori del 31° lotto delle fognature nel comune di Campagna Lupia	1/F16.4	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 52 23/05/2003	123.639,76	123.639,76	111.278,80	Lavori in corso				
96F	Progetto esecutivo dei lavori del 31° lotto delle fognature nel comune di S. Maria di Sala e Pianiga	1/F16.5	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 87 23/07/2003	510.827,62	510.827,62	459.744,77	Lavori in corso				
96G	Progetto esecutivo dei lavori del 31° lotto della fognatura nei comuni di Dolo, Camponogara e Stra.	1/F16.6	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 56 27/06/2003	684.114,40	684.114,40	684.114,40	Lavori collaudati	27/09/2003			Determinazione del contributo definitivo con DDPV n. 199 del 28/11/2006
96H	Progetto esecutivo dei lavori del 31° lotto della fognatura nei comuni di Scorzè e Martellago.	1/F16.7	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 57 23/07/2003	709.201,91	709.201,91	638.371,72	Lavori in corso				
96I	Progetto esecutivo dei lavori del 31° lotto della fognatura nel comune di Noale	1/F16.8	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 89 23/07/2003	430.879,99	430.879,99	338.146,30	Lavori in corso				

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione atto impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
96L	Progetto esecutivo dei lavori del 31° lotto della fognatura nel comune di Mira.	1/F/5.9	DGR N. 794 DEL 8/4/2002	DDOA N. 117 20/08/2003	772.051,42	772.051,42	694.694,70	Lavori in corso				
96M	Progetto esecutivo dei lavori del 31° lotto nel comune di Fossò - parte B.	1/F/5.10	DGR N. 794 DEL 8/4/2002	DDOA N. 174 19/11/2003	74.834,60	74.834,60	0,00	Progetto approvato				
96N	Progetto esecutivo dei lavori del 31° lotto nel comune di Strà - parte B.	1/F/5.11	DGR N. 794 DEL 8/4/2002	DDOA N. 22 08/02/2005	75.001,01	75.001,01	62.167,87	Lavori in corso				
96O	Progetto esecutivo dei lavori del 31° lotto nel comune di Campolongo maggiore, Fiesso D'Artico e Vigonovo - parte B.	1/F/5.12	DGR N. 794 DEL 8/4/2002	DDOA N. 49 23/03/2005	609.433,05	609.433,05	46.676,70	Lavori in corso				
97	Messa in sicurezza ex discarica per RSU	4/A/1.3	DGR N. 794 DEL 8/4/2002	DDOA 11404	2.400.000,00	240.000,00	187.934,31	Progettazione in corso				
98	Intervento di prevenzione dell'inquinamento dell'ex discarico per RSU e RSAU in località Ca' Perale del comune di Mirano	4/A/1.7	DGR N. 794 DEL 8/4/2002		2.402.250,26			Progettazione in corso				
[redacted]												
99	Costruzione nuove opere di fognatura nel comune di Camponogara - 31° lotto bis	6/E/1.A	DGR N. 1140 DEL 18/4/2003	DDOA N. 183 05/10/2004	1.250.000,00	1.250.000,00	369.734,68	Lavori in corso				
100	Costruzione nuove opere di fognatura nel comune di Spinea - 31° lotto bis	6/E/1.B	DGR N. 1140 DEL 18/4/2003	DDOA N. 184 05/10/2004	1.250.000,00	1.250.000,00	28.015,40	Lavori in corso				
[redacted]												
101	Intervento in comune di Fossò	E/1.3	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 31 21/03/2006	384.000,00	384.000,00	11.709,00	Lavori in corso				
102	Intervento in comune di Campolongo Maggiore - Parte A	E/1.10A	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDOA 195 25/10/2006	428.000,00	428.000,00	12.763,82	Lavori in corso				
	Intervento in comune di Campolongo Maggiore - Parte B	E/1.10B	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDOA 197 26/10/2006	150.000,00	150.000,00	97.174,50	Lavori in corso				
103	Intervento in comune di Pianiga	E/1.12	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDOA 134 17/08/2005	416.000,00	416.000,00	12.763,82	Lavori in corso				
104	Intervento in comune di Mira - Parte A	E/1.8A	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 43 29/03/2006	680.000,00	680.000,00	17.766,38	Lavori in corso				
105	Intervento in comune di Mira - Parte B	E/1.8B	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 42 29/03/2006	1.076.000,00	1.076.000,00	4.384,64	Lavori in corso				
106	Intervento in comune di Salzano	E/1.1	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 33 21/03/2006	664.000,00	664.000,00	17.122,58	Lavori in corso				
107	Intervento in comune di Spinea	E/1.5	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		416.000,00			Progettazione in corso				
108	Intervento in comune di Strà	E/1.7	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDOA 145 13/09/2005	488.000,00	488.000,00	18.488,81	Lavori in corso				
109	Intervento in comune di Vigonovo - Parte A	E/1.11A	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 146 02/10/2006	268.000,00	268.000,00	0,00	Lavori in corso				
	Intervento in comune di Vigonovo - Parte A	E/1.11B	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		140.000,00			Progettazione in corso				

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
110	Intervento in comune di Dolo	E/1.2	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 166 16/10/2006	576.000,00	576.000,00	0,00	Lavori in corso				
111	Intervento in comune di S. Maria di Sala	E/1.4	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 32 21/03/2006	664.000,00	664.000,00	18.110,03	Lavori in corso				
112	Intervento in comune di Camponogara	E/1.9	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 167 16/10/2006	1.656.000,00	1.656.000,00	0,00	Lavori in corso				
113	Intervento in comune di Campagna Lupia	E/1.6	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDDA 196 25/10/2006	416.000,00	416.000,00	12.290,88	Lavori in corso				
114	Intervento in comune di Mirano - Parte A	E/1.13A	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDDA 136 17/08/2006	716.000,00	716.000,00	17.484,16	Lavori in corso				
	Intervento in comune di Mirano - Parte B	E/1.13B	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDDA 135 17/08/2006	486.000,00	486.000,00	13.515,88	Lavori in corso				
115	Intervento in comune di Martellago	E/1.14	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 183 03/10/2006	576.000,00	576.000,00	0,00	Lavori in corso				
116	Realizzazione fognature nere nei comuni di Salzano, Fiesso D'Artico e Noale - 32° lotto	E/1.15	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 147 02/10/2006	428.000,00	428.000,00	0,00	Lavori in corso				
	Realizzazione fognature nere nei comuni di Strà e Fiesso D'Artico - 32° lotto	E/1.15.1	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDDA 145 13/09/2006	72.000,00	72.000,00	0,00	Lavori in corso				
117	Intervento di prevenzione dell'inquinamento dell'ex discarico per RSU e RSAU in località Ca' Perale del comune di Mirano	B/15	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		97.749,74			Progettazione in corso				
	TOTALI				102.630.688,01	96.219.716,62	77.981.283,41					

AZIENDA PIOVESE GESTIONE ACQUE (A.P.G.A.)

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Costruzione del collettore consortile da Piove di Sacco all'impianto di depurazione di Codevigo			DDLP N. 471 28/07/1988	1.291.142,25	1.291.142,25	1.285.338,09	Lavori collaudati	28/03/1989	24/05/1991	28/09/1996	Registrata, con DDLP n. 491 del 27/11/1996, un'economia di € 5.804,16
2	Realizzazione di collettori fognari e depurazione nell'area Sud del Piovese	1/4.4	DGR N. 2773 21/8/1994	DPGR N. 1293 8/8/1995	1.652.662,08	1.652.662,08	1.549.568,48	Lavori collaudati	10/07/1996	10/10/1999	09/04/2001	Registrata un'economia di € 103.093,6 destinata, con DDDA n. 26 del 25/03/2002, all'intervento 2 bis
2bis	Potenziamento dei sistemi depurativi e ampliamento reti fognarie - 1° stralcio - impianti (€ 103.093,60)	1/4.4bis	DGR N. 2773 21/8/1994	DDDA N. 126 6/11/2002			103.093,60	Lavori ultimati	10/07/1996	10/10/1999	-	Utilizzata l'economia di € 103.093,6 dell'intervento 2

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione elo lavaggio	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
3	Completamento impianto di depurazione di Codevigo	6/E/1	DGR N. 4977 2/11/1993	DPGR N. 2855 28/11/1994	3.064.204,68	3.064.204,68	3.064.204,68	Lavori collaudati	10/09/1998	15/12/1998	28/11/2001	Finanziamento originale pari a € 3.098.741,39. Registrata, con DDDA n. 39 del 23/04/2002, un'economia di € 34.536,72 destinata all'intervento 3 bis
3bis	Utilizzo delle economie di spesa maturate nel finanziamento del progetto relativo alle opere di ampliamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione di Codevigo	6/E/1 ECO	DGR N. 4977 2/11/1993	DDDA N. 169 13/09/2004	34.536,72	34.536,72	34.536,00	Lavori collaudati				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 227 del 05/12/2005
4	Adeguamento strutture fognarie: miglioramento reti secondarie nei comuni di Legnaro e S. Angelo di Piove	1/D/4	DGR N. 2203 21/5/1996	DDDA N. 11 DEL 12/2/1997	516.456,90	516.456,90	516.456,90	Lavori collaudati	04/09/1997	09/10/1998	09/07/2001	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 5 del 07/01/2004
5	Adeguamento strutture fognarie: progetto esecutivo per il disinquinamento area sud del Piovese (Pontelongo, Correzzola e Cona)	1/D/5	DGR N. 2203 21/5/1996	DDDA N. 11 DEL 12/2/1997	987.807,50	987.807,50	987.807,50	Lavori collaudati	18/09/1997	07/02/2000	25/01/2002	Finanziamento originale pari a € 1.032.913,80. Registrata, con DDDA n. 38 del 14/04/2003, un'economia di € 45.106,24 destinata all'intervento 4 bis
6bis	Utilizzo delle economie di spesa maturate nel finanziamento del progetto definitivo relativo ai lavori di disinquinamento dell'area sud - interventi nei comuni di Pontelongo, Correzzola e Cona	1/D/5.1	DGR N. 2203 21/5/1996	DDDA N. 136 14/07/2004	45.106,24	45.106,24	45.106,24	Lavori collaudati				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 178 del 11/10/2005
6	Adeguamento strutture fognarie: estensione rete fognaria in località San Piero in Comune di Piove di Sacco	1/D/3	DGR N. 2203 21/5/1996	DDDA N. 11 DEL 12/2/1997	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	Lavori collaudati	23/09/1998	05/11/1999	26/09/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 74 del 02/07/2001
7	Progetto 1° stralcio esecutivo di estensione della rete di fognatura di tipo separato ad alcune aree dei comuni di Legnaro, S. Angelo di Piove di Sacco e Polverara	1/E/5	DGR N. 4533 15/10/1996	DGCA N. 84 DEL 18/2/1998	1.266.319,40	1.266.319,40	1.248.823,93	Lavori collaudati	31/05/1999	28/04/2000	18/05/2002	Registrata, con DDDA n. 226 del 03/12/2004, un'economia di € 16.495,49
8	Progetto 2°stralcio esecutivo di estensione della rete di fognatura di tipo separato ad alcune aree dei comuni di S. Angelo di Piove, Brugine, Piove di Sacco, Arzergrande e Pontelongo.	1/E/5	DGR N. 4533 15/10/1996	DGCA N. 85 DEL 18/2/1998	1.420.256,47	1.420.256,47	1.420.256,47	Lavori collaudati	18/05/1998	25/09/2000	23/11/2002	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 98 del 08/06/2006
9	Progetto 3° stralcio esecutivo di estensione della rete di fognatura di tipo separato ad alcune aree dei comuni di Brugine, Piove di Sacco e Correzzola.	1/E/5	DGR N. 4533 15/10/1996	DDDA N. 24 DEL 22/6/1998	1.568.827,28	1.568.827,28	1.568.827,28	Lavori collaudati	31/05/1999	13/10/2000	18/02/2002	Finanziamento originale pari a € 1.755.953,46. Registrata, con DDDA n. 37 del 14/04/2003, un'economia di € 169.326,17 destinata all'intervento 9 bis
9bis	Utilizzo delle economie di spesa per un nuovo tratto di condotta fognaria in via S. Giovanni Bosco - Piove di Sacco	1/E/5.3 ECO	DGR N. 4533 15/10/1996	DDDA N. 168 13/09/2004	169.326,17	169.326,17	169.326,17	Lavori collaudati				Determinazione del contributo definitivo con DDPV n. 60 del 06/04/2006
10	Potenziamento del sistema depurativo e ampliamento delle reti di fognatura nel territorio del consorzio del Piovese - 1° stralcio impianti	A/4/1.1	DGR N. 2613 22/7/1997	DDDA N. 39 DEL 10/4/2001	2.788.867,26	2.788.867,26	2.788.867,26	Lavori collaudati	18/04/2001			Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 131 del 04/08/2005
11	Ampliamento delle reti di fognatura e del sistema depurativo nel territorio del consorzio del Piovese	A/4/1.2	DGR N. 2613 22/7/1997	DDDA N. 68 DEL 7/8/2000	4.957.986,23	4.957.986,23	4.957.986,23	Lavori collaudati	03/09/2001			Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 228 del 05/12/2005

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione atto impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio e consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Interventi di fognatura nei comuni di Piove di sacco, Legnaro, Brugine, Polverara, Correzzola, S. Angelo, Pontelongo, Arzergrande	**A/1 V fase**	**DGR N. 2921 DEL 3/8/1999**	**DDDA N. 106 14/12/2000**	**1.849.370,70**	**1.849.370,70**	**1.849.370,70**	**Lavori collaudati**				**Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 188 del 21/10/2005**
13	Interventi di fognatura in comune di Arzergrande	B/32	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 148 12/12/2002	309.874,14	309.874,14	0,00	Progetto approvato				
14	Interventi di fognatura in comune di Brugine	B/30	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 144 12/12/2002	381.519,83	381.519,83	381.519,83	Lavori ultimati				
15	Interventi di fognatura in comune di Correzzola	B/29	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 148 12/12/2002	258.228,45	258.228,45	258.228,45	Lavori ultimati				
16	Interventi di fognatura in comune di Legnaro	B/33	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 144 12/12/2002	693.928,43	693.928,43	693.928,43	Lavori ultimati				
17	Interventi di fognatura in comune di Piove di Sacco	B/31	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 145 12/12/2002	1.849.370,70	1.849.003,44	617.084,70	Lavori in corso				
18	Interventi di fognatura in comune di Pontelongo	B/28	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 148 12/12/2002	671.393,97	671.393,97	671.393,97	Lavori ultimati				
19	Interventi di fognatura in comune di S. Angelo di Piove	B/34	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 144 12/12/2002	842.279,74	842.279,74	316.045,70	Lavori in corso				
20	Interventi di fognatura in comune di Polverara	B/27	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 144 12/12/2002	774.688,35	774.688,35	774.688,35	Lavori ultimati				
21	Adeguamento impianti di depurazione minori	B/35	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 102 01/06/2004	1.849.370,70	1.848.370,70	382.536,31	Lavori in corso				
22	Adeguamento alle nuove normative e potenziamento impianti di depurazione di Codevigo, Pegolotta di Cona e Pontelongo	1/E/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDPV 63 09/05/2006	2.582.284,50	2.582.284,50		Progettazione in corso				
23	Realizzazione linee fognarie di collegamento per la dismissione di impianti di depurazione minori di Correzzola, Cona, diversione scarico di Pontelongo.	1/E/2	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDPV 148 02/10/2006	4.848.112,09	4.848.112,09		Progettazione in corso				
24	Riqualificazione ed implementazione dell della rete fognaria del comprensorio consortile	1/E/3	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDPV 150 02/10/2006	816.456,90	816.456,90		Progettazione in corso				
25	Interventi di fognatura nel comune di Polverara	1/E/4	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDPV 103 05/07/2006	258.228,45	258.228,45		Progettazione in corso				
26	Interventi di fognatura nel comune di Legnaro	1/E/5	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDPV 103 05/07/2006	258.228,45	258.228,45		Progettazione in corso				
27	Interventi di fognatura a Sant' Angelo di Piove.	1/E/6	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDPV 149 02/10/2006	413.165,52	413.165,52		Progettazione in corso				
28	Interventi di fognatura nei comuni di Piove di sacco, Arzergrande, Codevigo e Pontelongo	1/E/7A	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDPV 156 03/10/2006	721.568,17	721.568,17		Progettazione in corso				
29	Interventi di fognature nei comuni di Brugine, località Campagnola, Via Burta - 5° lotto	1/E/7B	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDPV 102 05/07/2006	931.103,91	931.103,91		Progettazione in corso				

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
30	Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999 dell' impianto di depurazione di Pontelongo e Pegolotte	6/D/1	DGR N. 1140 18/4/2003		1.640.000,00			Progettazione in corso				
31	Ampliamento, potenziamento ed affinamento dei processi degli impianti di depurazione di Cona, Codevigo e Pontelongo	E/6	DCR N. 24 04/05/2004		2.400.000,00			Progettazione in corso				
32	Completamento, estensione e riqualificazione di opere già avviate: a) reti fognarie di centri abitati b) impianti di sollevamento	E/7	DCR N. 24 04/05/2004		3.200.000,00			Progettazione in corso				
	TOTALI				46.442.389,96	39.302.002,70	28.294.703,05					

AZIENDA BRENTA SERVIZI

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Comune di Rossano: fognatura in zone laterali Via Salute e Via 11 Febbraio	E/8.1	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.087.320,00			Progettazione in corso				
2	Comune di Rosà: fognature in laterali via Granella, zona S. Pietro e Cusinati	E/8.2	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.598.400,00			Progettazione in corso				
	TOTALI				2.685.720,00	0,00	0,00					

AZIENDA SERVIZI IDRICI DELLA CASTELLANA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Interventi di fognatura in comune di Riese Pio X (TV). 1° stralcio	B/17.1 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 48 DEL 1/8/2000	1.032.913,80	1.032.913,80	966.608,02	Lavori collaudati	22/02/2001	14/11/2002	24/04/2003	Registrata, con DDDA n. 148 del 20/10/2003, un'economia di € 66.305,78 da reiscrivere nel bilancio regionale 2003
2	Interventi di fognatura nei comuni di Riese Pio X, Loria	B/54	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 30 21/3/2001	1.649.370,70	1.649.370,70	1.649.370,70	Lavori collaudati	30/10/2001			Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 165 del 31/08/2004
3	Interventi di ampliamento e ristrutturazione della rete fognaria nei comuni di Castello di Godego, Riese Pio X, Altivole, Maser, Asolo	1/M/1.1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 85 12/8/2002	1.748.741,39	1.748.741,39	1.736.676,40	Lavori collaudati	03/03/2003			Registrata, con DDDA n. 192 25/10/2005, un'economia pari a € 12.064,99
4	Costruzione della fognatura nera nei comuni di Castello di Godego e Loria (TV) - 3° stralcio (1° Lotto).	1/M/1.2	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 87 12/8/2002	1.350.000,00	1.350.000,00	1.340.726,57	Lavori collaudati	11/02/2003			Registrata, con DDDA n. 114 11/07/2005, un'economia pari a € 9.273,43

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del Finanziamento	Approvazione atto impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
5A	Interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia costruzione della fognatura nera in Comune di Castello di Godego e Loria - 4° stralcio (1° lotto)	6/F/1.1	DGR N. 1140 18/4/2003	DDDA N. 85 30/03/2004	33.000,00	33.000,00	0,00	Progetto approvato				
5B	Interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia costruzione della fognatura nera nel Comune di Riese Pio X° e Altivole - 4° stralcio (2° lotto)	6/F/1.2	DGR N. 1140 18/4/2003	DDDA N. 69 13/04/2004	1.367.000,00	1.367.000,00	1.060.311,18	Lavori in corso				
5C	Interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia costruzione della fognatura nera nel comune di Altivole, Asolo e Maser - 4° stralcio (3° lotto)	6/F/1	DGR N. 1140 18/4/2003	DDDA N. 84 11/08/2004	1.100.000,00	1.100.000,00	649.427,43	Lavori in corso				
5D	Interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia costruzione della fognatura nera in Comune di Castello di Godego e Loria - 4° stralcio (1° lotto)	6/F/2	DGR N. 1140 18/4/2003	DDDA N. 85 30/03/2004	1.000.000,00	1.000.000,00	990.747,85	Lavori in corso				
6	Costruzione rete di fognature nere in comune di Riese Pio X° (TV): via Monfenera, e Brigata Marèt del Grappa	E/6.2	DCR N. 24 04/06/2004	DDPV 83 05/09/2006	162.000,00	162.000,00		Progetto approvato				
7	Costruzione rete di fognature nere nei comuni di Asolo e Maser: completamento collettore Asolo / Impianto di depurazione di Maser.	E/6.1	DCR N. 24 04/06/2004	DDPV 83 05/09/2006	480.000,00	480.000,00		Progetto approvato				
8	Costruzione rete di fognature nere in Comune di Castello di Godego (TV): via Vegre, via Cecchetore e via Motte	E/6.3	DCR N. 24 04/06/2004	DDPV 83 05/09/2006	680.000,00	680.000,00		Progetto approvato				
	TOTALI				10.433.028,00	10.433.028,00	8.393.869,18					

AZIENDA SERVIZI PUBBLICI A.S.P. DI CHIOGGIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione atto impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	COMUNE DI CHIOGGIA - DISINQUINAMENTO											
1	Costruzione della fognatura del Comune di Chioggia (VE) - XIV lotto		DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DDEA N. 27 20/7/1993	335.696,98	335.696,98	331.607,90	Lavori collaudati			20/05/1994	Registrata, con DDLP n. 133 del 23/4/1997, un'economia pari a € 4.089,08 convogliata all'intervento 4
2	Costruzione della fognatura del Comune di Chioggia (VE) - XI lotto			DDLP N. 324 03/06/1988	671.393,97	671.393,97	571.793,63	Lavori collaudati			20/05/1994	Registrata, con DDLP n. 73 del 17/03/1997, un'economia pari a € 99.600,34 convogliata all'intervento 4
3	Costruzione della fognatura del Comune di Chioggia (VE) - XVI lotto		DGR N. 6641 DEL 10/11/1986	DDDA N.120 8/8/1990	1.886.087,85	1.886.087,85	1.838.810,70	Lavori collaudati	07/10/1997	28/10/1998	28/10/2000	Registrata, con DDLP n° 423 del 11/12/2003, un'economia pari a € 46.256,97.
4	Ampliamento dell'impianto di depurazione del Comune di Chioggia (VE) - Opere elettromeccaniche (XV lotto - I° stralcio)		DGR N. 710 DEL 22/7/1988	DDDA N. 13162 DEL 12/12/1988	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	Lavori collaudati	02/10/1998	24/08/1992	28/04/1995	Determinazione del contributo definitivo con DDLP n° 391 del 03/10/1997. Supero di spesa parzialmente coperto con le economie degli interventi 1 e 2. Residuo a carico dell'ente
5	Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione di Chioggia	1/1.2b	DCR N. 745 DEL 1/7/1988	DDDA N. 120 DEL 6/8/1990	6.164.868,99	6.164.868,99	6.164.868,99	Lavori collaudati	26/11/1998	31/07/1998	08/03/1999	Determinazione del contributo definitivo con DOPV N. 2 del 19/01/2006
6	Collegamento e impianto di depurazione di Valli di Chioggia (VE)	1/2.14b	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DDDA N. 109 20/6/1996	55.810,28	55.810,28	55.810,28	Lavori ultimati				Finanziamento originale pari a € 568.102,59, di cui € 511.292,33 revocati e devoluti alla Diocesi Patriarcato di Venezia
7	Appalto 42/A e 42/B. Ampliamento rete fognaria del centro storico di Chioggia e Sottomarina	1/2.14a	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DDDA N. 27 20/7/1993	7.436.979,35	7.436.979,35	7.191.067,31	Lavori collaudati	21/05/1997	15/06/2000	14/10/2002	Registrata, con DDDA n. 2 del 13/01/2003, un'economia di € 254.911,78 riiscritta nel capitolo 50511 del bilancio regionale
8	Fognature di Chioggia (VE)	3c	DGR N. 4976 DEL 2/11/1993	DDDA N. 116 28/6/1996	618.456,90	618.456,90	614.127,07	Lavori collaudati	16/10/1998	29/04/1997	03/03/1998	Registrata, con DDDA n. 35 del 21/06/2000, un'economia di € 2.329,83 riiscritta nel capitolo 50511 del bilancio regionale
9	Ampliamento fognature bianca e nera nel centro storico di Chioggia	5/F/1	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 66 2/10/1995	4.622.289,25	4.622.289,25	1.164.906,22	Parte dei lavori collaudati	29/04/1998	16/04/1998	03/10/2000	Rescisso il contratto con la ditta appaltatrice
10	Progetto per l'individuazione ed eliminazione delle intrusioni di acqua salata nella rete di fognatura	5/F/2	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 45 13/6/1996	842.279,74	842.279,74	832.779,50	Lavori collaudati	06/05/1996	06/12/1997	15/05/2000	Registrata, con DOPV n. 62 del 05/04/2006, un'economia di € 9.500,24
11	Realizzazione di opere fognarie relative a tratti secondari e terminali del Comune di Chioggia	1/E/2	DGR N. 4533 DEL 15/10/1996	DGCA N. 617 18/11/1997	4.906.340,64	4.906.340,64	4.318.869,01	Lavori collaudati	30/04/1998	10/11/2000	12/10/2002	Registrata, con DDDA n. 225 del 03/12/2004, un'economia di € 587.361,63

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione atto impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio e consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	ULSS 13											
12	Progetto definitivo dell'impianto elettrico del depuratore di Val da Rio - 1° e 2° stralcio	C33/2	DGR N. 853 DEL 28/2/1997	DGCA N. 826 1/12/1997	320.203,28	320.203,28	288.213,85	Lavori collaudati	16/02/1998	27/04/1998	21/01/2000	Registrata, con DDPV n. 51 del 03/04/2006, un'economia di € 54.989,43
13	Progetto esecutivo dei lavori di miglioramento ed ammodernamento della linea "Pacchi" del depuratore di Val da Rio	C33/3	DGR N. 853 DEL 28/2/1997	DGCA N. 848 18/12/1997	118.788,09	118.788,09	118.788,09	Lavori collaudati	18/03/1998	24/07/1998	29/03/1999	Determinazione del contributo definitivo con DDPV n° 53 del 05/03/2006
14	Lavori di miglioramento ed ammodernamento dell'impianto di depurazione di Val da Rio - lotto funzionale A	C33/1	DGR N. 853 DEL 28/2/1997	DGCA N. 388 24/6/1997	1.007.090,95	1.007.090,95	1.001.756,77	Lavori collaudati	13/11/1997	05/02/1999	29/03/2002	Registrata, con DDPV n. 110 del 17/07/2006, un'economia di € 5.334,18
	ULSS 14											
15	Realizzazione di interventi di completamento funzionale dell'impianto di depurazione di Val da Rio	B/16/7	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 85 29/6/1999	250.998,06	250.998,06	0,00	Lavori in corso	10/09/1999			
16	Progetto esecutivo di ampliamento della rete fognaria nella calli del centro storico di Sottomarina a nord di Via Roma, per l'adeguamento dello stesso alla nuova normativa di riferimento Merloni Ter. Finanziamento dei primi due lotti dell'opera	B/16/4.1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 95 30/10/2000	4.991.888,93	4.991.888,93	4.492.400,34	Lavori in corso	04/10/2002			
18	Progetto di riqualificazione edilizia della linea "pacchi" del depuratore di Val da Rio	B/16/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DGCA N. 848 18/12/1997	209.788,25	209.788,25	188.927,74	Lavori collaudati	09/03/1998	07/08/1998	08/07/1999	Registrata, con DDDA n. 39 del 14/04/2003, un'economia di € 19.777,51 da riscrivere nel bilancio regionale 2003
19	Progetto esecutivo per un sistema di disidratazione dei fanghi depuratore Val da Rio- 2° lotto	B/16/2	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DGCA N. 146 24/3/1998	194.381,88	194.381,88	194.381,88	Lavori collaudati	03/03/1999	10/06/1999	18/09/1999	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 84 del 29/06/1999
20	Progetto di manutenzione straordinaria presso l'impianto di depurazione di Val da Rio	B/16/3	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DGCA N. 430 22/10/1997	147.088,80	147.088,80	140.782,63	Lavori ultimati	29/11/1997	12/06/1998	19/12/1998	Documentazione relativa al collaudo dell'opera non ancora inviata da parte dell'ente.
21	Affinamento qualitativo dell'effluente del depuratore di Val da Rio	B/16/5	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 12 DEL 2/3/1999	2.040.004,76	2.040.004,76	1.882.990,14	Lavori collaudati	19/07/1999	31/10/2000		Registrata, con DDDA n. 219 del 28/11/2005, un'economia di € 157.014,61
22	Collettore di allacciamento della fognatura comunale per il conferimento dei reflui da Cà Bianca al depuratore di Val da Rio	B/16/6	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 22 18/3/1999	828.331,04	828.331,04	600.698,05	Lavori in corso	19/07/1999			L'importo complessivo dell'opera è pari a 3,1 MLD di lire, finanziato per 1,5 mld dal CIPE e per 1,6 MLD dalla Legge Spec. Ve
23	Progetto esecutivo relativo ad interventi a difesa dell'abitato di Chioggia - Fondamenta S. Domenico	B/16/4.2	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA 139 30/08/2005	516.062,18	516.062,18	516.062,18	Lavori in corso				
24	Completamento del depuratore di Val da Rio. I lotto funzionale. Impianto di modulazione e sollevamento "Piccolo de Conti"	B/16/4.3	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA 297 10/11/2005	1.153.000,00	1.023.000,00	909.133,91	Lavori in corso				
	ULSS 15											
23	Messa in sicurezza della discarica "Cà Rossa" in Comune di Chioggia	D/55	DGR N. 1634 DEL 23/6/2000		2.582.284,50			Progettazione in corso				Vedi scheda riepilogativa degli interventi relativi alla bonifica dei siti inquinati nel bacino scolante
24	Adeguamento tecnologico ambientale e completamento del depuratore di Val da Rio	B1/56	DGR N. 1634 DEL 23/6/2000	DDDA N. 134 29/11/2002	9.812.681,08	9.812.681,08	9.450.000,00	Lavori in corso				

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione dell'impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio e consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
25	Completamento ed adeguamento dell' impianto di depurazione di Val da Rio. (€ 8.197.482,79)		DGR N. 784 DEL 9/4/2002					Finanziamento suddiviso negli interventi 25A (€ 5.510.163,87) e 25B (€ 687.318,92)				
25A	Completamento ed adeguamento dell' impianto di depurazione di Val da Rio. (€ 5.510.163,87)	1/Q/1	DGR N. 784 DEL 9/4/2002		5.510.163,87			Progettazione in corso				
25B	Adeguamento tecnologico - ambientale e definitivo completamento del depuratore di Val da Rio - 1° lotto funzionale	1/Q/1.1	DGR N. 784 DEL 9/4/2002	DDOA N. 69 DEL 2004	687.318,92	687.318,92	0,00	Progetto approvato				
26	Risanamento e completamento dei sistemi fognari nei centri storici di Chioggia e Sottomarina	1/Q/2	DGR N. 784 DEL 9/4/2002	DDOA N. 142 12/12/2002	2.066.827,60	2.016.765,73	1.310.723,61	Lavori in corso				Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione
27	Interventi urgenti per l'ottimizzazione dell'afflusso delle acque bianche e nere di Sottomarina al depuratore di Val da Rio tramite adeguamento dell'impianto di sollevamento e modulazione "Niccolò De Conti"	E/2	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.200.000,00			Progettazione in corso				
28	Completamento dei sistemi fognari nel centro storico di Sottomarina - 1^ fase	E/3	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		2.400.000,00			Progettazione in corso				
29	Adeguamento dei sistemi fognari del centro storico di Chioggia in concomitanza dei lavori di difesa della città dalle acque alte	E/4	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		2.400.000,00			Progettazione in corso				
	TOTALI				65.604.290,73	61.333.770,49	43.631.190,41					
	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASSA PIANURA VENETA TRA SILE E PIAVE					

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
7	Interconnessione sistemi acquedottistici Venezia - Chioggia	B/21.2 Vfase	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DGCA N. 180 31/05/2004	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	Lavori ultimati				Intervento originario di € 19.780.812,18 affidato alla Delta Po S.p.A. ora Veneto Acque (Int. 2)
	TOTALI				5.360.261,22	5.360.261,22	4.997.016,11					
	Totale Comune di Chioggia				70.964.551,95	66.694.031,72	48.578.206,52					

AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SILE PIAVE

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Ampliamento della rete fognaria e realizzazione i stralcio dell'impianto di depurazione comunale della frazione Olmi in Comune di San Biagio di Callalta	B/13/1	DGR N. 2613 DEL 22/07/1997	DDDA N. 43 01/08/1999	116.508,77	116.508,77	116.508,77	Intervento sospeso e fondi dirottati per € 1.433.881,93 all'intervento 1 BIS				Intervento revocato con DDDA n. 71 del 11/08/2001
1 BIS	Progetto della fognatura del Comune di S. Biagio di Callalta - Realizzazione del collegamento tra S. Biagio di Callalta - Biancade - STRALCIO A	B/13/1.1	DGR N. 2613 DEL 22/07/1997	DDPV 56 20/04/2006	1.433.881,93	1.433.881,93	0,00	Progetto approvato				
2	Interventi di fognatura in comune di Quarto d'Altino	A/8 IV fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DDDA N. 83 01/09/2000	2.065.827,60	2.065.827,60	2.052.399,48	Lavori collaudati	09/10/2001	30/06/2003		Registrata, con DDDA n. 229 del 03/12/2004, un'economia di € 13.428,15
3	Progetto della fognatura del Comune di S. Biagio di Callalta - Realizzazione del collegamento tra Olmi - Biancade - STRALCIO B	A/8.6 IV fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DDPV 106 11/07/2006	666.703,60	666.703,60	0,00	Progetto approvato				
4	Ampliamento della rete fognaria nel Comune di Marcon	A/8.3 IV fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DDDA N. 78 15/09/2000	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	Lavori collaudati				Determinazione del contributo definitivo con DDDA 35 DEL 02/03/2005
5	Costruzione della fognatura del Comune di S. Biagio di Callalta - Ampliamento della rete - II stralcio	A/8.4 IV fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DDDA N. 94 30/10/2000	68.736,33	68.736,33	68.736,33	Lavori ultimati				
6	Ampliamento della rete fognaria dei comuni di Mogliano e Roncade	A/8.2 IV fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DDDA N. 61 01/09/2000	1.549.370,70	1.549.370,70	1.542.032,77	Lavori collaudati				Registrata, con DDDA n. 34 del 02/03/2005, un'economia di € 7.337,93
7	Progetto della fognatura del Comune di S. Biagio di Callalta - Realizzazione del collegamento tra S. Biagio di Callalta - Biancade - STRALCIO A	A/8.5 IV fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DDDA N. 56 20/04/2006	471.005,20	471.005,20	0,00	Progetto approvato				
8	Progetto della fognatura del Comune di S. Biagio di Callalta - Realizzazione del collegamento tra Olmi - Biancade - STRALCIO C	A/8.7 IV fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DDPV 107 11/07/2006	476.216,78	476.216,78	0,00	Progetto approvato				
9	Progetto della fognatura del Comune di S. Biagio di Callalta - Realizzazione della rete interna di S. Biagio di Callalta - STRALCIO D	A/8.8 IV fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DDPV 108 11/07/2006	641.394,23	641.394,23	0,00	Progetto approvato				

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione ob. legge	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
10	Estensione ed adeguamento della rete fognaria e realizzazione allacciamenti nel comune di Quarto d' Altino - 3° stralcio	B/22	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000	DDDA N. 88 12/08/2002	1.765.983,45	1.765.983,45	1.680.368,11	Lavori ultimati	01/04/2003			
11	Interventi di fognatura in comune di Marcon	B/23	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000	DDDA n. 70 13/06/2003	1.136.205,18	1.136.205,18	858.182,64	Lavori in corso				
12	Estensione ed adeguamento della rete fognaria e realizzazione allacciamenti nel comune di Monastier	B/24	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000	DDDA N. 86 12/08/2003	774.686,35	774.686,35	736.199,14	Lavori collaudati	27/01/2003			Registrata, con DDDA n. 210 del 16/11/2006, un'economia di € 38.486,21
13	Interventi di fognatura in comune di S. Biagio di Callalta	B/25	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000	DDDA N. 100 14/10/2002	774.686,35	774.686,35	770.350,17	Lavori collaudati	25/02/2003			Registrata, con DDPV n. 84 del 16/06/2006, un'economia di € 4.336,18
	[redacted]											
14	Ampliamento impianti Quarto d'Altino e realizzazione impianto trattamento bottini	1/C/1	DGR N. 794 DEL 09/04/2002	DDDA 86 23/06/2006	1.549.370,70	1.549.370,70	342.788,10	Lavori in corso				
15	Realizzazione condotta da impianto depurazione di Roncade ad impianto di Quarto d'Altino (Costo del progetto € 2.400.000,00)	1/C/2	DGR N. 794 DEL 09/04/2002	DDDA N. 127 02/07/2004	2.892.168,61	2.400.000,00	835.283,28	Lavori in corso				
	[redacted]											
14	Realizzazione condotta di collegamento dall'impianto di depurazione di Roncade all'impianto di depurazione di Quarto d'Altino	6/C/1	DGR N. 1140 DEL 18/04/2003	DDDA 235 16/12/2005	200.000,00	200.000,00		Progetto approvato				
15	Adeguamento al D.M. 30/07/99 dell'impianto di depurazione di Monastier di Treviso	6/C/2	DGR N. 1140 DEL 18/04/2003		604.000,00							
16	Progetto definitivo relativo al collegamento fognario tra Monastier e Roncade - Tratto fra la frazione di Vallio e Roncade	6/C/2.1	DGR N. 1140 DEL 18/04/2003	DDDA 235 16/12/2005	796.000,00	796.000,00	49.812,25	Lavori in corso				
17	Adeguamento al D.M. 30/07/99 dell'impianto di depurazione di Meolo capoluogo	6/C/3	DGR N. 1140 DEL 18/04/2003	DDDA N. 178 24/09/2004	1.300.000,00	1.300.000,00	1.061.838,00	Lavori in corso				
	[redacted]											
18	Intervento in Comune di Quarto D'Altino - riconversione fognature esistenti da miste a nere ed ampliamento rete esistente. Via De Gasperi e Via IV Novembre	E/16.1	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 135 06/09/2006	779.520,00	779.520,00	0,00	Progetto approvato				
19	Intervento in Comune di Roncade - realizzazione di interventi per costruzione condotta fognarie in Via Carboncino e Via Dary	E/16.2	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 37 23/03/2006	668.080,00	668.080,00	0,00	Progetto approvato				
20	Intervento in Comune di Marcon - riconversione fognature esistenti da miste a nere ed ampliamento rete esistente. Via zammarisa, Monte Pelmo, Tofane, Cristallo, Ortolan, Don Bosco e Ancilotto	E/16.3	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 136 06/09/2006	853.200,00	853.200,00	0,00	Progetto approvato				
	TOTALI				23.019.854,39	22.023.595,78	11.560.829,71					

ENERGIA TERRITORIO E RISORSE AMBIENTALI (E.T.R.A.)

TOTALE E.T.R.A. = BETA, TERGOLA, ALTA SERVIZI ed EUGANEO BERICO — 184.741.842,84 — 148.538.140,80 — 105.471.088,01

AZIENDA CONSORZIO ACQUEDOTTO EUGANEO BERICO

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione atto impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Adeguamento depuratore di Battaglia Terme	C3/0/2	DGR N. 553 DEL 28/2/1997	DGCA N. 126 13/3/1998	428.659,23	428.659,23	428.659,23	Per questo progetto sono stati utilizzati anche fondi CIPE (n.74/97) per un importo totale di € 1.032.913,80. Lavori collaudati	01/02/1999	05/02/2001	20/05/2002	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 32 del 2/4/2003
2	Ampliamento della rete fognaria nel Comune di Battaglia Terme	A/7/2	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 68 22/5/2000	868.102,59	868.102,59	860.970,86	Lavori in corso	31/07/2002			Registrata con DDPV n. 87 del 05/08/2006 economia pari a € 17.131,71
3	Ampliamento della fognatura in località Regazzoni nei comuni di Montegrotto T. e Galzignano T.	B/12 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1998	DDDA N. 82 DEL 4/6/2002	1.032.913,80	1.032.913,80	929.622,42	Lavori in corso	18/07/2002			
4	Installazione di fognature ed adeguamento impianto di depurazione in Comune di Battaglia Terme	B/53	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 149 13/09/2005	813.420,94			Finanziamento originale pari a € 1.542.787,94 diviso negli interventi 4A (€ 529.367,32) e 4B (€ 813.420,62)				
4A	Ampliamento rete fognaria in Comune di Battaglia Terme (€ 529.367,32)		DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 149 13/09/2005	529.367,00	529.367,00	0,00	Progettazione in corso				
4B	Ampliamento rete fognaria in Comune di Montegrotto Terme (€ 813.420,62)		Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 4					Progettazione in corso				
5	Interventi di ampliamento e ristrutturazione della rete fognaria nei comuni di Battaglia Terme, Galzignano Terme e Montegrotto Terme.	1/0/1	DGR N. 784 DEL 9/4/2002		980.509,35							
5A	Completamento fognatura nera e ristrutturazione tratti di condotta in comune di Galzignano Terme (PD)	1/0/1.1	DGR N. 784 DEL 9/4/2002	DDDA N. 20 09/02/2005	774.685,35	774.685,35	39.949,14					
5B	Ampliamento ed adeguamento della rete di fognatura nera in comune di Battaglia Terme.	1/0/1.2	DGR N. 784 DEL 9/4/2002	DDDA N. 149 13/09/2005	310.633,00	310.633,00	0,00					
	TOTALI				8.458.291,15	3.844.360,96	1.949.201,67					

AZIENDA CONSORZIO ALTA SERVIZI

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione ed impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Ampliamento impianto di depurazione di Onara	1/4.6	DGR N. 6752 DEL 28/12/1994	DPGR 2207 31/10/1996	1.239.496,56	1.239.496,56	1.239.496,56	Lavori collaudati	04/12/1996	18/10/2001	12/04/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDOA n. 156 del 30/10/2003
2	Collettore fognario di adduzione Ovest Fontaniva - Cittadella - Tombolo	1/4.6	DGR N. 6752 DEL 28/12/1994	DDOA N. 70 18/10/1995	2.833.930,19	2.833.930,19	2.833.907,51	Lavori collaudati	02/09/1999	23/07/1999	15/10/2001	Registrata, con DDOA n. 47 del 10/05/2002, una economia di € 22,68
3	Collettore Campretto - Lavari nel comune di S. Martino di Lupari	1/D/1	DGR N. 4887 DEL 31/10/1995	DGCA N. 380 2/10/1997	2.091.650,44	2.091.650,44	2.091.650,44	Lavori collaudati (eseguiti con 2 appalti)	30/03/1998 10/10/2001	17/07/2002 12/02/2003	09/06/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDOA n. 63 del 30/03/2004
4	Adeguamento strutture fognarie: fognatura nell'area sud di S. Martino di Lupari, Lovari e collegamento al depuratore di Onara	1/D/2	DGR N. 4887 DEL 31/10/1997	DGCA N. 387 2/10/1997	2.194.941,82	2.194.941,82	2.194.941,83	Lavori collaudati (eseguiti con 2 appalti)	08/07/1998 17/02/2003	04/08/2000 -	27/05/2002 -	Determinazione del contributo definitivo con DDOA n. 177 del 11/10/2005
5	Fognatura di Cittadella e Fontaniva	C/31/1	DGR N. 553 DEL 25/2/1997	DGCA N. 827 1/12/1997	1.652.682,08	1.652.682,08	1.652.682,08	Lavori collaudati	26/08/1998 21/02/2000	21/01/2003 28/04/2002	28/09/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDOA n. 62 del 30/03/2004
6	Progetto n. 7 . Adeguamento impianto elettrico e cogenerazione depuratore di Cittadella.	A/3/1.a	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDOA N. 60 4/11/1998	409.000,95	409.000,95	369.166,83	Lavori collaudati	11/02/2003	07/10/2003	28/10/2003	Registrata, con DDOA n. 184 del 31/08/2004, un'economia di € 39.844,13
7	Progetto n. 8 . Ottimizzazione impianto consorziale di Cittadella	A/3/1.b	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDOA N. 60 4/11/1998	1.998.105,92	1.998.105,92	1.998.105,92	Lavori collaudati	03/05/2000	01/12/2001	25/10/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDOA n. 184 del 31/08/2004
8	Progetto n. 6. Scolmatore roggia Munara	A/3/1.c	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDOA N. 60 4/11/1998	438.406,08	438.406,08	438.406,08	Lavori collaudati	30/11/2000	30/11/2001	20/09/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDOA n. 184 del 31/08/2004
9	Progetto "Laguna 9" - Progetto della rete di fognature nere nell'area di Cittadella e Fontaniva	A/10.1 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDOA N. 70 13/9/2000	2.014.181,91	2.014.181,91	2.014.181,91	Lavori collaudati	28/01/2001			Determinazione del contributo definitivo con DDOA n. 248 del 30/12/2005
10	Progetto "Laguna 10" - Progetto della rete di fognature nere nell'area est di Cittadella, Galliera e Tombolo	A/10.3 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 72 13/9/2000	1.910.890,53	1.910.890,53	1.910.890,52	Lavori collaudati	27/03/2001			Determinazione del contributo definitivo con DDOA n. 248 del 30/12/2005
11	Progetto "Laguna 11" - Progetto della rete di fognatura nere nell'area dei comuni di Tombolo e San Martino di Lupari.	A/10.2 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDOA N. 71 13/9/2000	1.910.890,53	1.910.890,53	1.910.890,53	Lavori collaudati	27/03/2001			Determinazione del contributo definitivo con DDPV n. 7 del 27/01/2006
12	Interventi di fognatura nei comuni di Cittadella, Galliera V.ta, Tombolo, S.Giorgio in Bosco, S. Martino di Lupari	B/26	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDOA N. 170 12/12/2001	7.746.853,49	7.746.853,49	6.744.298,99	Lavori in corso				

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio e consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
13	Adeguamento dell'impianto di depurazione di Cittadella con incremento da 60,000 a 75,000 A.E.	1/D/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDPV N. 162 03/10/2006	10.329.137,98	10.329.137,98	0,00	Progetto approvato				
	TOTALI				36.568.148,48	36.568.148,48	24.194.589,19					

AZIENDA CONSORZIO DEL TERGOLA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio e consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1°	Impianto di Vigonza (PD)		DGR N. 4976 2/11/1993	DPGR 2267 6/11/1998	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	Finanziamento convogliato nell'intervento 4A				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 4 del 15/01/2001
2	Interventi nel settore della zootecnia dell'alta padovana		DGR N. 4976 DEL 2/11/1993	DGR N. 561 DEL 2/3/1999	2.582.284,50	2.582.284,50	2.582.284,50	Lavori in corso	01/03/2000			Le opere eseguite vanno a far parte dell'intervento 1A SE.T.A. "Centro di biotrattamento di Camposampiero", il cui nuovo termine dei lavori è stabilito al 19/11/2008 con DDDA n. 173/2003.
3	Progetto esecutivo del sistema di collettamento del bacino Marzenego - Appalti A e B	1/A/1	DGR N. 4977 2/11/1993	DDDA N. 51 21/6/1995	18.165.100,94	18.165.100,94	18.165.100,94	Lavori collaudati	29/01/1996 16/01/1996 23/05/1997	23/07/1999 28/12/1998 04/08/2000	16/10/2000 07/07/2001 28/12/2001	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 96 del 23/09/2002
4	Ampliamento dell'impianto di depurazione in Comune di Vigonza	1/A/2	DGR N. 4977 2/11/1993	DPGR 2267 6/11/1998	6.507.356,93	6.507.356,93	6.507.356,93	Finanziamento convogliato nell'intervento 4A				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 4 del 15/01/2001
4A	Esecuzione dei lavori di ampliamento impianto di depurazione di Vigonza (€ 7.540.270,73)		Riuniti i finanziamenti 1 (€ 1.032.913,80) + 4 (€ 6.507.356,93) = € 7.540.270,73					Lavori collaudati	24/09/1996	07/07/1999 26/07/1999	10/02/2000 15/02/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 4 del 15/01/2001 per € 7.540.270,73
5	Ampliamento dell'impianto di depurazione del Comune di Camposampiero	1/A/3	DGR 4977 2/11/1993	DPGR 2391 24/11/1998	4.338.237,95	4.338.237,95	4.338.237,95	Finanziamento convogliato nell'intervento 1A gestito dalla subentrante SE.T.A.				
6	Progetto del collettore di collegamento della rete di Loreggia al depuratore di Camposampiero - XV lotto	1/A/4	DGR N. 4977 2/11/1993	DDDA N. 54 12/10/1994	774.685,35	774.685,35	774.685,35	Lavori collaudati	20/11/1995	30/11/1996	09/03/1999	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 45 del 09/05/2002
7	Collettore di collegamento della rete di Borgoricco alla rete consortile a Villanova di Camposampiero e costruzione fognatura Via Roma e S. Lorenzo a Borgoricco	1/A/5	DGR N. 4977 2/11/1993	DDDA N. 63 12/10/1994	1.882.662,08	1.882.662,08	1.881.834,57	Lavori collaudati	02/09/1996 01/06/2000	26/07/1999 27/06/2001	30/10/2001 06/12/2001	Registrata, con DDDA n. 14 del 15/01/2004, un'economia di € 827,51
8	Progetto fognatura nera lungo le vie Roma e Margarise e della pista ciclabile in comune di S.Giorgio delle Pertiche	1/E/4	DGR N. 4533 15/10/1996	DDDA N. 82 9/12/1998	110.005,32	110.005,32	110.005,32	Finanziamento convogliato nell'intervento 21A				Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 57 del 16/03/2004
9	Ampliamento rete fognaria comunale di Borgoricco	1/E/4	DGR N. 4533 8/11/1996	DGCA N. 17 12/1/1998	129.114,22	129.114,22	129.114,22	Lavori collaudati	19/08/1999	03/07/2000	18/10/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 13 del 21/02/2001

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione alla spesa	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o ultimazione lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
10	Progetto esecutivo di ampliamento rete fognaria comunale di Massanzago	1/E/4	DGR N. 4833 8/11/1996	DGCA N. 16 12/1/1998	206.582,76	206.582,76	206.582,76	Lavori collaudati	18/08/1999	03/07/2000	27/11/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 69 del 08/06/2001
11	Ampliamento rete fognaria in comune di Vigonza	1/E/4	DGR N. 4833 15/10/1996	DGCA N. 64 DEL 2/2/1998	366.366,26	366.366,26	366.366,26	Lavori collaudati	27/07/1998	05/07/1999	05/05/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 5 del 16/01/2001
12	Completamento del collegamento fognario tra Cavino di S. Giorgio delle Pertiche e Campodarsego	1/E/4	DGR N. 4833 15/10/1996	DGCA N. 63 DEL 2/2/1998	380.828,73	380.828,73	380.828,73	Lavori collaudati	12/10/1998	04/10/2000	21/06/2001	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 46 del 09/05/2002
13	Progetto fognatura acque nere in comune di Villanova di Camposampiero - I stralcio	1/E/4	DGR N. 4833 15/10/1996	DGCA N. 124 13/3/1998	201.418,18	201.418,18	201.418,18	Lavori collaudati	05/07/1998	10/05/1999	15/09/2000	Registrata una economia di € 66.810,26, reimpegnata nell'intervento 13 bis come da DDDA N. 113 del 18/10/2002
13 bis	Realizzazione rete fognatura nera nelle vie Cavin Casella, Comara, Cavin dei Do' e piazza Mercato in comune di Villanova di Camposampiero	1/E/4.1	DGR N. 4833 15/10/1996	DDDA N. 28 26/2/2003	66.810,26	66.810,26	66.810,26	Finanziamento convogliato nell'intervento 88A con DDDA N. 28 del 24/03/2003				Utilizzata l'economia di € 66.810,26 del finanziamento 13
14	Progetto esecutivo integrato dell'allargamento e della fognatura di Via Bassa 1^ in comune di Campodarsego	1/E/4	DGR N. 4833 15/10/1996	DDDA N. 160 DEL 1/4/1998	335.696,98	335.696,98	335.696,98	Lavori collaudati	05/03/1999	27/07/2000	08/03/2002	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 183 del 30/10/2003
15	Progetto rete fognaria comune di Noventa Padovana	1/E/4	DGR N. 4833 15/10/1996	DDDA N. 17 27/5/1998	289.216,86	289.216,86	289.216,86	Lavori collaudati	03/02/1999	20/09/2000	18/12/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 70 del 08/06/2001
16	Collettore fognario Abbazia Pisani-Villa del Conte-S. Giustina in Colle	C/32/1	DGR N. 553 25/2/1997	DGCA N. 28 19/1/1998	1.962.536,22	1.962.536,22	1.962.536,22	Lavori collaudati	15/12/1998	28/02/2001	28/01/2002	Registrata una economia di € 258.228,45, reimpegnata nell'intervento 16 bis come da DDDA N. 112 del 18/10/2002
16 bis	Ampliamento della rete di fognatura nera del comune di Villa del Conte e della frazione Abbazia Pisani. (€ 258.228,45)	CA3/1.1	DGR N. 553 25/2/1997	DDDA N. 27 26/3/2003	258.228,45	258.228,45	258.228,45	Finanziamento convogliato nell'intervento 16				Utilizzata con DDDA n. 27 del 26/03/2003 l'economia di € 258.228,45 dell'intervento 16
17	Ampliamento impianto di depurazione di Cadoneghe	A/6.2	DGR N. 2613 22/7/1997	DDDA N. 33 DEL 6/5/1999	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	Finanziamento convogliato nell'intervento 44A				Determinazione del contributo definitivo con DDDA N.176 del 11/10/2005
18	Impianto di biotrattamento di Camposampiero	A/6/1	DGR N. 661 DEL 2/3/1999		11.370.568,66	11.370.568,66	11.370.568,66	Finanziamento convogliato nell'intervento 1A gestito dalla subentrante BETA				
19	Progetto fognatura nera in comune di S. Giustina in Colle	A/6.3	DGR N. 2613 22/7/1997	DDDA N. 1 DEL 3/2/1999	281.469,01	281.469,01	281.469,01	Lavori collaudati	22/04/1999	02/10/2000	03/01/2001	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 143 del 12/11/2001
20	Progetto fognatura nera in comune di Cadoneghe	A/6.3	DGR N. 2613 22/7/1997	DDDA N. 18 DEL 2/3/1999	309.874,14	309.874,14	309.874,14	Lavori collaudati	22/06/1999	21/12/2000	30/01/2002	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 94 del 23/09/2002
21	Progetto fognatura nera lungo le vie Roma e Margherita e della pista ciclabile in comune di S. Giorgio delle Pertiche	A/6.3	DGR N. 2613 22/7/1997	DDDA N. 82 8/12/1998	122.400,28	122.400,28	122.400,28	Finanziamento convogliato nell'intervento 21A				Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 67 del 16/03/2004

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione atto impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
21A	Realizzazione fognatura nera lungo le vie Roma e Margarita e pista ciclabile lungo via Roma in Comune di S. Giorgio delle Pertiche (€ 232.408,60)		Rimbl I finanziamenti 8 (€ 110.005,32) + 21 (€ 122.409,28) = € 232.408,60					Lavori in fase di collaudo	18/11/1998	17/10/2002		L'importo del finanziamento regionale è pari a € 232.408,60. Il residuo, rispetto all'importo di progetto di € 621.821,47 resta a carico dell'ente. Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 57/2004
22	Progetto rete fognaria di Via Ronchi in comune di Loreggia	A/5.3	DGR N. 2813 22/7/1997	DDDA N. 83 30/12/1998	259.646,00	259.646,00	259.646,00	Finanziamento convogliato nell'intervento 56A				Determinazione del contributo definitivo con DDPV n. 12 del 31/01/2006
23	Progetto per l'estensione della rete fognaria nei Comuni di Trebaseleghe e Camposampiero e adeguamento impianto di sollevamento.	A/5.3	DGR N. 2813 22/7/1997	DDDA N. 80 25/6/1999	1.269.121,92	1.269.121,92	1.269.121,92	Lavori collaudati	06/03/2000 25/05/2000	19/10/2001 19/01/2001	30/04/2002 30/07/2001	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 184 del 30/10/2003
24	Progetto rete fognaria in comune di Saonara.	A/5.3	DGR N. 2813 22/7/1997	DDDA N. 82 25/6/1999	309.874,14	309.874,14	309.874,14	Lavori collaudati	07/06/2000			Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 100 del 10/06/2005
25	Ampliamento della rete di fognatura nera del Comune di Villa del Conte e della frazione Abbazia Pisani	A/1.14 / IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 161 3/12/2001	288.229,46	288.229,46	288.229,46	Finanziamento convogliato nell'intervento 79H				
26	Progetto esecutivo per il completamento della rete fognaria nella via Cerpane e Col di Lana in Comune di Vigonza (Pd)	A/1.8 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 92 30/10/2000	618.468,90	618.468,90	618.468,90	Lavori collaudati	30/07/2001			Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 9 del 21/01/2005
27	Realizzazione del bypass fognario in Comune di S. Giustina in Colle	A/2.2 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 77 18/8/2000	387.342,67	387.342,67	387.342,67	Lavori collaudati	04/07/2001 09/12/2002	27/06/2002 31/12/2002	18/11/2002 25/07/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 170 del 17/11/2003
28	Realizzazione della via di fognatura nera, nella via Giovanni Xxiii, Cavo dei Mondo e Piscina in comune di Campodarsego	A/1.8 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 116 16/11/2000	99.547,04	99.547,04	99.547,04	Finanziamento convogliato nell'intervento 56A				Determinazione del contributo definitivo con DDPV n. 91 del 18/06/2006
29	Rete di fognatura nera a servizio delle località Noventa Padovana	A/1.9 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 90 DEL 4/8/2000	618.468,90	618.468,90	618.468,90	Finanziamento convogliato nell'intervento 56A				Determinazione del contributo definitivo con DDPV n. 112 del 11/07/2006
30	Rete di fognatura nera nella via Sabbadina, Lovara, Malcanton e Mason in comune di Borgoricco	A/1.11 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 85 30/7/2001	774.685,35	774.685,35	774.685,35	Finanziamento convogliato nell'intervento 63A				Determinazione del contributo definitivo con DDPV n. 207 del 11/12/2006
31	Progetto esecutivo per la realizzazione del collettore fognario di collegamento della frazione di Fiumicello di Campodarsego alla rete consortile principale	A/1.4 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 78 18/8/2000	619.748,28	619.748,28	619.748,28	Lavori collaudati	30/07/2001 28/05/2003	27/06/2002 -	28/02/2003 -	Determinazione del contributo definitivo con DDPV n. 114 del 17/07/2006
32	Rete fognaria nera a servizio delle località Noventana in comune di Noventa Padovana	A/2.1 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 95 DEL 4/8/2000	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	Finanziamento convogliato nell'intervento 56A				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 112 del 11/07/2005
33	Progetto esecutivo per il completamento della rete fognaria nera nella via Julia, Trieste, Murgia e Paramizo in Comune di Vigonza (Pd)	A/1.8 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 83 30/10/2000	144.607,93	144.607,93	144.607,93	Lavori collaudati	03/04/2002			Determinazione del contributo definitivo con DDPV n. 29 del 21/03/2006
34	Progetto esecutivo per l'ampliamento della rete fognaria comunale di S. Giorgio delle Pertiche nelle vie Fornace e Ruaia	A/1.7 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 97 30/10/2000	185.286,21	185.286,21	185.286,21	Finanziamento convogliato nell'intervento 67A				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 238 del 17/12/2004

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione atto impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
35	Interventi di fognatura nei comuni consorziati e negli impianti di depurazione di Vigonza e Cadoneghe	A/1 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999		420.701,05	-						Scheda madre
35A	Collegamento stradale e fognario Z.I. laterale Via Visentin con Via Straella San Pietro in Comune di Camposampiero (€ 88.364,63)	A/1.18 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 35 04/02/2004	88.426,43	88.426,43	79.582,89	Lavori in corso				
35B	Riqualifica della rete di fognatura nera nelle Vie: prolungamento e lottizzazione Fratina e Bassa I° in comune di Campodarsego - Rostrola in comune di Camposampiero (€ 518.456,90)	A/1.17 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 123 10/09/2003	518.456,90	518.456,90	379.001,01	Lavori in corso				Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 35
35C	Realizzazione della rete fognaria nelle Via Straella, Bonora, S. Pietro, Straella di Rustega e del Graticolato Romano nei Comuni di Camposampiero, Borgoricco e Massanzago - 1° stralcio (€ 61.645,69)	A/1.16 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 91 04/08/2003	61.645,69	61.645,69	61.645,69	Finanziamento convogliato nell'intervento 72A				Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 35
35D	Riqualifica della rete di fognatura nera nelle Via: Rigotti e Matteotti in comune di Cadoneghe - S. Francesco, Goldoni e S. Chiara in Comune di Vigonza - Don Orione in Comune di Trebaseghe (€ 1.032.913,80)	Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 35					In fase di progettazione		-			
35E	Costruzione di una fognatura nera lungo Via Capriccio in Comune di Vigonza (€ 191.089,06)	A/1.15 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 72 13/06/2003	191.089,06	191.089,06	191.089,06	Finanziamento convogliato nell'intervento 58A				Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 35
35F	Interventi nel Comuni ex Tergola (€ 331.516,83)	Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 35						Finanziamento convogliato nell'intervento 76G				
35G	Completamento impianto di depurazione di Vigonza e diversione dello scarico in fiume Brenta (€ 826.331,04)	Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 35						Finanziamento convogliato nell'intervento 2A gestito dalla subentrante SETA				
36	Estensione delle reti di fognatura nera nelle vie Ghiaccaia, Pio X e Montegrappa in Comune di S. Giustina in Colle	A/2.3 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 118 19/12/2006	247.899,31	247.899,31	247.899,31	Finanziamento convogliato nell'intervento 90A/90				Determinazione del contributo definitivo con DDDPV N. 33 del 15/05/2006
37	Progetto esecutivo per il collegamento della zona Industriale di S. Giorgio delle Pertiche alla rete di fognatura nera comunale e riutilizzazione rete principale nei Comuni di Borgoricco e Massanzago.	A/1.2 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 58 22/8/2000	404.385,75	404.385,75	404.385,75	Lavori collaudati	02/07/2001	05/09/2002	19/03/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 86 del 18/09/2003
38	Completamento centro di biodrattamento di Camposampiero	B/20 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 60 23/03/2005	6.249.129,46	6.187.321,21	3.489.225,98	Finanziamento convogliato nell'intervento 1A gestito dalla subentrante SE.T.A.				
39	Collettore di collegamento fognario Resana - Torreselle	A/2.4 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 31 21/2/2001	2.039.418,75	2.039.418,75	2.039.418,75	Finanziamento convogliato nell'intervento 58A				Determinazione del contributo definitivo con DDPV N. 144 del 02/10/2006
39 bis	Intervento per la riqualificazione del sistema fognario del comune di Resana - realizzazione della rete fognaria separata in località Castelminio	A/2.4 IV fase ECO	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N 179 12/12/2006	35.408,86	35.408,86	35.408,86	Lavori in corso				
40	Ampliamento della rete fognaria nelle vie Stroppari e Pievega Nord in comune di Villanova di Camposampiero.	A/1.10 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 84 30/7/2001	206.582,76	206.582,76	206.582,76	Finanziamento convogliato nell'intervento 72A				Determinazione del contributo definitivo con DDPV N. 212 del 18/12/2006
41	Progetto esecutivo per il collegamento della rete fognaria di Via dell'Industria in Comune di Borgoricco alla fognatura comunale.	A/1.3 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 57 22/8/2000	65.073,57	65.073,57	65.073,57	Lavori collaudati	04/12/2001	01/07/2002	02/09/2002	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 97 del 18/09/2003

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione dell'impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
42	Nuovo by-pass della rete di fognatura in comune di Loreggia.	A/2.5 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 88 30/7/2001	138.443,38	138.443,38	138.443,38	Finanziamento convogliato nell'intervento 47A				Determinazione del contributo definitivo con DDPV N. 208 del 11/12/2006
43	Nuovo by-pass della rete fognaria in comune di Loreggia	A/1.12 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 88 30/7/2001	224.888,76	224.888,76	224.888,76	Finanziamento convogliato nell'intervento 47A				Determinazione del contributo definitivo con DDPV N. 208 del 11/12/2006
44	Progetto di ampliamento del depuratore di Cadoneghe (PD)	A/1.11V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 84 DEL 4/8/2000	774.888,38	774.888,38	772.578,83	Finanziamento convogliato nell'intervento 44A				Registrata, con DDDA n. 176 del 11/10/2005, economia di € 2.188,82
44A	Ampliamento dell'impianto di depurazione di Cadoneghe (€1.807.899,16)	Rimodulazione finanziamenti 17 (€ 1.032.913,80) + 44 (€ 774.888,38) = € 1.807.899,16						Opere in fase di collaudo 03/07/2000 24/04/2003				
45	Ampliamento dell'impianto di depurazione di Cadoneghe - 2ª fase	A/1.13 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 124 4/10/2001	2.117.473,28	2.117.473,28	1.987.448,74	Finanziamento convogliato nell'intervento 73A				
	Estensione fognatura nera lungo la strada regionale 248 Castellana in comune di Trebaseleghe	A/1.19 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA 21 09/03/2005	185.000,00	185.000,00	138.803,23	Lavori in corso				
	Realizzazione rete di fognatura nera nelle vie Treviso, Manara ed Umberto I in comune di Vigonza	A/1.20 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA 25 14/02/2006	350.000,00	350.000,00	178.838,45	Lavori in corso				
	Costruzione rete fognatura nera nelle vie Buonarroti, Antoniana, Mameli,Camporese ed Acquario in comune di Cadoneghe	A/1.21 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDPV 64 09/08/2006	44.771,85	44.771,85	0,00	Lavori in corso				
	Completamento dell'impianto di depurazione di Vigonza e diversione dello scarico in fiume Brenta	A/1.22 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDPV N. 85 08/08/2006	406.639,30	406.639,30	0,00	Lavori in corso				
	Riqualifica della rete di fognatura nera in alcune vie dei comuni di Vigonza, Trebaseleghe e Cadoneghe.	A/1.23 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDPV N. 129 28/08/2006	804.896,27	804.896,27	0,00	Lavori in corso				
46	Interventi di fognatura nera in comune di Massanzago	B/12	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 106 18/10/2002	309.874,14	309.874,14	278.886,72	Lavori in corso				
47	Interventi di fognatura in comune di Loreggia	B/3.2	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 86 30/7/2001	388.937,84	388.937,84	172.073,22	Finanziamento convogliato nell'intervento 47A				
47A	Costruzione di un nuovo by-pass della rete fognaria di Loreggia (€ 723.039,68)	Rimodulazione finanziamenti 42 (€ 139.443,38) + 43 (€ 224.888,76) + 47 (€ 388.937,84) = € 723.039,68						Lavori in corso	18/05/2002			
48	Riqualificazione della rete di fognatura mista del comune di Campodarsego e dell' area denominata "Fornace"	B/7	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 82 DEL 9/8/2001	616.456,90	616.456,90	464.811,21	Lavori in corso	02/05/2002			
49	Interventi di fognatura in comune di Campodarsego loc. Fiumicello (PD)	B/8	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 14 22/2/2002	1.136.205,18	1.136.205,18	861.671,84	Lavori in corso				
50	Realizzazione della rete di fognatura nera nelle vie Giovanni XXIII, Cao del Mondo e Puccini in comune di Camposampiero	B/11	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 116 19/12/2000	413.165,82	413.165,82	413.165,82	Finanziamento convogliato nell'intervento 50A				Determinazione del contributo definitivo con DDPV n. 91 del 15/05/2006
50A	Esecuzione della rete di fognatura nera in via Giovanni XXIII e via Cao del Mondo e Puccini a Camposampiero (€ 802.512,56)	Rimodulazione finanziamenti 28 (€ 89.347,04) + 50 (€ 413.165,52) = € 502.512,56						Lavori in corso	02/05/2002			
51	Rete di fognatura nera nelle vie Sabbadina, Lovara, Mascanton e Musoni in comune di Borgoricco	B/9	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 85 30/7/2001	268.228,45	268.228,45	103.291,35	Finanziamento convogliato nell'intervento 63A				

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione ado leggere	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
52	Interventi di fognatura in comune di Cadoneghe	B/10	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 66 27/5/2003	258.228,45	258.228,45	232.405,61	Lavori in corso				
53	Interventi di fognatura in comune di Rasana	B/15	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 150 13/08/2003	154.937,07	154.937,07		Progetto approvato				
54	Impianto di depurazione di Camposampiero	B/20	DGR N. 1834 23/6/2000		516.456,90			Finanziamento convogliato nell'intervento 1A gestito dalla subentrante SETA				
55	Estensione rete di fognatura nera lungo le vie Granzetta e Moreolni in comune di Saonara - 2° tronco	B/17	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 149 19/11/2001	258.228,45	258.228,45	232.405,61	Lavori in corso	20/02/2002			
56	Rete di fognature nera a servizio della località Noventana in comune di Noventa Padovana	B/13.1	DGR N. 1834 DEL 3/6/2000	DDDA N. 88 30/10/2000	330.632,42	330.632,42	330.632,42	Finanziamento convogliato nell'intervento 66A				Determinazione del contributo definitivo con DDDA N.312 del 11/07/2005
56A	Realizzazione rete di fognature nera a servizio della località Noventana in Comune di Noventa Padovana (€ 1.879.903,12)		Riunita I finanziamenti 29 (€ 516.456,90) + 32 (€ 1.032.913,80) + 56 (€ 330.632,42) = € 1.879.903,12					Opere in fase di collaudo	04/08/2000 30/10/2002	19/06/2003		
57	Impianto di depurazione di Cadoneghe	B/21	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 124 4/10/2001	413.165,52	413.165,52	0,00	Finanziamento convogliato nell'intervento 73A				
58	Interventi di fognatura in comune di Vigonza	B/8.2	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 72 13/06/2003	144.607,93	144.607,93	111.038,23	Finanziamento convogliato nell'intervento 58A con DDDA N. 72 del 13/06/2003				
58A	Costruzione di una fognatura lungo via Capriccio in Comune di Vigonza (€ 335.969,58)		Riunita I finanziamenti 36E (€ 191.089,65) + 58 (€ 144.607,93) = € 335.969,58									
59	Interventi di fognatura nera e pista ciclabile in via Montello, 1° e II° tronco, in comune di Trebaseleghe - 1° stralcio.	B/2	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 61 DEL 9/5/2001	516.456,90	516.456,90	484.911,21	Lavori in corso	08/04/2002			Determinazione del contributo definitivo con DDPV N. 93 del 15/06/2006
60	Estensione delle reti di fognatura nera nelle vie Ghiacciaia, Pio X e Montegrappa in comune di S. Giustina in Colle	B/4	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 115 18/12/2000	516.456,90	516.456,90	516.456,90	Finanziamento convogliato nell'intervento 60A				
60A	Estensione della rete fognaria nera nelle vie Ghiacciaia, Pio X e Montegrappa in Comune di Santa Giustina in Colle (€ 784.356,21)		Riunita I finanziamenti 38 (€ 267.899,31) + 60 (€ 516.456,90) = € 784.356,21									
61	Rete fognaria nella via Palù e sistemazione rete nelle vie Stiffonie villaggio Europa in comune di Piombino Dese.	B/14	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 35 DEL 3/4/2001	309.874,14	309.874,14	309.874,14	Lavori collaudati	03/04/2002	28/05/2003		Determinazione del contributo definitivo con DDPV N. 146 del 02/10/2006
62	Condotta fognaria in via Marconi e laterali in comune di Noventa Padovana	B/13.2	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 86 30/7/2001	547.444,31	547.444,31	416.893,21	Lavori in corso	09/01/2003			
63	Condotta di by-pass impianto di depurazione Camposampiero (vedi Dgr 1834/00)Rete di fognatura nera nelle vie Sabbadina, Lovara, Malcanton e Musson in comune di Borgoricco	B/19	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 85 30/7/2001	516.456,90	516.456,90	516.456,90	Finanziamento convogliato nell'intervento 63A				Determinazione del contributo definitivo con DDPV N. 207 del 11/12/2006
63A	Realizzazione rete di fognature nelle vie di Sabbadina, Lovara, Malcanton in Comune di Borgoricco (€ 1.549.370,70)		Riunita I finanziamenti 30 (€ 774.685,35) + 51 (€ 258.228,45) + 63 (€ 516.456,90) = € 1.549.370,70					Lavori in corso	23/05/2002			
64	Completamento del collettore fognario Abbazia Pisani - Villa dei Conte e della pista ciclabile lungo la via Cardinale Priuli, Militare e Rettilineo.	B/6.1	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 121 29/12/2000	619.748,28	619.748,28	619.748,28	Lavori collaudati	04/12/2001 30/06/2003			Determinazione del contributo definitivo con DDPV N. 143 del 02/10/2006

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione atto impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio e consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
65	Collettore di collegamento fognario Rossano - Torresella.	B/16.1 VP fase	DGR N. 1834 DEL 30/6/2000	DDDA N. 31 21/3/2001	358.167,14	358.167,14	358.167,14	Finanziamento convogliato nell'intervento 66A				Registrata con DDPV n. 144 del 02/10/2006, economia di € 280.891,14 reinvestita nell'Int. B/16.1 ECO
65 eco		B/16.1 ECO	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA 179 12/10/2005	280.891,14	280.891,14	154.361,03	Lavori in corso				
65A	Collegamento fognario Rossano - Torresella (€ 2.685.575,88)		Riunti I finanziamenti 39 (€ 2.068.827,60) + 65 (€ 616.748,28) = € 2.685.575,88					Opere in fase di collaudo	23/05/2002	20/05/2003		
66	Progetto definitivo per la realizzazione della rete fognaria di via Ronchi in comune di Lorenggia (PD)	B/0.1	DGR N.1834 23/6/2000	DDDA N.23 26/2/2001	187.619,35	187.619,35	187.619,35	Finanziamento convogliato nell'intervento 66A				Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 12 del 31/01/2005
66A	Realizzazione fognature acque nere e pista ciclabile lungo la SP 71 nel Comune di Loreggia (€ 476.064,35)		Riunti I finanziamenti 22 (€ 289.545,00) + 64 (€ 187.619,35) = € 476.064,35					Lavori collaudati	13/10/1999	05/04/2002	19/11/2002	
67	Ampliamento della rete fognaria comunale di S. Giorgio delle Pertiche nelle vie Fornace e Russia	B/16	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 87 30/10/2000	484.611,21	484.611,21	484.611,21	Finanziamento convogliato nell'intervento 67A				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 238 del 17/12/2004
67A	Ampliamento della rete fognaria comunale di S. Giorgio delle Pertiche nelle vie Fornace e Russia (appalto A) e completamento degli stessi (appalto B) (€ 630.077,42)		Riunti I finanziamenti 34 (€ 165.356,21) + 67 (€ 484.611,21) = € 630.077,42					Lavori collaudati	30/07/2001 21/01/2003	26/06/2003 02/07/2003		Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 238 del 17/12/2004
68	Realizzazione della rete di fognatura nera nelle vie Cavin Castella Comiera, Cavin, del Do e Piazza Mercato in comune di Villanova di Camposampiero	B/16.2	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 136 30/10/2001	338.696,98	338.696,98	283.483,37	Finanziamento convogliato nell'intervento 68A con DDDA N. 28 del 28/03/2003				
68A	Realizzazione della rete di fognatura nera nelle vie Cavin Castella Comiera, Cavin del Do e Piazza Mercato in comune di Villanova di Camposampiero - 1 stralcio (€ 392.600,00)		Riunti I finanziamenti 13 bis (€ 88.810,26) + 68 (€ 338.696,98) = € 392.600,00					Lavori in corso	14/01/2003			
69	Ampliamento della rete di fognatura nera del comune di Villa del Conte, e della frazione Abbazia Pisani	B/6.2	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 161 3/12/2001	309.874,14	309.874,14	309.874,14	Finanziamento convogliato nell'intervento 78H				
70	Ampliamento della rete fognaria nelle vie Stroppari e Piovega Nord in comune di Villanova di Camposampiero.	B/16.1	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 84 30/7/2001	77.468,53	77.468,53	49.083,46	Finanziamento convogliato nell'intervento 70A				
70A	Ampliamento rete di fognatura nelle vie Stroppari e Piovega nord in Comune di Villanova di Camposampiero (€ 284.051,29)		Riunti I finanziamenti 40 (€ 206.582,76) + 70 (€ 77.468,53) = € 284.051,29					Opere in fase di collaudo	08/05/2002	20/05/2003		
71	Progetto definitivo relativo alla realizzazione dei lavori di allargamento della sede stradale e fognatura di acque nere di via Prati in comune di Vigonza - 1° stralcio	B/6.1	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 130 25/11/2002	320.203,28	320.203,28	238.182,85	Lavori in corso				
72	Realizzazione della condotta fognaria di by-pass fra S.Giustina in Colle e Camposampiero	1/A/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 91 04/06/2003	774.888,35	774.888,35	692.051,85	Finanziamento convogliato nell'intervento 72A				
72A	Realizzazione della rete fognaria nelle Vie Strselle, Bomore, S. Pietro, Strselle di Rustega e del Gradicolato Romano nei Comuni di Camposampiero, Borgoricco e Massanzago-1° stralcio (€ 828.331,04)		Riunti I finanziamenti 38C (€ 53.648,69) + 72 (€ 774.888,35) = € 828.331,04					Progettazione in corso				

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione atto impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
73	Completamento dell'impianto di depurazione di Cadoneghe	1/A/2	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDOA N. 124 30/10/2002	1.859.244,84	1.859.244,84	0,00	Finanziamento convogliato nell'intervento 73A				
73A	Ampliamento dell'impianto di depurazione di Cadoneghe - 2^ fase (€ 4.369.883,68)		Riuniti i finanziamenti 45 (€ 2.117.473,29) + 57 (€ 413.166,82) + 73 (€ 1.859.244,84) = € 4.389.883,68					Progettazione esecutiva terminata				
74	Completamento dell'impianto di depurazione di Vigonza e diversione dello scarico in fiume Brenta	1/A/3	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDPV N. 85 05/06/2006	1.549.370,70	1.549.370,70		Finanziamento convogliato nell'intervento 2A gestito dalla subentrante SETA				
75	Realizzazione di condotta fognaria a Piombino Dese.	1/A/4	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDPV N. 34 21/03/2006	640.913,80	640.913,80		Progettazione in corso	14/01/2003			
76	Interventi di fognatura nei comuni consorziati	1/A/5	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		748.993,03			Finanziamento diviso negli interventi 76A, 76B, 76C, 76D, 76E, 76F, 76G e 76H				
76A	Realizzazione della rete fognaria nella via Cavin Casella, Cavin del Do, Cantale e Piazza Mercato in comune di Villanova di Camposampiero - 2° stralcio	1/A/5.6	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDOA N. 23 08/02/2005	679.664,52	679.664,52	341.992,93	Lavori in corso				
76B	Realizzazione reti di fognatura nera nelle vie Isonzo, Piave, Aspetti, Luganega, Arigoni nord, con Castello del Do Peraga	1/A/5.10	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDPV N. 60 03/05/2006	600.000,00	600.000,00		Lavori in corso				
76C	Realizzazione della rete di fognatura nera	1/A/5.12	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDPV N. 168 18/10/2002	160.000,00	160.000,00		Progetto approvato				
76D	Realizzazione condotta di fognatura nera in Via Frattina, in Via Tiepolo, Via Castellaro e via Deeman in Comune di Borgoricco	1/A/5.3	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 84 30/03/2004	460.000,00	460.000,00	388.474,23	Lavori in corso				
76E	realizzazione della rete fognaria nelle Vie Stradia, Bonora, S. Pietro, Stradia di Rustega in Comune di Camposampiero - 2° stralcio: costruzione della rete di fognatura nera in Via Stradia San Pietro	1/A/5.13	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDOA N. 81 06/08/2003	800.000,00	800.000,00	0,00	Progetto approvato				
76F	Rete di fognatura nera in depressione nelle Via Noventana e laterali a Noventa Padovana - 1° Stralcio (€ 600.000,00)	1/A/5.4	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDOA N. 183 13/10/2004	846.000,00	846.000,00	839.704,24	Lavori in corso				
76G	Estensione della rete fognaria nelle vie Guizza Alta e Carpane in comune di Conegliano (PD)	1/A/5.5	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDOA N. 194 13/10/2004	350.000,00	350.000,00	153.293,34	Lavori in corso				
76H	Riqualifica della rete di fognatura nera in alcune vie dei comuni di Vigonza, Trebaseleghe e Cadoneghe	1/A/5.11	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDPV N. 129 25/08/2006	183.545,98	183.545,98		Progetto approvato				
76I	Ampliamento rete di fognatura nera nel Comune di Villa del Conte e nella frazione di Abbazia Pisani (€ 286.633,67)	1/A/5.2	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDOA N. 179 09/12/2003	286.633,67	286.633,67	176.337,11	Lavori in corso				
76L	Sistemazione e messa in sicurezza di un tratto della S.P. 10 "Desman" (Via Roma) e relativi servizi tecnologici in comune di San Giorgio delle Pertiche	1/A/5.7	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDOA N. 138 17/08/2005	650.000,00	650.000,00	402.778,44	Lavori in corso				
76M	Intervento per la riqualificazione del sistema fognario del comune di Resana - Realizzazione della rete fognaria separata in località Castelminio	1/A/5.8	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDOA N. 179 12/10/2006	94.000,00	94.000,00		Progetto approvato				

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
76N	Realizzazione della rete fognaria nera nelle vie Roma (S.P. 34) e Franceschina in comune di Cadoneghe	1/A/5.9	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 203 31/10/2005	500.000,00	500.000,00		Progetto approvato				
77	Progetto definitivo per lavori di rifacimento e separazione condotte fognarie lungo via Manzoni, via Zanella, vicolo Aggio e viale della Vittoria in Comune di Piombino Dese	1/A/4.1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 123 30/10/2002	392.000,00	392.000,00	295.525,49	Lavori in corso	14/01/2003			
	TOTALI				94.614.903,23	92.869.544,99	79.076.107,09					

SE.T.A. – SERVIZI TERRITORIO AMBIENTE

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Completamento dell' impianto di depurazione di Camposampiero	6/A/1	DGR N. 1140 DEL 18/4/2003		1.000.000,00			Finanziamento convogliato nell'intervento 1A				
1A	Realizzazione del centro di biotrattamenti di Camposampiero (importo progetto del 1998 pari a € 22.790.470,34, aggiornato al settembre 2003 in € 26.724.765,46)		Finanziato parzialmente con i fondi dei finanziamenti 1 SE.T.A. (€ 1.000.000,00) + 2 Tergola (€ 2.582.284,50) + 5 Tergola (€ 4.338.237,95) + 18 Tergola (€ 11.878.509,55) + 38 Tergola (€ 6.249.128,46) + 54 Tergola (€ 516.456,90) = € 26.564.616,50					Lavori in corso	14/01/2003			La differenza tra l'importo di progetto e l'importo finanziato è a carico dell'ente
2	Completamento dell' impianto di depurazione di Vigonza	6/A/2	DGR N. 1140 DEL 18/4/2003	DDPV N. 85 05/06/2006	515.000,00	515.000,00		Finanziamento convogliato nell'intervento 2A				
2A	Completamento dell' impianto di depurazione di Vigonza e diversione scarico in fiume Brenta (€ 2.890.701,74)		Riuniti i finanziamenti 2 SE.T.A. (€ 818.000,00) + 350 Tergola (€ 826.331,04) + 74 Tergola (€ 1.549.370,70) = € 2.890.701,74					Progettazione in corso				
3	Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999: collegamento dell' impianto di depurazione minore di via Fabris di Camposampiero con l' impianto principale.	6/A/3	DGR N. 1140 DEL 18/4/2003		480.000,00			Progettazione in corso				
4	Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999 dell' impianto di depurazione di Onara di Tombolo.	6/A/4	DGR N. 1140 DEL 18/4/2003		2.115.000,00			Progettazione in corso				
5	Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999: collegamento (con dismissione) dell' impianto di depurazione di Battaglia Terme con l' impianto di depurazione di Montegrotto T. con relative opere di adeguamento dimensionale di quest' ultimo.	6/A/5	DGR N. 1140 DEL 18/4/2003	DDPV 171 18/10/2006	2.750.000,00	2.750.000,00		Progettazione in corso				
6	Interventi di fognature nei comuni di S. Martino di Lupari frazioni Capretta e Borghetti, Villa del Conte e S. Giustina in Colle fraz. Fratte	6/A/6	DGR N. 1140 DEL 18/4/2003	DDPV 122 09/08/2006	2.000.000,00	2.000.000,00		Progettazione in corso				
7	Impianto di depurazione di Vigonza: completamento ed adeguamento trattamenti terziari	E/17	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 85 05/06/2006	800.000,00	800.000,00		Progetto approvato				
8	Impianto di depurazione di Onara: dismissione impianto depurazione di Onara e collegamento all'impianto di depurazione di Cittadella	E/18	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		308.000,00			Progettazione in corso				

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione del bando	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio e consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
9	Completamento rete fognaria Galzignano e Battaglia, dismissione impianto di depurazione di Battaglia, collegamento all'impianto di depurazione di Montegrotto e suo potenziamento fino a 30.000 A.E.	E/19	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 161 18/10/2006	1.500.000,00	1.500.000,00		Progetto approvato				
10	Impianto di depurazione di Camposampiero: seconda fase digestione anaerobica, completamento compostaggio aerobico, viabilità	E/20	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		2.000.000,00			Progettazione in corso				
11	Impianto di depurazione di Cittadella: opere di completamento (acquedotto duale e trattamento sabbie)	E/21	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 152 03/10/2006	2.000.000,00	2.000.000,00		Progetto approvato				
12	Intervento in Comune di Trebaseleghe - Via Ronchi, Obaia Alta e Bassa	E/22.1	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		208.000,00			Progettazione in corso				
13	Intervento in Comune di Trebaseleghe - Via Villanova	E/22.2	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDOA N. 77 11/05/2005	230.000,00	230.000,00	214.390,06	Lavori in corso				
14	Completamento della fognatura per acque nere in via Villanova, comune di Trebaseleghe	E/22.2 ECO	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV N. 37 23/03/2006	10.000,00	10.000,00						
15	Intervento in Comune di Cittadella - Via delle Sorgenti	E/22.3	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDOA N. 24 14/03/2005	42.000,00	42.000,00	37.800,00	Lavori in corso				
16	Intervento in Comune di Villa del Conte - Via degli Alpini, Don Carrara, Marconi, Maso Moro, Tergola	E/22.4	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		755.600,00			Progettazione in corso				
17	Intervento in Comune di Massanzago - Via Roma, Stradona, Padovana, Cà Zorzi e Bigolo	E/22.5	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		240.000,00			Progettazione in corso				
18	Intervento in comune di S. Giorgio delle Pertiche: collegamento imp. Selezione frazione secca, della SS 307 e di via Anconetta, nonché fognatura nera nella via Montegrappa e Ceccarello	E/22.6	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.060.000,00			Progettazione in corso				
19	Intervento in Comune di Piombino Dese - Via Piave, Massari, Sutfoni	E/22.7	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		160.000,00			Progettazione in corso				
20	Intervento in Comune di Piombino Dese - riqualifica funzionale rete fognaria del capoluogo	E/22.8	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.140.913,80			Progettazione in corso				
21	Riqualificazione della rete fognaria nera nel centro del capoluogo del comune di Piombino Dese (PD)	E/22.8A	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 34 21/03/2006	469.086,20	469.086,20		Progetto approvato				
22	Intervento in Comune di S. Martino di Lupari - riqualifica funzionale rete fognaria del capoluogo	E/22.9	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		2.600.000,00			Progettazione in corso				
23	Intervento in Comune di S. Martino di Lupari/S. Giustina in Colle - collegamento fraz. Camposto - Borghetto - Fratte a S. Giustina in Colle - 2° Stralcio	E/22.10	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV N. 122 09/08/2006	800.000,00	800.000,00		Progettazione in corso				
24	Intervento in Comune di Campodarsego - riqualifica funzionale rete fognaria del capoluogo	E/22.11	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		800.000,00			Progettazione in corso				
25	Realizzazione delle opere di fognatura nera, bianca e sistemazione stradale lungo il lato ovest di via Antoniana, da via Marcello fino al capluogo in comune di Campodarsego	E/22.11.1	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV N. 81 05/06/2006	380.000,00	380.000,00						

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
26	Realizzazione delle opere di fognatura nera, bianca e sistemazione stradale lungo via Antoniana, da via Marcello fino al civico 15 nel comune di Campodarsego	E/22.11.2	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV N. 82 05/06/2006	420.000,00	420.000,00						
27	Intervento in Comune di Resana - interventi di riqualificazione del sistema fognario	E/22.12	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		2.120.000,00			Progettazione in corso				
28	Interventi di fognatura nei comuni del comprensorio	E/22.13	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		500.000,00			Progettazione in corso				
29	Intervento in comune di Noventa Padovana: fognatura nera nelle vie Marezzane, Marco Polo e laterali e completamento delle opere di fognatura in depressione lungo via Noventana e laterali	E/22.14	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV N. 98 15/06/2006	450.000,00	450.000,00		Progettazione in corso				
	TOTALI				28.123.600,00	12.458.086,20	252.190,08					

AZIENDA SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Realizzazione rete fognaria primaria Comuni di Castelfranco Veneto, Vedelago, Altivole, - 1° Lotto	E/16	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		7.360.000,00			Progettazione esecutiva				
	TOTALI				7.360.000,00	0,00	0,00					

SERVIZI PUBBLICI INTEGRATI MOGLIANO S.p.A. (SPIM S.p.A.)

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Lavori di estensione della rete fognaria ed implementazione degli allacciamenti in fognatura nera.	1/3.6.B	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DDDA N. 29 21/03/2001	516.456,90	516.456,90	516.456,90	Lavori in corso				
2	Lavori di estensione della rete fognaria ed implementazione degli allacciamenti in fognatura nera.	1/3.6.D	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DDDA N. 29 21/03/2001	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	Lavori ultimati				
3	Lavori di estensione della rete fognaria ed implementazione degli allacciamenti in fognatura nera.	B/13 IV fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DDDA N. 29 21/03/2001	516.456,90	516.456,90	258.228,45	Lavori in corso				
4	Adeguamento del depuratore di Pregnzioi: potenziamento dei sistemi di decantazione, clorazione e filtazione finale	E/23	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDDA N.214 22/10/2008	560.000,00	560.000,00		Progetto approvato				

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
5	Completamento rete fognaria nel territorio comunale: Via Statua, Via Zerlolo, Via Levada, Via Marcello, Via Molin Cappello Nord	E/13	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDDA N. 194 25/10/2005	260.800,00	260.800,00	0,00	Progetto approvato				
	TOTALI				3.403.084,50	3.403.084,50	2.324.056,05					

AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE CENTRO VENETO SERVIZI

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Interventi di fognatura per impianti di depurazione minori.	1/5.2	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000	DDDA N. 148 12/12/2002	1.549.370,70	1.549.370,70	1.394.433,63	Lavori in corso				
2	Interventi di fognatura nei comuni di Candiana, Conselve, Monselice, Pozzonovo, Solesino, Tribano	4d	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000	DDDA N. 101 18/10/2002	3.615.198,29	3.615.198,29	2.767.060,11	Lavori in corso				
3	Ampliamento schema fognario della zona del Conselvano.	A/2/1	DGR N. 2613 DEL 22/07/1997	DPGR N. 83 12/11/1998	5.939.254,34	5.939.254,34	5.939.254,34	Contabilità finale	19/04/1999	7/11/2001	07/12/2001 15/02/2002	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 30 del 05/04/2002
4	Ampliamento impianto di depurazione di Monselice	A/4 IV fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DDDA N. 171 12/12/2001	1.032.913,80	1.032.913,80	929.622,42	Lavori in corso				
5	Interventi di fognatura in comune di S. Elena	A/5 IV fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/2000	DDDA N. 114 19/12/2000	361.519,83	361.519,83	361.519,83	Contabilità finale	12/07/2001	19/09/2002	14/04/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 147 del 20/10/2003
6	Interventi su impianti di depurazione di fognature e di diversione nei comuni di: Pernumia, Solesino, Borgoforte di Anguillara Veneta, Arre, Agna, Bagnoli, Bovolenta, Candiana, Cartura, Conselve, Pozzonovo, Terrassa P. ,Tribano.	A/3 IV fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/2001	DDDA N. 87 30/07/2001	3.821.781,05	3.821.781,05	3.411.465,81	Lavori in corso	02/07/2002 02/07/2002 15/05/2002 02/07/2002			
7	Lavori di rifacimento della fognatura e pavimentazione nelle vie Matteotti e Principe Umberto, con sistemazione di Piazza Maggiore - 13° stralcio fognature in comune di Este	A/5 IV fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/2002	DDDA N. 136 30/10/2001	1.446.079,32	1.446.079,32	1.301.471,39	Lavori in corso				
8	Impianto di biotrattamento di Conselve (€ 8.779.767,28)		Intervento sospeso e fondi riallocati con D.G.R. 794/2002 agli interventi 8A (€ 1.032.913,80); 8B (€ 4.648.112,09) e 8C (€ 3.098.741,39)									
8A	Adeguamento al D. M. 30 luglio 1999 dell' impianto di depurazione di Conselve - II stralcio	B/23 V fase	DGR N. 1140 DEL 18/04/2003	DDDA N. 8 08/01/2005	1.032.913,80	1.032.913,80	0,00	Finanziamento convogliato nell'intervento 11A per l'importo di € 1.032.913,80				
8B	Impianto di depurazione di Conselve potenzialità 46.550 A.E. - 1° stralcio	A/5.1 V fase	DGR N. 2924 DEL 30/08/1999	DDDA N. 69 26/06/2002	4.648.112,09	4.648.112,09	4.183.300,88	Lavori in corso				Proveniente da fondi riallocati
8C	Interventi su reti fognarie per allacciare l'80% dei residenti, nei comuni consorziati	A/5.2 V fase	DGR N. 2924 DEL 30/08/1999	DDDA N. 28 28/03/2003	3.098.741,39	3.098.741,39	1.599.939,01	Finanziamento convogliato nell'intervento 9A per l'importo di € 3.098.741,39				

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione dell'impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
9	Opere di ampliamento ed adeguamento tecnologico dell'impianto di depurazione del comune di Este - 3° lotto - 1° stralcio	B1/64.A	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000	DDPV 121 09/08/2006	1.284.732,28	1.284.732,28						Cambio soggetto attuatore: ex comune di Este
10	Interventi su reti fognarie per allacciare l'80% dei residenti, nei comuni consorziati	1/B/1	DGR N. 794 DEL 09/04/2002	DDDA N. 28 26/03/2003	616.488,90	616.488,90	0,00	Finanziamento convogliato nell'intervento 9A per l'importo di € 616.488,90				
10A	Interventi su reti fognarie per allacciare l'80% dei residenti, nei comuni consorziati (€ 3.816.188,29)		Ripartiti i finanziamenti 8C (€ 3.098.741,39) + 9 (€ 616.488,90) = € 3.816.188,29					Progettazione definitiva				
11	Progetto definitivo relativo alle opere di rifacimento delle fognature nelle vie Massimo D Azeglio, Pascherla Vecchia, Madonnetta, Marconi, P.zza Trieste, Cavour, Calle della Musica etc. - XV° Stralcio fognature	1/T/1	DGR N. 794 DEL 09/04/2002	DDDA N. 116 20/08/2003	€ 1.549.370,70	1.549.370,70	0,00	Progetto approvato				Cambio soggetto attuatore: ex comune di Este
12	Interventi di fognature nel territorio comunale di Arquà Petrarca.	1/V/1	DGR N. 794 DEL 09/04/2002	DDDA N. 14 21/02/2003	616.488,90	616.488,90	338.103,58	Lavori in corso	09/06/2003			
13	Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999 dell' impianto di depurazione di Conselve - II stralcio	6/B/1	DGR N. 1140 DEL 18/04/2003	DDDA N. 6 18/01/2006	687.068,20	687.068,20	43.268,72	Finanziamento convogliato nell'intervento 12A per l'importo di € 687.068,20				
13A	Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999 dell' impianto di depurazione di Conselve - II stralcio (€ 1.700.000,00)		Ripartiti i finanziamenti 8A (€ 1.012.913,80) + 11 (€ 687.068,20) = € 1.700.000,00					In fase di progettazione				
14	Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999 dell' impianto di depurazione di Agna: diversione dello scarico nel fiume Fiume Gorzone	6/B/2	DGR N. 1140 DEL 18/04/2003	DDDA N. 96 06/04/2005	450.000,00	450.000,00	0,00	Progetto approvato				
15	Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999 dell' impianto di depurazione di Candiana: dismissione e collegamento con l' impianto di depurazione di Conselve	6/B/3	DGR N. 1140 DEL 18/04/2003	DDDA N. 95 01/09/2006	400.000,00	400.000,00	0,00	Progetto approvato				
16	Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999 dell' impianto di depurazione di Pozzonovo: diversione dello scarico fuori laguna	6/B/4	DGR N. 1140 DEL 18/04/2003	DDDA N. 102 15/06/2005	300.000,00	300.000,00	0,00	Progetto approvato				
17	Interventi di fognature in comune di Cartura	6/B/5	DGR N. 1140 DEL 18/04/2003	DDDA N. 250 23/12/2004	640.000,00	640.000,00	0,00	Progetto approvato				
18	Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999 dell' impianto di depurazione di via del Borgo- Monselice: diversione dello scarico fuori laguna	6/N/1	DGR N. 1140 DEL 18/04/2003	DDPV 165 03/12/2006	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	Progetto approvato				Cambio soggetto attuatore: ex comune di Monselice
19	Lavori di fognature in via S. Pietro - S.P. 14, Pernumia	E/9.8	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 77 05/06/2006	235.200,00	235.200,00	5.523,08	Lavori in corso				
20	Lavori di fognature in via Cà Erizzo, Borgoricco	E/9.12	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 69 24/05/2006	116.360,00	116.360,00		Progetto approvato				
21	Lavori di fognature in via Rovere prolungamento, Anguillara	E/9.17	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 74 05/06/2006	67.680,00	67.680,00	13.523,08	Lavori in corso				
22	Lavori di fognature in via Bologna, Ponte S. Nicolò	E/9.10	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 73 06/06/2006	48.400,00	48.400,00		Progetto approvato				
23	Lavori di fognature in via Bologna laterale, Ponte S. Nicolò	E/9.11	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 78 05/06/2006	48.400,00	48.400,00		Progetto approvato				

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione del impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
24	Sdoppiamento rete, adeguamento rete del centro e del nucleo del centro storico, suddivisione acque nere e bianche, nella zona di Monselice capoluogo	E9.4	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 80 05/06/2006	2.561.626,00	2.561.626,00	142.388,71	Lavori in corso				
25	Completamento rete fognatura nella vecchia zona industriale e via Umbria, Monselice	E9.31	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 78 05/06/2006	1.000.000,00	1.000.000,00		Progetto approvato				
26	Lavori di fognatura in via Marconi laterale, Terrassa Padovana	E9.7	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 69 24/05/2006	47.580,00	47.580,00	13.233,08	Lavori in corso				
27	Lavori di fognatura in via Corso e Ponte de Riva laterali, Due Carrare	E9.28	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 69 24/05/2006	66.400,00	66.400,00		Progetto approvato				
28	Lavori di fognatura in via Chiaviche, Arquà	E9.27	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 78 05/06/2006	66.400,00	66.400,00		Progetto approvato				
29	Comune di Ponte S. Nicolò. Completamento della rete fognaria nera nella porzione di territorio comunale ricadente nel bacino scolante nella Laguna di Venezia	E9.15	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 73 05/06/06	360.000,00	360.000,00		Progetto approvato				
30	Lavori di fognatura in via Boarlo Polito, Arquà	E9.10	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 78 05/06/2006	33.840,00	33.840,00	0,00	Progetto approvato				
31	Lavori di fognatura in via Arglna, Pozzonovo	E9.16	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 79 05/06/2006	90.880,00	90.880,00		Progetto approvato				
32	Lavori di fognatura in via Arre prolungamento, S.P., Conselve	E9.21	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 75 05/06/2006	90.240,00	90.240,00		Progetto approvato				
33	Lavori di fognatura in via Ca Borin laterale, Baone	E9.20	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 68 24/05/2006	225.600,00	225.600,00		Progetto approvato				
34	Lavori di fognatura in via S. Trinità, Pernumia	E9.14	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 77 05/06/2006	228.160,00	228.160,00		Progetto approvato				
35	Lavori di fognatura in via Monte Grappa laterale, Conselve	E9.18	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 76 05/06/2006	112.800,00	112.800,00	5.523,08	Lavori in corso				
36	Lavori di fognatura in via Stanga prolungamento, Arre	E9.23	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 69 24/05/2006	201.120,00	201.120,00		Progetto approvato				
37	Lavori di fognatura in via Paradiso, Pozzonovo	E9.2	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 79 05/06/2006	60.000,00	60.000,00	5.523,08	Lavori in corso				
38	Lavori di fognatura in via Roma prolungamento lato destro, Ponte S. Nicolò	E9.3	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 73 05/06/2006	144.800,00	144.800,00	23.309,94	Lavori in corso				
39	Lavori di fognatura in via Maserallno, Cartura	E9.25	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 76 05/06/2006	189.200,00	189.200,00		Progetto approvato				
40	Ulteriore stralcio funzionale di completamento della rete fognaria nel centro storico di Este e nel quartiere di Meggiaro	E9.22	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 67 24/05/2006	2.800.000,00	2.800.000,00	52.998,34	Lavori in corso				
41	Lavori di fognatura nella S.P. 21 prolungamento, Baone	E9.28	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 68 24/05/2006	66.400,00	66.400,00		Progetto approvato				
42	Lavori di fognatura in via Fossalta prolungamento, Conselve	E9.30	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 75 05/06/2006	197.920,00	197.920,00		Progetto approvato				

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio e consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
43	Lavori di fognatura in via Santo, Anguillara	E/9.24	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 74 05/06/2006	223.040,00	223.040,00		Progetto approvato				
44	Collegamento al depuratore comunale dello scarico depurato del mattatoio "Agricola Berica" e di altre 20 utenze civili, Monselice	E/9.1	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 78 05/06/2006	392.800,00	392.800,00	48.165,04	Lavori in corso				
45	Lavori di fognatura in via Ponte de Riva S.P., Cartura	E/9.6	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 76 05/06/2006	310.400,00	310.400,00	8.523,08	Lavori in corso				
46	Lavori di fognatura in via Rana Camori laterale, Este	E/9.5	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 75 05/06/2006	105.600,00	105.600,00	8.523,08	Lavori in corso				
47	Lavori di fognatura in via Razzole laterale, Pozzonovo	E/9.13	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 79 05/06/2006	92.160,00	92.160,00		Progetto approvato				
48	Lavori di fognatura in via Rialto laterale, Candiana	E/9.9	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 69 05/06/2006	48.400,00	48.400,00		Progetto approvato				
49	Lavori di fognatura in via Rana Camori laterale, Este	E/9.29	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 68 05/06/2006	484.800,00	484.800,00		Progetto approvato				
	TOTALI				48.929.293,36	48.929.293,36	22.647.988,28					

VE.S.T.A.

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio e consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1 (94 V.)	(Acquedotto di Venezia ORIGINARIAMENTE) Progetto definitivo della nuova centrale di sollevamento sull'isola del Tronchetto dell'acquedotto di Venezia centro storico ed estuario sud	1/4.9		DGCA N. 147 29/3/2001	4.131.655,19	4.131.655,19	720.119,80	Progetto approvato				
2	Progetto relativo ad attività di eliminazione delle acque parassite	1/2.5.A	DGR 4589 05/03/1991	DGR N. 1041 24/04/2002	1.362.929,76	1.362.929,76		Progetto approvato				
3	Progetto Campalto: costruzione del I tronco del collettore Acque Basse	1/C/3	DGR N. 6400 DEL 12/12/1995		8.006.081,94			Progettazione in corso				La DGR 719 del 19/03/2004 concede al progetto il giudizio di compatibilità ambientale
4	Progetto Campalto: riazionamento del canale di interconnessione tra gli impianti di Campalto e dello Scolmatore Marzenego	1/C/6	DGR N. 6400 DEL 12/12/1995		2.582.284,50			Progettazione in corso				La DGR 719 del 19/03/2004 concede al progetto il giudizio di compatibilità ambientale
2 (95 V.)	(Acquedotto di Venezia ORIGINARIAMENTE) Progetto definitivo della nova centrale di sollevamento sull'isola del Tronchetto dell'acquedotto di Venezia centro storico ed estuario sud	1/4.10		DGCA N. 147 29/3/2001	4.131.655,19	4.131.655,19	0,00	Progetto approvato				

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione dell'impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
5	Realizzazione della condotta Ponte della Libertà - Tronchetto (Venezia)	B/21.1 V fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DGR N. 3057 DEL 2003	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00	Progetto approvato				
6	Adeguamento impianto di potabilizzazione Cà Solaro	D/66	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DGCA N. 137 29/4/2004	3.488.084,97	3.488.084,97	788.104,00	Lavori in corso				
	TOTALI				26.639.690,85	15.952.324,22	1.588.223,80					

SEZIONE III: CONSORZI DI BONIFICA

Nota: nelle tabelle che seguono vengono riportati i finanziamenti attribuiti direttamente ai Consorzi di Bonifica

PAGINA BIANCA

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE BACCHIGLIONE

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio e consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Intervento di diversione idraulica della laguna - incremento invasi - monitoraggio e telecontrollo	6/B/1	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 130 DEL 8/8/1996	12.844.589,35	12.844.589,35	12.844.589,35	Contabilità finale	22/09/1997	20/03/2001	04/08/2001	Registrata, con DDDA n. 112 del 14/8/2001, un'economia di € 66.833,12 destinata a finanziare l'intervento 1 bis
1 bis	Area pilota di fitodepurazione per integrazione di reti fognarie e rete di bonifica (€ 66.833,12)	6/B/2		DDDA N. 38 19/4/2002	66.833,12	66.833,12	66.833,12	Finanziamento convogliato nell'intervento 4A				DDDA n. 38 del 19/04/2002 utilizza l'economia di € 66.833,12 dell'intervento 1. Decreto di contabilità finale DDDA n. 6 del 07/01/2004
2	Interventi strutturali in rete di bonifica - Sistema di telecontrollo	5/B/5	DGR N. 2568 DEL 27/7/1999	DDDA N. 21 26/2/2001	619.748,28	619.748,28	493.459,25	Contabilità finale	26/02/2002			Registrata, con DDDA n. 163 del 31/08/2004, un'economia di € 126.289,03
3	Interventi strutturali: ricalibrazione e sostegni sui rii Barbegara, Rebosola e S. Silvestro	5/B/4	DGR N. 2203 DEL 21/5/1998	DDDA N. 22 22/6/1998	5.164.568,99	5.164.568,99	5.164.568,99	Contabilità finale	21/06/2000	21/06/2003	03/11/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 205 del 22/10/2204
4	Area pilota di fitodepurazione per integrazione di reti fognarie e rete di bonifica.	5/C/1	DGR N. 6400 DEL 12/12/1995	DDDA N. 61 DEL 4/8/1999	2.582.284,50	2.582.284,50	2.582.284,50	Finanziamento convogliato nell'intervento 4A per € 2.582.284,50				
4A	Area pilota di fitodepurazione per integrazione di reti fognarie e rete di bonifica (€ 2.649.117,67)		Riuniti i finanziamenti 1 bis (€ 66.833,12) + 4 (€ 2.582.284,50) = € 2.649.117,62					Lavori collaudati	04/08/2000	04/08/2003	04/09/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 6 del 07/01/2004
5	Intervento di incremento dei tempi di ritenzione delle acque di sfioro urbane e di dilavamento di superfici agricole nei comuni di Este e Baone	B/12 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 18 12/3/2003	3.615.198,29	3.615.198,29	149.344,87	Progetto approvato				In corso perizia per espropri. Erogazione limitata alle sole spese di progettazione
6	Fitodepurazione per integrazione di rete fognaria e rete di bonifica per l' autodepurazione nei bacini centrali.	A/11 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 138/01 DDDA N. 110/02	7.746.853,49	381.519,83	381.519,83	Progetto approvato				In corso perizia per espropri. Decreti di impegno ed erogazione limitati alle sole spese di progettazione
7	Incremento invaso e capacità di autodepurazione Valli di Gazzignano e di Arquà Petrarca. (ricalibratura canali, creazione aree umide e sostegni, ripristino vegetazione di sponde)	D/79	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDPV N. 180 30/10/2006	5.164.568,99	5.164.568,99		Progetto approvato				Procedura di screening in corso
8	Progetto per la miglior gestione delle acque irrigue	D/80	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		7.746.853,49			Progettazione in corso				Procedura di screening in corso
9	Incremento volume invaso canale dei Cuori e diaframmatura argini	2/N/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 109 18/10/2002	3.098.741,39	232.405,60	232.405,60	Lavori in corso				Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione
10	Opere di diaframmatura e completamento bacino Ca' di Mezzo	2/N/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 130 24/09/2003	258.228,46	258.228,46	196.053,36	Lavori in corso				Erogazione limitata alle sole spese di progettazione (€ 19.367,13) come da DDDA n. 109/02

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
11	Ricalibratura canale San Giacomo - Monselesana	2/O/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 164 21/09/2005	1.291.142,25	1.291.142,25	537.323,85	Lavori in corso				Decreto di impegno dell'opera.
12	Ricalibratura e sostegni canali Barbegara, Rebosola, S. Silvestro	2/P/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 163 21/09/2005	3.098.741,39	3.098.741,39	1.259.175,97	Lavori in corso				Decreto di impegno dell'opera. Riunito il finanziamento con opera 18, complessivamente € 3.407.114,59
[illegible]												
13	Fitodepurazione per integrazione di rete fognaria e rete di bonifica per l' autodepurazione nei bacini centrali - (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 6)	D1/1	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		183.819,20			Progetto approvato				
14	Intervento di incremento dei tempi di ritenzione delle acque di sfioro urbane e di dilavamento di superfici agricole nei comuni di Este e Baone (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 5)	D1/2	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		139.228,00			Progetto approvato				
15	Integrazione di rete fognaria e rete di bonifica. Incremento dell'invaso e della capacità di autodepurazione nelle valli di Galzignano e di Arquà Petrarca e nel canale di scarico Carmine (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 7)	D1/3	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV N. 180 30/10/2006	481.339,20	481.339,20		Progetto approvato				
16	Progetto per la miglior gestione delle acque irrigue (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 8)	D1/4	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.211.142,20			Progettazione in corso				
17	Ricalibratura canale San Giacomo - Monselesana (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 11)	D1/5	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDDA 164 del 21/09/2005	176.097,20	176.097,20		Progetto approvato				
18	Ricalibratura e sostegni canali Barbegara, Rebosola, S. Silvestro (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 12)	D1/6	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDDA 163 del 21/09/2005	308.373,20	308.373,20		Progetto approvato				Decreto di impegno dell'opera. Riunito il finanziamento con opera 12, complessivamente € 3.407.114,59
19	Interventi in rete minore di bonifica. Aumento tempi di corrivazione e autodepurazione nei bacini Foresto Superiore e Foresto Centrale	D1/7	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		3.000.000,00			Progettazione in corso				
20	Aumento tempi di ritenzione per autodepurazione nei bacini Giovannelli, Zuccona, Tassi, Foresto Superiore e Rebosola: stralcio	D1/8	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.000.000,00			Progetto preliminare				
21	Impinguamento canali Beoli - Rebosola	D2/42	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.150.000,00			Progettazione in corso				
	TOTALI				60.948.350,98	36.265.638,64	23.887.558,69					

CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE BRENTA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione atto impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio e consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Sistemazioni idraulico-ambientali area Brenta-Bacchiglione (foce lagunare di Lova)	5/D/1	DGR N. 4967 DEL 3/10/1995	DDDA N. 71 27/10/1998	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	Contabilità finale	22/07/1998	28/11/1997	20/03/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 82 del 12/7/2001
2	Interventi strutturali in rete di bonifica - Sistema di telecontrollo	5/B/5	DGR N. 2858 DEL 27/7/1999	DDDA N. 73 DEL 27/7/2001	619.748,28	619.748,28	413.780,85	Lavori in corso	03/05/2001			La somma impegnata è stata ridotta rispetto a quella finanziata in base alla riduzione dell'importo del progetto iniziale (da € 619.748,28 a € 516.468,90)
3	Interventi strutturali: diversione delle acque di piena del Fiumicello (idrovora Cambroso)	5/B/7	DGR N. 6400 DEL 12/12/1998	DGCA N. 72 DEL 27/7/1999	1.549.370,70	1.549.370,70	1.272.488,29	Lavori in corso	12/10/1998	28/11/1997		Approvata perizia di variante
4	Ricalibrature e sostegni sul rti di Piove	A/7 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 181 13/8/2005	4.131.668,20	4.131.668,20	266.882,78	Lavori in corso				Decreto di impegno dell'opera
5	Ricalibrature reti di bonifica e gestione invasi e recapito finale nell'area "Brondolo" in comune di Chioggia	A/8 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 108 14/12/2000	774.688,35	774.688,35	271.210,88	Lavori in corso				
6	Ricalibrature e sostegni sui corsi d'acqua nella zona di Piove di Sacco e Codevigo	A/8 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999					Finanziamento originale di € 2.840.812,93 suddiviso negli interventi 6A (€ 1.549.370,70) e 6B (€ 1.291.141,25)				
6A	Interventi strutturali in rete minore. Ricalibrature e sostegni sui corsi d'acqua nella zona di Piove di Sacco e Codevigo (1° stralcio) - Bacino Sesta Presa - sottobacino del Rti di Piove (€ 1.549.370,70)	A/8.2 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 149 13/09/2005	1.549.370,85	1.549.370,85		Progetto definitivo				Con DGR 1550 e1551 del 25/05/2004 ottenuto giudizio di compatibilità ambientale
6B	Interventi strutturali in rete minore. Ricalibrature e sostegni sui corsi d'acqua nella zona di Piove di Sacco e Codevigo (1° stralcio) - Bacino Bernio (€ 1.291.141,25)	A/8.1 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 190 07/10/2004	1.291.142,00	1.291.142,00	142.025,85	Lavori in corso				
7	Ricalibrature, realizzazione aree golenali e ripristino vegetazionale nei corsi d'acqua in zona Piove di Sacco e Codevigo (2° stralcio)	D/7/2	DGR N. 1634 DEL 23/6/2000	DDDA N. 78 13/6/2003	3.098.741,35	184.937,07	184.937,07	Finanziamento suddiviso negli interventi 7A (€ 2.324.056,05) e 7B (€ 774.685,30)				Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione
7A	Interventi strutturali in rete minore. Ricalibrature e sostegni sui corsi d'acqua nella zona di Piove di Sacco e Codevigo (2° stralcio) - Bacino Sesta Presa - sottobacini e sud del Fiumicello (€ 2.324.056,05)	Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 7 (€ 2.324.056,05)						Progetto preliminare				
7B	Interventi strutturali in rete minore. Ricalibrature e sostegni sui corsi d'acqua nella zona di Piove di Sacco e Codevigo (2° stralcio) - Bacino Trezza (€ 774.685,35)	Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 7 (€ 774.685,35)						Progetto preliminare				
8	Miglioramento della gestione delle acque irrigue nei bacini Sesta Presa in Sinistra Brenta e Settima Presa Inferiore (Ricalibrazione e rinaturalizzazioni canali, nuove opere di derivazione, nuove reti di condotte)	D/7/6	DGR N. 1634 DEL 23/6/2000	DDDA N. 83 13/6/2003	2.582.284,50	128.114,23	128.114,23	Progetto preliminare				Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione alla tipologia	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
9	Ricalibratura e rinaturalizzazione della rete di bonifica costituita dallo scolo Noventana e sue diramazioni; costruzione nuovo impianto idrovoro "Noventa" per la diversione acque di piena della Laguna	D/73	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDPV N 62 03/05/2006	2.324.056,05	2.324.056,05	116.202,80	Lavori in corso				Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione
10	Progetto definitivo per la realizzazione di interventi strutturali in rete minore di bonifica. Gestione degli invasi e diversione delle acque di piena nell' idrovia Padova - Venezia.	D/74	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDOA N. 128 18/11/2002	774.888,35	774.888,00	861.080,35	Lavori in corso				
11	Completamento ricalibratura e gestione invasi nell' area Brondolo di Chioggia	2/A/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDOA N. 66 13/6/2003	1.239.486,66	61.974,83	61.974,83	Progetto preliminare				Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione
12	Estensione sistema telecomando e telecontrollo alle opere di derivazione e manufatti irrigui	2/B/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDOA N. 64 21/4/2005	1.032.913,80	1.032.913,80	51.645,69	Lavori in corso				Decreto di impegno dell'opera
13	Realizzazione di vasche di espansione ed adeguamento impianti di sollevamento Bernio e Trezze di Chioggia	2/C/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDOA N. 67 13/6/2003	3.098.741,39	164.937,07	164.937,07	Finanziamento suddiviso negli interventi 13A (€ 1.291.142,26) e 13B (€ 1.807.599,16)				Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione
13A	Realizzazione di vasche di espansione ed adeguamento impianti Bernio e Trezze di Chioggia - bacino Bernio (€ 1.291.142,26).	Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 13 (€ 1.291.142,26)						Progetto preliminare				
13B	Realizzazione di vasche di espansione ed adeguamento impianti Bernio e Trezze di Chioggia - bacino Trezze (€ 1.807.599,16).	Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 13 (€ 1.807.599,16)						Progetto preliminare				Procedura di screening
14	Ricalibrazione e sostegni su corsi d' acqua nell' area della Riviera del Brenta	2/D/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDOA N. 68 13/6/2003	2.576.701,74	118.785,09	118.785,09	Progetto preliminare				Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione
15	Interventi strutturali in rete di bonifica: diversione delle acque di piena del Fiumicello (idrovora di Camposo) (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dall'Int. 3)	D/6	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 98 15/06/2006	180.000,00	180.000,00		Lavori in corso				
16	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibratura e sostegni sul Rii di Piove (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dall'Int. 4)	D1/10	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		600.000,00			Progettazione in corso				
17	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibratura e sostegni sul corsi d'acqua nella zona di Piove di Sacco e Codevigo - Bacino Sesta Presa e Bacino Bernio (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dall'Int. 6)	D1/11	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		200.000,00			Progettazione in corso				
18	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibratura reti di bonifica e gestione invasi e recapito finale nell'area di "Brondolo" in comune di Chioggia (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dall'Int. 6)	D1/12	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		150.000,00			Progetto esecutivo				
19	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibratura e sostegni sul corsi d'acqua nella zona di Piove di Sacco e Codevigo (II stralcio) - Bacino Sesta Presa e Bacino Trezze (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dall'Int. 7)	D1/13	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		300.000,00			Progettazione in corso				

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
20	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibratura reti di bonifica e gestione invasi e recapito finale nel bacino "Noventana" (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'Int. 9)	D1/14	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 62 03/06/2006	200.000,00	200.000,00		Progettazione in corso				
21	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Miglioramento della gestione delle acque irrigue nei bacini Sesta Presa in Sinistra Brenta e Settima Presa inferiore (I stralcio) (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'Int. 8)	D1/15	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		360.000,00			Progettazione in corso				
22	Completamento, ricalibratura e gestione invasi nell'area Brondolo di Chioggia (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'Int. 11)	D1/16	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		50.000,00			Progetto preliminare				
23	Realizzazione di vasche di espansione ed adeguamento impianti di sollevamento Bernio e Trezze di Chioggia (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'Int. 13)	D1/17	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		570.000,00			Progetto preliminare				
24	Completamento ricalibratura e sostegni sullo scolo Altipiano	D1/18	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		3.000.000,00			Progettazione in corso				
25	Interventi di trasformazione irrigua del Bacino Bernio in sx del canale Novissimo nei Comuni di Chioggia e Codevigo	D2/43	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		5.963.000,00			Progettazione in corso				
	TOTALI				39.464.963,95	18.696.748,31	5.194.114,02					

CONSORZIO DI BONIFICA BASSO PIAVE

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Miglioramento della efficienza dello scarico delle reti fognarie 1° stralcio - Risanamento e riordino idraulico delle isole Trepontine	B/17/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 52 DEL 4/8/2000	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.091,54	Lavori collaudati	24/04/2002			Determinazione contributo definitivo con DDDA 191 del 25/10/2005: registrata economia di € 50,71
2	Acquedotto sostitutivo pozzi per irrigazione area Cavallino	B/20 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 223 DEL 2004	53.789,67	53.789,67	53.789,67	Finanziamento revocato				Finanziamento originale pari a € 12.911.422,48, di cui € 10.857.632,91 devoluti alla Diocesi Patriarcato di Venezia e € 2.000.000,00 alla Comunità Ebraica di Venezia.

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione ado impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
3	Completamento intervento per aquedotto sostitutivo pozzi in comune di Cavallino	6/B/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		0,00	0,00	0,00	Finanziamento revocato				Finanziamento originale pari a € 6.164.568,99 interamente revocato e devoluto alla Diocesi Patriarcato di Venezia
4	Progetto di opere aziendali e comuni e più fondi nel settore dell'irrigazione - Distribuzione di acqua alle aziende delle unità irrigue elementari	D2/44	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		2.978.171,00			Progetto preliminare				
	TOTALI				4.333.102,82	1.344.831,82	1.344.831,11					

CONSORZIO DI BONIFICA DESE SILE

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione ado impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Costruzione impianto idrovoro Canale Scolmatore F. Marzenego		DGR N. 1151 DEL 18/11/1988	DDLP N. 909 10/12/1990	1.852.582,08	1.852.582,08	1.852.582,08	Lavori collaudati	1990	08/04/1994	11/11/1995	Determinazione del contributo definitivo con DDLP n. 356 del 17/09/1997. La maggiore spesa rispetto al finanziato, pari a € 140.088,36 è a carico dell'ente
2	Opere accessorie relative all'impianto idrovoro del Canale Scolmatore e ristrutturazione rete di bonifica Favaro Veneto (VE)		DGR N. 1161 DEL 18/11/1988	DR N. 762 08/08/1990	774.685,36	774.685,36	774.685,36	Lavori collaudati	1988	30/11/1990	16/10/1992	Determinazione del contributo definitivo con DDLP n. 356 del 17/09/1997. La maggiore spesa rispetto al finanziato, pari a € 140.088,36 è a carico dell'ente
3	Risanamento e rinaturalizzazione del II tronco del canale Acque Basse	1/2.4a	DGR N. 3324 DEL 29/07/1986	DPGR 2436 03/10/1994	6.466.711,24	6.466.711,24	276.991,48	Lavori in corso				
4	Impianto idrovoro a servizio del Canale Scolmatore del fiume Marzenego - II stralcio	1/4.1	DGR N. 2773 DEL 21/08/1994	DDDA N. 72 02/11/1995	3.088.741,39	3.088.741,39	3.088.741,39	Lavori collaudati	23/11/1996	30/06/1997	06/12/1998	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 27 del 31/03/1999
5	Sistemazione Fiume Marzenego - Ramo Beccherie		DGR N. 6762 DEL 28/12/1994	DGCA N. 367 24/09/1997	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.142,25	Lavori collaudati	23/07/1999	23/01/2001	22/01/2002	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 132 del 26/11/2002
6	Ricalibrazione e sostegno nei sottobacini del Marzenego		DGR N. 8400 DEL 12/12/1995		1.291.142,25			Finanziamento convogliato nell'intervento 16 per € 1.291.142,25				

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione atto impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
7	Riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Dmgenzolo nell'area denominata "Oasi" in comune di Noale per la riduzione dei nutrienti versati nella laguna di Venezia. Progetto definitivo di 1° stralcio (il finanziamento di € 774.685,38 - DG	5/B/3.3										Con D.D.A. n° 18 del 29/02/01 e successivo D.D.A. n°38 del 09/04/01 il finanziamento è stato trasferito al comune di Noale
10	Sistema di monitoraggio e controllo della rete idrica scolante nella Laguna di Venezia. Interventi strutturali in reti di bonifica. Estensione del sistema di telecontrollo nel Bacino scolante/impianto per n. 24 stazioni.	5/B/6	DGR N. 6400 DEL 12/12/1998	DDDA N. 69 18/06/2001	813.419,82	813.419,82	813.419,82	Contabilità finale	14/06/2002			Determinazione del contributo definitivo con DDPV N. 161 11/11/2008
11	Interventi di riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Zero	5/B/1	DGR N. 6400 DEL 12/12/1998	DDDA N. 33 19/06/1998	7.230.396,69	7.230.396,69	7.230.396,69	Contabilità finale	18/11/1999	08/09/2003		Importo originale € 7.870.396,69. Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 105 del 08/06/2004. L'economia registrata convogliata negli int. 25 e 26
12	Interventi strutturali: riciallbrazione e sostegni sul sottobacino del fiume Dese (finanziamento iniziale: 8.263.310,39 euro)	5/B/2	DGR N. 6400 DEL 12/12/1998					Finanziamento di € 8.263.310,39 suddiviso negli interventi 12A (€ 4.131.655,19) e 12B (€ 4.131.655,19)				
12A	Ristrutturazione rete di bonifica dell'area centrale e del medio corso dei fiumi Dese e Zero e tributaria dei corsi d'acqua consortili: Piovega di C., Desolino, Rio S.Martino, Piovega di S., Rio S.Ammrogio, Piovega di L. e Piovega dei Tre Comuni, Fossa St	5/B/2.1	DGR N. 6400 DEL 12/12/1998	DDDA N. 83 11/06/2004	4.131.655,19	4.131.655,19	2.718.982,11	Lavori in corso				
12B	Ristrutturazione rete di bonifica tributaria dei collettori Marignana, Deviatore Piovega di Passaggia, Bacino Pisani, Passaggiana, Marocchesa e Terò in Comune di Venezia, Mogliano V.to e Scorze' (€ 4.131.655,19)	5/B/2	DGR N. 6400 DEL 12/12/1998		4.131.655,19			Progettazione in corso				
13	Interventi strutturali: riciallbrazione e sostegni sul sottobacino del Marzenego.	5/B/3	DGR N. 6400 DEL 12/12/1998		2.014.161,91			Progettazione in corso				
14	Sistemazione del fiume Marzenego - Ramo Beccherie in Venezia - Mestre, 1^a e 2^a pentola supplettiva e di variante.	5/B/3.1	DGR N. 6400 DEL 12/12/1998	DDDA N. 40 30/06/2000	309.874,14	309.874,14	309.874,14	Contabilità finale	23/07/1999	23/01/2001	22/01/2002	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 132 del 28/11/2002
15	Interventi di riqualificazione ambientale del corsi d'acqua della terraferma veneziana	5/B/3.2	DGR N. 6400 DEL 12/12/1998	DDDA N. 83 04/08/2000	4.848.112,69	4.648.112,69	4.628.058,83	Lavori collaudati	02/01/2002			Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 183 del 28/12/2005: registrata economia di € 23.068,18
16	Ricalibratura e sostegni nei sottobacini del Marzenego	A/10 V fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999		1.291.142,25			Finanziamento suddiviso negli interventi 16A (€ 309.874,14) e 16B (€ 981.268,11)				
16A	Interventi di ritenzione e controllo del deflussi idrici lungo il fiume Marzenego ed aree delle risorgive nei Comuni di Venezia, Martellago, Noale, Piombino Dese e Trebaseleghe - Sistemazione Rio La Fossetta (€ 309.874,14)	Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 16 (€ 309.874,14)						Progettazione in corso				Approvazione VIA con DGR N. 1549 DEL 14/06/02

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione del bando	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
16B	Interventi di riqualificaz. nell'area denominata "Oasi di Noale". 2° Stralcio (€ 981.268,11)		Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 16 (€ 981.268,11)					Progettazione in corso				
17	Riqualificazione ambientale della fossa Storta e interventi presso cave Preallo e Marcon	D/78	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000		2.582.284,50			Progettazione in corso				
18	Riqualificazione ambientale del bacino del canale scolmatore del F.Marzenego e interv. sugli affluenti	D/77	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000		5.032.284,50			Finanziamento diviso negli interventi 18A (€ 2.582.284,50) e 18B (€ 2.582.284,50)				
18A	Interventi nella zona a monte del bacino del canale Scolmatore del f. Marzenego e suoi affluenti	D/77	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000					Progettazione definitiva in corso				
18B	Interventi di riqualificazione fluviale nella zona di bacino del canale Scolmatore del f. Marzenego. Completamento Rio Roviego e sistemazione idraulica Rio Storto - Stralcio cave	D/77.1	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000	DDPV 16 28/02/2006	2.714.568,99	2.714.568,99		Progetto approvato				
19	Ricalibrazione e sostegni su sottobacini del Dese e Zero. II° stralcio - scolo Zermason	2/E/1	DGR N. 784 DEL 09/04/2002		1.291.142,25			Progettazione in corso				
20	Ricalibrazione e sostegni su sottobacini del Dese e Zero. II° stralcio - scolo Rustaghin	2/F/1	DGR N. 784 DEL 09/04/2002		1.291.142,25			Progettazione in corso				
21	Ricalibrazione e sostegni su sottobacini del Dese e Zero. II° stralcio - scolo Zeretto	2/G/1	DGR N. 784 DEL 09/04/2002		1.032.913,80			Progettazione in corso				
22	Ricalibrazione e sostegni su sottobacini del Dese e Zero. II° stralcio - scolo Vernise	2/H/1	DGR N. 784 DEL 09/04/2002		2.582.284,50			Progettazione in corso				
23	Ricalibrazione e sostegni su sottobacini del fiume Marzenego e del suo scolmatore. II° stralcio - scolo Organzolo	2/I/1	DGR N. 784 DEL 09/04/2002		774.685,35			Progettazione in corso				
24	Ricalibrazione e sostegni su sottobacini del fiume Marzenego e del suo scolmatore. II° stralcio - scolo Dese e prolungamento	2/L/1	DGR N. 784 DEL 09/04/2002		774.685,35			Progettazione in corso				
25	Interventi di riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Zero per il controllo e la riduzione dei nutrienti sversati nella Laguna di Venezia - Completamento ed adeguamento	6/B/1.2	DGR N. 1140 DEL 18/04/2003	DDTA N. 84 02/07/2003	403.848,02	403.848,02	403.848,02	Contabilità finale	03/07/2003	08/09/2003		Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 105 del 08/06/2004
26	Interventi di riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Zero per il controllo e la riduzione dei nutrienti sversati nella Laguna di Venezia - Completamento ed adeguamento	B/23	DGR N. 1140 DEL 18/04/2003	DDTA N. 84 02/07/2003	36.151,98	36.151,98	6.501,93	Contabilità finale	03/07/2003	08/09/2003		Registrata, con DDDA n. 108 del 08/06/2004, un'economia di € 29.650,05
27	Riqualificazione ambientale del basso corso del fiume Marzenego - Osellino per la riduzione ed il controllo dei nutrienti sversati in Laguna - integrazione tra la rete principale di bonifica ed il sistema di smaltimento delle acque meteoriche	B/7	DCR N. 24 DEL 04/08/2004		7.000.000,00			Progettazione in corso				

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione atto impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio e consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
28	Estensione, completamento e gestione della Zona Tampone arborea realizzata presso l'Azienda Diana di Veneto Agricoltura, con raccolta ed elaborazione di dati per il monitoraggio dell'efficacia della fascia tampone arborea nel controllo dell'inquinamento	D1/29	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 120 28/07/2006	1.000.000,00	1.000.000,00		Progettazione in corso				
29	Interventi strutturali in rete minore di bonifica - Ricalibrazione e sostegni su sottobacchi del Marzenego - 2° Stralcio, Ramo di Noale e Rio Storto a monte di Maserne	D1/30	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.000.000,00			Progettazione in corso				
30	Ristrutturazione rete di bonifica tributaria del collettori Marignana, Deviatore Piovega di Peseggia, Bacino Pisani, Peseggiana, Marocchesa e Terdi in Comune di Venezia, Mogliano V.to e Scorzè (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI delTint. 12B)	D1/19	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.950.000,00			Progettazione in corso				
31	Ristrutturazione rete di bonifica dell'area centrale e del medio corso dei Rumi Desa e Zero e tributarie dei corsi d'acqua consortili: Piovega di C., Desolino, Rio S.Martino, Piovega di S., Rio S.Ammoglo, Piovega di L. e Piovega del Tre Comuni, Fossa St	D1/20	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDTA N. 238 20/12/2006	800.000,00	800.000,00		Progetto approvato				
32	Interventi strutturali: ricalibrazione e sostegni sul sottobacino del Marzenego. (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI delTint. 13)	D1/21	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		800.000,00			Progettazione in corso				
33	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Riqualificazione ambientale del bacino del canale Scolmatore del fiume Marzenego e interventi sugli affluenti (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI delTint. 16)	D1/22	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		200.000,00			Progettazione in corso				
34	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibrazione e sostegni sul sottobacino del Dese e Zero. II stralcio - scolo Zamnason (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI delTint. 19)	D1/23	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		200.000,00			Progettazione in corso				
35	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibrazione e sostegni sul sottobacino del Dese e Zero. II stralcio - scolo Rustaghin (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI delTint. 20)	D1/24	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		150.000,00			Progettazione in corso				
36	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibrazione e sostegni sul sottobacino del Dese e Zero. II stralcio - scolo Zerotta (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI delTint. 21)	D1/25	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		80.000,00			Progettazione in corso				
37	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibrazione e sostegni sul sottobacino del Dese e Zero. II stralcio - scolo Vernise (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI delTint. 22)	D1/26	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		850.000,00			Progettazione in corso				

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio e consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
38	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibrazione e sostegni sul sottobacino del Dese e Zero. II stralcio - scolo Draganziolo (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'Int. 23)	D1/27	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		50.000,00			Progettazione in corso				
39	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibrazione e sostegni sul sottobacino del Dese e Zero. II stralcio - scolo Dosa e prolungamento (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'Int. 24)	D1/28	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		120.000,00			Progettazione in corso				
40	Interventi nel Bacino Scolante in Laguna di Venezia per la bonifica di aree precedentemente occupate da discariche, inceneritori, attività industriali, ecc.	B/15	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		3.000.000,00			Progettazione in corso				
	TOTALI				74.250.513,00	35.060.968,92	23.201.280,89					

CONSORZIO DI BONIFICA DESTRA PIAVE

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio e consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Sostegni e incremento tempi di ritenzione delle acque del sottobac. Vela: risezionamento corsi d' acqua, manufatti di controllo, nuovi collegamenti e recupero capacità d' invaso nei comuni di S. Biagio di Callalta, Monastier, Roncade.	B/14 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 29 27/3/2003	516.456,90	516.456,90	516.456,90	Contabilità finale	14/05/2003			Lavori collaudati.DDDA 157 del 20/9/2005 determinazione contributo definitivo. Con DDDA 29/03 stabilito nuovo termine fine lavori
2	Sostegni e incremento tempi di ritenzione delle acque del sottobac. Vela: risezionamento corsi d' acqua, manufatti di controllo, nuovi collegamenti e recupero capacità d' invaso nei comuni di S. Biagio di Callalta, Monastier, Roncade.	D/81	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 29 27/3/2003	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	Contabilità finale	14/05/2003			Lavori collaudati.DDDA 157 del 20/9/2005 determinazione contributo definitivo. Con DDDA 29/03 stabilito nuovo termine fine lavori
3	Interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia nel Bacino Vela: diversione delle acque, recupero della capacità di invaso, manufatti di controllo e fitodepurazione.	2/U/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		1.549.370,70			Progettazione in corso				
4	Risanamento dell' alto corso del fiume Meolo in area ad alta intensità di allevamenti ittici e colture agricole	2/V/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 114 18/10/2002	1.032.913,80	51.645,69	51.645,69	Progettazione in corso				Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione
6	Risanamento dell'alto corso del fiume Meolo in area di alta densità di allevamenti ittici e colture agricole	D1/31	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		500.000,00			Progettazione preliminare				

6	Diversione delle acque, recupero della capacità di invaso, manufatti di controllo e fitodepurazione	D1/32	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.000.000,00		Progettazione preliminare					
	TOTALI				6.148.112,09	2.117.473,29	2.117.473,29					

CONSORZIO DI BONIFICA PEDEMONTANO BRENTELLA DI PEDEROBBA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Bonifica ex - cava di Riese denominata "Cava Bergamin"	D/84	DGR N. 1634 DEL 23/06/2000	DGR N. 2621 DEL 10/10/2001	823.748,75	823.748,75	613.796,31	Lavori in corso	15/04/2003			Vedi scheda riepilogativa degli interventi relativi alla bonifica dei siti inquinati nel bacino scolante.
2	Sistemazione dello scarico di Salvarosa a monte della confluenza nel fiume Zero	5/D/3	DGR N. 1140 DEL 18/04/2003		780.000,00			Progettazione in corso				
3	Sistemazione dello scarico di Salvatronda a monte della confluenza nello Zero in Comune di Castelfranco	D1/33	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.400.000,00			Progettazione in corso				
4	Riconversione del sistema irriguo in Comune di Vedelago, zona di Fanzolo e Barcon - Riconversione da scorrimento ad aspersione (pluvirrigazione) su un'area di 1.200 Ha	D2/45	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV 179 30/10/2006	6.840.000,00	6.840.000,00		Progettazione in corso				
	TOTALI				9.843.748,75	7.663.748,75	613.796,31					

CONSORZIO DI BONIFICA SINISTRA MEDIO BRENTA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Interventi urgenti alla stazione di sollevamento di Malcontenta	1/3.3a	DGR N. 2549 DEL 30/4/1992	DDEA N. 59 11/12/1991	206.582,76	206.582,76	206.582,76	Lavori ultimati.				Intervento inizialmente affidato al CVD poi revocato (DDEA N. 2549 del 30/04/1992) e affidato a questo consorzio. Le date non sono reperibili.
2	Lavori di sistemazione idraulica e di ricalibratura della rete di bonifica di Chirignago e di interconnessione con l'impianto idrovoro di Malcontenta.	4b	DGR N. 3324 DEL 29/7/1996		774.685,35			Finanziamento convogliato nell'intervento 8A				Impegno pari a € 774.685,35 disimpegnato con decreto Direzione Bilancio nn. 6, 7 e 9 del 07/04/2004
3	Potenziamento dell'impianto idrovoro di Malcontenta (finanziato effettivo: L. 2,5 MLD)	4 c	DGR N. 3324 DEL 29/7/1996	DDDA N. 39 19/5/1999	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.142,25	Lavori collaudati	12/06/2000	03/06/2002		Determinazione del contributo definitivo con DDPV 97 del 23/06/2006

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

4	Progetto integrato Fusina P.I.F. (Ricalibrature degli scoli Fondi a Est e fondi a Sud e sottopasso del Naviglio)	1/A/1	DGR N. 3324 DEL 28/7/1998	DDDA N. 40 19/5/1999	1.652.662,08	1.652.662,08	127.166,63	Lavori in corso						
5	Progetto integrato Fusina P.I.F. (Ricalibratura canali di bonifica Bastie, Foscara e Giare)	1/A/2 .2	DGR N. 3324 DEL 28/7/1998	DDDA N. 100 22/10/1999	2.608.107,34	2.608.107,34	282.787,63	Finanziamento convogliato nell'intervento 6A						
6	PARCO LAGUNARE DI MIRA - EX Progetto integrato Fusina P.I.F. (Ricalibratura canali di bonifica Bastie, Foscara e Giare)	1/A/2 .3	DGR N. 33 DEL 12/1/1999	DDDA N. 100 22/10/1999	1.187.850,87	1.187.850,87	0,00	Finanziamento convogliato nell'intervento 6A						
6A	Progetto integrato Fusina P.I.F. (Ricalibratura canali di bonifica Bastie, Foscara, Giare) (€ 3.796.958,22)		Riunti i finanziamenti 6 (€ 2.608.107,34) + 8 (€ 1.187.850,87) = € 3.796.958,22					Progettazione in corso						
7	Progetto integrato Fusina P.I.F. (Potenziamento impianto idrovoro di Dogaletto in comune di Mira)	1/A/2 .1	DGR N. 3324 DEL 28/7/1998	DDDA N. 38 19/5/1999	2.656.481,65	2.656.481,65	2.656.481,65	Lavori ultimati	12/06/2000	28/06/2002	Lavori ultimati - collaudo in corso			
8	Sistemazione idraulica e ricalibratura della rete di bonifica dal bacino di Chirignago e interconnessione all' impianto idrovoro di Malcontenta	1/B/2	DGR N. 3324 DEL 28/7/1998	DDDA N. 101 22/10/1999	2.065.827,60	2.065.827,60	195.153,33	Finanziamento convogliato nell'intervento 8A						
8A	Sistemazione idraulica e ricalibratura della rete di bonifica del bacino di Chirignago e interconnessione all' impianto idrovoro di Malcontenta (€ 2.840.512,85)		Riunti i finanziamenti 2 (€ 774.685,35) + 8 (€ 2.065.827,60) = € 2.840.512,95					Progettazione in corso						
9	Progetto integrato Fusina P.I.F. (Invasi di laminazione e sedimentazione in aree depresse per circa 30 ha con sistemazione a parco e con restituzione all'idrovora di Malcontenta)	1/B/3	DGR N. 3324 DEL 28/7/1998		1.549.370,70			Finanziamento convogliato nell'intervento 11A			Fondi disimpegnati con DGR N. 5087/98			
10	Interventi strutturali in rete di bonifica - Sistema di telecontrollo	6/B/5	DGR N. 2558 DEL 27/7/1999		619.748,28	619.748,28	0,00	Progetto approvato			In attesa di coordinamento con l'intervento di ARPAV codice 6/A/1			
11	Progetto dimostrativo integrazione rete fognaria e di bonifica	B/13.1 V fase	DGR N. 2824 DEL 3/8/1999		1.820.188,28			Finanziamento convogliato nell'intervento 11A			Con decreto 230/05 impegnati € 218.000 a favore I.d.I. ACM per opere complementari			
11A	Progetto dimostrativo integrazione rete fognaria e di bonifica (L'importo complessivo del progetto è pari a € 8.234.568,98, di cui € 5.184.668,99 costituiscono il primo stralcio)		Riunti i finanziamenti 9 (€ 1.549.370,70) + 11(€ 3.615.198,29) = € 5.164.568,99					Progettazione in corso			L'importo di € 5.184.668,99 è costituito da uno stralcio di € 2.469.568,99 affidato al Consorzio e da uno stralcio di € 2.695.000,00 all' A.C.M.			
12	Realizzazione di un sistema di contenimento e fitodepurazione delle acque della zona a Nord del naviglio brenta	D/76	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 11 25/01/2005	4.131.658,19	4.131.658,19	1.028.841,03	Lavori in corso			Decreto di impegno dell'opera			
13	Riassetto idraulico e rinaturalizzazione dell' asta principale del bacino Pionca a monte del sifone sotto il taglio di Mirano, nei comuni di Mira, Dolo, Pianiga e Mirano	2/G/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 89 12/10/2002	2.065.827,60	103.291,38	103.291,38	Progettazione in corso			Decreto di impegno ed erogazione limitati alle sole spese di progettazione			
14	Completamento della sistemazione idraulico-ambientale dello scolo Lusore a monte della botte a sifone del taglio di Mirano	2/R/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 96 12/10/2002	2.065.827,60	103.291,38	0,00	Progettazione in corso			Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione			

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

15	Ricalibratura con rinaturalizzazione del sistema di collettori di bonifica e ridosso di Camposampiero (Fossa Maun, Orcone, S. Marco e Vandura).	2/S/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 104 12/10/2002	1.032.913,80	51.648,69	0,00	Progettazione in corso			Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione
16	Rissetto della rete scolante del sottobacino dell' Arzere	2/T/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 102 12/10/2002	1.032.913,80	51.648,69	0,00	Progettazione in corso			Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione
17	Ammodernamento e potenziamento impianto idrovoro di Dogaletto a Mira (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'Int. 7)	D1/34	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDDA N. 218 17/11/2004	310.000,00	310.000,00	309.164,18	Lavori collaudati			Registrata, con DDPV n. 84 del 08/06/2006, economia di € 1.848,82
18	Ricalibratura scoli Fondi a Est e Fondi a Sud e Malcontenta (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'Int. 4)	D1/35	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		206.582,00			Lavori in corso			
19	Sistemazione idraulica e ricalibratura rete di bonifica bacino Chirignago Malcontenta (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'Int. 8A)	D1/36	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		774.564,00			Progettazione in corso			
20	Ricalibrazione e rinaturalizzazione della rete idraulica del bacino Gambarare - Mira (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'Int. 8A)	D1/37	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		852.152,00			Progettazione in corso			
21	Progetto dimostrativo per integrazione di rete di fognatura bianca e rete di bonifica (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'Int. 11A)	D1/38	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		488.478,42			Progettazione in corso			
22	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Realizzazione di un sistema di contenimento e fitodepurazione delle acque della zona a nord del Naviglio Brenta (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'Int. 12)	D1/39	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDPV N. 139 28/08/2006	300.000,00	300.000,00		Progetto approvato			
23	Rissetto idraulico e rinaturalizzazione dell' asta principale del bacino Pionca e monte del sifone sotto il taglio di Mirano, nei comuni di Mira, Dolo, Pianiga e Mirano (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'Int. 13)	D1/40	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.032.913,80			Progettazione in corso			
24	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Rissetto della rete scolante del sottobacino Rio dell'Arzere (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'Int. 16)	D1/41	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.549.370,70			Progettazione in corso			
25	Riconversione irrigua di preesistenti impianti a scorrimento nella zona di Cittadella, S.Martino di Lupari e Castelfranco	D2/46	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		174.240,00			Progetto approvato			
26	Indagine preliminare sulla qualità dei terreni da scavo	B/15	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		200.000,00			Progettazione in corso			Somma assegnata con DGR 4529/04.
27	Completamento piano caratterizzazione della qualità di scavo dei collettori consorziali fondi sud e fondi sud-est (bacini scolo meccanico di Malcontenta)	B/15	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		180.000,00			Progettazione in corso			Somma assegnata con DGR 4529/04.
	TOTALI				32.700.198,14	17.239.912,15	6.097.589,73				

PAGINA BIANCA

SEZIONE IV: REGIONE VENETO

Nota:
REGIONE VENETO – BONIFICA SITI INQUINATI: I fondi vengono ripartiti con Deliberazione della Giunta Regionale tra i diversi soggetti attuatori (vedi anche scheda riepilogativa pag. 115)
REGIONE VENETO / CONSORZIO VENEZIA DISINQUINAMENTO: gli interventi con i numeri evidenziati in grigio sono stati realizzati direttamente dalla Regione Veneto, tramite il C.V.D.)
REGIONE VENETO – FORESTE/AGRICOLTURA/ZOOTECNIA: I fondi vengono ripartiti con Deliberazione di Giunta Regionale tra i diversi soggetti attuatori (Consorzi di Bonifica ed aziende Agricole)

PAGINA BIANCA

REGIONE: ACQUEDOTTI

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio e consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Condotta Cà solaro - Gazzera	D/90	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DGCA N. 178 19/4/2001	4.002.540,97	6.197,48	6.197,48	Progettazione in corso				
2	Condotta Cà solaro - Cavallino	D/89	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DGCA N. 178 19/4/2001	6.972.168,14	13.427,88	13.427,88	Progettazione in corso				
	TOTALI				10.974.709,11	19.625,36	19.625,36					

REGIONE: DISINQUINAMENTO / CONSORZIO VENEZIA DISINQUINAMENTO (C.V.D.)

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio e consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Somme in amministrazione per spese tecniche e notarili	1/1.22		DPGR 2553 31/12/1990	424.340,91	424.340,91	424.340,91					
2	Impianto di sollevamento e modulazione del bacino di Zelarino.	1/1.3		DDDA N. 7 12/9/1990	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	Lavori collaudati				Variazione finanziamento con DDDA n. 81/96. Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 55/2001
3	Lavori di costruzione dello scolmatore di via del Bosco a Chirignago - Mestre (VE)	1/1.2		DDDA N. 6 12/9/1990	1.652.662,08	1.652.662,08	1.652.662,08	Lavori collaudati			31/07/1997 30/03/1998	Variazione finanziamento con DDDA n. 76/98. D.C.F. 23 del 22/06/1998
4	Lavori di ristrutturazione delle reti fognarie del Cavallino (VE)	1/1.11		DDDA N. 19 12/11/1990	1.931.597,89	1.931.597,89	1.931.597,89	Lavori collaudati			22/07/1995	Finanziamento originale pari a € 2.065.827,60. DCF 147 del 24/03/1998. Economia, pari a € 134.229,71, convogliata nell'int. 24
5	Lavori di completamento dei sistemi principali di collettamento della rete fognaria di Chioggia (VE)	1/1.8	N. 744 DEL 1/7/1988	DDDA N. 12 12/9/1990	4.899.757,78	4.899.757,78	4.358.762,66	Lavori collaudati				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 82 del 16/02/1999 e trasferita economia al Comune di Chioggia con DDDA 16/1999
6	Lavori di costruzione rete di fognatura zona di via Martiri di Marzabotto - bacino Gazzera - Mestre (VE)	1/1.14		DDDA N. 28 18/12/1990	1.344.229,74	1.344.229,74	1.344.229,74	Lavori collaudati			07/07/1994	Finanziamento originale pari a € 1.446.079,32. DCF 47/1996. Economia, pari a € 101.849,58, convogliata nell'int. 24
7	Lavori di estensione delle reti fognarie secondarie di Chioggia e Sottomarina (VE)	1/1.15		DDDA N. 29 18/12/1990	3.042.086,08	3.042.086,08	3.042.086,07	Lavori collaudati				Finanziamento originale pari a € 3.047.095,70. DCF 96 del 06/08/2001. Economia, pari a € 5.009,62, convogliata nell'int. 24

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione ed/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
8	Lavori di costruzione delle opere fognarie di collettamento delle frazioni a sud di Codevigo	1/1.23	DGR N. 6263 DEL 2/10/1990	DDDA N. 13 18/2/1991	995.302,76	995.302,76	995.302,76	Lavori collaudati			13/03/1997	Finanziamento originale pari a € 1.032.913,80. DCF DGCA 161/1998. Economia, pari a € 37.611,00, convogliata nell'Int. 24
9	Lavori di costruzione dei collettori fognari di collegamento all'impianto di depurazione di Musile di Piave (VE)	1/1.13	DGR N. 744 DEL 1/7/1988	DDDA N. 25 12/12/1990	980.677,05	980.677,05	980.677,05	Lavori collaudati			22/10/1998	Finanziamento originale pari a € 1.032.913,80 . DCF DDDA 106 del 26/10/1999. Economia, pari a € 52.336,76, convogliata nell'Int. 24
10	Lavori di costruzione nuovo impianto di sollevamento nel bacino di via Torino e collegamento bacino di S. Giuliano	1/1.17		DDDA N. 31 18/12/1990	770.689,83	770.689,83	770.689,83	Lavori collaudati			14/08/1998	Finanziamento originale pari a € 774.685,33. DCF DDDA n. 48 del 14/08/1998. Economia pari a € 3.995,52 convogliata nell'Int. 24
11	Lavori di costruzione della rete di fognatura della zona di via Asseggiano - bacino Gazzera (VE)	1/1.1	DGR N. 744 DEL 1/7/1988	DDDA N. 5 12/8/1990	835.121,92	835.121,92	835.121,92	Lavori collaudati			07/07/1995	Finanziamento originale pari a € 877.976,73 . DCF DDDA 42/1998. Economia, pari a € 42.854,81, convogliata nell'Int. 24
12	Lavori di completamento della fognatura nella zona Nord-Est del Comune di Campagna Lupia (VE)	1/1.18		DDDA N. 30 18/12/1990	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	Lavori collaudati			31/05/1997	Variazione finanziamento con DDDA n 564 del 18/12/1997. Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 83 del 16/03/1998
13	Lavori di costruzione della rete secondaria di fognatura bacino di Chirignago - Mestre (VE)	1/1.10		DDDA N. 15 11/10/1990	1.298.767,42	1.298.767,42	1.298.767,42	Lavori collaudati			21/06/1994	Finanziamento originale pari a € 1.497.725,01. DCF 48 del 20/03/1998. Economia, pari a € 198.967,59, convogliata nell'Int. 24
14	Lavori di costruzione della rete secondaria di fognatura bacino di Carpenedo - Mestre (VE)	1/1.12		DDDA N. 20 12/11/1990	972.642,76	972.642,76	972.642,76	Lavori collaudati			08/11/1994	Finanziamento originale pari a € 1.032.913,80. DCF 106 del 19/08/1998. Economia, pari a € 60.271,04, convogliata nell'Int. 24
15	Lavori di costruzione della rete fognaria del Lido di Venezia - VI lotto	1/1.7		DDDA N. 11 12/8/1990	1.136.206,18	1.136.206,18	1.068.606,88	Lavori ultimati				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 63 del 20/05/2002
16	Fognatura bacino San Giuliano	1/1.6		DDDA N. 10 12/8/1990	433.816,22	433.816,22	433.816,22	Lavori collaudati			16/05/1994	Finanziamento originale pari a € 464.811,21. DCF 18 del 03/03/1997. Economia, pari a € 30.994,99, convogliata nell'Int. 24
17	Redazione del Piano Direttore				516.456,90	516.456,90	516.456,90	Intervento concluso				
18	Lavori di adeguamento delle reti fognarie e dell'impianto di depurazione - reti di Jesolo Lido (VE)	1/1.4	DGR N. 6263 DEL 2/10/1990	DDETA N. 8 12/8/1990	2.698.497,30	2.698.497,30	2.652.463,24	Lavori collaudati				Determinazione del contributo definitivo con DGCA n. 151/1998

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione atto impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
19	Lavori di estensione della rete interna ed il collegamento alla rete consortile - Comune di Mira (I parte)	1/1.19	DGR N. 5263 DEL 2/10/1990	DDDA N. 34 19/12/1990	3.352.130,39	3.279.236,81	3.279.236,81	Lavori collaudati			30/05/1996	Finanziamento originale pari a € 3.356.969,84. DCF n. 76/1997. Economia pari a € 77.733,23 convogliata nell'int. 24
20	Lavori di teleregolazione e telecontrollo della fognatura di Jesolo - Philips	1/1.22		DPGR 2883 31/12/1990	627.508,56	627.508,56	627.508,56	Lavori collaudati				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n.84 del 12/09/2002
21	Lavori di adeguamento reti e impianto di depurazione di Jesolo (VE) - opere civili ed elettromeccaniche	1/1.22		DPGR 2883 31/12/1990	448.078,81	448.078,81	448.078,81	Lavori collaudati			28/06/1996	Determinazione del contributo definitivo con DGCA n.125/1998
22	Ispezioni televisive	1/1.22		DPGR 2883 31/12/1990	77.590,68	77.590,68	77.590,68	Lavori collaudati			22/03/1995	Determinazione del contributo definitivo con DGCA n.125/1998
23	Piano pilota W.R.C.	1/1.22		DPGR 2883 31/12/1990	327.330,36	327.330,36	327.330,36	Lavori collaudati				Determinazione del contributo definitivo con DGCA n.125/1998
24	RIUTILIZZO ECONOMIE L. 910/88 Es. 1987/88	1/1. ECO	DGR 2617 DEL 13/09/2002		618.094,08	618.094,08	535.906,01	Lavori in corso				
25	Lavori di costruzione delle opere fognarie di collettamento delle frazioni a sud di Codevigo. RIUTILIZZO ECONOMIA	1/1.23 ECO		DGR 1356 21/04/1998	28.077,39	28.077,39	28.077,39	Lavori ultimati				
26	Lavori di estensione rete interna e collegamento alla rete consortile - Comune di Mira - II parte	1/1.18		DDDA N. 32 18/12/1990	3.068.741,39	3.068.741,39	3.003.584,63	Lavori collaudati			12/07/1996	Registrata, con DDDA n. 73 del 30/06/1997, un'economia di € 95.156,76
	RIUTILIZZO ECONOMIA LEGGE 910/88 Es. 1989	1/1. ECO	PCR 745 DEL 01/07/1998	DDPV 41 29/03/2006	62.241,46	13.460,22	0,00	Lavori in corso				
27	Aggiornamento Piano Direttore II^ fase, monitoraggio acque sfocianti in laguna e fognature di Venezia	1/2.16 Penna	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991		1.814.488,82	1.612.368,41	1.546.668,55	Lavori in corso				
28	Progetto integrato Fusina (P.I.F.)	1/2.5.A	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991		702.897,83	657.192,96	657.192,96	Lavori in corso				
29	Aggiornamento del Piano Direttore	1/2.16	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991		967.795,88	967.795,88	959.682,38	Lavori ultimati				
30	Impianto integrato di Fusina - P.I.F. (linea di filtrazione per il riutilizzo industriale delle acque trattate - I° stralcio)	1/2.5	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991		96.506,54	96.506,54	96.506,54	Intervento concluso				Quota spesa per la sola progettazione
31	Progetto integrato Fusina (P.I.F.)	1/6.1	DGR N. 45 DEL 15/07/1999	DGR N. 2121 DEL 2004	7.229.137,98	1.799.099,61	62.400,00	Lavori in corso				Impegno di spesa a favore dello IUAV
32	Progetto integrato Fusina (P.I.F.)	1/6.3	DGR N. 45 DEL 15/07/1999	DDPV N. 125 09/08/2006	8.263.310,39	8.263.310,39	3.549.600,00	Lavori in corso				
33	Quota regionale agenzia per Venezia											Finanziamento di € 5.164.568,99 revocato con DDDA n. 108 del 28/10/1999

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione atto impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio e consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
34	Progetto Integrato Fusina (P.I.F.)	6/N/1	DCR N. 24 DEL 04/05/2004 (PCR 1115/95 di assegnazione dei fondi)		12.181.000,00			Finanziamento convogliato nell'intervento 44A				Finanziamento proveniente da fondi rivenienti da cui alla legge 139/92 II fase (schede 4/A/1 e 4/A/2 destinati alla Direzione Politiche Agroambientali e Servizi per l'Agricoltura)
35	Progetto Integrato Fusina (P.I.F.)	B/1 MM 3^ fase	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		21.342.812,00			Finanziamento convogliato nell'intervento 44A				
36	Realizzazione Carta Geologica della Laguna	B/22.1 IV fase	DCR N. 23 DEL 1/3/2000	DGR N. 3788 1/12/2000	309.874,14	309.870,17	308.322,85	Lavori ultimati				
37	Informazione, stampa, divulgazione, Piano Direttore, carta geologica della laguna	B/22 IV fase	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		451.899,79	428.730,01	428.129,97	Lavori in corso				
38	Progetto Integrato Fusina (reflui civili industriali) - P.I.F.	A/3	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999		18.075.991,47							
39	Contributi per riduzione inquinamento atmosferico (comune VE)	E/84	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		2.582.284,50	102.000,00		Lavori in corso				Intervento congiunto Regione Veneto/Comune di Venezia
40	Studi e sperimentazioni per interventi coordinati di riduzione dell'inquinamento e del trasporto di sedimenti dalla laguna	E/85	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDOA N. 43 DEL 2002	91.142,25	85.427,85	34.427,85	Lavori in corso				
41	Informazione, stampa, divulgazione, Piano Direttore, carta geologica della laguna	E/83	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		1.032.913,80	837.068,80	671.206,85	Lavori in corso				
42	Progetto Integrato Fusina (P.I.F.)	1/O/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		15.493.706,97							
43	Progetto Integrato Fusina (P.I.F.)		DCR N. 24 DEL 04/05/2004		9.919.447,16			Finanziamento convogliato nell'intervento 44A				
44A	Progetto Integrato Fusina (P.I.F.)	B/1	Riunito i finanziamenti 43 (€ 9.919.447,16), 34 (€ 12.181.000,00) e 35 (€ 21.342.812,00) = € 68.278.000,00					Progetto approvato				
45	Accordo di programma relativo a progetti di ricerca, sperimentazione e utilizzo dell'idrogeno tra Regione Veneto e Ministero dell'Ambiente	B/11	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		5.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Progetto preliminare				
46	Attività di studi, ricerche, indagini e divulgazione, cocernenti il Piano Direttore 2000	B/16	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		700.000,00							
	TOTALI				141.007.818,78	63.990.471,91	42.399.717,02					

REGIONE: BONIFICA SITI INQUINATI

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione atto impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio e consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Bonifica siti inquinati in Comune di Venezia - Zona Industriale di Marghera	C/24/1	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA 95/03 DGR 2392/03 DGR 1948/03	498.721,69	498.272,22	187.116,78	Lavori in corso				Fondi a disposizioni della Regione Veneto da utilizzare assieme ai fondi di cui al D.M. 468/2003
2	Accordo integrativo per la chimica di Porto Marghera - MASTER PLAN.(Bonifica siti inquinati in comune di Venezia - Z. I. di Porto Marghera)	C/24/1.1	DCR N. 45 DEL 16/7/1999	DDDA N. 37 23/4/2002	551.575,97	551.575,97	551.575,97	Lavori ultimati	Date diverse			Esecuzione dei lavori affidata a 5 soggetti attuatori.
	Interventi legati all'attuazione dell' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383/2004. Bonifica area Porto Marghera.	C/24/1.A	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 109 04/07/2005	784.388,84	784.388,84	784.388,84	Lavori in corso				
	Bonifica siti inquinati in comune di Venezia - Zona Industriale di Porto Marghera	C/24/1.B	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999		747.899,50	728.371,50	534.843,90	Lavori in corso				
	Interventi legati all'attuazione dell' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383/2004. Bonifica area Porto Marghera.	B/19 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999		3.400.000,00							
3	Bonifica siti inquinati P.Marghera	B/16.1 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 109 04/07/2005	5.126.345,12	5.126.345,12	5.126.345,12			Fondi a disposizioni della Regione Veneto da utilizzare assieme ai fondi di cui al D.M. 468/2003. Il finanziamento complessivo pari a € 7.643.562,11, comprende anche una quota pari a € 1.516.216,99 destinata al Comune di Venezia per la bonifica delle Corti Femminili		
	Interventi legati all'attuazione dell' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383/2004. Oneri connessi al funzionamento della gestione Commissariale.	B/16.2 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 67 26/04/2005	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00					
4	Indagine epidemiologica Marghera	B/18 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999		103.291,38			Progettazione in corso				
5	Bonifica dell' area industriale ex Italsintex in comune di Camposampiero (PD)	D/84	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DGR N. 4136 22/12/2000	39.291,84	39.291,84	39.284,92	Lavori in corso				Liquidazione sospesa
6	Interventi legati all'attuazione dell' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383/2004. Bonifica area Porto Marghera.	D/83A	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 109 04/07/2005	1.483.310,39	1.483.310,39	1.483.310,39	Lavori ultimati				Fondi a disposizioni della Regione Veneto da utilizzare assieme ai fondi di cui al D.M. 468/2003
7	PROGETTO INTEGRATO FUSINA	D/83B	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		6.800.000,00							
8	Interventi legati all'attuazione dell' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383/2004. Bonifica area Porto Marghera.	E/85	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		1.200.000,00							Con DGR 967 del 11/04/2006 destinazione somme al Commissario

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione atto impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
9	MASTERPLAN bonifica Porto Marghera	4/A/2	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		616.456,90	89.000,00	38.500,00	Lavori in corso				In attesa del decreto di impegno
10	Interventi nel Bacino Scolante in Laguna di Venezia per la bonifica di aree precedentemente occupate da discariche, inceneritori, attività industriali ecc.	B/16	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		952.250,26	44.500,00	35.014,88	Lavori in corso				
	TOTALI				23.182.229,88	10.324.053,88	9.789.378,80					

REGIONE: FORESTE / AGRICOLTURA / ZOOTECNIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione atto impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Recupero ambientale e valorizzazione dell'area di S. Giuliano (VE) - Bosco di Mestre - I stralcio	1/3.4	DGR N. 6243 DEL 30/10/1991	DDEA N. 33 DEL 28/9/1993	462.932,70	216.807,60	216.807,60	Lavori ultimati				Progetto affidato al Centro Veneto Disinquinamento (CVD) e direzione lavori affidata all'Azienda Regionale Foreste (A.R.F.)
2	Progetto per la realizzazione del Bosco di Mestre - II stralcio	1/4.8	DGR N. 6211 DEL 18/11/1993	DGCA N. 842 DEL 10/12/1997	408.756,90	229.532,47	229.532,47	Lavori in corso				Progetto esecutivo e direzione lavori affidata all'Azienda Regionale Foreste (A.R.F.)
3	Recupero ambientale e valorizzazione dell'area di S. Giuliano (VE) - Bosco di Mestre - II stralcio		DGR N. 5211 DEL 18/11/1993	DDOA N. 73 DEL 03/08/2005	688.681,09	680.845,25	0,00	Progetto approvato				Progetto esecutivo e direzione lavori affidata all'Azienda Regionale Foreste (A.R.F.)
4	Interventi strutturali: gestione idraulica del deflussi delle superfici agricole - I lotto (3.2a) (€ 15.493.706,97)	2/D/1	DGR N. 2876 DEL 28/7/1998	VARI	15.493.706,97	13.520.851,25	11.640.532,26					Importo complessivo del finanziamento pari a € 6.713.939,69, di cui € 2.610.813,37 destinati al Progetto Integrato Fusina (vedi scheda Regione: Disinquinamento Int. 34)
5	Protezione zootecnia: gestione reflui zootecnici(3.3a)	4/A/1	DGR N. 2876 DEL 28/7/1998	VARI	1.884.191,81	1.884.191,81	1.745.808,81	Verifiche di collaudo				

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
6	Protezione zootecnia: Interventi strutturali in zootecnia(3.3b).	4/A/2	DGR N. 2878 DEL 28/7/1998	VARI	9.994.317,15	8.281.976,32	8.106.978,28	Verifiche di collaudo				Importo complessivo del finanziamento pari a € 20.668.276,98, di cui € 9.670.186,63 destinati al Progetto Integrato Fusina (vedi scheda Regione: Disinquinamento Int. 34)
7	Gestione reflui zootecnici e interventi strutturali in zootecnia	4/A/3	DCR N. 45 DEL 16/7/1999	VARI	5.184.888,99	4.725.005,02	2.714.738,10	Lavori in corso				
8	Incentivi, modifiche colturali e piani di sparglmento e gestione idraulica dei deflussi delle superfici agricole	A/4 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDRPAS 72 DEL 28.12.2000; DDRPAS 1 DEL 07.02.2002; DDRPAS 37 DEL 28.3.2002; DDRPAS 141 DEL 05.09.2002	10.329.137,98	8.820.098,11	6.822.784,73	Lavori in corso				Importo complessivo del finanziamento pari a € 10.329.157,98, di cui € 8.818.338,60 destinati al Consorzi di bonifica. La somma di tutte le erogazioni relative ai consorzi di bonifica è pari a € 3.481.602,81
9	Incentivi alla politiche agricole ecocompatibili, modifiche colturali e piani di sparglmento	C/67	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDRPASA 186 DEL 23.10.2003	10.329.137,98	10.327.486,12	7.955.728,58	Lavori in corso				
10	Gestione pratiche agricole: incentivazione all'innovazione ambientale	C/71	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		1.549.370,70	1.549.370,69	899.678,32	Lavori in corso				
11	Gestione reflui zootecnici e interventi strutturali	C/70	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		5.164.888,99	5.164.499,07	4.493.691,84	Lavori in corso				
12	Ricostruzione fasce tampone e set-aside	C/68	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDRPAS 72 DEL 13.05.2003; DDRPASA 29 DEL 18.06.2003; DDRPASA 34 DEL 25.06.2003	3.615.198,29	3.614.872,81	2.328.804,42	Lavori in corso				
13	Gestione pratiche irrigue	C/69	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		10.329.137,98	8.970.799,31	3.466.677,12	Lavori in corso				
14	AGRICOLTURA COMPATIBILE (Al fine di ridurre gli apporti di fitonutrienti a favorire una più corretta gestione del suolo.)	3/A/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		10.329.137,98	4.598.244,50	1.532.614,48	Lavori in corso				
15	Realizzazione di fasce tampone e messa a riposo colturale con finalità ambientali nell' area del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia	3/B/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		2.258.233,20	2.258.188,00	910.073,20	Lavori in corso				
16	Gestione delle pratiche irrigue: razionalizzazione dell' uso della risorsa idrica nel Bacino Scolante Laguna di Venezia	3/C/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		5.164.888,99			In istruttoria				
17	Agricoltura compatibile nell'area del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia (C5.1.3a)	C/1	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		8.811.724,00			In corso di realizzazione				

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione stip impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
18	Gestione dei reflui zootecnici ed interventi strutturali in zootecnia (C6.1.4)	C/2	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		22.264.384,00	16.844.338,67	2.990.037,68	In corso di realizzazione				
19	Realizzazione fasce tampone e messa a riposo colturale con finalità ambientali nell'area del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia (C6.1.3b)	C/3	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		11.046.290,00	7.484.833,60	1.717.462,60	In corso di realizzazione				
20	Gestione delle pratiche irrigue: razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica nel Bacino Scolante nella laguna di Venezia (C6.1.3c)	C/4	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		10.408.396,00			In corso di realizzazione				
21	Gestione delle pratiche agricole: incentivazione all'innovazione ambientale ecocompatibile in agricoltura nel Bacino Scolante nella laguna di Venezia (C6.1.6)	C/5	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.500.000,00	290.700,00		In corso di realizzazione				
	TOTALI				146.023.411,72	98.887.979,60	57.270.748,59					

SEZIONE V: AMMINISTRAZIONI E SOCIETA' PUBBLICHE

PAGINA BIANCA

ARPAV

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione atti impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio e consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Sistema informativo regionale - Nodo laguna	4a	DGR N. 4976 DEL 2/11/1993	DGR N. 2559 27/07/1999	258.228,50	258.228,45	258.228,45	Lavori ultimati				Fondi derivanti da un finanziamento iniziale di € 7.950.653,98 suddiviso negli interventi 1 (€ 258.228,45), 2 (€ 1.032.913,80), 7A (€ 4.787.555,45), 8 (€ 839.242,48) e 11 (€ 1.032.913,80)
2	Interventi per il monitoraggio dei corsi d'acqua	4/B/1	DGR N. 2559 DEL 27/7/1999	DGR N. 2559 27/07/1999	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	Lavori in corso				
3	Estensione rete agrometeorologica	9/C/1	DGR N. 4977 DEL 22/07/1993	DGR N. 166 27/1/1995	516.456,90	516.456,90	516.250,42	Lavori ultimati			18/05/1998	
4	Interventi strutturali in rete di bonifica.	8/B/5	DGR N. 6400 DEL 12/12/1998	DGR N. 2559 27/07/1999	103.291,60	103.291,60						
5	Settore agricolo: potenziamento del servizio agrometeorologico della Regione Veneto	2/B/1	DGR N. 2238 DEL 21/8/1998	DGR 2554/96 DGR 2696/97	1.807.599,16	1.793.792,29	1.789.184,73	Lavori in corso				Finanziamento suddiviso in 2 interventi: servizio agrometeo (€ 774.685,34) e radar meteo progetto 2RAdMETEO (€ 1.032.913,80)
6	Settore agricolo: potenziamento del Centro Agrochimico della Regione Veneto	2/C/1penna	DGR N. 6400 DEL 12/12/1998	DGR N. 2203 DEL 21/8/1998	2.582.284,50	2.582.284,50	1.647.866,29	Lavori in corso				Finanziamento suddiviso: parte attività agro-zootecnica (€ 1.807.599,16) lavori ultimati e parte ampliamento sede (€ 774.685,34)
7A	Progetto quadro di monitoraggio (€ 4.788.555,48)							Finanziamento convogliato nell'intervento 7				
7B	S.I.R.A.V. (Sistema Informativo Regionale Ambientale Veneto) (€ 1.406.927,03)							Finanziamento convogliato nell'intervento 7				
7	Sistema di monitoraggio e controllo della rete idrica scolante in Laguna (€ 8.197.482,79)	8/A/1	DGR 2510/98 DGR 2558/99	DGR 2510/98 DGR 2558/99	8.197.482,90	8.197.482,79	6.167.589,90	Lavori ultimati				
8	Interventi strutturali in rete di bonifica.	8/B/5	DGR N. 2558 DEL 27/7/1999	DGR N. 2558 27/07/1999	839.242,90	839.242,48	147.448,48	Lavori in corso				
9	Potenziamento della rete di telerilevamento agrometeorologica	C/2/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DGR 2696 29/07/1997	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	Lavori collaudati				L'importo finanzia parte del progetto 2RAdMETEO
10	Potenziamento del servizio di analisi ed informazione in campo agro-zootecnico del centro Agroambientale di Castelfranco Veneto.	AR.1 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 97 8/10/2002	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	Lavori collaudati				Opera conclusa

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione del rilegame	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
11	Sistema di monitoraggio e controllo della rete idrica scolante in Laguna di Venezia - estensione del sistema di telecontrollo nel Bacino Scolante	B/15.1 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DGR N. 667 14/3/2003	1.032.913,80	1.032.913,80	516.456,90	Lavori in corso				
12	Monitoraggio delle acque lagunari e dei canali d'acqua del bacino scolante	E/61	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		84.370,00			Progettazione in corso				Importo complessivo del finanziamento pari a € 1.549.370,70, suddiviso negli interventi 12 e 13
13	Monitoraggio interventi di disinquinamento nel Bacino Scolante in Laguna di Venezia e realizzazione del Laboratorio per l'analisi delle diossine presso il Dipartimento dell'ARPAV di Venezia - Centro di riferimento del Bacino Scolante	E/61.1	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 63 26/5/2003	1.466.000,00	1.466.000,00	1.334.437,32	Lavori in corso				Importo complessivo del finanziamento pari a € 1.549.370,70, suddiviso negli interventi 12 e 13
14	Piano di monitoraggio della qualità dell' aria a Porto Marghera e nel bacino scolante nella laguna di Venezia. Sistema integrato per il monitoraggio ambientale e la previsione del rischio industriale e delle emergenze a P.M.	E/62	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DGR N. 4013 31/12/2001	1.549.370,70	1.549.370,70	774.685,35	Lavori in corso				Progetto SIMAGE I° LOTTO
15	Sistema integrato per il monitoraggio ambientale e la gestione del rischio industriale e delle emergenze per l' area di Porto Marghera - SIMAGE II° Lotto	G/A/1	DGR N. 794 DEL 8/4/2002	DDDA N. 188 17/12/2003	1.549.370,70	1.549.370,70	774.685,35	Lavori in corso				
16	Progetto Grandi Rischi Industriali - Verifiche zona Industriale di Porto Marghera	A/2	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DGR 4375 30/12/2003	500.000,00	500.000,00	250.000,00	Lavori in corso				
17	Completamento Progetto SIMAGE - II° LOTTO	A/1	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DGR 4375 30/12/2003	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	Lavori in corso				
18	Realizzazione nuova sede del laboratorio ARPAV di Venezia a supporto dei monitoraggi e dei controlli ambientali nel sistema lagunare	B/17	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDDA 44 11/03/2005	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Lavori ultimati				
	TOTALI				28.684.352,93	28.568.176,57	20.774.544,55					

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione del rilegame	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Impianto pilota per il lavaggio di sedimenti nel Porto di Venezia		DGR N. 1140 DEL 18/4/2003	DGR 1835 13/06/2006	516.460,00	516.460,00		Progetto approvato				
	TOTALI				516.460,00	516.460,00	0,00					

AZIENDA SPECIALE PORTO DI CHIOGGIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio e consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Bonifica aree interessate alla realizzazione delle banchine "A", "E", "B" - terminal di Val da Rio in comune di Chioggia		DGR N. 1140 DEL 18/4/2003	Decreto 6877 09/01/1999	2.600.000,00	616.040,00		Progetto approvato				
	TOTALI				2.600.000,00	616.040,00	0,00					

ENTE DI BACINO R.S.U. VENEZIA 2

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio e consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Impianto di trattamento R.S.U. di Venezia	4e	DGR N. 4976 DEL 2/11/1993	DGR N. 863 09/03/1993	6.713.939,69	6.713.939,69	6.713.939,69	Lavori collaudati	18/10/1988	09/12/1998	07/06/1999	I finanziamenti sono stati riuniti in un unico progetto il cui importo finale è stato determinato con DDDA n. 118 del 18/11/1999 in € 39.835.911,31. Oltre ai finanziamenti della Legge Speciale per Venezia, l'intervento ha beneficiato dei fondi F.I.O. e della legge regionale 48/1994
2	Impianto di trattamento R.S.U. di Venezia		DGR N. 6243 DEL 30/10/1991	DPRG N. 911 06/05/1992	3.356.969,84	3.356.969,84	3.356.969,84					
3	Impianto di trattamento R.S.U. di Venezia-Marghera, loc. Malcontenta	4/A/1	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DGR N. 4977 02/11/1993	9.296.224,18	9.296.224,18	9.296.224,18					
4	Completamento impianto R.S.U. di Venezia (Fusina)	C/28/1	DGR N. 863 DEL 28/2/1997	DGR N. 863 28/02/1997	2.943.804,32	2.943.804,32	2.943.804,32					
5	Bonifica ex discarica per RSU in loc. S. Liberale di Marcon	B/18	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		2.600.000,00							
	TOTALI				24.910.938,04	22.310.938,04	22.310.938,04					

MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA

Ord.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio e consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Interventi di difesa dell'isola di S.Erasmo dalle acque alte.	I/3.6.C1	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000	DIDDA N. 99 30/10/2000	1.822.282,58	1.822.282,58	0,00	Progetto approvato				Accordo di programma tra Regione e Comune. Fondi ex "Fognature Giudecca" pari a € 2.582.284,49 riallocati con DCR 32/97, al finanziamento 1 (€ 1.822.282,58) e al finanziamento 2 (€ 660.031,92)
2	Fognatura S. Erasmo	I/3.6.C	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000		660.031,92			Fondi disimpegnati sul capitolo 60511 con DGR 2817 DEL 13/09/2002				
3	Interventi per ripristino dei pennelli alle foci di Adige e Brenta	B/21 IV fase	DGR N. 2924 DEL 30/1999	DDOS N. 28 11/2/1999	1.549.370,70	1.520.474,93	1.434.437,77	Lavori in corso				
4	Interventi per il ripristino dei pennelli alle foci del fiumi Adige e Brenta	6/D/1	DGR N. 1140 DEL 18/4/2003	DDSPC 431 09/10/2003	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Lavori in corso				Accordo di Programma tra Regione Veneto, MAV, comuni di Chioggia e Rosolina
5	Interventi sui manufatti idraulici di Torre di Burri e Castelfranco	6/D/2	DGR N. 1140 DEL 18/4/2003	DDPV N. 15 20/02/2006	2.767.443,55	2.767.443,55	2.065.882,63	Lavori in corso				
6	Riordino della rete scolante in laguna attraverso i manufatti idraulici di torre di Burri, Castelfranco - i sfalcio - ricalibratura dei Canale Piovego di Villa Bozza	B/22.1 V fase	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDPV N. 15 20/02/2006	5.164.568,96	5.164.568,96	0,00	Progetto approvato				Intervento coordinato con il M.A.V. che finanzia una quota pari ad altri € 9.197.483,01
7	Interventi sui manufatti idraulici di Torre di Burri e Castelfranco e Botte di Concha	B/22.2 V fase	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		1.032.913,80							
8	Accordo di programma Regione Veneto/M.A.V. - Interventi per il ripristino dei pennelli alle foci del fiumi Adige e Brenta	A/3	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDSPC 287 16/09/2004	3.400.000,00	3.400.000,00	1.562.883,82	Lavori in corso				
9	Accordo di programma Regione Veneto/M.A.V. - Botte di CONCHE	A/4	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.242.000,00			Progetto preliminare				
	TOTALI				18.738.581,62	18.774.740,04	8.083.184,32					

PROVINCIA DI VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
[illegible]												
1	Realizzazione di una rete ecologica in Provincia di Venezia mediante individuazione di aree ad esempio meccanismi di fitodepurazione, sostenendo i principi di un'agricoltura sostenibile a basso impatto ambientale	B/10	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		2.000.000,00			Progetto preliminare				
	TOTALI				2.000.000,00	0,00	0,00					

PROVINCIA DI PADOVA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
[illegible]												
1	Intervento di bonifica in via sostitutiva dell'ex area Promofin in comune di Piombino Dese	B/15	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		400.000,00			Progettazione in corso				
	TOTALI				400.000,00	0,00	0,00					

S.A.VE. – SERVIZI AEROPORTUALI VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
[illegible]												
1	Realizzazione di un sistema di trattamento di prima pioggia al fine di contenere gli inquinanti attualmente scaricati nella Laguna di Venezia - Porzione scolante in bonifica - 1° stralcio	B/4	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		3.090.000,00			Progetto preliminare				
2	Realizzazione di un sistema di trattamento di prima pioggia al fine di contenere gli inquinanti attualmente scaricati nella Laguna di Venezia - Porzione scolante in bonifica - 2° stralcio	B/5	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		3.520.000,00			Progetto preliminare				
	TOTALI				6.610.000,00	0,00	0,00					

U.L.S.S. n° 12 - VENEZIA

SETTORE "OSPEDALI"

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione atto impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Dipartimento urgenza Ospedale SS. Giovanni e Paolo - Venezia - II stralcio				6.197.482,78	6.197.482,78	6.197.482,78	Finanziamento convogliati nell'intervento 4A				
2	Dipartimento urgenza Ospedale SS. Giovanni e Paolo - Venezia - II stralcio				5.164.569,98	5.164.569,98	5.164.569,98	Finanziamento convogliati nell'intervento 4A				
3	Dipartimento urgenza Ospedale SS. Giovanni e Paolo - Venezia - II stralcio				2.582.284,50	2.582.284,50	2.582.284,50	Finanziamento convogliati nell'intervento 4A				
4	Dipartimento urgenza Ospedale SS. Giovanni e Paolo - Venezia - II stralcio	C/27/1	DGR N. 853 DEL 25/2/1997	DDLLPP 167 13/7/1998	3.356.969,84	3.356.969,84	3.317.410,04	Finanziamento convogliati nell'intervento 4A				
4A	Dipartimento urgenza Ospedale SS. Giovanni e Paolo - Venezia - II stralcio		Riuniti i finanziamenti 1, 2, 3 e 4					Lavori collaudati	-	-	30/09/2003	Decreto di contabilità finale in preparazione
5	Urgenti lavori di messa a norma di alcuni padiglioni dell'Ospedale S.S. Giovanni e Paolo di Venezia	B/2	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDEA 134 06/12/2006	3.000.000,00	614.940,86		Progetto preliminare				
	TOTALI				20.301.308,12	17.818.248,86	17.261.746,32					

SETTORE "DISINQUINAMENTO"

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione atto impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
6	Ristrutturazione della rete fognaria dell'ospedale civile SS. Giovanni e Paolo - Primo stralcio funzionale	1/2.9	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DDDA N. 68 18/10/1995	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	Lavori collaudati	04/12/1995	30/06/1998	25/02/2002	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 21 del 28/03/2003
7	Ristrutturazione della rete fognaria dell'ospedale civile SS. Giovanni e Paolo - Secondo stralcio funzionale	B/22/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DGCA N. 152 27/3/1998	929.622,42	929.622,42	916.230,09	Lavori collaudati	25/10/1999	15/11/2000	30/04/2003	Registrata, con DDDA n. 153 del 30/10/2003, un'economia di € 14.392,33 reiscritta nel bilancio regionale
8	Ristrutturazione della rete fognaria di complessi ospedalieri: ospedale civile e G.B. Giustinian in Comune di Venezia	B/22/2	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DGCA N. 426 27/10/1997	103.291,38	103.291,38	76.910,27	Lavori collaudati	13/06/1995	30/10/1998	27/03/2003	In attesa del decreto di contabilità finale di competenza dei lavori pubblici

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio e consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
9	Completamento della rete fognaria acque bianche dell' Ospedale SS. Giovanni e Paolo e prolungamento della condotta di scarico nella laguna Nord.	1/P/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 126 29/06/2004	774.685,35	774.685,35	0,00	Progetto preliminare approvato				
	TOTALI				2.840.512,94	2.840.512,96	2.024.054,16					
	TOTALI Disinquinamento e Ospedali				23.141.819,06	20.758.789,93	19.285.800,48					

A.S.L. n° 15 – ALTA PADOVANA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio e consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Progetto per l'integrazione delle informazioni sanitarie ed ambientali per la gestione del territorio scolante nel bacino della Laguna di Venezia	B/18	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.039.000,00			Progettazione in corso				
	TOTALI				1.039.000,00	0,00	0,00					

U.L.S.S. n° 17 – ESTE - MONSELICE

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio e consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Ristrutturazione delle fognature in area ospedaliera di Monselice - 1^ fase funzionale.	A/7 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 96 30/10/2000	1.291.142,28	1.291.142,28	1.288.164,00	Lavori collaudati	08/04/2002			Registrata, con DDPV n. 49 del 08/04/2006, economia di € 5.978,28
2	Interventi di completamento e ristrutturazione della fognatura nera dell' area ospedaliera di Monselice	6/L/1	DGR N. 1140 DEL 18/4/2003		232.000,00			Progettazione esecutiva in corso				
	TOTALI				1.523.142,28	1.291.142,28	1.288.164,00					

VENETO ACQUE S.p.A (ex DELTA PO S.p.A.)

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio e consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Sistema degli acquedotti del Basso Veneto - Realizzazione della condotta Cavarzere - Chioggia	1/4.10	DGR N. 4442 DEL 27/7/1999	DGR N. 2367 DEL 9/8/2002	8.934.704,35	8.934.704,35	2.680.411,31	Lavori in corso				Erogazioni stabilite dalla DGR 2367/2002

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione atto impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
2	Interconnessione sistemi acquedottistici Venezia - Chioggia	B/21 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DGCA N. 344 10/10/2000	17.880.812,18	17.880.812,18	17.880.812,18	Lavori in corso				Intervento originario di € 19.780.812,18 affidato alla Delta Po S.p.A. ora Veneto Acque. La quota pari a € 1.900.000,00 assegnati all'ASP di Chioggia (int. 7)
3	Schema acquedottistico del Veneto Centrale previsto dal Modello Strutturale degli acquedotti del Veneto - Realizzazione delle condotte Padova - Mestre e collegamento con il Piovese	D/88	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DGR N. 2367 DEL 9/8/2002				Finanziamento originale pari a € 18.108.905,27 (impegnato alla Delta Po € 18.876.499,64 suddivisi, poi, negli Int. 3A (€ 14.818.466,41) e 3B (€ 4.058.043,23); il residuo pari a € 232.405,81 impegnato per paese di progettazione)				Erogazioni stabilite dalla DGR 2367/2002
3A	Schema acquedottistico del Veneto Centrale previsto dal Modello Strutturale degli acquedotti del Veneto - Realizzazione delle condotte Padova - Mestre e collegamento con il Piovese	D/88	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DGR N. 2367 DEL 9/8/2002	14.350.882,02	14.350.882,02	11.328.899,80	Lavori in corso				
3B	Schema acquedottistico del Veneto centrale - Condotta Padova-Mestre - Progetto definitivo 2° stralcio Condotta Centrale Gazzera-Caselle autostradale di Mestre e condotta centrale Villa Augusta - svincolo autostrada A4 Padova-Mestre-Bologna	D/88.2	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DGR N. 2367 DEL 9/8/2002	4.825.837,64	4.825.837,64	0,00	Progetto approvato				
4	Modello strutturale degli acquedotti del Veneto. Sistemazione nodo idrico di Padova e chiusura anello Venezia-Padova-Cavarzere-Chioggia (1° stralcio)	6/A/1	DGR N. 784 DEL 9/4/2002	DGR N. 2367 DEL 9/8/2002	10.329.137,88	10.329.137,88	3.088.741,40	Lavori in corso				Erogazioni stabilite dalla DGR 2367/2002
5	Progetto integrato Fusina P.I.F. (impianto turatura processi: completamento ed aggiornamento del progetto e realizzazione dell'impianto)	1/6.1.1	DGR N. 45 DEL 15/01/1999	DGR 3906 12/12/2003	3.100.000,00	3.100.000,00	930.000,00	Lavori in corso				
6	Modello strutturale degli acquedotti del Veneto. Schema Veneto centrale Lisea-Padova-Piove di Sacco-Cavarzere	B/14	DGR N. 24 DEL 04/05/2004		20.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Progetto definitivo				
	TOTALI				79.121.154,18	66.121.154,18	41.818.884,69					

VENETO AGRICOLTURA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione atto impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Interventi sperimentali per il trattamento dei reflui zootecnici per il recupero energetico	6/O/1	DGR Fin. 6400 12/12/1995		3.300.000,00							

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

1	Messa a punto di modelli produttivi innovativi nelle colture estensive per una gestione ecocompatibile nell'ambito del Bacino scolante in Laguna di Venezia	B/B	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDDA 208 10/11/2006	900.000,00	900.000,00	0,00	Progetto approvato	
2	Utilizzo dei compost di qualità in agricoltura e sperimentazione tecnica ed economica finalizzata alla riduzione dei concimi azotati tradizionali	B/B	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDDA 162 21/09/2006	1.000.000,00	1.000.000,00	200.000,00	Progetto approvato	
	TOTALI				6.300.000,00	1.900.000,00	200.000,00		

PAGINA BIANCA

SEZIONE VI: ENTI VARI

PAGINA BIANCA

ABBAZIA DI SAN GIORGIO MAGGIORE (Venezia)

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Ristrutturazione e completamento della rete di fognatura nell' isola di S. Giorgio Maggiore	1/Z/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 148 15/10/2003	206.582,76	206.582,76	206.532,97	Lavori collaudati				Registrata, con DDDA 155 del 20/09/2005, economia di € 49,79.
2	Ristrutturazione e completamento della rete di fognatura nell' isola di S. Giorgio Maggiore	B/3	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDDA N. 180 13/10/2005	80.000,00	80.000,00	72.000,00	Lavori ultimati - Collaudo in corso				
	TOTALI				286.582,76	286.582,76	278.532,97					

COMUNITA' EBRAICA DI VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Lavori di restauro dell'edificio adibito all'assistenza agli anziani della Comunità Ebraica di Venezia	B/20.2 V fase	DGR 2924 03/08/1999	DDDA N. 68 26/04/2005	2.000.000,00	2.000.000,00	1.800.000,00	Lavori in corso				Finanziamento proveniente dalla riallocazione degli ex fondi Consorzio di bonifica Basso Piave "Acquedotto sostitutivo pozzi per irrigazione nell'area del Cavallino" cod B/20 V fase
	TOTALI				2.000.000,00	2.000.000,00	1.800.000,00					

DIOCESI PATRIARCALE DI VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Restauro della Sede Patriarcale, del Seminario Patriarcale e della Basilica della Salute	1/5.1B	DGR 4976 02/11/1993		444.697,73			Progettazione in corso				Finanziamento proveniente dalla riallocazione degli ex fondi Comune di Venezia "Vasca di prima pioggia e laminazione in loc. "Gazzera" Mestre - Venezia" cod 1/5.1
2	Restauro della Sede Patriarcale, del Seminario Patriarcale e della Basilica della Salute	1/2.14b.1	DGR 4589 06/08/1991		511.292,33			Progettazione in corso				Finanziamento proveniente dalla riallocazione degli ex fondi Comune di Chioggia/ASP "Impianto di depurazione di Valli di Chioggia (VE)" cod 1/2.14b

RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione ed impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
3	Restauro della Sede Patriarcale, del Seminario Patriarcale e della Basilica della Salute	1/C/16.1	DGR 4977 02/11/1993		1.758.853,46			Progettazione in corso				Finanziamento proveniente dalla riallocazione degli ex fondi Comune di Venezia "Vasca di prima pioggia e laminazione in loc. "Cazzaro" Mestre - Venezia" cod 1/C/16
4	Adeguamento e delle linee fognarie e degli impianti di depurazione a servizio del complesso edilizio del seminario patriarcale in Venezia		DGR N. 1140 DEL 18/4/2003	DDOA N. 80 20/02/2004	464.400,00	464.400,00	133.800,00	Lavori in corso				
5	Restauro della Sede Patriarcale, del Seminario Patriarcale e della Basilica della Salute	C/23/1.6	DGR 2813 22/07/1997		5.265.854,58			Progettazione in corso				Finanziamento proveniente dalla riallocazione degli ex fondi Comune di Venezia "Ampliamento e ristrutturazione rete fognaria" cod C/23/1
6	Restauro della Sede Patriarcale, del Seminario Patriarcale e della Basilica della Salute	B/20.1 V fase	DGR 2924 03/08/1999		10.867.832,91			Progettazione in corso				Finanziamento proveniente dalla riallocazione degli ex fondi Consorzio di bonifica Basso Piave "Acquedotto sostitutivo pozzi per irrigazione nell'area del Cavallino" cod B/20 V fase
7	Restauro della Sede Patriarcale, del Seminario Patriarcale e della Basilica della Salute	6/B/1.1	DGR 794 09/04/2002		6.164.668,98			Progettazione in corso				Finanziamento proveniente dalla riallocazione degli ex fondi Consorzio di bonifica Basso Piave "Acquedotto sostitutivo pozzi per irrigazione nell'area del Cavallino" cod 6/B/1
8	Risanamento igienico sanitario della Chiesa di Venezia	B/12.2	DCR N. 24 04/05/2004	DDPV 38 23/03/2006	1.300.743,00	750.000,00	344.700,00	Progettazione in corso				
	TOTALI				25.755.143,00	1.214.400,00	478.500,00					

ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DEL VENETO "GOLDONI"

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione ed impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Risanamento igienico sanitario degli impianti del Teatro Goldoni	B/13	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		455.000,00			Progetto preliminare				
	TOTALI				455.000,00	0,00	0,00					

PARROCCHIA DI OGNISSANTI

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione atto impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio e consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Risanamento igienico sanitario delle Chiese di Venezia. Parrocchia Ognissanti - Tempio della Madonna dell'Apparizione.	B/12.1 V fase	DCR N. 24 DEL 04/08/2004	DDDA N. 147 13/09/2005	800.000,00	800.000,00	200.771,61	Lavori in corso				
	TOTALI				800.000,00	800.000,00	200.771,61					

ENTI VARI

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione atto impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio e consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Interventi da destinare	6/F/1	DGR Fin. 6400 12/12/1995		12.706,88							
2	Fondo di rotazione per la progettazione	B/19 IV fase	DGR N. 2924 DEL 30/1999		1.784.568,99	1.784.920,84	1.784.920,84	Progetto approvato				
3	Spese per progettazione interventi ." Schema acquedottistico del Veneto Centrale previsto dal Modello Strutturale degli acquedotti del Veneto ".	D/58.1	DGR 1834 DEL 23/06/2000		232.405,61	232.405,61	184.459,84	Progettazione in corso				
	TOTALI				2.009.681,28	1.987.326,18	1.939.380,68					

PAGINA BIANCA

Documento D ***Comune di Venezia***

Stato di attuazione delle attività finanziate con fondi di legislazione speciale per Venezia – Aggiornamento al 31 dicembre 2006

PAGINA BIANCA

GABINETTO

Vice Sindaco
on. Michele Vianello

Venezia, 12 aprile 2007
Prot. 163348

Alla Signora Presidente del Magistrato alle Acque
Dott. Ing. Maria Giovanna Piva
Segretario del Comitato di Indirizzo Coordinamento e Controllo
Palazzo dei X Savi
30124 – Venezia

Oggetto: Stato di attuazione delle attività finanziate con fondi di legislazione speciale per Venezia.

Gentile Presidente,

Con riferimento alla Vostra nota 4 aprile 2007 prot. n. 262/GAB e in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 4, comma IV°, della legge 798/'84 si trasmette, compiegato, lo stato di avanzamento degli interventi di salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nelle competenze di questa Amministrazione, aggiornato al 31 dicembre 2006.

La situazione venutasi a creare in seguito alla drastica riduzione dei finanziamenti della legislazione speciale per Venezia, ha comportato una ridotta capacità di far fronte alla salvaguardia della città storica e della laguna.

L'Amministrazione ha dovuto rivisitare dinamicamente il Piano Generale degli Investimenti, al fine di recuperare risorse come: le economie derivanti dagli interventi conclusi e/o non più realizzabili, l'assestamento del finanziamento di quegli interventi inseriti in vecchi programmi e le disponibilità venutesi a creare a seguito della ricognizione del debito globale riferito ai mutui contratti con decorrenza dal 2001.

Con l'adozione da parte del Consiglio Comunale della deliberazione n. 13 del 13 febbraio 2006 che ha approvato il programma degli interventi di legge speciale, si sono utilizzate risorse pari ad euro **48.371.334,86=** così in dettaglio:

- **€ 2.156.680,12#** economie derivanti dagli interventi conclusi e/o non più realizzabili;
- **€ 2.156.680,12#** economie derivanti dai ribassi d'asta per complessivi;
- **€ 25.913.347,31#** risultanti dalla disponibilità venutasi a creare a seguito della ricognizione del debito globale riferiti ai mutui con decorrenza 2001;
- **€ 18.325.584,74#** dal decremento dei finanziamenti di alcune voci di programma e la contestuale rimodulazione dei programmi finanziati con la legge speciale.

Va sottolineato, infine come la percentuale dello speso sia aumentata del 5% rispetto alla annualità precedente.

Distinti saluti.

On. Michele Vianello

All.

COMUNE DI VENEZIA

PROGRAMMAZIONE LEGGE SPECIALE

LEGGI FINANZIAMENTO	FASCIA DECORRENZE DAL MUTUO	IMPORTO RICHIESTO ASSEGNAZIONE ANNUALE CONTRIBUTO STATO	DATA DELIBERA MUTUO	AMMONTARE DISPONIBILE ALLA STIPULA DEL MUTUO	IMPORTO ACCANTONATO (O COME RISERVA (*)
LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 139	1993	17.043	22.12.1992	151.340	- - -
	1994	7.081	21.07.1994	69.150	- - -
	1995	4.948	09.06.1995	45.135	- - -
	1996	4.498	22.12.1995	42.378	- - -
LEGGE 30 DICEMBRE 1995 N. 539	1996	3.160	24.07.1996	32.702	- - -
	1997	5.969	24.07.1996	64.619	- - -
LEGGE 9 OTTOBRE 1996 N. 515	1997	18.514	30.08.1996	204.290	- - -
	1998	9.428	30.07.1997	111.328	- - -
LEGGE 2 OTTOBRE 1997 N. 345	1998	9.640	23.12.1997	114.611	- - -
	1999	6.585	12.11.1998	81.384	- - -
LEGGE 3 AGOSTO 1998 N. 295	1999	658	02.11.1999	8.254	- - -
	2000	439	02.11.1999	5.443	- - -
LEGGE 28 DICEMBRE 1998 N. 448	1999	10.639	25.10.1999	143.540	- - -
	2000	2.995	20.12.1999	45.288	- - -
	2001	3.873	07.07.2000	57.523	- - -
LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 499	2001	6.352	11.10.2000	83.621	- - -
	2002	6.972	08.05.2001	79.017	8.263
LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388	2002	3.925	23.04.2002	43.920	4.880
	2003	6.972	17.06.2002	90.000	10.000
LEGGE 28 DICEMBRE 2001 N. 448	2002	2.505	17.07.2002	27.372	2.628
	2003	4.170	17.07.2002	45.448	4.552
	2004	8.780	17.07.2003	94.824	10.536
DELIBERA C.I.P.E. PER IL TRIENNIO 2002-2004 ART. 80, COMMA 28, L. 166/2002 (art. 6, lett. A) - B) - C), L. 398/24)	2004	4.566 (**)	29.12.2003	50.400 (***)	5.600
DELIBERA C.I.P.E. PER IL TRIENNIO 2002-2004 ART. 80, COMMA 28, L. 166/2002 (art. 6, lett. A) - B) - C), L. 398/24)	2005	5.516	16.12.2005	51.527	5.726

(*) la riserva è una somma prudenziale che viene accantonata e che potrà essere disponibile solo dopo i primi 5 anni dalla stipula di ogni singolo contratto di mutuo. L'ammontare è presunto e dipende dal tasso ufficiale di sconto vigente alla data della verifica e dai relativi piani di erogazione. Per la sua indeterminatezza e la sua non immediata disponibilità, non è stata conteggiata nel programma degli interventi

(**) limite di impegno per Comune di Venezia € 3.652= per il Comune di Cavallino - Treporti € 226= per il Comune di Chioggia € 565=

(***) Comune di Venezia € 30.152=, Commissario delegato al traffico acqueo € 10.168=, Comune Cavallino - Treporti e Comune di Chioggia € 10.050=

I DATI SONO ESPOSTI IN MILIONI DI EURO

AGGIORNAMENTO AL 31/12/2006	Legge 5 febbraio 1992 n. 139																			
	1993 IMI cod 1 Limite d'impegno a decorrere dal 1993 - Mutuo fino a Euro 151.339.965,91 = lit 14 cod 4				1994 IMI cod 2 Limite d'impegno a decorrere dal 1994 7.081 mil € Mutuo fino a Euro 69.150.161,2 lit 14 cod 6.1 - 6.2				1995 IMI cod 3 Limite d'impegno a decorrere dal 1995 4.948 mil € - Mutuo fino a Euro 45.135.025,29 lit 14 cod 6.3				1996 IMI cod 4 Limite d'impegno a decorrere dal 1996 4.498 mil € - Mutuo fino a Euro 42.378.318,2 lit 14 cod 6.5				TOTALE GENERALE			
Interventi	programmato	impegnato	obbligato	speso	programmato	impegnato	obbligato	speso	programmato	impegnato	obbligato	speso	programmato	impegnato	obbligato	speso	programmato	impegnato	obbligato	speso
lettera a) - art. 6 Legge 798/84	80.944	80.785	80.785	79.594	26.627	26.389	26.389	26.338	31.079	31.035	30.875	30.875	28.366	28.110	28.110	27.021	167.016	166.319	166.159	163.828
lettera b) - art. 6 Legge 798/84	9.238	9.238	9.238	8.986	603	603	603	599	5.522	5.522	5.522	5.370	8.440	8.440	8.440	7.920	23.803	23.803	23.803	22.875
lettera c) - art. 6 Legge 798/84	14.565	14.565	14.565	14.516	15.225	15.225	15.225	14.585	785	785	785	402	215	215	215		30.790	30.790	30.790	29.503
lettera d) - art. 6 Legge 798/84	15.994	15.994	15.994	15.947	2.909	2.909	2.909	2.909	7.700	7.700	7.700	6.369	5.358	5.358	5.358	3.114	31.961	31.961	31.961	28.339
lf - art. 5 Legge 139/92 = rete antincendio	30.600	30.600	30.600	30.497	23.786	23.786	23.786	23.786	49	49	49	49					54.435	54.435	54.435	54.332
TOTALE	151.341	151.182	151.182	149.840	69.180	68.912	68.912	68.217	45.135	45.091	44.931	43.065	42.379	42.123	42.123	38.055	308.005	307.308	307.148	296.877
		100%	100%	99%		100%	100%	99%		100%	100%	95%		99%	99%	90%		100%	100%	97%

AGGIORNAMENTO AL 31/12/2006	Legge 20 dicembre 1995 n. 539											
	1996 CREDIOP cod 5 Limite d'impegno a decorrere dal 1996: 3.160 mil € - Mutuo fino a Euro 32.701.921,06 al 4 cod 76				1997 CREDIOP cod 6 Limite d'impegno a decorrere dal 1997: 5.969 mil € - Mutuo fino a Euro 64.619.045,09 al 4 cod 77				TOTALE GENERALE			
Intervento	programmato	impegnato	obbligato	speso	programmato	impegnato	obbligato	speso	programmato	impegnato	obbligato	speso
lettera a) - art. 6 Legge 798/84	25.002	24.536	24.536	22.186	45.884	43.967	42.782	35.662	70.886	68.503	67.318	67.848
lettera b) - art. 6 Legge 798/84	3.369	3.369	3.369	3.024	9.132	8.821	7.612	6.739	12.501	12.190	10.981	9.763
lettera c) - art. 6 Legge 798/84	2.582	2.582	2.582	2.476	6.714	6.714	6.714	6.714	9.296	9.296	9.296	9.190
lettera d) - art. 6 Legge 798/84	1.033	1.033	1.033	1.033	2.706	2.706	2.582	2.582	3.739	3.739	3.615	3.615
II - art. 6 Legge 139/92 + rete antincendio	716	716	716	712	233	233	233	233	949	949	949	945
TOTALE	32.702	32.236	32.236	29.431	64.669	62.441	59.923	51.930	97.371	94.677	92.159	81.361
		99%	99%	90%		97%	93%	80%		97%	95%	84%

AGGIORNAMENTO AL 31/12/2006

TOTALE GENERALE

TOTALE

AGGIORNAMENTO AL 31/12/2006

TOTALE GENERALE

AGGIORNAMENTO AL 31/12/2006	Legge 27 dicembre 1997 n. 448															
	1999 Credop cod 13 Limite d'impegno a decorrere dal 1999: 10.639 mil € Mutuo fino a Euro 143.540.641,26 (135.793.787,76 + Save 7.750.000,00) lit 4 cod 21 - lit 21 cod 2				2000 Dexia Credop S.p.A. - Monte Paschi Siena cod 14 Limite d'impegno a decorrere dal 2000: 2.995 mil € Mutuo fino a Euro 45.288.441,03 (+ 38.449.841,76 + Save 5.164.568,99 + 1.674.030,28 disponibili) lit 4 cod 22 +				2001 Monte Paschi Siena cod 15 Limite d'impegno a decorrere dal 2001: 3.873 mil € Mutuo fino a Euro 57.523.378,00 (compreso Save Euro 5.164.568,99) lit 15 cod 2				TOTALE GENERALE			
Interventi	programmato	impegnato	obbligato	spesa	programmato	impegnato	obbligato	spesa	programmato	impegnato	obbligato	spesa	programmato	impegnato	obbligato	spesa
lettera a) - art. 6 Legge 798/84	77.099	75.982	74.936	68.154	6.178	6.162	5.874	4.922	9.910	9.707	8.366	6.755	93.187	91.851	89.176	79.831
lettera b) - art. 6 Legge 798/84	27.846	27.211	26.950	21.370	4.248	4.232	4.232	4.232	17.140	15.427	14.876	13.485	49.234	46.870	46.058	39.087
lettera c) - art. 6 Legge 798/84	20.856	20.706	20.706	12.552	2.714	2.624	2.624	426	1.500	1.500	1.500		25.070	24.830	24.830	12.978
lettera d) - art. 6 Legge 798/84	14.153	14.107	12.929	4.459	10.101	8.427	8.427	321	5.165	5.165	5.166		29.419	27.699	26.521	4.780
di - art. 5 Legge 139/92 + lete antincendio	3.586	3.586	3.586	3.315	22.047	22.047	22.047	21.452	23.808	23.808	23.808	18.000	49.441	49.441	49.441	42.767
TOTALE	143.540	141.892	139.107	109.850	45.288	43.492	43.204	31.353	57.523	55.607	53.715	38.240	246.351	240.691	236.026	179.443
		99%	97%	77%		96%	96%	69%		97%	93%	66%		98%	96%	73%

AGGIORNAMENTO AL 31/12/2006

TOTALE GENERALE

| | | |

AGGIORNAMENTO AL 31/12/2006

TOTALE GENERALE

AGGIORNAMENTO AL 31/12/2006

AGGIORNAMENTO AL 31/12/2006	DELIBERA CIPE N. 20 [illegible]/2003 (L. [illegible])			
	2004 Dedo Credito cod. 23 Mutuo fino a Euro 40.320.000,00 + riserva Euro 4.480.000,00 al 4 cod. 28			
Interventi	programmato	impegnato	obbligato	speso
lettera a) - art. 6 Legge 798/84	14.287	8.313	7.813	2.984
lettera b) - art. 6 Legge 798/84	6.674	4.951	4.864	3.900
lettera c) - art. 6 Legge 798/84	5.576	5.456	5.455	3.947
lettera d) - art. 6 Legge 798/84	3.465	1.251	746	670
rif. - art. 5 Legge 139/92 + rete antincendio	150	150	150	4
TOTALE	30.152	20.121	19.029	11.505
		67%	63%	38%

AGGIORNAMENTO AL
31/12/2006

TOTALE GENERALE AL
31/12/2006
TOTALE LEGGE
TOTALE LEGGE
TOTALE LEGGE
TOTALE LEGGE

TOTALE GENERALE AL 31/12/2006
TOTALE LEGGE
TOTALE LEGGE
TOTALE LEGGE
TOTALE LEGGE
TOTALE

TOTALE GENERALE AL 31/12/2006

TOTALE LEGGE

TOTALE LEGGE

TOTALE LEGGE

TOTALE GENERALE LEGGI

Documento E ***Comune di Chioggia***

Stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia – Aggiornamento al 31 dicembre 2006

PAGINA BIANCA

SETTORE PROGETTAZIONE
& QUALITA' DELL'AMBIENTE
C.lle Nordio Marangoni s.c.
Tel. 041 5534021 Fax. 041 403459
Responsabile del Procedimento: Ing. Lucio Napetti
Istruttore del Procedimento: ILN

MAGISTRATO ALLE ACQUE
- SEGRETERIA -
Arr. 07. MAG 2007
Prot. N. 315 /GAB.

Risposta alla nota prot. n 262 del 04/04/2007

Prot. n. del

Chioggia 30/04/2007

OGGETTO: **Richiesta dati**

Trasmetto in allegato i file con i dati aggiornati richiesti con la Vs. del 04/04/2007 prot. 262/gab al fine della redazione della Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia.
Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento
Distintamente.

Il Dirigente Settore Progettazione
Ing. Lucio Napetti

LEGGE N. 798/84

Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti

Soggetti	Limiti di impegno	Importi assegnati e disponibili	Importi sottoscritti con contratto di mutuo	Importi impegnati	Importi spesi
COMUNE DI CHIOGGIA dati al 31.12.2006	32.060	32.060	31.961	31.961	26.322
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento Immobili					
L.360/91, art. 2 lett. c) Infrastrutture					
L.798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria					
L.798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati					

LEGGE N. 139/92

Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti

Soggetti	Limiti di impegno ex Legge 139/92	Importi assegnati e disponibili	Importi sottoscritti con contratto di mutuo	Importi impegnati	Importi spesi
COMUNE DI CHIOGGIA dati al 31.12.2006	**4.132**	**35.687**	**35.687**	**35.687**	**34.424**
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento Immobili		18.436.304	18.436.304	18.311.295	17.886.568
L.360/91, art. 2 lett. c) Infrastrutture		4.399.902	4.399.902	4.399.902	4.377.252
L.798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria		7.443.581	7.443.581	7.420.684	7.155.142
L.798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati		5.407.304	5.407.304	5.407.304	5.005.230

LEGGE N. 539/95

Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti

Soggetti	Limiti di impegno ex Legge 539/95	Importi assegnati e disponibili	Importi sottoscritti con contratto di mutuo	Importi impegnati	Importi spesi
COMUNE DI CHIOGGIA dati al 31.12.2006	**1.503**	**14.761**	**14.761**	**13.531**	**12.948**
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento Immobili		8.047.428	8.047.428	6.817.428	6.523.692
L.360/91, art. 2 lett. c) Infrastrutture		2.324.056	2.324.056	2.324.056	2.320.787
L.798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria		774.685	774.685	774.685	774.686
L.798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati		3.615.198	3.615.198	3.615.198	3.329.276

LEGGE N. 139/92

Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti

Soggetti	Limiti di impegno ex Legge 515/96	Importi assegnati e disponibili	Importi sottoscritti con contratto di mutuo	Importi impegnati	Importi spesi
COMUNE DI CHIOGGIA dati al 31.12.2006	**4.492**	**46.706**	**46.706**	**41.245**	**30.447**
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento Immobili		24.213.229	24.213.229	22.314.000	15.507.123
L.360/91, art. 2 lett. c) Infrastrutture					
L.798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria		18.257.626	18.257.626	14.696.618	13.040.140
L.798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati		4.234.947	4.234.947	4.234.947	1.899.812

LEGGE N. 345/97

Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti

Soggetti	Limiti di impegno ex Legge 345/97	Importi assegnati e disponibili	Importi sottoscritti con contratto di mutuo	Importi impegnati	Importi spesi
COMUNE DI CHIOGGIA dati al 31.12.2006	**1.852**	**24.830**	**24.830**	**22.988**	**19.830**
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento Immobili		12.236.847	12.236.847	11.215.263	8.874.041
L.360/91, art. 2 lett. c) Infrastrutture					
L.798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria		10.785.710	10.785.710	9.965.330	9.369.701
L.798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati		1.807.599	1.807.599	1.807.599	1.587.082

LEGGE N. 448/1998

Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti

Soggetti	Limiti di impegno ex Legge 448/98			Importi assegnati e disponibili				Importi sottoscritti con contratto di mutuo	Importi impegnati	Importi spesi
	anno 1999	anno 2000	anno 2001	anno 1999	anno 2000	anno 2001	totale			
COMUNE DI CHIOGGIA dati al 31.12.2006	1.670	620	775	22.691	8.242	10.071	40.904	40.904	37.291	25.271
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento immobili				10.544.178	3.899.246	5.263.731	19.707.155	19.707.155	19.706.352	11.842.964
L.360/91, art. 2 lett. c) Infrastrutture							-	-	-	
L.798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria				5.901.267	4.343.118	4.994.135	15.238.518	15.238.518	12.937.298	9.805.243
L.798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati				6.145.834			6.145.834	6.145.834	4.648.109	3.623.583
Enti vari finanziati attraverso il Comune di										25.271.790

LEGGE N. 295/98 anno 1999
Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti

Soggetti	Limiti di impegno ex Legge 295/98		Importi assegnati e disponibili			Importi sottoscritti con contratto di mutuo	Importi impegnati	Importi spesi
	anno 1999	anno 2000	anno 1999	anno 2000	totale			
COMUNE DI CHIOGGIA dati al 31.12.2006	116	77	1.476	1.030	2.506	2.506	2.506	594
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento Immobili			1.476.271		1.476.271	1.476.271	1.291.142	66.189
L.360/91, art. 2 lett. c) Infrastrutture				100.559	100.559	100.559	100.559	13.136
L.798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria				929.622	929.622	929.622	929.622	514.358
L.798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati								

LEGGE N. 488/99
Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti

Soggetti	Limiti di impegno ex Legge488/99		Importi assegnati e disponibili			Importi sottoscritti con contratto di mutuo	Importi impegnati	Importi spesi
	anno 2001	anno 2002	anno 2001	anno 2002	totale			
COMUNE DI CHIOGGIA dati al 31.12.2006	978	1.033	9.968	13.428	23.396	23.396	19.170	10.107
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento Immobili			5.107.172	6.300.771	11.407.943	11.407.943	11.717.805	6.334.699
L.360/91, art. 2 lett. c) Infrastrutture								
L.798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria			4.142.371	4.389.880	8.532.251	8.532.251	7.060.348	3.380.596
L.798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati			748.862	2.384.090	3.132.952	3.132.952	392.153	392.153

LEGGE N. 388/00

Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti

Soggetti	Limiti di impegno ex Legge 388/00		Importi assegnati e disponibili			Importi sottoscritti con contratto di mutuo	Importi impegnati	Importi spesi
	anno 2002	anno 2003	anno 2002	anno 2003	totale			
COMUNE DI CHIOGGIA dati al 31.12.2006	301	1.102	3.612	13.219	16.831	13.219	13.170	8.567
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento Immobili				3.420.000		3.420.000	3.408.131	2.136.249
L.360/91, art. 2 lett. c) Infrastrutture								
L.798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria				6.970.000		6.970.000	3.321.020	1.652.941
L.798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati				2.829.000		2.829.000	2.829.000	1.166.770
Enti vari finanziati attraverso il Comune di Chioggia	301		3.612.000		3.612.000	3.612.000	3.612.000	3.612.000

LEGGE N. 448/001

Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti

Soggetti	Limiti di impegno ex Legge 448/01			Importi assegnati e disponibili				Importi sottoscritti con contratto di mutuo	Importi impegnati	Importi spesi
	anno 2002	anno 2003	anno 2004	anno 2002	anno 2003	anno 2004	totale			
COMUNE DI CHIOGGIA dati al 31.12.2006	387	658	1.450	4.644	7.896	17.400	29.940	28.140	27.938	11.808
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento Immobili				2.583.039	2.990.000	6.965.300	12.538.339	12.217.339	12.438.339	5.242.156
L.360/91, art. 2 lett. c) Infrastrutture										
L.798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria				1.000.000	4.670.000	8.311.000	13.981.000	13.981.000	13.798.008	5.818.495
L.798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati				1.322.000	238.000	323.700	1.881.700	1.881.700	1.701.700	647.853
Enti vari finanziati attraverso il Comune di			150			1.800	1.800			

LEGGE N. 166/02

Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti

Soggetti	Limiti di impegno ex Legge 166/02	Importi assegnati e disponibili	Importi sottoscritti con contratto di mutuo	Importi impegnati	Importi spesi
COMUNE DI CHIOGGIA dati al 31.12.2006	**685**	**8.224**	**8.224**	**8.224**	**1.205**
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento Immobili		4.184.700	4.184.700	4.184.700	456.585
L.360/91, art. 2 lett. c) Infrastrutture		1.325.000	1.325.000	1.300.000	86.441
L 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria		2.550.000	2.550.000	2.300.000	619.194
L 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati		164.500	164.500	164.500	43.424

LEGGE N. 350/03

Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti

Soggetti	Limiti di impegno ex Legge 350/03	Importi assegnati e disponibili	Importi sottoscritti con contratto di mutuo	Importi impegnati	Importi spesi
COMUNE DI CHIOGGIA dati al 31.12.2006	973	10.635	10.635	9.138	1.673
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento Immobili		1.828.025	1.828.025	1.170.000	665.725,44
L.360/91, art. 2 lett. c) Infrastrutture		2.138.275	2.138.275	1.537.275	7.700
L.798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria		2.830.000	2.830.000	2.592.719	291.478
L.798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati		3.838.700	3.838.700	3.838.700	708.282

PAGINA BIANCA

Documento F ***Università Ca' Foscari di Venezia***

Stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia – Aggiornamento al 31 dicembre 2006

PAGINA BIANCA

UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA

GABINETTO

MAGISTRATO ALLE ACQUE - GABINETTO -

Prot. n. 11195 - VIII/1
Rag/MN/*af*

Venezia, 30 04 2007

DIVISIONE RAGIONERIA

Dott. Ing. Maria Giovanna Piva
Presidente del Magistrato alle Acque
Segretario del Comitato di Indirizzo Coordinamento e Controllo (art. 4 – Legge 29.11.1984, n. 798)
San Polo, 19
30125 VENEZIA

MAGISTRATO ALLE ACQUE - SEGRETERIA -
Arr. 5 MAG 2007
Prot. N. 3146 /GAB.

Oggetto: Dati per "Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia".

Come richiesto, si invia il quadro delle attività svolte a fronte dei finanziamenti ottenuti con la legislazione speciale al 31 dicembre 2006.

Con i migliori saluti

UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA

IL RETTORE
Prof. Pier Francesco Ghetti

Sezione Contabilità
tel. 041 2348270

Sezione Stipendi
tel. 041 2348209

fax 041 2348380

Ca' Foscari
Dorsoduro, 3246
30123 VENEZIA

Cod. Fisc. 80007720271

Il Responsabile del Procedimento:
Dott.ssa Martina Nardo – Direttore Divisione Ragioneria

UNIVERSITÀ CA'FOSCARI di VENEZIA

Relazione sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia

Legge	Denominazione Fondi	Importo Assegnato	Opere finanziate	Importo Progetto	Impegnato	Pagato
798/84	L. 67/88	12.911.422,49				
			S. Sebastiano	1.291.142,25	1.291.142,25	1.266.105,44
			S. Margherita	1.581.112,61	1.581.112,61	1.581.112,61
			Ca'Garzoni e Moro	1.549.370,70	1.549.370,70	1.548.043,94
			Ca'Foscari	296.446,26	296.446,26	50.167,53
			S.Marta	2.788.867,26	2.788.867,26	2.788.867,26
			Calle dei Guardiani	2.530.638,81	2.530.638,81	2.515.528,18
			Palazzo Nani Mocenigo	662.376,16	662.376,16	477.433,44
			Ca'Cappello	258.228,45	258.228,45	249.766,67
			Wolf Ferrari	258.228,45	258.228,45	258.228,45
			Celestia	569.135,50	569.135,50	569.135,50
			S. Giobbe Restauro e adeg. Funzionale	1.125.876,04	1.125.876,04	1.125.876,04
	Totale L. 798/84	**12.911.422,49**		**12.911.422,49**	**12.911.422,49**	**12.430.265,06**

UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA

IL RETTORE
Prof. Pier Francesco Ghetti

Legge	Denominazione Mutuo	Importo Assegnato	Opere finanziate	Importo Progetto	Impegnato	Pagato
139/92	Imi	13.090.805,21				
			Informatizzazione Ateneo e Biblioteche	2.606.342,05	2.606.342,05	2.606.342,05
			S. Giobbe Restauro e adeg. Funzionale	3.550.930,01	3.550.930,01	3.550.930,01
			Zattere - Acquisto SCI	5.388.023,87	5.388.023,87	5.388.023,87
			Opere varie - Manutenzione straordinaria	1.211.113,81	1.211.113,81	1.211.113,81
			Ca' dalla Zorza - Acq. 3° piano	334.395,47	334.395,47	334.395,47
			Totale Mutuo Imi	**13.090.805,21**	**13.090.805,21**	**13.090.805,21**
	Bnl	4.900.450,69				
			S. Giobbe fase A - Restauro e adeg. Funzionale	919.575,82	919.575,82	919.575,82
			Ca' Bembo - Acquisto	1.500.751,90	1.500.751,90	1.500.751,90
			Zattere - Acquisto Stargas 1	1.291.597,12	1.291.597,12	1.291.597,12
			Zattere - Acquisto Stargas 2	1.188.525,85	1.188.525,85	1.188.525,85
			Totale Mutuo Bnl	**4.900.450,69**	**4.900.450,69**	**4.900.450,69**
	Totale L. 139/92	**17.991.255,90**		**17.991.255,90**	**17.991.255,90**	**17.991.255,90**

UNIVERSITÀ CÀ FOSCARI VENEZIA

IL RETTORE
Prof. Pier Francesco Ghetti

Legge	Denominazione Mutuo	Importo Assegnato	Opere finanziate	Importo Progetto	Impegnato	Pagato
539/95	Crediop 1	4.717.454,71				
			S. Giobbe - Edifici vari	3.096.994,00	3.096.994,00	3.096.994,00
			Ca' Garzoni - Restauro	773.022,10	773.022,10	773.022,10
			S. Marta Fabb. C	347.723,11	347.723,11	347.723,11
			Opere varie - Manutenzione straordinaria	371.543,20	371.543,20	371.543,20
			S. Giobbe - Fase A 5° stralcio	128.172,30	128.172,30	41.495,81
			Totale Mutuo Crediop 1	**4.717.454,71**	**4.717.454,71**	**4.630.778,22**
	Interbanca	4.519.855,60				
			S. Giobbe fase C e B	1.779.206,43	1.779.206,43	1.779.206,43
			S. Giobbe Edificio Ex Poste	960.609,27	960.609,27	959.736,61
			Via Torino - Capannoni	808.931,78	808.931,78	808.931,78
			S.Marta - Teatro Poli	11.765,24	11.765,24	11.765,24
			Via Torino - Facoltà di Scienze	516.456,90	516.456,90	516.456,90
			Opere varie - Manutenzione straordinaria	273.266,07	273.266,07	136.306,07
			S. Giobbe - Fase A 5° stralcio	169.619,91	169.619,91	-
			Totale Mutuo Interbanca	**4.519.855,60**	**4.519.855,60**	**4.212.403,03**
	Totale L. 539/95	**9.237.310,31**		**9.237.310,31**	**9.237.310,31**	**8.843.181,25**

UNIVERSITÀ C.A. FOSCARI - VENEZIA

IL RETTORE
Prof. Pier Francesco Ghetti

Legge	Denominazione Mutuo	Importo Assegnato	Opere finanziate	Importo Progetto	Impegnato	Pagato
515/96	Mediocredito	14.570.918,33				
			S. Giobbe fase C e B	3.398.918,83	3.398.918,83	3.306.813,02
			Zattere - Capannone	3.822.445,61	3.822.445,61	3.822.209,53
			Attuazione D.lgs. 626/94	1.291.142,25	1.291.142,25	1.267.924,56
			Acquisto Edificio Ex Poste	5.965.077,19	5.965.077,19	5.965.077,18
			Ca' Foscari - restauro	93.334,45	93.334,45	91.536,00
			Totale Mutuo Mediocredito	**14.570.918,33**	**14.570.918,33**	**14.453.560,29**
	Crediop 2	7.562.973,82				
			S. Giobbe fase C e B	6.089.026,84	6.089.026,84	6.089.026,84
			Zattere - Capannone	516.456,90	516.456,90	507.475,01
			Via Torino - Fac. Scienze	957.490,08	957.490,08	581.401,30
			Totale Mutuo Crediop 2	**7.562.973,82**	**7.562.973,82**	**7.177.903,15**
	Totale L. 515/96	**22.133.892,15**		**22.133.892,15**	**22.133.892,15**	**21.631.463,44**

UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA

IL RETTORE
Prof. Pier Francesco Ghetti

Legge	Denominazione Mutuo	Importo Assegnato	Opere finanziate	Importo Progetto	Impegnato	Pagato
345/97	Crediop 3	19.505.426,22				
			S. Giobbe fase C e B	9.229.777,94	9.229.777,94	8.836.533,38
			Ca' Foscari - restauro	4.229.808,87	4.229.808,87	4.199.122,93
			Acquisto Falegnameria Ex Bozzola	258.228,45	258.228,45	258.228,45
			Opere varie - Manutenzione straordinaria	1.245.840,47	1.245.840,47	1.235.574,28
			S. Marta - Copertura Fabbricato B	66.770,00	66.770,00	66.770,00
			S. Margherita Auditorium - Rilascio CPI	40.250,90	40.250,90	26.281,16
			Via Torino - Adeguamento locali	78.207,00	78.207,00	77.285,99
			Palazzo Cosulich - Chiusura porticato	40.495,00	40.495,00	39.828,00
			Ca'Cappello - Manutenzione locali 1° e 2° piano	57.705,00	57.705,00	56.471,66
			Via Torino - Fac. Scienze	3.264.022,33	3.264.022,33	-
			Fondo per accordi bonari	597.341,60	597.341,60	-
			S. Giobbe - Fase A 5° stralcio	396.978,66	396.978,66	327.359,52
			Totale Mutuo Crediop 3	**19.505.426,22**	**19.505.426,22**	**15.123.455,37**
	Meliorbanca	7.040.144,43				
			S. Giobbe fase C e B	953.803,20	953.803,20	953.803,20
			S. Giobbe - Fase A 5° stralcio	121.387,25	121.387,25	-
			Ca' Foscari - restauro	7.134,57	7.134,57	7.134,57
			Ca' Foscari - trasloco	94.630,35	94.630,35	-
			Via Torino - Fac. Scienze	3.703.631,23	3.703.631,23	-
			Opere varie - Manutenzione straordinaria	428.236,75	428.236,75	261.030,00
			Fondo per accordi bonari	1.000.000,00	1.000.000,00	886.000,00
			S. Sebastiano	649.521,08	649.521,08	-
			S. Sebastiano - Trasloco	50.000,00	50.000,00	-
			Zattere - Trasloco	31.800,00	31.800,00	-
			Totale Mutuo Meliorbanca	**7.040.144,43**	**7.040.144,43**	**2.107.967,77**
	Totale L. 345/97	**26.545.570,65**		**26.545.570,65**	**26.545.570,65**	**17.231.423,14**

UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA

IL RETTORE
Prof. Pier Francesco Ghetti

Legge	Denominazione Mutuo	Importo Assegnato	Opere finanziate	Importo Progetto	Impegnato	Pagato
295/98	San Paolo Imi 1	10.044.089,42				
			S. Basilio - Adeg. Funzionale	46.512,00	46.512,00	-
			Ca'Foscari - restauro	8.260.551,82	8.260.551,82	7.568.223,18
			Zattere - Capannone	469.975,78	469.975,78	319.216,54
			Via Torino - Fac. Scienze	1.267.049,82	1.267.049,82	-
			Totale Mutuo Crediop 3	**10.044.089,42**	**10.044.089,42**	**7.887.439,72**
	San Paolo Imi 2	14.132.860,06				
			S. Giobbe fase A 5°stralcio	982.008,17	982.008,17	35.103,28
			Attuazione D.lgs. 626/94	516.456,90	516.456,90	477.754,15
			Via Torino - Fac. Scienze	12.634.394,99	12.634.394,99	-
			Totale Mutuo San Paolo Imi 2	**14.132.860,06**	**14.132.860,06**	**512.857,43**
	Totale L. 295/98	**24.176.949,48**		**24.176.949,48**	**24.176.949,48**	**8.400.297,15**

UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA

IL RETTORE
Prof. Pier Francesco Ghetti

Legge	Denominazione Mutuo	Importo Assegnato	Opere finanziate	Importo Progetto	Impegnato	Pagato
388/00	Opi 2	3.918.170,48				
			Via Torino - Facoltà di Scienze	3.718.489,68	3.718.489,68	-
			S. Giobbe fase A 5°stralcio	199.680,80	199.680,80	-
			Totale Mutuo Opi 2	**3.918.170,48**	**3.918.170,48**	-
	Totale L. 388/00	**3.918.170,48**		**3.918.170,48**	**3.918.170,48**	-

IL RETTORE
Prof. Francesco Ghetti

CA' FOSCARI VENEZIA

Legge	Denominazione Mutuo	Importo Assegnato	Opere finanziate	Importo Progetto	Impegnato	Pagato
448/01	Opi 1	2.013.601,79				
			Via Torino - Facoltà di Scienze	1.860.000,00	1.860.000,00	828.595,05
			S. Giobbe fase A 5°stralcio	153.601,79	153.601,79	-
			Totale Mutuo Opi 1	**2.013.601,79**	**2.013.601,79**	**828.595,05**
	Unicredit	1.587.898,68				
			Via Torino - Facoltà di Scienze	1.587.898,68	1.587.898,68	-
			Totale Mutuo Unicredit	**1.587.898,68**	**1.587.898,68**	-
	Totale L. 448/01	**3.601.500,47**		**3.601.500,47**	**3.601.500,47**	**828.595,05**

UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA

IL RETTORE
Prof. Pier Francesco Ghetti

PAGINA BIANCA

Documento G ***Consorzio per la gestione del Centro di Coordinamento delle attività di ricerca inerenti il sistema lagunare di Venezia – CO.RI.LA***

Stato di attuazione delle attività finanziate dalla legge speciale per Venezia – Aggiornamento al 31 dicembre 2006

PAGINA BIANCA

CORILA

Consorzio per la Gestione del Centro di Coordinamento delle Attività di Ricerca Inerenti il Sistema Lagunare di Venezia

Palazzo Franchetti
S. Marco 2847
30124 Venezia
Tel. +39.041.2402511
Fax +39.041.2402512
venezia@corila.it
www.corila.it
C.F. 94041400279
P.IVA 03338290277

Prot. 278/07
Venezia, 18/04/07

Al Presidente
del Magistrato alle Acque di Venezia
Ing. Maria Giovanna Piva
Palazzo X Savi
30121 Venezia

Gentile Presidente,

in risposta alla cortese Sua del 04/04/07 si comunicano i dati aggiornati al 31/12/06 relativamente ai finanziamenti assegnati.

Legge n. 388/00

Limiti di impegno	Importi assegnati e disponibili	Importi sottoscritti con contratti di mutuo	Importi impegnati	Importi spesi
2003	2003			
362	4.338	4.338	4.338	2.285

Legge n. 488/01

Limiti di impegno	Importi assegnati e disponibili	Importi sottoscritti con contratti di mutuo	Importi impegnati	Importi spesi
2004	2004			
129	1.563	1.563	1.563	1.563

* Gli importi qui riportati differiscono da quelli presentati gli anni precedenti a motivo delle minori spese per interessi e si intendono definitivi, essendo terminato il "periodo di utilizzo" dei mutui stessi. (nota: il fattore moltiplicativo del limite di impegno è risultato 12,10)

Cordiali saluti

Il Direttore
Ing. Pierpaolo Campostrini

PAGINA BIANCA

Documento H ***SAVE Aeroporto di Venezia Marco Polo***

Attività svolte a fronte dei finanziamenti ottenuti con la legislazione speciale – Aggiornamento al 31 dicembre 2006

PAGINA BIANCA

GABINETTO

MAGISTRATO ALLE ACQUE
VENEZIA
03. MAG 2007
GABINETTO

SAVE
MARCO POLO S.p.A.
MAGISTRATO ALLE ACQUE
- SEGRETERIA -
Arr. 07. MAG 2007
Prot. N. 317 /GAB.

Il Presidente

Spett.le
Ministero dei Lavori Pubblici
Magistrato alle Acque
Comitato di indirizzo,
coordinamento e controllo
Riva del Vin, 19
30100 VENEZIA

Oggetto: Aeroporto Marco Polo Tessera Venezia - Attività svolte a fronte dei finanziamenti ottenuti con la legislazione speciale

Con riferimento alla Vostra richiesta del 4 aprile 2007 prot. n. 262/GAB, con la presente si trasmettono prospetti riepilogativi delle opere, eseguite presso l'Aeroporto di Venezia, per le quali Save S.p.A. ha usufruito dei finanziamenti ottenuti con la legislazione speciale.

Distinti saluti.

Enrico Marchi

Venezia Tessera, 27 aprile 2007
Prot. 07/ 043 /Pres/EM/LS/pl

FINANZIAMENTO LEGGE n. 798/84 e rifinanziamenti (L. 910/86 - L. 67/88 - L. 360/91 - 415/92 - 724/94) **al 31.12.2006**

CATEGORIA	VOCI		IMPORTI ASSEGNATI (000 €)	IMPORTI IMPEGNATI (000 €)	IMPORTI SPESI (000 €)
Studi, sperimentazioni, monitoraggi, indagini e raccolta dati	Ricerche finalizzate all'avanzamento delle conoscenze e alla realizzazione degli interventi di salvaguardia	ambiente			
		beni culturali			
		economia			
		gestione dati			
Patrimonio mobiliare	Restauro conservativo di quadri, arazzi, sculture, mobili, etc				
Immobili	Restauro, manutenzione, consolidamento statico, sistemazione di immobili destinati a:	culto (chiese, etc)			
		cultura/musei/beni architettonici			
		istruzione			
		altri usi (specificare)			
Manutenzione bacino lagunare	Escavo canali e smaltimento fanghi				
Urbanizzazione e infrastrutture	Infrastrutture portuali				
	Infrastrutture aeroportuali		1.033	1.033	1.033
Altri interventi	.... (specificare la tipologia di intervento realizzato)				
TOTALE LEGGE n. 798/84 e successivi rifinanziamenti			**1.033**	**1.033**	**1.033**

NOTE: Vedi nota di allegato n. 3 lettera Magistrato: importi impegnati mediante Convenzione con altri enti

FINANZIAMENTO LEGGE n. 139/92 al 31.12.2006					
CATEGORIA	VOCI		IMPORTI ASSEGNATI (000 €)	IMPORTI IMPEGNATI (000 €)	IMPORTI SPESI (000 €)
Studi, sperimentazioni, monitoraggi, indagini e raccolta dati	Ricerche finalizzate all'avanzamento delle conoscenze e alla realizzazione degli interventi di salvaguardia	ambiente			
		beni culturali			
		economia			
		gestione dati			
Patrimonio mobiliare	Restauro conservativo di quadri, arazzi, sculture, mobili, etc.				
Immobili	Restauro, manutenzione, consolidamento statico, sistemazione di immobili destinati a:	culto (chiese, etc.)			
		cultura/musei/beni architettonici			
		istruzione			
		altri usi (specificare)			
Manutenzione bacino lagunare	Escavo canali e smaltimento fanghi				
Urbanizzazione e infrastrutture	Infrastrutture portuali				
	Infrastrutture aeroportuali		26.512	26.512	26.512
Altri interventi	..... (specificare la tipologia di intervento realizzato)				
TOTALE LEGGE n. 139/92			**26.512**	**26.512**	**26.512**

NOTE:

FINANZIAMENTO LEGGE n. 539/95 al 31.12.2006					
CATEGORIA	VOCI		IMPORTI ASSEGNATI (000 €)	IMPORTI IMPEGNATI (000 €)	IMPORTI SPESI (000 €)
Studi, sperimentazioni, monitoraggi, indagini e raccolta dati	Ricerche finalizzate all'avanzamento delle conoscenze e alla realizzazione degli interventi di salvaguardia	ambiente			
		beni culturali			
		economia			
		gestione dati			
Patrimonio mobiliare	Restauro conservativo di quadri, arazzi, sculture, mobili, etc				
Immobili	Restauro, manutenzione, consolidamento statico, sistemazione di immobili destinati a	culto (chiese, etc.)			
		cultura/musei/beni architettonici			
		istruzione			
		altri usi (specificare)			
Manutenzione bacino lagunare	Escavo canali e smaltimento fanghi				
Urbanizzazione e infrastrutture	Infrastrutture portuali				
	Infrastrutture aeroportuali		12.216	12.216	12.216
Altri interventi	(specificare la tipologia di intervento realizzato)				
TOTALE LEGGE n. 539/95			12.216	12.216	12.216

NOTE:

FINANZIAMENTO LEGGE n. 515/96 al 31.12.2006					
CATEGORIA	VOCI		IMPORTI ASSEGNATI (000 €)	IMPORTI IMPEGNATI (000 €)	IMPORTI SPESI (000 €)
Studi, sperimentazioni, monitoraggi, indagini e raccolta dati	Ricerche finalizzate all'avanzamento delle conoscenze e alla realizzazione degli interventi di salvaguardia	ambiente			
		beni culturali			
		economia			
		gestione dati			
Patrimonio mobiliare	Restauro conservativo di quadri, arazzi, sculture, mobili, etc.				
Immobili	Restauro, manutenzione, consolidamento statico, sistemazione di immobili destinati a:	culto (chiese, etc.)			
		cultura/musei/beni architettonici			
		istruzione			
		altri usi (specificare)			
Manutenzione bacino lagunare	Escavo canali e smaltimento fanghi				
Urbanizzazione e infrastrutture	Infrastrutture portuali				
	Infrastrutture aeroportuali		18 944	18 944	18.944
Altri interventi	..... (specificare la tipologia di intervento realizzato)				
TOTALE LEGGE n. 515/96			18.944	18.944	18.944

NOTE:

FINANZIAMENTO LEGGE n. 345/97 al 31.12.2006					
CATEGORIA	**VOCI**		**IMPORTI ASSEGNATI (000 €)**	**IMPORTI IMPEGNATI (000 €)**	**IMPORTI SPESI (000 €)**
Studi, sperimentazioni, monitoraggi, indagini e raccolta dati	Ricerche finalizzate all'avanzamento delle conoscenze e alla realizzazione degli interventi di salvaguardia	ambiente			
		beni culturali			
		economia			
		gestione dati			
Patrimonio mobiliare	Restauro conservativo di quadri, arazzi, sculture, mobili, etc.				
Immobili	Restauro, manutenzione, consolidamento statico, sistemazione di immobili destinati a	culto (chiese, etc.)			
		cultura/musei/beni architettonici			
		istruzione			
		altri usi (specificare)			
Manutenzione bacino lagunare	Escavo canali e smaltimento fanghi				
Urbanizzazione e infrastrutture	Infrastrutture portuali				
	Infrastrutture aeroportuali		12 701	12 701	12 701
Altri interventi	(specificare la tipologia di intervento realizzato)				
TOTALE LEGGE n. 345/97			**12.701**	**12.701**	**12.701**

NOTE:

FINANZIAMENTO LEGGE n. 295/98 al 31.12.2006					
CATEGORIA	VOCI		IMPORTI ASSEGNATI (000 €)	IMPORTI IMPEGNATI (000 €)	IMPORTI SPESI (000 €)
Studi, sperimentazioni, monitoraggi, indagini e raccolta dati	Ricerche finalizzate all'avanzamento delle conoscenze e alla realizzazione degli interventi di salvaguardia	ambiente			
		beni culturali			
		economia			
		gestione dati			
Patrimonio mobiliare	Restauro conservativo di quadri, arazzi, sculture, mobili, etc.				
Immobili	Restauro, manutenzione, consolidamento statico, sistemazione di immobili destinati a:	culto (chiese, etc.)			
		cultura/musei/beni architettonici			
		istruzione			
		altri usi (specificare)			
Manutenzione bacino lagunare	Escavo canali e smaltimento fanghi				
Urbanizzazione e infrastrutture	Infrastrutture portuali				
	Infrastrutture aeroportuali		12.739	12.739	12.368
Altri interventi	..... (specificare la tipologia di intervento realizzato)				
TOTALE LEGGE n. 295/98			**12.739**	**12.739**	**12.368**

NOTE:

FINANZIAMENTO LEGGE n. 448/98 al 31.12.2006					
CATEGORIA	**VOCI**		**IMPORTI ASSEGNATI (000 €)**	**IMPORTI IMPEGNATI (000 €)**	**IMPORTI SPESI (000 €)**
Studi, sperimentazioni, monitoraggi, indagini e raccolta dati	Ricerche finalizzate all'avanzamento delle conoscenze e alla realizzazione degli interventi di salvaguardia	ambiente			
		beni culturali			
		economia			
		gestione dati			
Patrimonio mobiliare	Restauro conservativo di quadri, arazzi, sculture, mobili, etc.				
Immobili	Restauro, manutenzione, consolidamento statico, sistemazione di immobili destinati a:	culto (chiese, etc.)			
		cultura/musei/beni architettonici			
		istruzione			
		altri usi (specificare)			
Manutenzione bacino lagunare	Escavo canali e smaltimento fanghi				
Urbanizzazione e infrastrutture	Infrastrutture portuali				
	Infrastrutture aeroportuali		19.109	19.109	0
Altri interventi	..... (specificare la tipologia di intervento realizzato)				
TOTALE LEGGE n. 448/98			**19.109**	**19.109**	**0**

NOTE: Vedi nota di allegato n. 9 lettera Magistrato del 24/05/2005, del 04/04/2006 e del 04/04/2007: di conseguenza quest'anno non è stato indicato quanto eventualmente speso. Importi impegnati tramite altri enti.

FINANZIAMENTO LEGGE n. 488/99 al 31.12.2006					
CATEGORIA	VOCI		IMPORTI ASSEGNATI (000 €)	IMPORTI IMPEGNATI (000 €)	IMPORTI SPESI (000 €)
Studi, sperimentazioni, monitoraggi, indagini e raccolta dati	Ricerche finalizzate all'avanzamento delle conoscenze e alla realizzazione degli interventi di salvaguardia	ambiente			
		beni culturali			
		economia			
		gestione dati			
Patrimonio mobiliare	Restauro conservativo di quadri, arazzi, sculture, mobili, etc.				
Immobili	Restauro, manutenzione, consolidamento statico, sistemazione di immobili destinati a:	culto (chiese, etc.)			
		cultura/musei/beni architettonici			
		istruzione			
		altri usi (specificare)			
Manutenzione bacino lagunare	Escavo canali e smaltimento fanghi				
Urbanizzazione e infrastrutture	Infrastrutture portuali				
	Infrastrutture aeroportuali				
Altri interventi	..... (specificare la tipologia di intervento realizzato)				
TOTALE LEGGE n. 488/99			**0**	**0**	**0**

NOTE:

FINANZIAMENTO LEGGE n. 388/00 al 31.12.2006					
CATEGORIA	**VOCI**		**IMPORTI ASSEGNATI (000 €)**	**IMPORTI IMPEGNATI (000 €)**	**IMPORTI SPESI (000 €)**
Studi, sperimentazioni, monitoraggi, indagini e raccolta dati	Ricerche finalizzate all'avanzamento delle conoscenze e alla realizzazione degli interventi di salvaguardia	ambiente			
		beni culturali			
		economia			
		gestione dati			
Patrimonio mobiliare	Restauro conservativo di quadri, arazzi, sculture, mobili, etc				
Immobili	Restauro, manutenzione, consolidamento statico, sistemazione di immobili destinati a:	culto (chiese, etc.)			
		cultura/musei/beni architettonici			
		istruzione			
		altri usi (specificare)			
Manutenzione bacino lagunare	Escavo canali e smaltimento fanghi				
Urbanizzazione e infrastrutture	Infrastrutture portuali				
	Infrastrutture aeroportuali		5.578	5.578	0
Altri interventi	... (specificare la tipologia di intervento realizzato)				
TOTALE LEGGE n. 388/00			**5.578**	**5.578**	**0**

NOTE: importi riferiti a due mutui in fase di stipula

FINANZIAMENTO LEGGE n. 448/01 al 31.12.2006					
CATEGORIA	**VOCI**		**IMPORTI ASSEGNATI (000 €)**	**IMPORTI IMPEGNATI (000 €)**	**IMPORTI SPESI (000 €)**
Studi, sperimentazioni, monitoraggi, indagini e raccolta dati	Ricerche finalizzate all'avanzamento delle conoscenze e alla realizzazione degli interventi di salvaguardia	ambiente			
		beni culturali			
		economia			
		gestione dati			
Patrimonio mobiliare	Restauro conservativo di quadri, arazzi, sculture, mobili, etc.				
Immobili	Restauro, manutenzione, consolidamento statico, sistemazione di immobili destinati a:	culto (chiese, etc.)			
		cultura/musei/beni architettonici			
		istruzione			
		altri usi (specificare)			
Manutenzione bacino lagunare	Escavo canali e smaltimento fanghi				
Urbanizzazione e infrastrutture	Infrastrutture portuali				
	Infrastrutture aeroportuali		1.548	0	0
Altri interventi	..... (specificare la tipologia di intervento realizzato)				
TOTALE LEGGE n. 448/01			**1.548**	**0**	**0**

NOTE: importi riferiti a mutuo che dovrà essere messo in appalto per la futura stipula

RIEPILOGO FINANZIAMENTI AL 31.12.2006

CATEGORIA	VOCI		IMPORTI ASSEGNATI (000 €)	IMPORTI IMPEGNATI (000 €)	IMPORTI SPESI (000 €)	
Studi, sperimentazioni, monitoraggi, indagini e raccolta dati	Ricerche finalizzate all'avanzamento delle conoscenze e alla realizzazione degli interventi di salvaguardia	ambiente	0	0	0	
		beni culturali	0	0	0	
		economia	0	0	0	
		gestione dati	0	0	0	
Patrimonio mobiliare	Restauro conservativo di quadri, arazzi, sculture, mobili, etc.		0	0	0	
Immobili	Restauro, manutenzione, consolidamento statico, sistemazione di immobili destinati a	culto (chiese, etc.)	0	0	0	
		cultura/musei/beni architettonici	0	0	0	
		istruzione	0	0	0	
		altri usi (specificare)	0	0	0	
Manutenzione bacino lagunare	Escavo canali e smaltimento fanghi		0	0	0	
Urbanizzazione e infrastrutture	Infrastrutture portuali		0	0	0	
	Infrastrutture aeroportuali		110.380	108.832	84.002	
Altri interventi	..... (specificare la tipologia di intervento realizzato)		0	0	0	
TOTALE			**110.380**	**108.832**	**84.002**	**0**

NOTE: in fase di definizione i fabbisogni da finanziare. Concordata nota con riferimento presso Magistrato alle Acque, Dott. Bellodi / Dott.ssa Munaretto

PAGINA BIANCA

Documento I ***La Biennale di Venezia***

Stato di attuazione delle attività svolte a fronte dei finanziamenti ottenuti sulla legge per la salvaguardia di Venezia – Aggiornamento al 31 dicembre 2006

PAGINA BIANCA

GABINETTO

La Biennale di Venezia
Palazzo Querini Dubois
San Polo 2004, 30125 Venezia
tel. + 39 041 5218711
fax + 39 041 2728329
p.IVA e C.F. 00330320276
www.labiennale.org







Spett.le
MAGISTRATO ALLE ACQUE
Comitato di indirizzo coordinamento e controllo
(art.4-legge 29.11.1984 n.798)
S. Polo, 19
30125 VENEZIA
prot. n. 991 PS del 3.5.07

Venezia, 03.05.2007

Oggetto: Trasmissione dati Legge n. 488/99

In ottemperanza a quanto da voi richiesto con lettera del 4 aprile (prot. n. 262/GAB) alleghiamo di seguito un quadro dettagliato, aggiornato al 31.12.2006, sullo stato di attuazione delle attività svolte.

Cordiali saluti

arch. Pina Maugeri
Responsabile Progetti Speciali

la Biennale di Venezia

Arte
Architettura
Cinema
Danza
Musica
Teatro
Archivio Storico

1. QUADRO RIASSUNTIVO DELLE ATTIVITA' SVOLTE AL 31.12.2006 (LEGGE 388/99)

1	***ARSENALE DI VENEZIA - INTERVENTI SUGLI EDIFICI IN CONCESSIONE***	
	Interventi di riqualificazione delle aree espositive nell'Area Sud dell'Arsenale di Venezia (edificio 306, edificio 229, edificio 227/a)	263.594,05
2	***ASAC - ALLESTIMENTO SEDE PRESSO EDIFICIO PLEIADI (Vega)***	
	Interventi per la riqualificazione di alcuni locali dell'edificio Pleiadi al Vega (Marghera) destinati a deposito e laboratori ASAC	684.844,80
3	***CONCORSO INTERNAZIONALE NUOVO PALAZZO DEL CINEMA***	
	Concorso Internazionale di Progettazione del Nuovo Palazzo del Cinema e riqualificazione dell'area pertinente	133.520,32
	Spese generali di produzione e spese mutuo	*168.690,05*
	TOTALE SPESO ANNO 2006	**1.250.649,22**

Documento L ***Fondazione Scientifica Querini Stampalia***

Stato di attuazione interventi finanziati dalla legislazione speciale – Aggiornamento al 31 dicembre 2006

PAGINA BIANCA

GABINETTO

Fondazione Querini Stampalia
Onlus

Il Direttore

MAGISTRATO ALLE ACQUE
- SEGRETERIA -
GABINETTO

Venezia 30 aprile 2007
Prot.n. 507/A7D
ML/br

Gent.ma Signora
Ing. Maria Giovanna Piva
Presidente
Magistrato alle Acque
Comitato di Indirizzo Coordinamento e Controllo
S. Polo,19
30125 Venezia

MAGISTRATO ALLE ACQUE
- SEGRETERIA -
Ent. 5 MAG 2007
Prot.N. 348 /GAB.

Oggetto: legge n. 798/ 84. Trasmissione dati richiesti.

Gentile Presidente,

faccio seguito alla Sua nota prot. n° 262/GAB del 04/04/2007, per comunicarLe i dati relativi alle opere eseguite nell'ambito delle leggi 798/84 e 295/98.

1. **Legge n° 798/84**: finanziamento di € 920.768,58 ottenuto mediante Convenzione stipulata con il Comune di Venezia in data 19 luglio 2004, registrata a Mestre il 27 luglio 2004, n° di repertorio 100167; si evidenzia che la cifra deliberata dal Consiglio Comunale in data 28 marzo 2002, PD 2002/1158, ammontava a € 1.033.000,00.
Gli importi impegnati al 31.12.2006 sono stati € 475.000,00; gli importi spesi € 320.000,00 come da dettaglio nell'allegato A.

2. **Legge n. 295/98**: finanziamento ottenuto tramite il Crediop (istituto finanziatore) stipulando i seguenti contratti:

a) contratto stipulato in data 30.12.1999, n° di repertorio 12461, (notaio Alberto Gasparotti) per la somma valutabile, compresi gli interessi, in € 3.615.198,29

b) contratto stipulato in data 9.12.2000, n° di repertorio 13705. (notaio Alberto Gasparotti) per la somma valutabile, compresi gli interessi, in € 3.615.198,29

Totale somma ottenibile comprensiva degli interessi € 7.230.396,58

Nel 2006 gli importi impegnati non hanno subito variazioni rispetto a quanto comunicatovi il 28 giugno 2006, prot.n. 562/A7D:

- cifra impegnata € 7.230.000,00
- importo speso € 6.251.000,00.

Distinti saluti

il direttore
Chiara Simonato Rabitti



Fondazione Querini Stampalia
Onlus

Il Direttore

ALLEGATO A

Legge 798/84

Prospetto 1° - Elenco delle opere in progetto

A) Completamento della corte coperta

B) Ristrutturazione locale "M"

C) Ristrutturazione ingresso civico 5252

D) Completamento della corte scoperta e ristrutturazione del passaggio verso corte Nova

E) Sistemazione facciata esterna e piante su Rio di Santa Maria Formosa

F) Realizzazione opere strutturali e a protezione dell'umidità dell'auditorium

G) Realizzazione opere strutturali e contro l'umidità dei locali 0.35 - 0.36 - 0.37

H) Realizzazione opere strutturali e di protezione contro l'umidità dello "Stabile Nuovo"

1) Importo presunto delle opere a base di gara	€ 1.968.828,99
2) Somma a disposizione per progettazione e Direzione Lavori	€ 98.441,45
3) A disposizione per IVA	€ 196.882,90
Importo generale di progetto	**€ 2.264.153,34**

Su detto importo è stato ottenuto un contributo in conto capitale di € 920.768,58.

Prospetto 2° - Elenco delle opere eseguite a tutto il 31.12.2006

A) Completamento della Corte Coperta	
B) Ristrutturazione locale "M"	
1) Importo dei lavori	€ 348.800,00
2) Spese progettazione e Direzione Lavori	€ 17.500,00
3) Spese per IVA	€ 34.880,00
Spesa generale delle opere eseguite	**€ 401.180,00**

Opere ancora da collaudare da parte dei tecnici del Comune di Venezia e per le quali si presume di ottenere un contributo in conto capitale di circa il 49,90% pari ad € 200.000,00.

Prospetto 3° - Opere in corso

1) Realizzazione opere strutturali e di protezione contro l'umidità per auditorium	€ 480.000,00
2) Somma a disposizione per progettazione e Direzione Lavori	€ 24.000,00
3) Somma a disposizione per IVA	€ 48.000,00
Sommano	**€ 552.000,00**

I lavori sono iniziati il 15 maggio 2006 e l'ultimazione degli stessi è prevista per il mese di giugno 2007.

Per queste opere nel 2006 sono stati spesi € 120.000,00.

Prospetto 4° - Opere in fase di progettazione

1) Ristrutturazione ingresso civico 5252
2) Completamento della corte scoperta e ristrutturazione del passaggio verso Corte Nova
3) Sistemazione facciata esterna e del ponte su Rio Santa Maria Formosa

Le opere descritte saranno eseguite, presumibilmente, negli anni 2007 – 2008 e la spesa presunta ammonta ad € 712.500,00 così distinta:

-	per esecuzione lavori a mezzo trattativa privata tra ditte di fiducia della Fondazione	€ 570.000,00
-	somme a disposizione per progettazione e direzione lavori compreso oneri fiscali	€ 85.500,00
-	somme a disposizione per iva	€ 57.000,00
Totale		**€ 712.500,00**

Per queste opere si presume di ottenere un contributo in conto capitale del 49,90%, pari a € 356.000,00.

il direttore
Chiara Simonato Rabitti

PAGINA BIANCA

Documento M ***Fondazione Giorgio Cini***

Stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia – Dati consuntivi delle attività svolte – Aggiornamento al 31 dicembre 2006

PAGINA BIANCA

GABINETTO
SEZ. 1°
SEZ. 2°
SEZ. 3°
SEZ. 4°
SEZ. 5°
UFFICIO TECNICO
MAGISTRATO alle ACQUE
30 APR. 2007
ARRIVO

fondazione GIORGIO CINI onlus
VENEZIA
30. APR 2007
GABINETTO

Spett.le
MAGISTRATO ALLE ACQUE
ISPETTORATO GENERALE PER LA
LAGUNA DI VENEZIA MARANO E GRADO
S.Polo, 19 - 30125 VENEZIA

Venezia, 26 aprile 2007
PROT. N. 90/07 SG

MAGISTRATO ALLE ACQUE
- SEGRETERIA -
Arr. 07 MAG 2007
Prot. N. 314 /GAB.

Oggetto : **COMITATO DI INDIRIZZO COORDINAMENTO E CONTROLLO**
Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia - Dati consuntivi al 31/12/2005 delle attività svolte dalla Fondazione Cini
Rif.: Vs. comunicazione prot. n. 262/GAB del 4/4/2007.

1) Relazione sulle attività :

La Fondazione Cini ha realizzato, nel corso del 2006, i lavori di restauro delle coperture della manica lunga del Buora (Ambito "I"), della sala degli arazzi e del padiglione delle capriate (ambito "B5/1" e "B5/2").
Sull'ambito I al 31/12/2006 sono stati spesi 226.916,89 €
Sull'ambito B5/1-2 al 31/12/2006 sono stati spesi 800.171,32 €

Sono state sviluppate le progettazioni dei lavori di restauro dell'edificio denominato "Manica Lunga del Buora" e per la realizzazione della nuova grande biblioteca di storia dell'Arte della Fondazione Cini (Ambito "P"), e della nuova sala mostre nel fabbricato dell'ex-convitto (ambito "H1").

Sono stati appaltati e sono in corso di esecuzione i lavori per l'adeguamento dell'intera rete fognaria dell'isola di San Giorgio, con impianto centralizzato di trattamento reflui (ambito "V"). I lavori dovrebbero essere completati entro la fine del 2007.

E' stata completata la realizzazione del restauro dell'ex "casetta delle suore" per la trasformazione in bar per l'isola di San Giorgio (ambito "H2"). I lavori sono terminati con l'entrata in funzione del nuovo bar nel mese di giugno 2006, con un consuntivo complessivo finale di 465.996,15 €.

E' stata affidata anche la progettazione degli adeguamenti impiantistici nelle aree monumentali della Fondazione (uffici istituti e biblioteca del Longhena), i progetti definitivi sono già stati presentati alla Soprintendenza ed abbiamo già ottenuto l'approvazione.

E' infine stato affidato l'incarico di progettazione per la ristrutturazione dell'ex-officina meccanica, i lavori inizieranno entro il 2007.

2) Consuntivi al 31/12/2006

Legge 488/1999

Capitolo 7187 :

Annualità quindicennali per l'aggiornamento degli studi sulla Laguna di Venezia ....

- IMPORTO ASSEGNATO : **7.746.853,49 €**
- IMPORTO IMPEGNATO : **7.746.853,49 €**
- IMPORTO SPESO : **5.409.823,06 €**

Capitolo 7195

Annualità quindicennali per gli interventi di competenza della Fondazione Giorgio Cini

- IMPORTO ASSEGNATO : **8.600.000,00 €**
- IMPORTO Sottoscritto con contratto di mutuo : **8.600.000,00 €**
- IMPORTO SPESO : **1.889.057,83 €**

Legge 388/2000

Capitolo 7195 :

Annualità quindicennali per gli interventi di competenza della Fondazione Giorgio Cini

- IMPORTO ASSEGNATO (a valere dal 2002) : **6.523.766,06 €**
- IMPORTO ASSEGNATO (a valere dal 2003) : **2.609.501,37 €**
- IMPORTO Sottoscritto con contratto di mutuo : **9.133.267,43 €**
- IMPORTO SPESO : **2.034.812,54 €**

Legge 448/2001

Capitolo 7195 :

Annualità quindicennali per gli interventi di competenza della Fondazione Giorgio Cini

- IMPORTO ASSEGNATO (a valere dal 2002) : **3.259.002,98 €**
- IMPORTO ASSEGNATO (a valere dal 2003) : **1.629.501,49 €**
- IMPORTO ASSEGNATO (a valere dal 2004) : **2.000.000,00 €**
- IMPORTO Sottoscritto con contratto di mutuo : **6.888.504,47 €**
- IMPORTO SPESO : **124.963,90 €**

Distinti saluti

FONDAZIONE GIORGIO CINI
Isola di San Giorgio Maggiore
30124 VENEZIA

Documento N ***Curia Patriarcale di Venezia***

Stato di attuazione interventi finanziati dalla legislazione speciale – Aggiornamento al 31 dicembre 2006

PAGINA BIANCA

GABINETTO

CURIA PATRIARCALE DI VENEZIA

UFFICIO AMMINISTRATIVO DIOCESANO - S. Marco 320/A - 30124 Venezia

DIOCESI: PATRIARCATO DI VENEZIA

07.MAG.2007

GABINETTO

Venezia, 30.04.2007

Prot. 85

Pos. OPI L.S.-Magistr.Acque

RACCOMANDATA

MAGISTRATO ALLE ACQUE
- SEGRETERIA -

Arr. 08 MAG 2007

Prot. N. 326 /GAB.

Dott. Ing. Maria Giovanna Piva
Presidente
Magistrato alle Acque
Segretario del Comitato di Indirizzo
Coordinamento e Controllo
S. Polo, 19
30125 VENEZIA

Oggetto: Diocesi: Patriarcato di Venezia.
Richiesta dati.
Rilevazione dati L. 798/84, al 31.12.2006.

In risposta alla Vs. del 04.04.2007, Prot. N. 262/GAB, questa Amministrazione allega le schede relative ai finanziamenti assegnati con la legislazione speciale, suddivisi per numero di legge.

Con distinti saluti.

L'AMMINISTRAZIONE DIOCESANA
Il Segretario U.A.D.
Rag. Arrigo Memo

ALLEGATI: scheda finanziamento L. n. 295/98
" L. n. 488/99
" L. n. 388/00

Art.M/ "OPILEGGESPECIALE"

FINANZIAMENTO LEGGE n. 295/98 al 31.12.2006

CATEGORIA	VOCE		IMPORTI ASSEGNATI (000 €)	IMPORTI IMPEGNATI (000 €)	IMPORTI SPESI (000 €)
Studi, sperimentazioni, monitoraggi, indagini e raccolta dati	Ricerche finalizzate all'avanzamento delle conoscenze e alla realizzazione degli interventi di salvaguardia	ambiente			
		beni culturali			
		economia			
		gestione dati			
Patrimonio mobiliare	Restauro conservativo di quadri, arazzi, sculture, mobili, etc.				
Immobili	Restauro, manutenzione, consolidamento statico, sistemazione di immobili destinati a:	culto (chiese, etc.)	12.384	12.384	12.384
		cultura/musei/beni architettonici			
		istruzione			
		altri usi (specificare)			
Urbanizzazione e infrastrutture	Infrastrutture portuali				
	Infrastrutture aeroportuali				
Altri interventi	..... (specificare la tipologia di intervento realizzato)				
TOTALE LEGGE n. 295/98			12.384	12.384	12.384

CURIA PATRIARCALE VENEZIA

FINANZIAMENTO LEGGE n. 488/99 al 31.12.2006					
CATEGORIA	[illegible]		IMPORTI ASSEGNATI (000 €)	IMPORTI IMPEGNATI (000 €)	IMPORTI SPESI (000 €)
Studi, sperimentazioni, monitoraggi, indagini e raccolta dati	Ricerche finalizzate all'avanzamento delle conoscenze e alla realizzazione degli interventi di salvaguardia	ambiente			
		beni culturali			
		economia			
		gestione dati			
Patrimonio mobiliare	Restauro conservativo di quadri, arazzi, sculture, mobili, etc.				
Immobili	Restauro, manutenzione, consolidamento statico, sistemazione di immobili destinati a:	culto (chiese, etc.)	10.699	10.699	10.699
		cultura/musei/beni architettonici			
		istruzione			
		altri usi (specificare)			
Urbanizzazione e infrastrutture	Infrastrutture portuali				
	Infrastrutture aeroportuali				
Altri interventi	..... (specificare la tipologia di intervento realizzato)				
[illegible]	TOTALE LEGGE n. 488		10.699	10.699	10.699



FINANZIAMENTO LEGGE n. 388/00 al 31.12.2006					
CATEGORIA	VOCI		IMPORTI ASSEGNATI (000 €)	IMPORTI IMPEGNATI (000 €)	IMPORTI SPESI (000 €)
Studi, sperimentazioni, monitoraggi, indagini e raccolta dati	Ricerche finalizzate all'avanzamento delle conoscenze e alla realizzazione degli interventi di salvaguardia	ambiente			
		beni culturali			
		economia			
		gestione dati			
Patrimonio mobiliare	Restauro conservativo di quadri, arazzi, sculture, mobili, etc.				
Immobili	Restauro, manutenzione, consolidamento statico, sistemazione di immobili destinati a:	culto (chiese, etc.)	28.488	28.488	12.144
		cultura/musei/beni architettonici			
		istruzione			
		altri usi (specificare)			
Urbanizzazione e infrastrutture	Infrastrutture portuali				
	Infrastrutture aeroportuali				
Altri interventi	..... (specificare la tipologia di intervento realizzato)				
TOTALE LEGGE n. 388/00			28.488	28.488	12.144

Documento O ***Diocesi di Chioggia***

Stato di attuazione interventi finanziati dalla legislazione speciale – Aggiornamento al 31 dicembre 2006

PAGINA BIANCA

DIOCESI DI CHIOGGIA
Curia Vescovile
D.M. 20 ott. 1986, n. 328 - G.U. 17 nov. 1986, n. 267

GABINETTO

Ufficio TECNICO

Prot. n. 93 / 2007

MAGISTRATO ALLE ACQUE
- SEGRETERIA -
Arr. 23 APR. 2007
Prot. N. 280 /GAB.

Chioggia, 17 aprile 2007

MAGISTRATO ALLE ACQUE
VENEZIA
23 APR
GABINETTO

Al Segretario del Comitato di Indirizzo
Coordinamento e Controllo
(Art. 4 legge 29.11.1984 n. 798)
Ministero delle Infrastrutture
Magistrato alle Acque
Palazzo X Savi
VENEZIA

Risposta al Prot. n. 262/GAB del 04/04/2007

OGGETTO: Stato di attuazione interventi finanziari della legislazione speciale al 31-12-2006.

In riscontro alla Vs. richiesta a margine ed in esecuzione al disposto del quarto comma dell'art. 4 della legge 798/84 abbiamo predisposto lo schema sullo stato degli utilizzi dei finanziamenti concessi a questa Diocesi relativi alla legge sulla Salvaguardia di Venezia, che alleghiamo.

Distinti saluti.

DIOCESI DI CHIOGGIA
Rione Duomo 1006
Chioggia (Ve)

Il Vicario Generale
Mons. Pietro Mozzato
Mozzato

DIOCESI DI CHIOGGIA

Finanziamenti legge speciale per Venezia

Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti al 31 dicembre 2006

(importi in migliaia di euro)

1

Anno 1999	Limiti d'impegno - ex lege 448/98	Importi assegnati e disponibili	Importi sottoscritti con contratti di mutuo	Importi impegnati	Importi spesi
Importi	215	3.098	3.098	2.718	2.718

N.B.: Finanziamento totalmente speso

2

Anno 2000	Limiti d'impegno - ex lege 488/99	Importi assegnati e disponibili	Importi sottoscritti con contratti di mutuo	Importi impegnati	Importi spesi
Importi	55	723	723	674	674

N.B.: Finanziamento totalmente speso

3

Anno 2002	Limiti d'impegno - ex lege 448/2001	Importi assegnati e disponibili	Importi sottoscritti con contratti di mutuo	Importi impegnati	Importi spesi
Importi	370	4.500	4.500	4.500	4.500

N.B.: Finanziamento totalmente speso

4

Anno 2004	Limiti d'impegno - ex lege 448/2001	Importi assegnati e disponibili	Importi sottoscritti con contratti di mutuo	Importi impegnati	Importi spesi
Importi	100	-	-	-	-

N.B.: Non ancora utilizzato

Chioggia 17/04/2007

DIOCESI DI CHIOGGIA
Rione Duomo 1008
Chioggia (Ve)

Il Vicario Generale
(Mons. Mozzato dr. Pietro)

Mozzato
